

تقرير متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية  
لقطاع التربية والتعليم

جداول قطاع التربية والتعليم

للفترة من ١/١ ولغاية ٣١/١٢/٢٠١٤

قسم التنسيق والمتابعة

شعبة المتابعة

## متابعة مشاريع قطاع التربية والتعليم

### للفترة من ١/١ ولغاية ٣١/١٢/٢٠١٤

ويتضمن هذا القطاع وبصورة رئيسية مشاريع كل من وزارتي (( التربية ، التعليم العالي)) والتقرير في أدناه يتضمن أهم المؤشرات عن أداء هذا القطاع لعام ٢٠١٤ ومن خلال العينة التي تمت متابعتها وزيارتها ميدانيا من قبل فرق الزيارات الميدانية الهندسية من وزارة التخطيط.

### خطة عام ٢٠١٤

مشاريع الخطة الاستثمارية لقطاع التربية والتعليم المقترحة لعام ٢٠١٤ : ٣٦٩ مشروع

المشاريع المخطط لزيارتها لعام ٢٠١٤ : ١١٥ مشروع وتمثل ما نسبته ( ٣١% ) من مشاريع قطاع التربية والتعليم لعام ٢٠١٤

المشاريع التي تم زيارتها خلال عام ٢٠١٤ : ٩٢ مشروع

النسبة بين المخطط والفعلي لعام ٢٠١٤ : ٨٠%

النسبة بين الفعلي والكلي لخطة زيارة المشاريع لعام ٢٠١٤ : ٢٥%

### خطة عام ٢٠١٣

الخطة الاستثمارية قطاع التربية والتعليم لعام ٢٠١٣ : ٥٥١ مشروع .

المشاريع المخطط لزيارتها لعام ٢٠١٣ : ١٨٥ مشروع وتمثل ما نسبته ٣٤% من مشاريع قطاع التربية والتعليم لعام ٢٠١٣ .

المشاريع التي تم زيارتها خلال عام ٢٠١٣ : ١٣٣ مشروع .

النسبة بين المخطط والفعلي لعام ٢٠١٣ : ٧٢% .

النسبة بين الفعلي والكلي لخطة زيارة المشاريع لعام ٢٠١٣ : ٢٤%

### مقارنة بين خطة عام ٢٠١٣ و عام ٢٠١٤

ان مشاريع القطاع لعام ٢٠١٤ مثلت المشاريع المستمرة من خطة عام ٢٠١٣ حيث بلغت خطة قطاع التربية والتعليم لهذا العام ٥٥١ مشروع وهي اكبر من خطة القطاع لعام ٢٠١٤ والبالغة ٣٦٩ مشروع اما بالنسبة لخطة المتابعة فنلاحظ ان خطة عام ٢٠١٣ تضمنت زيارة ١٨٥ مشروع وما نفذ منها هو ٧٢ % وخطة عام ٢٠١٤ تضمنت زيارة ١١٥ مشروع وقد تم تخفيض الخطة لتلائم والامكانيات المتاحة وتم تنفيذ ما نسبته ٨٠% من هذه الخطة


والجدول رقم (1) و المخطط (1) يظهر خطة متابعة مشاريع قطاع التربية والتعليم لعام 2014 حيث يلاحظ منه شمول المشاريع ب 99 زيارة ميدانية وبمعدل 1 زيارة لكل مشروع وهي نسبة متواضعة حيث ان الطموح زيارة كل موقع بما لا يقل عن 3 مرات في السنة لمواكبة مراحل تنفيذ المشروع بصورة أفضل

### جدول رقم (1) تربية وتعليم

ت	الوزارة	عدد المشاريع المخطط زيارتها عام 2014	الاهمية النسبية %	عدد المشاريع التي تم زيارتها لغاية 12/31	نسبة التنفيذ المنوية من الخطة السنوية %	عدد الزيارات المتحققة	معدل عدد الزيارات لكل مشروع
1	وزارة التربية	5	4.35	1	20.00	2	2.00
2	وزارة التعليم العالي	110	95.65	91	82.73	97	1.07
	الكلية	115	100.00	92	80	99	2.07

### المخطط (1) يظهر خطة متابعة مشاريع قطاع التربية والتعليم

عدد الزيارات المتحققة ■ عدد المشاريع التي تم زيارتها لغاية 12/31 ■ عدد المشاريع المخطط زيارتها عام 2014

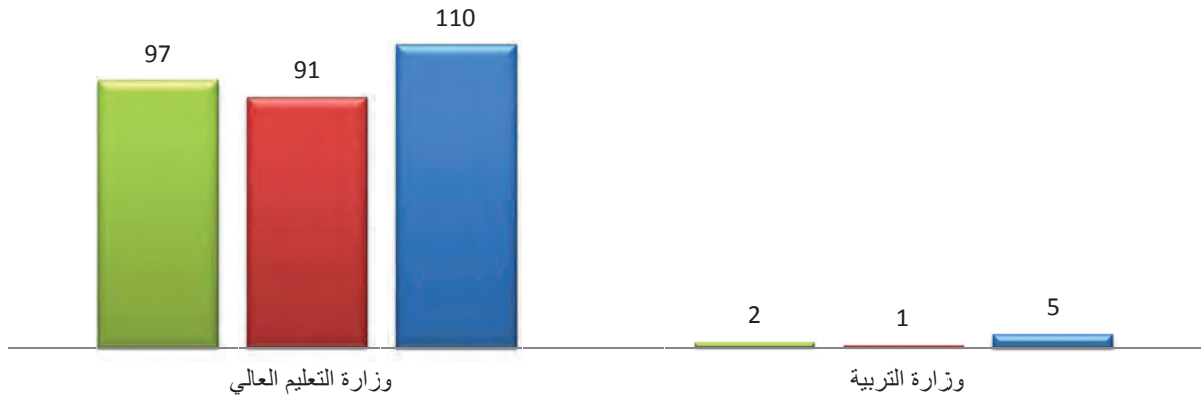


## توزيع الزيارات على المحافظات

الجدول رقم (٢) والمخطط رقم (٢) يظهر عدد الزيارات المتحققة على مستوى كل محافظة ويلاحظ منه عدم اوقلة الزيارات الميدانية المتحققة في النصف الثاني من السنة لكل من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين والانبار وكركوك وذلك يعود للأوضاع الامنية لهذه المحافظات

وحصلت مشاريع محافظة بغداد على أعلى عدد من الزيارات المتحققة حيث بلغ عددها ١٩ زيارة وتليها محافظة البصرة ١٤ زيارة وبلغ معدل الزيارات على مستوى كل محافظة (٧ زيارة / محافظة)


جدول (٢)			
عدد الزيارات حسب المحافظات			
المحافظة	الوزارة		المجموع
	التعليم العالي	التربية	
بغداد	19	0	19
البصرة	14	0	14
ميسان	5	0	5
ذي قار	8	1	9
المتنى	8	0	8
القادسية	5	0	5
واسط	7	1	8
بابل	9	0	9
كربلاء	8	0	8
نجف	11	0	11
صلاح الدين	0	0	0
نينوى	0	0	0
كركوك	3	0	3
الانبار	0	0	0
ديالى	0	0	0
المجموع	97	2	99

مخطط (2) يوضح عدد المشاريع التي تم زيارتها موزعة على المحافظات

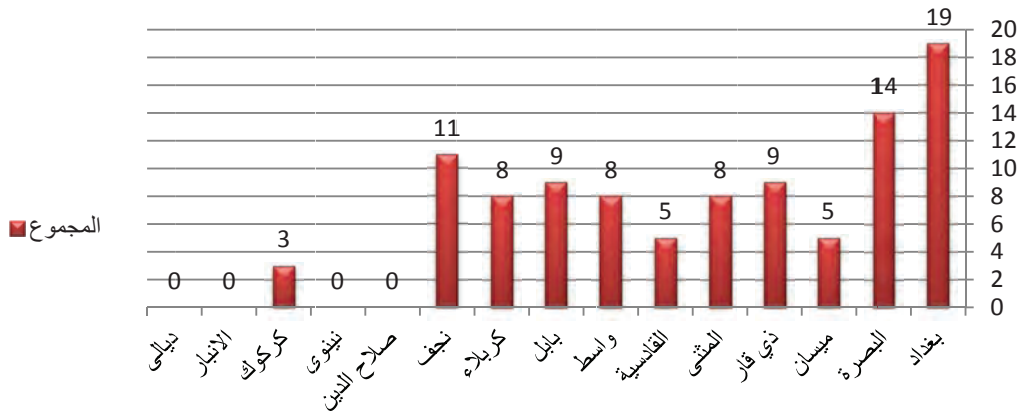


### المؤشرات المستخلصة من عينة المشاريع التي تمت زيارتها

يظهر المخطط (٣) نسب انحراف المشاريع موزعه على فئات لقطاع التشييد /التربية والتعليم ويلاحظ منه ان المشاريع ذات نسب الانحراف الاقل من ٥% احتلت ما مقداره ٢٨% من العينة و المشاريع ذات نسب الانحراف من (٢٠% وأكثر ) احتلت ما مقداره ٤٢% من مجموع المشاريع التي تم زيارتها .

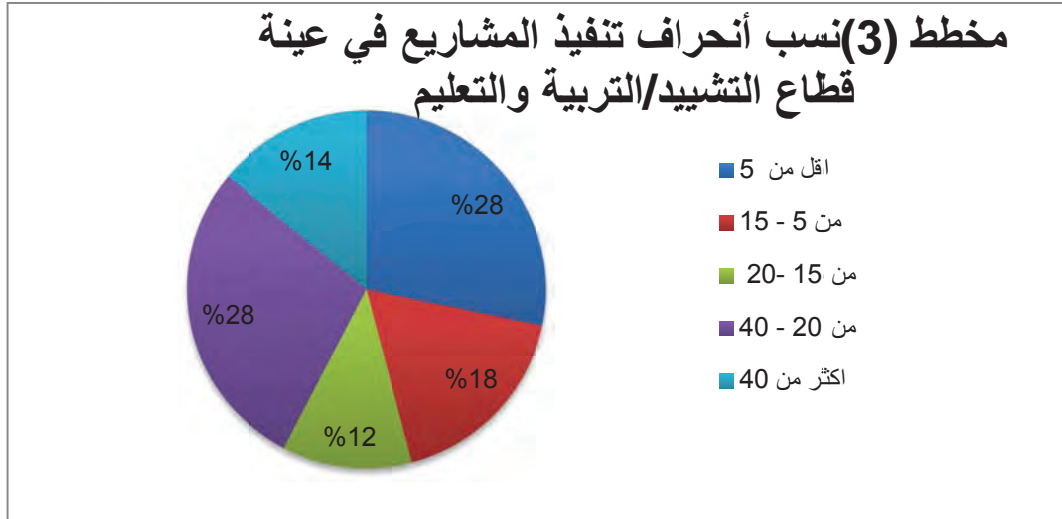


اما بالنسبة للمخطط (٤) فيظهر نسب الانجاز موزعه على فئات من اجل تحديد مراحل تنفيذ خطة القطاع بشكل عام وتلاحظ منه ان المشاريع ذات نسب الانجاز التي تتراوح (من ٨٠% الى ١٠٠%) احتلت النسبة الاعلى ومقدراها ٢٩% من حجم العينة ، اما أوطأ نقطه فظهرت عند المشاريع ذات نسب الانجاز ( من ٠% الى ٢٠% ) وبنسبة مقدارها ٨% من حجم العينة .

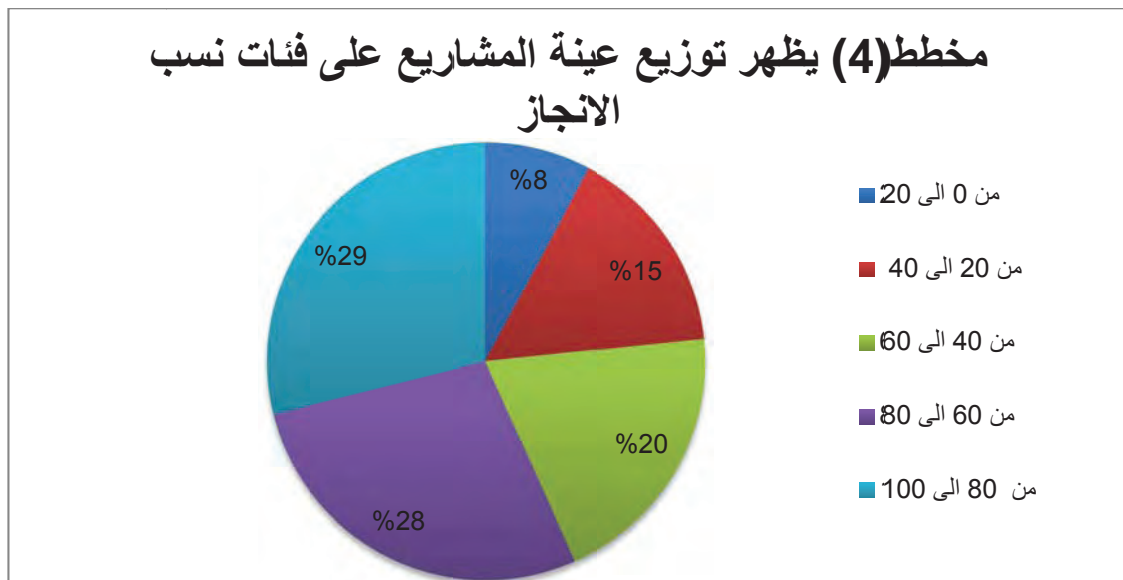


## مقارنة بين نسب الانحراف والانجاز لقطاع التربية والتعليم بين عامي 2013-2014

من خلال المخطط رقم (5- التربية والتعليم) يتضح منه ان هنالك تغير واضح في فئة المشاريع ذات نسب الانجاز الاقل من 5% حيث ان هنالك انخفاض في هذه الفئة في عام 2014.

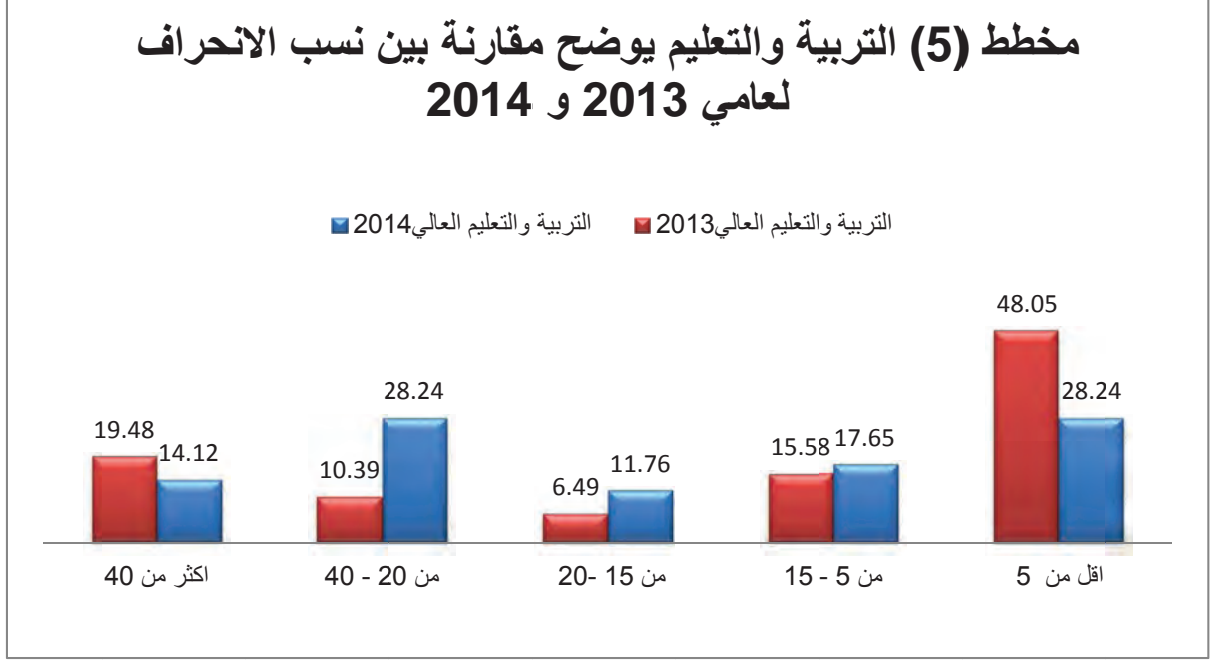

ومن المخطط رقم (6) تربية وتعليم) فيلاحظ منه ارتفاع في نسب الانجاز للفئات المحصورة بين 20% إلى 80% وانخفاض قليل للفئة من 80% وأكثر.

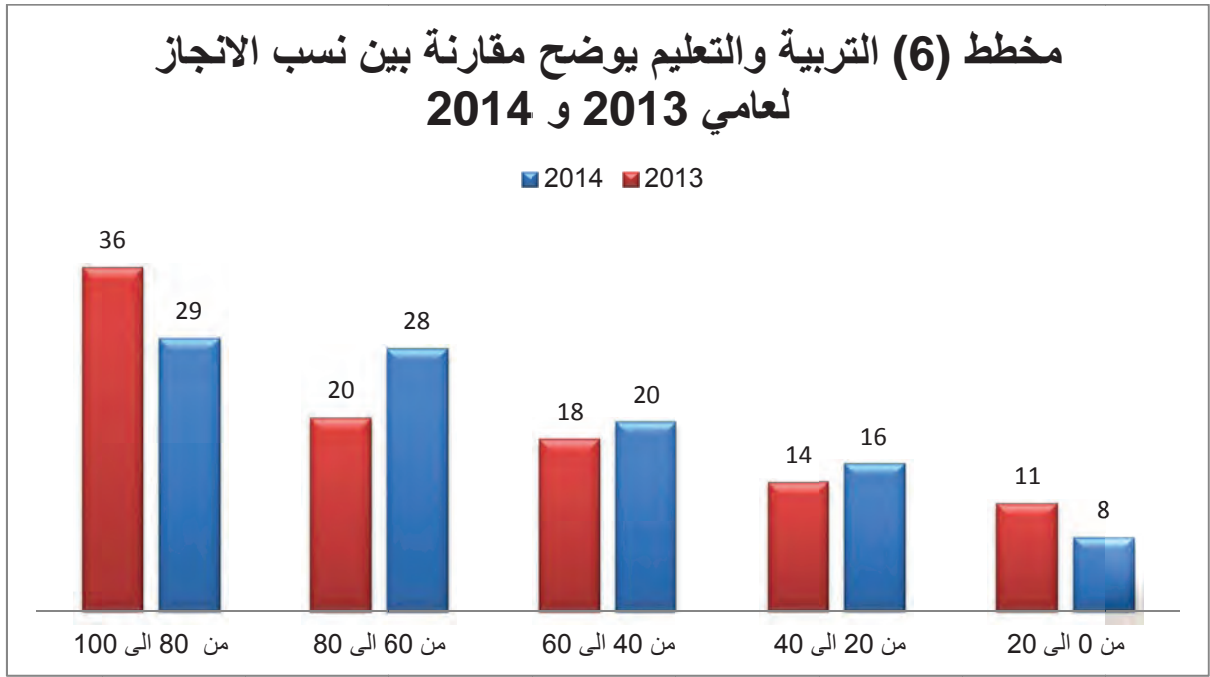


## تحليل نموذج من وزارات قطاع التربية والتعليم / وزارة التعليم العالي


تم اختيار وزارة التعليم العالي كعينة من قطاع التربية والتعليم للوقوف على تفاصيل إنجاز المشاريع ومراحل تقدم خطة وزارة التعليم العالي ومن خلال المؤشرات المستخلصة من المخططين (1) التعليم العالي و(2) التعليم العالي) نستنتج الآتي :

- مؤشرات الانجاز مخطط (1) التعليم العالي) حيث يلاحظ منه ان مشاريع ذات نسب إنجاز ما بين (80% إلى 100%) هي الأكثر والتي تمثل 29% من العينة من ضمن مخطط التعليم العالي ، اما بالنسبة الى مؤشر الانحراف وكما موضح في المخطط رقم (2) التعليم العالي) فيلاحظ منه ان المشاريع ذات نسب الانحراف الضمن 5% شملت 29% من عينة المشاريع

### مخطط (1) التعليم العالي) يتضمن تحليل مؤشرات مشاريع وزارة التعليم العالي وحسب نسب الانجاز لعينة المشاريع

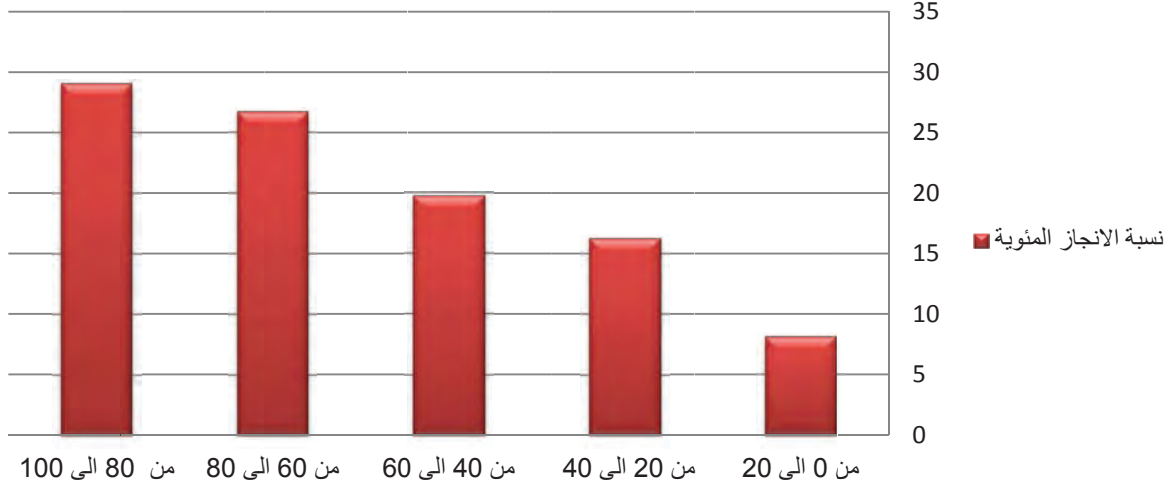

### مخطط (2) التعليم العالي) يتضمن تحليل مؤشرات مشاريع وزارة التعليم العالي وحسب نسب الانحراف لعينة المشاريع

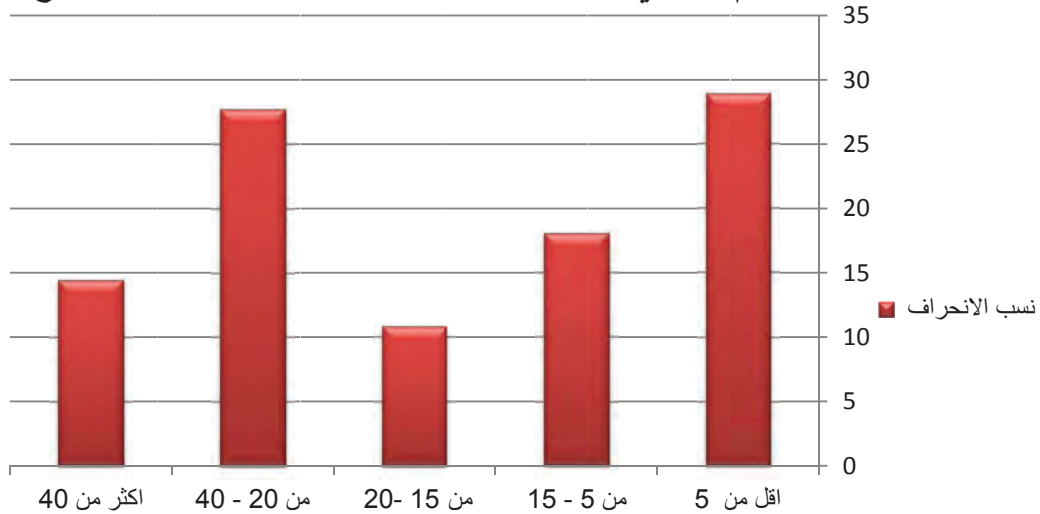





مدرسة قيس بن سعد / قضاء البتيرة / محافظة ميسان





انشاء المراكز البحثية / المركز البحثي  
/ جامعة ذي قار / الناصرية

عيبة من مشاريع الخططة الإستثمارية لقطاع التربية والتعليم المشمولة بالزيارات الميدانية لعام 2014

المتعدد	الملاحظات	المشاكل والمعوقات	نسبة الجهد المشروع على مستوى القدرات	تاريخ الزيارة	المحافظة	نسبة اكمال المشروع	نسبة اكمال المشروع الكلية	المسروف التراكمي	التخصيص مليون دينار	الكلفة مليون دينار	سنة ابراج المشروع	الجهة المنفذة	اسم المشروع	التوقيت	ت
		تأخر ظهور نتائج الفحوصات المركزية ، عدم وجود استشاري متخصص ان التصميم هو الاستشاري نفسه ، تأخر حصول المصلحة الأجنبية على تصاريح الأقامة والعمل		1	البحر	70	30	100	1050	4000	2010	التعليم العالي	انشاء المركز الثقافي (البحر)	5-2-1-27	1
	المشروع ملغى وستتم استلامها اربلا			1	البحر	0	100	100				التعليم العالي	استكمال كلية الطب (جامعة البحر)		2
		تلك المشروع بسبب الاجران الجوية والاضطر والمانسبت المالية		1	ذي قار	17	60	77	1489	2000	2010	التعليم العالي	انشاء مبنى المراكز البحثية (جامعة ذي قار)	5-2-1-4-1	3
		تلك الشركة المقارنة بتفصيل الاصل		12	ذي قار	9.8	90.2	100	2272.2	4000	2009	التعليم العالي	انشاء كلية المراكز البحثية في جامعة ذي قار	5-2-1-4-1	
		مقارنة (1) وجود اختلاف بين المواصفات وجدول الكميات ، تأخر المصابقة على التصميم ، تأخر ظهور نتائج الفحوصات المخبرية ، عدم تواجد الجهة الاستشارية في موقع العمل ، مقارنة (2) تلك الشركة في تنفيذ الاصل المقابلة بها ، تأخر اجراءات سحب العمل.		1	كربلاء				9000	60000	2011	التعليم العالي	البنية كلية الهندسة (جامعة كربلاء)	5-2-10-25	4
		مقارنة (1) وجود اختلاف بين المواصفات وجدول الكميات ، تأخر المصابقة على التصميم ، تأخر ظهور نتائج الفحوصات المخبرية ، عدم تواجد الجهة الاستشارية في موقع العمل ، مقارنة (2) تلك الشركة في تنفيذ الاصل المقابلة بها ، تأخر اجراءات سحب العمل.		5	كربلاء	12	5	17	1233.9	9000	2011	التعليم العالي	البنية كلية الهندسة (جامعة كربلاء)	5-2-10-25	
		تأخر العمل بسبب غرارة الاضطر		1	واسط	21	78	99	1001	7000	2011	التعليم العالي	البنية رئاسة الجامعة	5-2-12-17	5
	بشمية 100% عمل التسليم الجزئية في الجدول عمل المقارنة رقم (3) فقط			1	واسط	26	74	100	683	13800	2005	التعليم العالي	انشاء مجمعات سكنية للتدريس في واسط	5-2-12-16	6
		تجميع مياه الاضطر كون المنطقة ذات مستوى منخفض يمر عبر من وجود منزل قريب جهل المناسبات الليلية والليل ، كثره اضرار العوارض وتأخر المصابقة عليها ، الرزتين الاروي و محدودة الصلاحيات للشركة المقارنة كونها جهة حكومية ، انه الكادر الفني المتلف ، عدم العناية بحاجات تأجل في القدرات بسبب اعطائها على قورات مستحقة غير متعلق عليها ،		1	بابل	17	82	99	9230.7	2610	2010	التعليم العالي	انشاء ابنية كلية طب الانسان	5-2-9-40	7

عينة من مشاريع الخططة الإستثمارية لقطاع التربية والتعليم المشمولة بالزيارات الميدانية لعام 2014

المتعدد	الملاحظات	المشاكل والمواقف	نسبة النجاح المشروع على مستوى القدرات	تاريخ الزيارة	تاريخ الزيارة	المحافظة	نسبة احوال المشروع الكلية	نسبة احوال المشروع الكلية	المصروف التراكمي	التخصص مليون دينار	الكلية مليون دينار	سنة اذراج المشروع	الجهة المنظمة	اسم المشروع	التويريب	ت	
		محدودية الصلاحيات للشركة المنفذة كون الشركة حكومية ، ضعف الكفاءة الفنية للشركة ، تأخر تجهيز القدرات الامتدادية ، عدم جدية الشركة المنفذة بالرفع من الاجازات المتكرو ، تغير المواصفات وزيادة كمية القابوات		2	1	كربلاء	45	55	100	7000	18500	2011	التعليم العالي	انشاء محطة كويبرام للتمسية -33 KV /11 جامعة كربلاء	5-2-10-23	8	
	اربع عيوبات من اصل (9) عيوب و الحزن الخمس وحل الى نسبة (80%)	ارتفاع نسبة المتوجدة في المياه منها يجعلها غير صالحة للشرب مع دخول اصحاب زراعة التيل في الحياض الخاصة بالمشروع		2	1	البحرة	0	91	91	13703	3360	2007	التعليم العالي	خدمات موقع الجامعة في باب الزبير والحريم	5-2-15-10	10	
		لا يوجد		2	1	المنشي	40	39	79	1085	7000	2010	التعليم العالي	انشاء محطيرات كلية الطب / جامعة المنشي	5-2-1-16	11	
		كثر من المظلم والمسببات البيئية التي تؤدي الى توقف العمل ، صعوبة حصول المواد الاجانبية والكثير المتأخر بسبب الاجازات الامنية الممتدة ، الروتين الادري في المحطات الرسمية		2	1	بغداد	11	71	82	2001	500	5000	2012	التعليم العالي	انشاء قاعات دراسية في معهد الورد للثقافة	5-2-18-25	12
		كثر من المظلم والمسببات البيئية التي تؤدي الى توقف العمل ، ضعف الكفاءة المالية للشركة ، كثرة ايام العجز وتأخر المحاسبة عليها ، قلة و ضعف الكادر الفني المنفذ ، وجود فارق زمني كبير بين تاريخ اذراج المشروع (2008) والمبشورة الفعلية فيه (2011)		2	1	النجف	7.5	7.5	15		1500	20500	2008	التعليم العالي	انشاء كلية طب الامتنان / جامعة القوفة	5-2-1-50	13
	تم سحب العمل من الشركة المقاربية وادخل الى شركتين اخرى وانظر التعلق على حسب الحقول التالي			3	1	البحرة		29		2500	19000	2010	التعليم العالي	كلية الطب البيطري في جامعة البصرة	4-2-1-5-20	14	
	تم اذراج المشروع واستلمه صباحا واما بتاريخ 10/12/2013			3	1	القادسية				1,650,237	12000	2006	التعليم العالي	انشاء مبني كلية الآداب في جامعة القادسية	5-2-1-3-7	51	
		عدم فتح فترات العمل المتاحة ، قلة الكادر المنفذ مقاربة بحجم قلة الكادر المنفذ مقارنة بحجم العمل ، ضعف الكفاءة المالية للشركة ، بطء المعاملات المتأخر مع الشركة اذ الى توقف العمل ، عدم جدية الشركة المنفذة .		3	1	بغداد	63	37	100	1347,09	1750	14000	2010	التعليم العالي	انشاء بناية خمسة الطوارزسي /2	5-2-1-26	16
		قلة الكادر المنفذ مقارنة بحجم العمل ، ضعف الكفاءة المالية للشركة ، بطء المعاملات المتأخر مع الشركة اذ الى توقف العمل ، عدم جدية الشركة المنفذة .		8	2	بغداد	66	44	100	2080,4	1750	14000	2010	التعليم العالي	انشاء بناية خمسة الطوارزسي /2	5-2-1-26	17
		قلة الكادر (الصحة) اذ الشركة المنفذة ، بطء المعاملات المتأخر مع الشركة ، قلة الكادر المنفذ ، قلة الكادر المنفذ ، قلة الكادر المنفذ ، قلة الكادر المنفذ		3	1	كركوك	26	66	89	13000	10000	18000	2012	التعليم العالي	انشاء الاقسام الطبية /2 / كركوك	5-2-5-21	17
		قلة الكادر (الصحة) اذ الشركة المنفذة ، بطء المعاملات المتأخر مع الشركة ، قلة الكادر المنفذ ، قلة الكادر المنفذ ، قلة الكادر المنفذ		3	1	كركوك	19,4	56,3	75,7	10199	10000	20000	2011	التعليم العالي	كلية التربية الاكاديمية الطبية / جامعة كركوك	5-2-5-18	18

صيانة من مشاريع الخط الإستثمارية لقطاع التربية والتعليم المشمولة بالزيارات الميدانية لعام 2014

المتعدد	الملاحظات	المشاكل و المبررات	نسبة إنجاز المشروع على مستوى المقدرات	تاريخ الزيارة	تسليم الزيارة	المحافظة	نسبة إنجاز المشروع الكلية	نسبة إنجاز المشروع الكلية	المصروف التراكمي	التخصص	القيمة	سنة اذراج المشروع	الجهة المنفذة	اسم المشروع	التوقيت	ت
		وجود نسبة الحرف في بداية المشروع بسبب ارتفاع مستوى المياه الجوفية .		3	1	المش	59	64	1,295,592	1500	6000	2012	التعليم العلي	كلية التربية الازمسية / جامعة البصرة	5-2-21-22	19
		تأخر الشركة المقاولية بتفصيل الاصل وتجهيز المواد والمعدات بسبب التأخر الشركة المقاولية بتفصيل الاصل وتجهيز المواد والمعدات بسبب		4	1	البصرة	7.8	78.6	#####	1750	26000	2004	التعليم العلي	انشاء قسم داخلية الطلبة والطلقات / جامعة البصرة	5-2-15-8	20
		تأخر الشركة المقاولية بتفصيل الاصل وتجهيز المواد والمعدات بسبب		10	2	البصرة	16.9	76.1	17,148	1750	26000	2004	التعليم العلي	انشاء قسم داخلية الطلبة والطلقات / جامعة البصرة	5-2-15-8	
		المشروع في مرحلة تحليل العروض		4	1	ميسان				500	1400	2012	التعليم العلي	تاهيل وتطوير و تجهيز الاقسام	5-2-20-14	21
		المشروع جدر بتاريخ 3/11/2013 وهو قيد الانجاز		4	1	بغداد	0	100	1701,4		2500	2008	التعليم العلي	انشاء بنائه الدراسات العليا / الجامعة التقنية	5-2-3-11	22
		سحب الصل واعادة اطلاق مناقشته لعدم وجود شروط تقنية ولم تتم اعادة الاعلان للشركة الفائزة		4	1	بابل	79	21	549,6		25000	2009	التعليم العلي	انشاء ابنية كلية الازراء والاصفند / جامعة بابل	5-2-9-12	23
				4	1	ذي قار	8	67	346,67	597,8	1000	2011	التعليم العلي	انشاء محطة الوقود في جامعة ذي قار	5-2-14-28	24
		تأخر اقرار الموزعة بما لدى تاخر صرف المصلحة		4	1	كربلاء	20	70	117	700	2000	2012	التعليم العلي	انشاء اقسام داخلية في المعهد التقني / كربلاء	5-2-18-17	25
		لا يوجد		4	1	القادسية	8	92	1550	2000	8000	2009	التعليم العلي	تاهيل وتجديد ابنية جامعة ١	5-2-13-18	26
		العجز المالي للشركة بسبب دخولها في الائتمانات ولا قدر من مشروع تأخر صرف المصلحة بسبب تعطل اقرار الموزعة ، وكذا الكوارث المصاحبة بالمشروع فيما يخصه وعدم توافر الكادر الفني بصورة مستمرة في المشروع .		4	1	النجف	30	60	90	1500	5000	2011	التعليم العلي	بنائية القاعات الدراسية وخدماتها في كلية التقنيات الصحية والطبية / الكوفة	5-2-18-33	27
		عدد المراكز الجديدة 53 موزعة على كل الجامعات ولم زيارة مركز الوزارة وسلمت تروينها بموقعها من قبل وزارة التعليم		4	1	بغداد							التعليم العلي	تاهيل وتجهيز المراكز الجديدة		28
		الصلح بموجب عقد اذار 2014		5	1	واسط	0	78	4668	2500	10500	2012	التعليم العلي	انشاء كلية الهندسة المتكاملة في جامعة واسط	5-2-12-18	29
م		بسبب ضعف الكفاءة المالية للشركة وقد تم توجيه كتاب التاجر بتاريخ 15/4/2014		19	100	واسط	19	81	100	90000	154500	2009	التربية	مشروع بناء مدارس ابتدائية بنائية جابر بغداد (100) عن بغداد	5-5-1-24	30
م		بسبب ضعف الكفاءة المالية للشركة بسبب تكرر الشركة وتغيرها عن موقع العمل		29	100	ذي قار	29	71	100	13490	154500	2009	التربية	مشروع بناء مدارس ابتدائية بنائية جابر بغداد (100) عن بغداد	5-5-1-24	

عينة من مشاريع الخططة الإستثمارية لقطاع التربية والتعليم المشمولة بالبرامج الميزانية لعام 2014

المتعدد	الملاحظات	المشاكل و العقبات	نسبة الإنجاز المشروع على مستوى الفترات	تاريخ الأبرية	تسليم الأبرية	المحافظة	نسبة إنجاز المشروع الكلية	نسبة الإنجاز المشروع	المصروف التزمي	التخصيص مليون دينار	الكلفة مليون دينار	سنة اذراج المشروع	الجهة المنفذة	اسم المشروع	التوقيت	ت	
		بطر الشركة المنفذة ، قلة عدد الشركة المنفذة ، عدم فتح الفترات المتاحة من قبل الشركة المنفذة ، تنقص المقاول في جذب المشاريع والتكويكات الخاصة بأعمال المقاولية ، تأخر العمل مع التزم الرسمي للجامعة ، كثرة تسلف الأبرية في الفترة المنفذة حدثت من سير العمل .		5	1	كركوك	34	50	86	14440	20000	50000	2012	التعليم العالي	اصول موقع ورويات جامعة كركوك	5-2-5-20	31
		المشروع مكون من ستة فترات الأولى منجزة والخمسة الأخرى قيد الاضمان		5	1	بابل	3.5	16.5	20	1943.2	1000	22000	2011	التعليم العالي	انشاء قاعات دراسية في موقع الجامعة / جامعة بابل	4-2-9-41	32
	ليعمل موقع وتم سحب العمل واصدرت المحكمة قرار بسحب العمل من الشركة وقامت الشركة بتطبيق مبرر الحكم والان لم يصرح في المحكمة التمييز التي فيه			5	1	ميسان	60	40	100	1527	3578.5	7800	2009	التعليم العالي	انشاء مركز ثقافي / جامعة ميسان	5-2-20-8	33
		تأخر اعلان النقص الذي من المتوقع ان تقوم بها المحافظة ضمن خطة تنمية الاقليم مما أدى الى وجود نسبة احوال 38%.		5	1	ميسان	38	2	40	1000	240000	2010	التعليم العالي	انشاء وحدات سكنية للتدريس / جامعة ميسان	5-2-19-6	34	
	تلاحظ وجود فرق في نسب الاجزاء عن الزيادة السابقة وخاصة نسبة الاجزاء المحطط حيث تم تقليل نسبة الاجزاء المحطط الجديدة بسبب منح الشركة المنفذة مدة اضافية (178) يوما	لا يوجد		11	2	ميسان	4	22	26	1000	240000	2010	التعليم العالي	انشاء وحدات سكنية للتدريس / جامعة ميسان	5-2-19-6	35	
		قلا عدم الشركة المنفذة ، عدم صرف السلف المالية بسبب عدم اقرار الموزنية ، الاضرار والتلفات بسبب الوضع الامني وخطاها الائتمانية ، تأخر الفوصات بسبب قلة المصنفات والالتزام بالمتابعة		5	1	النجرة	30	60	90	8187	3000	19000	2008	التعليم العالي	انشاء كلية الزراعة / جامعة النجرة	5-2-15-19	36
		قلا عدم الشركة ، تأخر تصفير القية وتأخر التتالي على الاستشاري ، قلة كادر ادارة المحاسن التعليم والمشاركون على العمل		5	1	النجرة	30	44	74	7190	1940	19000	2007	التعليم العالي	انشاء كلية الآداب / جامعة النجرة	5-2-15-18	37
		لا يوجد		5	1	ميسان	9	50	59	8000	200000	2012	التعليم العالي	تطوير وتوسيع جامعة ميسان	5-2-20-12	35	
		لا يوجد		5	1	النجرة	14.6	11.7	74	1949.5	1548	19850	2012	التعليم العالي	انشاء كلية طب الاسنان / جامعة النجرة	5-2-15-21	38
	المشروع منجز ويستمر استلام ارباب			6	1	ذي قار	100	100	100	53.3	2500	2011	التعليم العالي	انشاء القسم الدراسي للعلوم / جامعة ذي قار	5-4-14-22	39	
		لا يوجد		6	1	بغداد	3	97	100	6224.6	1750	12000	2010	التعليم العالي	انشاء كلية العلوم الاسلامية / جامعة بغداد	5-2-1-31	40
		تتكر الشركة المقاولية وعدم جديتها في العمل		8	1	النجف	40	60	100	2335	25	7500	2007	التعليم العالي	انشاء شقق الاستراحة للآداب / جامعة النجف	5-2-11-36	41
	المشروع منجز			8	1	النجرة	0	100	100	650	1500	2010	التعليم العالي	تأهيل محطة تصفية المياه الثقيلة في كركوك عبي	5-2-15-19	42	

صيانة من مشاريع الخط الإستثمارية القطاع التربية والتعليم المشمولة بالزيارات الميدانية لعام 2014

المتعدد	الملاحظات	المشاكل والمواقف	على نسبة الجزء المشروع على مستوى القدرات	تاريخ الزيارة	تاريخ الزيارة	المحافظة	نسبة الجزء المشروع الكلية	نسبة الجزء المشروع	المصروف التقديمي	التخصيص مليون دينار	الكلفة مليون دينار	سنة الم شروع	الجهة المتقعة	اسم المشروع	التبويب	ت
		المخرج المادي للشركة، قلة الاوى العملة		8	1	البصرة	53	47	2132	3000	14000	2010	التعليم العالي	انشاء مبنى مطرقة في جامعة البصرة	5-2-15-30	43
	المشروع بنجر	لا يوجد		8	1	واسط	0	100	375.788	368940	1750	2012	التعليم العالي	تاهيل وتطوير وتجهيز الاقسام الساتخية القديمة / جامعة واسط	5-2-12-20	44
	المشروع بنجر وسنم اسلاكها بولينا	صعوبة وصول المواد الاضمية، التأخر في المصاقله على ايام الطار والمحد الاضمية، صعوبة دخول الالات في المنطقة بسبب السيطرات والوضع الامني، تأخر صرف المنطق بسبب تأخر القرار الموزانية		8	1	المنفى	0	100	3347	368940	5000	2008	التعليم العالي	انشاء بناية رئاسة جامعة المنفى	5-2-21-4	45
		وجود تفاصيل غير متفق عليها بين العملي والعماري التي التي تأخر العمل، مدة المشروع وتكاسيم مع ضخمة المشروع، تم سحب عمالة ماهرة وغير ماهرة بجانب بعد (260) بسبب الظروف الامنية، تأخر وصول المواد الاضمية، تأخر الحصول على سمات الجدران لعمال الاجنبي		8	1	بغداد	10	90	3157.7	1500	5000	2011	التعليم العالي	انشاء قاعات دراسية في المعهد التقني / اربط عرابية	5-2-16-28	46
		عدم اشراك الجهة المستفيدة في اعداد التندر الامر الذي يؤدي الى كثرة ايام الفيل، تجزية اعمال التبريد،		8	1	بغداد	5	95	2351	900	4000	2010	التعليم العالي	انشاء مبنى الطاعت الدرسية الكلية للطب في الكلية / جامعة البعث	5-2-16-15	48
		تأخر الشركة في تنفيذ المظلة، تأخر الشركة بتجهيز المصاعد بسبب الاختلاف حول سفينة المصاعد		8	1	بغداد	23	77	3425.5	4060.3	10000	2010	التعليم العالي	النظام بناية هدمه الحفريات وتكليفها بالمطومات / الجامعة التقنية	5-2-3-17	49
	المشروع متوقف			8	1	القادسية			1366	1500	1500	2010	التعليم العالي	انشاء بناية قسم الشؤون التعليمية في الجامعة مع خدمات الموقع والسجلات الخضراء		50
	المشروع متوقف			8	1	القادسية			5688	15000	15000	2010	التعليم العالي	انشاء كلية الزراعة في النورية		51
	المشروع متوقف وفي اجراءات سحب العمل بسبب تأخر الشركة	قلة الاوى العاملة، ضعف الكفاءة المهنية للشركة، صعوبة اوصول المواد بسبب الوضع الامني		8	1	بغداد	8	92	3000	3000	11400	2007	التعليم العالي	انشاء كلية الصيدلاني / الجامعة العراقية	5-2-17-6	52
		المشروع مكون من اربع مكونات ثلاث منها متجزئة والرابع قيد الاجتلاء		9	1	التنجف	25	75	50	50	500	2007	التعليم العالي	انشاء عمارة كلية الطب جامعة الكوفة		53
		لا يوجد		9	1	التنجف		25	24.05	1162	14800	2008	التعليم العالي	انشاء كلية التمريض / جامعة الكوفة	4-2-1-11	54
		القطاع الشركة عن العمل منذ 50 يوم بدون سبب وتم توجيه التاجر لها، تأخر الشركة المتقعة في تجهيز المواد الاضمية، عدم استخدام معدات الامان في المشروع		9	1	ذي قار	21	47	511.4	1250	6000	2012	التعليم العالي	انشاء قاعة متعددة الاغراض في جامعة ذي قار	5-2-14-27	55
		تأخر الشركة في الحجز الاعمال، عدم تحميت جدول تقدم العمل، تأخر تجهيز المواد الاضمية		12	2	ذي قار	47	30	511.4	850	6000	2012	التعليم العالي	انشاء قاعة متعددة الاغراض في جامعة ذي قار	5-2-14-27	



عيبة من مشاريع الخط الإستثمارية لقطاع التربية والتعليم المشمولة بإستثمارات الميزانية لعام 2014

المتعدد	الملاحظات	المشاكل والمواقف	نسبة إنجاز المشروع على مستوى الفترات		تاريخ الإيزارة	تسليم الإيزارة	المحافظة	نسبة إنجاز المشروع الكلية		المصروف التراكمي	التخصيص مليون دينار	الكلفة مليون دينار	سنة الإنجاز المشروع	الجهة المنفذة	اسم المشروع	التوثيق	ت
			مستوى الفترات	مستوى الفترات				المحافظة	الكلية								
	الشروع في طور الإنجاز	تتكرر الشراكة المبررة بتبني العمل			9	1	ذو قار	0	100	18885.61	750	2000	2011	التعليم العالي	إنشاء مركز صحي في جامعة ذي قار	5-2-14-25	56
		لا يوجد			9	1	واسط	1.5	95.5	3977	3171.6	10000	2012	التعليم العالي	إنشاء أقسام طبية في كلية الأرواح والأقتصاد 2م	5-2-12-16	57
		تكرر إجراءات الترقية الثالثة لعدم تطبيق حساب قديم مع الشركة السابقة قبل 2003 والتي اتمت 40% من العقود الثالثة			9	1	كربلاء	10	80	7396.7	500	185000	2008	التعليم العالي	إنشاء كلية العلوم / جامعة كربلاء	5-2-10-10	58
		كلية الكونجرس البيئي ، علم تطابق جدول الكميات في بوابة الجامعة وطاقم القسم البيئي			9	1	بابل	8	92	5753.7	1970	10000	2011	التعليم العالي	تطوير و تحويل وتأهيل الأبنية الجامعية	5-2-9-42	59
		التفكير والاحتراف الحاصل في المشروع بسبب قلة الكوادر وصعوبة المجال الصناعي ، تتكرر وصول المواد اللازمة بسبب علق المناقش الحصرية في المناطق الساكنة			9	1	بابل	29	58	1700	69401	7200	2012	التعليم العالي	تصميم وتنفيذ ابنية كلية الصيدية	5-2-9-43	60
		التفكير والاحتراف الحاصل في المشروع بسبب قلة الكوادر وصعوبة المجال الصناعي ، تتكرر وصول المواد اللازمة بسبب علق المناقش الحصرية في المناطق الساكنة			9	1	بابل	18.6	25.8	1033.5	256	27000	2012	التعليم العالي	تصميم وتنفيذ ابنية كلية الهندسة	5-2-9-45	61
		كلية كوارث الشركة السابقة			9	1	بابل	13	76	1700	5	8500	2012	التعليم العالي	تصميم وتنفيذ ابنية كلية الدراسات القرآنية	5-2-9-44	62
		تكرر الشركة في تقديم جدول تطور العمل : قلة العمالة وقامته العمارة بسبب تطورهم ، قلة المواد الاحتمالية وخضرة السمات والحصى			9	1	بغداد	20	60	5924.5	5875.9	12850	2011	التعليم العالي	بناء موقع متعدد الطوابق في الجامعة التكنولوجية	5-2-3-19	63
		في طور الإنجاز الاولي			9	1	بغداد	0	100	5043.5	1294.28	8500	2003	التعليم العالي	إنشاء ابنية كلية الصيدية / مجمع البيع	5-2-2-1	64
		كثير موقف الطلبة اذ لم يتطابق العمل الحاصل وكان جديد ، تم استغلال البيئات الصورية لخل المواد الى الحرم الجامعي ، تم حمله اعلان التوجة كمرحلة الزاوية وقلها مما يؤدي الى عرقلة اعلان الاحتمالات			9	1	بغداد	0	80	5740.4	1750	12000	2010	التعليم العالي	كلية القانون 1م / جامعة بغداد	5-2-1-30	65
		ضبط العمارة المائية ، عدم تواجد الشركة في موقع العمل مع توقف الاعمال ، اعتمد الشركة على السلف فقط كونها جهة حكومية			9	1	بغداد	35	65	100	1250	120000	2010	التعليم العالي	كلية التربية / جامعة بغداد	5-2-1-27	66
		تكرر الشركة المنفذة وضبط العمارة المائية اثناء اقله كوارث الشركة السابقة نتيجة مبالغتهم بسبب الأوضاع الازمة ، عدم تحديث جدول تقدم العمل			10	1	النجرة	21	74	10759.12	1700	19000	2004	التعليم العالي	إنشاء كلية التربية الرياضية / جامعة البصرة	5-2-15-5	67
		كلية كوارث الشركة المنفذة نتيجة مبالغتهم بسبب الأوضاع الازمة ، تتكرر السلف المائية المنفذة للشركة بسبب تكرار الأوراز الموزعة			12	2	النجرة	21	74	10759.12	1700	19000	2004	التعليم العالي	إنشاء كلية التربية الرياضية / جامعة البصرة	5-2-15-5	67

صيانة من مشاريع الخط الإستثمارية لقطاع التربية والتعليم المشمولة بالزيارات الميدانية لعام 2014

المعتمد	الملاحظات	المشاكل والمواقف	نسبة إنجاز المشروع على مستوى الفترات		نسبة الإنجاز	تسليم الزيارة	المحافظات	نسبة إنجاز المشروع الكلية	المصروف التراكمي	التخصيص مليون دينار	الكلفة مليون دينار	سنة الإنجاز المشروع	الجهة المنفذة	اسم المشروع	التوقيت	ت	
			مستوى الفترات	الزيارة													
		لا يوجد			10	1	النجف	0	4779.85	212.5	12600	2007	التعليم العالي	إنشاء كلية الصوبية في جامعة الكوفة	5-2-11-22	68	
		لا يوجد			10	1	النجف	0	2400.9	425	3500	2007	التعليم العالي	بريات جامعة الكوفة	5-2-11-32	69	
		ضبط كفاءة العقول ملابا ، قلة عدد كادر المهنيين المقوم حيث ان مهنيي داره المهنيين المقوم ملتبس من مشروع داخل الحرم الجامعي			10	1	النجف	38	56	3708.7	9500	2008	التعليم العالي	إنشاء دور وتعلق التربين في جامعة النجفي	5-2-21-7	70	
		تأخر السلف			10	1	النجف	8	92	1282.2	4000	2008	التعليم العالي	تأهيل الأبرية القائمة في جامعة النجفي	5-2-21-9	71	
	المشروع مستلم	صوبية تجهيز المشروع بطمواد الإنشائية خاصة التي تجهز من المناطق الساكنة ، قلة عدد المهنيين المقوم ، حصول توقف في بداية العمل بسبب تغير الموقع ، حصول توقف بالأعمال بسبب وود بعض العقول في الكوريت ، تكرر الشركة في بداية العمل بسبب قلة الصيانة وعدم كفاءتهم			10	1	النجف	0	100	1800	5000	2012	التعليم العالي	تأهيل وتطوير وتجهيز الاقسام الداخلية القائمة	5-2-21-24	72	
		تم تكرر تسبب الاجاز بسبب تعلق التصاميم واعاد جداول الكميات كونها جداول عمليات جزئية			10	1	كربلاء	21	79	3866.4	1750	375000	2011	التعليم العالي	إنشاء مستشفى جامعي في كربلاء	4-2-10-26	73
		المشروع في طور سحب العمل بعد توجه التاليف للشركة المنفذة			10	1	بغداد	22	875	6000	12000	2012	التعليم العالي	إنشاء رئاسة الجامعة في سبع ايجار كلية اللغات / جامعة بغداد	5-2-17-13	74	
		المشروع مستلم			10	1	النجف	0	100	1141	8000	2009	التعليم العالي	إنشاء مبني خدمية ودار حفلات / جامعة القادسية	5-2-13-24	76	
		عدم الكفاءة السليمي ، كثرة التغيرات على فترات العمل ، متفكك الخراج والحال الايات ومواد البناء والاسمان ، تأخر الفترات الاقسامية			11	1	النجف	19	50	1814.6	7800	2013	التعليم العالي	تأهيل ابرية جامعية	5-2-15-34	77	
		قلة عدد كادر المهنيين المنفذة ، ضعف الكفاءة المهنية للشركة والتمتعها بالخر من مشروع ، صعوبة وصول مادة الحجر بسبب الوضع الامني ، صعوبة توفير الاجود العاملة والقيية ، وجود تاخري في العمل مع فترات مشروع اخر (تطوير وتأهيل الاقسام الداخلية)			11	1	بابل	29	71	1292.5	5000	2012	التعليم العالي	إنشاء القاعات الدراسية في المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا / بابل	5-2-18-29	78	
		المشروع مستلم من (4) محرمات			11	1	كربلاء	6.5	19	620.8	2000	2012	التعليم العالي	إنشاء نادي ومركز خدمات لجمعية الاقسام الداخلية	5-2-10-27	79	
		الان على مشروع والتاليف يتم احالها لسبب تعذر ضمانها مع الشركة			11	1	كربلاء		9860	4000	14500	2010	التعليم العالي	المرحلة التنفيذية لوصول كلية التربية / جامعة الكوفة	5-2-10-21	80	
		قلة الكوادر العاملة للشركة المنفذة ، ضعف الكفاءة المهنية والادارية للشركة			11	1	النجف	20	80	7827.6	3500	2008	التعليم العالي	بناء الاقسام العلمية الكلية العلوم / جامعة الكوفة	5-2-11-39	81	
					11	1	النجف	23	34	1963.1	750	2008	التعليم العالي	إنشاء عمادة كلية اللغة والحرف اللغوي من القاعات / جامعة الكوفة	5-2-11-40	82	



