

تقرير متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية
للقطاع الصناعي

جداول القطاع الصناعي

للفترة من ١/١ ولغاية ٣١/١٢/٢٠١٤

قسم التنسيق والمتابعة

شعبة المتابعة

متابعة مشاريع القطاع الصناعي

للفترة من ١/١ ولغاية ٣١/١٢/٢٠١٤

ويتضمن هذا القطاع مشاريع كل من وزارة النفط والكهرباء والصناعة بالإضافة الى مشاريع الوزارت الأخرى والجهات الغير مرتبطة بوزارة التي لها طابع القطاع الصناعي والتقارير في أدناه يتضمن أهم المؤشرات عن أداء هذا القطاع لعام ٢٠١٤ ومن خلال العينة التي تمت متابعتها وزيارتها ميدانيا من قبل فرق الزيارات الميدانية الهندسية في وزارة التخطيط.

خطة عام ٢٠١٤

مشاريع الخطة الإستثمارية للقطاع الصناعي المستمرة لعام ٢٠١٤: ٤١٣ مشروع تقريباً

المشاريع المخطط لزيارتها لعام ٢٠١٤: ٢٠٠ مشروع وتمثل ما نسبته ٤٨% من مشاريع القطاع الصناعي لعام ٢٠١٤.

المشاريع التي تم زيارتها خلال عام ٢٠١٤: ١٨٦ مشروع

النسبة بين المخطط والفعلي لخطة زيارة المشاريع لعام ٢٠١٤: ٩٣%

النسبة بين الفعلي والكلي لخطة زيارة المشاريع لعام ٢٠١٤: ٤٥%

خطة عام ٢٠١٣

الخطة الإستثمارية للقطاع الصناعي لعام ٢٠١٣: ٤٤٣ مشروع

المشاريع المخطط لزيارتها لعام ٢٠١٣: ٣٠٠ مشروع وتمثل ما نسبته ٦٧.٧% من مشاريع القطاع الصناعي لعام ٢٠١٣

المشاريع التي تم زيارتها خلال عام ٢٠١٣: ١٧٣ مشروع

النسبة بين المخطط والفعلي لخطة زيارة المشاريع لعام ٢٠١٣: ٥٧.٦%

النسبة بين الفعلي والكلي لخطة زيارة المشاريع لعام ٢٠١٣: ٣٩%

مقارنة بين خطة عام ٢٠١٣ و عام ٢٠١٤


من خلال مقارنة أعداد المشاريع للقطاع لكلا العامين فإن أعداد المشاريع متقاربة ولكن عند مقارنة الخطط الموضوعية فإن عدد المشاريع المخطط لزيارتها لعام ٢٠١٣ هو ٣٠٠ مشروع وهو أعلى من المخطط لعام ٢٠١٤ والبالغ ٢٠٠ مشروع حيث تم تخفيض العدد ليتلائم مع الامكانيات المادية والبشرية المتاحة حيث نلاحظ ان ما تحقق في عام ٢٠١٤ قريب جدا للمخطط وتم تنفيذ ما نسبته ٩٣% وعليه ومن اجل وضع خطط قابلة للتطبيق فقد تضمنت خطة عام ٢٠١٥ للقطاع الصناعي زيارة ٢٥٠ مشروع مع الاشارة الى الوضع الامني الغير مستقر لعدد من المحافظات وكذلك التأثير الكبير لهبوط أسعار النفط على التوسع في الخطط وأضاف مشاريع جديدة ومن اجل تصحيح المسار ومراجعة الخطط فإنه في التقرير النصف سنوي سوف يتم مراجعة ما تم أنجازه وتحديث الخطط الموضوعية وحسب مستجدات الوضع من تحسن للوضع الامني واسعار النفط وكذلك تطوير أمكانيات فرق الزيارات الميدانية.

والجدول رقم (١ صناعي) و المخطط (١ صناعي) يظهر خطة متابعة مشاريع القطاع الصناعي لعام ٢٠١٤ حيث يلاحظ منه شمول المشاريع ب ٣٦٨ زيارة ميدانية وبمعدل ٢ زيارة لكل مشروع وهي نسبة جيدة و ان الطموح زيارة كل موقع بما لا يقل عن ٣ مرات في السنة لمواكبة مراحل تنفيذ المشروع بصورة أفضل

جدول رقم (١ صناعي)							
ت	الوزارة	عدد المشاريع المخطط زيارتها عام ٢٠١٤	الاهمية النسبية %	عدد المشاريع التي تم زيارتها	نسبة التنفيذ النسبية	عدد الزيارات المتحققة	معدل عدد الزيارات لكل مشروع
1	وزارة النفط	70	35	67	95.71	138	2
2	وزارة الكهرباء أنعاش الاهوار	70	35	74	105.71	158	2
3	وزارة الصناعة	60	30	45	75	72	2
		200	100	186	93	368	2

تم شمول مشاريع أنعاش الاهوار / قطاع كهربية الريف والنواحي بالزيارات الميدانية وهي من ضمن قطاع الكهرباء

مخطط (1 صناعي) يظهر والمخطط والمتحقق للمشاريع المشمولة بالمتابعة

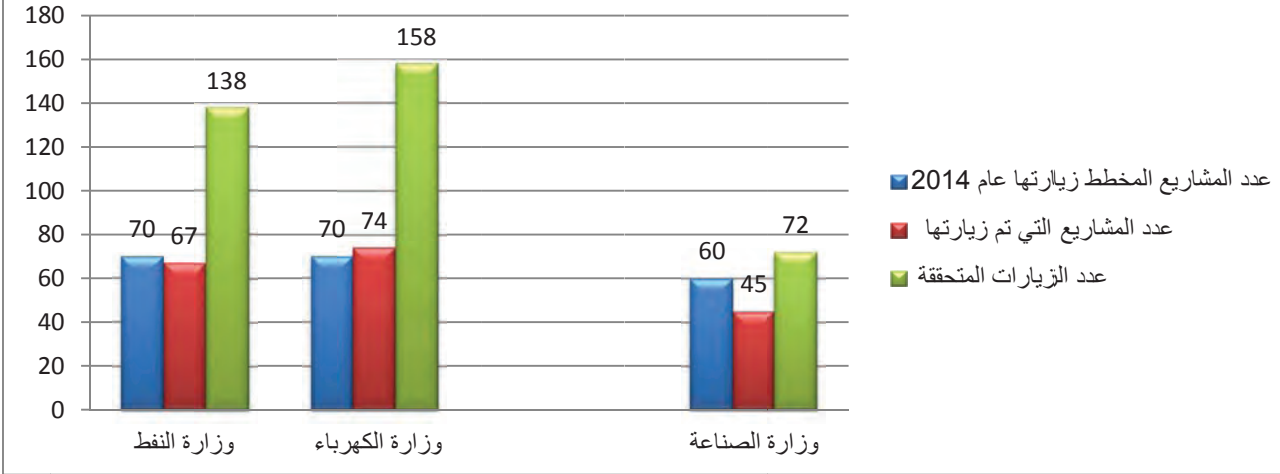


توزيع الزيارات على المحافظات

المخطط رقم (٢ صناعي) يظهر عدد الزيارات المتحققة على مستوى كل محافظة ويلاحظ منه عدم او قلة الزيارات الميدانية المتحققة في النصف الثاني من السنة لكل من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين والانبار وكركوك وذلك يعود للأوضاع الامنية لهذه المحافظات


وحصلت مشاريع محافظة البصرة على أعلى عدد من الزيارات المتحققة حيث بلغ عددها ٨٠ زيارة وتليها محافظة بغداد ٧٢ زيارة وبلغ معدل الزيارات على مستوى كل محافظة (٢٤ زيارة / محافظة)

جدول (٢ صناعي)				
عدد الزيارات حسب المحافظات				
المحافظة	الوزارة			المجموع
	الصناعة والمعادن	الكهرباء	النفط	
بغداد	29	21	22	72
البصرة	9	24	47	80
ميسان	3	21	29	53
ذي قار	4	16	9	29
المتشي	0	5	8	13
القادسية	6	19	3	28
واسط	2	9	3	14
بابل	12	12	1	25
كربلاء	2	17	6	25
نجف	4	13	6	23
صلاح الدين	0	0	0	0
نينوى	0	0	0	0
كركوك	0	1	3	4
الانبار	1	0	1	2
ديالى	0	0	0	0
المجموع	72	158	138	368

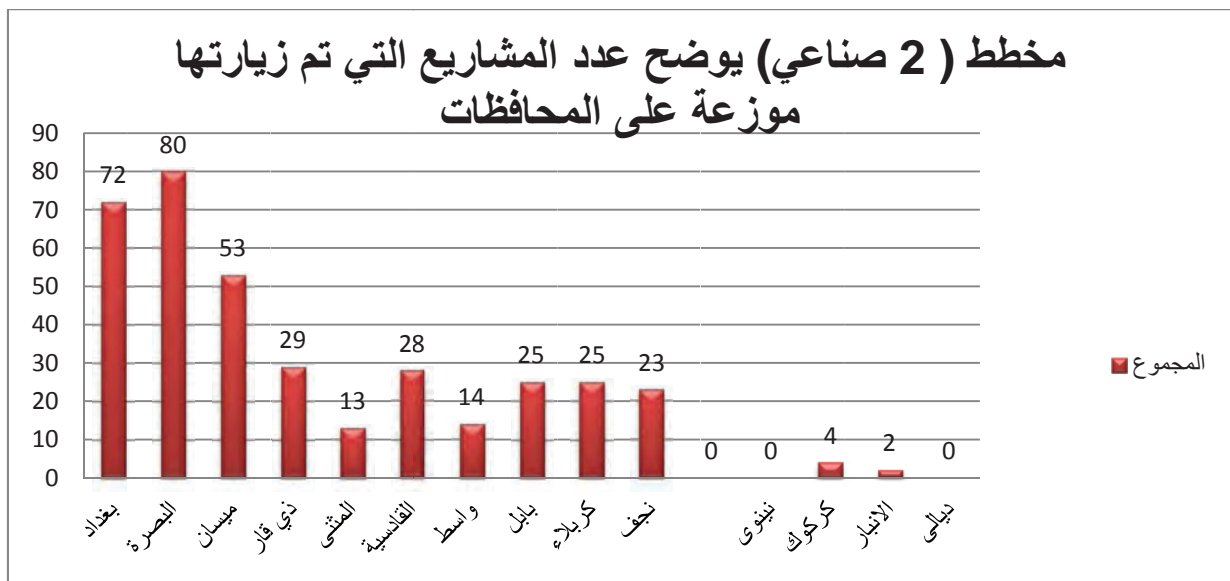


المؤشرات المستخلصة من عينة المشاريع التي تمت زيارتها

يظهر المخطط (٣ صناعي) نسب انحراف المشاريع موزعه على فئات ويلاحظ منه ان المشاريع ذات نسب الانحراف الاقل من ٢٠% احتلت ما مقداره ٥٠% من العينة

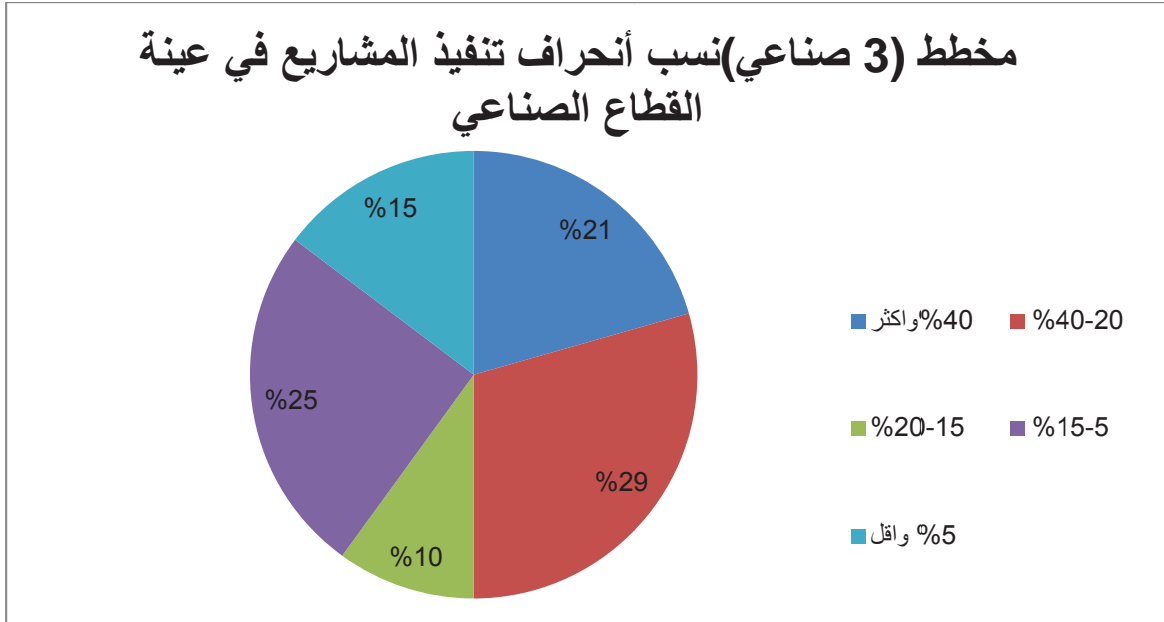

اما بالنسبة للمخطط (٤ صناعي) فيظهر نسب الانجاز موزعه على فئات من اجل تحديد مراحل تنفيذ خطة القطاع بشكل عام ونلاحظ منه ان المشاريع ذات نسب الانجاز التي تتراوح من ٨٠% الى ١٠٠% احتلت النسبة الاعلى ومقدراها ٢٥% من حجم العينة ، اما أوطأ نقطه فظهرت عند المشاريع ذات نسب الانجاز من ٢٠% الى ٤٠% وبنسبة مقدارها ١٥% من حجم العينة ومن خلال هذه المؤشرات من الممكن ان نستنتج الى ان القطاع الصناعي باتجاه أنجاز خطته في المرحلة القادمه

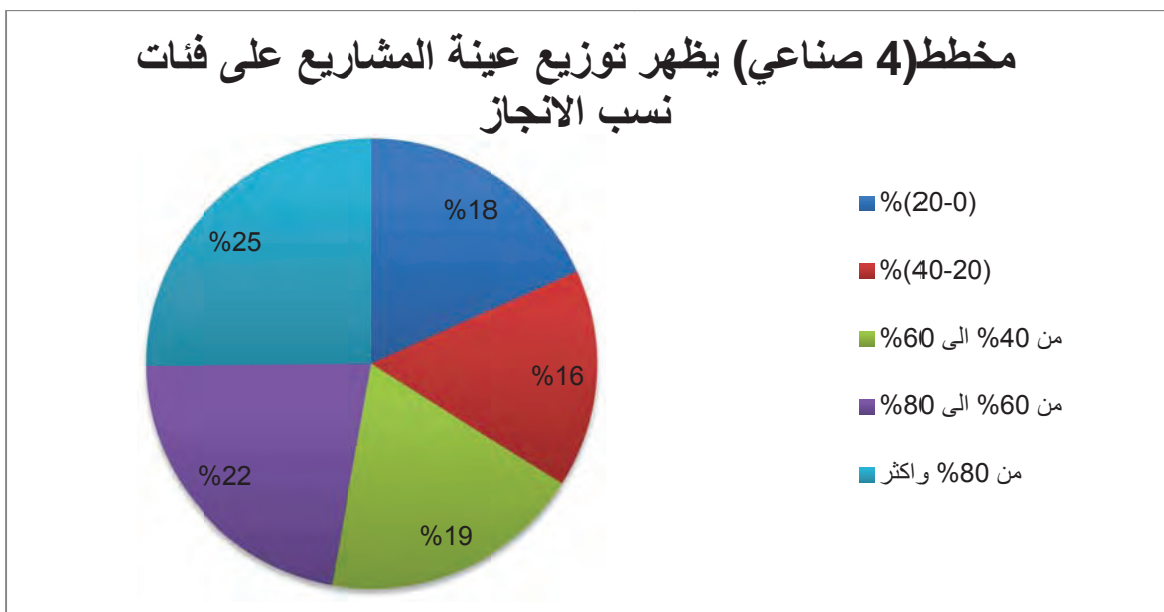

✓ مقارنة بين نسب الانحراف والانجاز للقطاع الصناعي بين عامي 2013-2014


من خلال المخطط (٥- صناعي) يتبين هنالك فرق طفيف بين عام ٢٠١٣ و ٢٠١٤ حيث نلاحظ ان هنالك انخفاض في نسبة المشاريع ذات الانحراف الاقل من ٥% وزيادة في نسبة المشاريع ذات نسب الانحراف الاكثر من ٤٠% (اي ان هنالك تراجع في مستوى تنفيذ المشاريع لعام ٢٠١٤ عن عام ٢٠١٣)

مخطط (5)صناعي يوضح مقارنة بين نسب الانحراف لعامي 2014 و 2013



اما بالنسبة الى مؤشرات نسب الانجاز فيظهر المخطط رقم (٦-صناعي) بان نسب الانجاز للفئة من (٠ الى ٢٠) % كانت في عام ٢٠١٣ مرتفعه ومثلت ما مقداره ٥١% من عينة المشاريع المشمولة بالزيارة ويقابلها ١٨% للفئة نفسها لعام ٢٠١٤ ، اما بالنسبة الى الفئات الاخرى ولغاية ١٠٠% فنلاحظ ارتفاع نسب الانجاز لعام ٢٠١٤ عن عام ٢٠١٣ وهذا يعود لأسباب كثيرة منها اعتماد خطة مشاريع ٢٠١٤ على المشاريع المستمرة من عام ٢٠١٣ .

مخطط (6)صناعي يوضح مقارنة بين نسب الانجاز لعامي 2014 و 2013

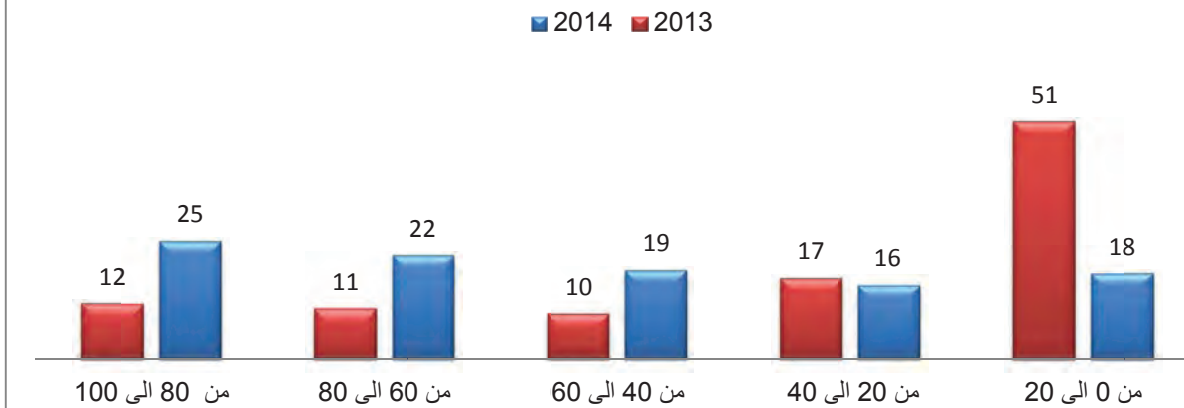

تحليل نموذج من وزارات القطاع الصناعي / وزارة الكهرباء

تم اختيار وزارة الكهرباء كعينة من القطاع الصناعي للوقوف على تفاصيل إنجاز المشاريع ومراحل تقدم خطة وزارة الكهرباء وعليه تم تقسيم مشاريع الوزارة الى القطاعات الرئيسية وكالاتي:

- **مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية :** تشكل مشاريع الانتاج نسبة ٥٧,١٣% من تخصيصات وزارة الكهرباء لعام /٢٠١٤ وتشمل (المحطات الحرارية والمحطات الغازية وتأهيل المحطات القائمة) ، تم التوجه في الى اقامة محطات غازية والتي تعمل على انواع مختلفة من الوقود اما بخصوص اقامة محطات حرارية فتم الاقتصار على إنشاء محطة كهرباء واسط الحرارية وتأهيل المحطات الحرارية الاخرى التي تم نصبها وادخالها للخدمة منذ العقد الماضي وعليه ومن خلال متابعة عمل المحطات الغازية تبين التالي :


١. عدم وجود مؤشرات أكيدة تدل على مدى توفر الغاز الطبيعي لأنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة بشكل دائم مع عدم توفر منظومات الغاز الطبيعي بصورة كافية .
٢. انجاز عدد من المحطات الغازية وعدم ادخالها للخدمة بسبب عدم اكتمال خطوط نقل الوقود الى المحطة أو عدم وصول ضغط الغاز المجهز الى المستوى المطلوب .
٣. من خلال دراسة ما تم صرفه على مشاريع الانتاج خلال الخمسة سنوات الاخيرة (٢٠١٠-٢٠١٤) تبين أن اجمالي المصروفات لقطاع الانتاج (انشاء محطات + تأهيل محطات) بلغ (١٦١٥٣,٩) مليون دينار أي مايعادل (١٦١٥٣,٩) ميكاواط (في حال اعتماد اسلوب الاستثمار الخاص في انتاج الطاقة الكهربائية) والذي من المفترض أنه يغطي حاجة البلد من الطاقة في حين وصل الانتاج خلال عام ٢٠١٤ بحدود (٩٥٠٠) ميكا واط. مع الاشارة الى ان الطلب على الطاقة الكهربائية بأزدياد مستمر وقد تمت معالجة موضوع أنتاج الطاقة الكهربائية من خلال فتح باب الاستثمار في هذا المجال وكمثال على ذلك إقليم كردستان حيث كان يعاني من نقص حاد في أنتاج الطاقة الكهربائية بعد ٢٠٠٣

مشاريع نقل الطاقة الكهربائية تشكل مانسبته ١٤.٦% من تخصيصات وزارة الكهرباء لعام /٢٠١٤ والتي تعد من المشاريع ذات الاولوية لحل الاختناقات الحاصلة في المنظومة الكهربائية والتي تعد حلقة وصل بين ما يتم انتاجه من الطاقة الكهربائية وما سيتم توزيعه من الطاقة الكهربائية مع ضرورة وجود تنسيق في الاعمال بين ما يتم انتاجه من الطاقة وخطوط ومحطات النقل لاستيعاب الطاقة المتولدة وكما تم تأشيريه في موقع محطة كهرباء الزبيدية الحرارية حيث ساعات خطوط النقل حالت دون الاستفادة من الطاقات المتولدة للمحطة لمحافظة بغداد.


مشاريع توزيع الطاقة الكهربائية : تشكل هذه المشاريع مانسبته ٢٧% من تخصيصات وزارة الكهرباء لعام /٢٠١٤ ، من خلال متابعة مشاريع توزيع الطاقة الكهربائية نلاحظ قيام المحافظات بتنفيذ اغلب مشاريع التوزيع في محافظاتها مع القيام بمد شبكات لتوزيع الطاقة الكهربائية في مناطق عشوائية مما يؤثر على توازن الشبكة الكهربائية وأمكانية أستيعابها لهذه التوسعات بالاضافة الى صعوبة السيطرة على جباية مبالغ أستهلاك الطاقة الكهربائية وكذلك التجاوز على الشبكات التوزيع.

ومن خلال المؤشرات المستخلصة من الزيارات الميدانية لمشاريع وزارة الكهرباء وكما موضحة في المخططين (١ كهرباء) و(٢ كهرباء) نستنتج الآتي

- مؤشرات الانجاز مخطط (١ كهرباء) حيث يلاحظ منه ان كلا قطاعي الانتاج والنقل لم تتضمن مشاريع ذات نسب أنجاز أولية اي أن التوجه العام في هذين القطاعين هو نحو أنجاز المشاريع المستمرة حيث نلاحظ أن نسبة المشاريع ذات الانجاز أكثر من ٦٠% هي الأكثر من ضمن مخطط الانتاج والنقل حيث ان أغلب مشاريع الخطة مستمرة من عام ٢٠١٣.

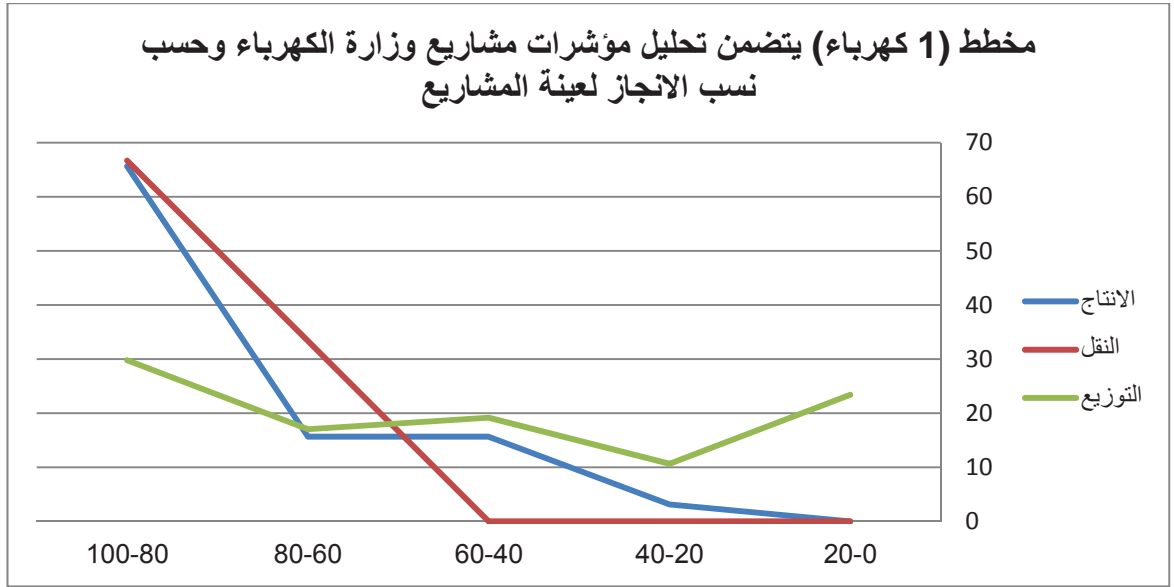

- مؤشرات انحراف المشاريع وكما موضح في المخطط (٢ كهرباء) ويلاحظ منه أختلاف في أنماط المخطط البياني لكل قطاع الا ان عينة مشاريع قطاع الانتاج كانت أفضل القطاعات من خلال ارتفاع نسبة المشاريع ذات نسب الانحراف الاقل من ٥% وتساوي النسبة لكل من قطاعي النقل والتوزيع في نفس نسبة الانحراف لكن بالنسبة لعينة المشاريع ذات نسب الانحراف الأكثر من ٤٠% فأحتلت عينة قطاع التوزيع النسبة الأكثر من بقية القطاعات

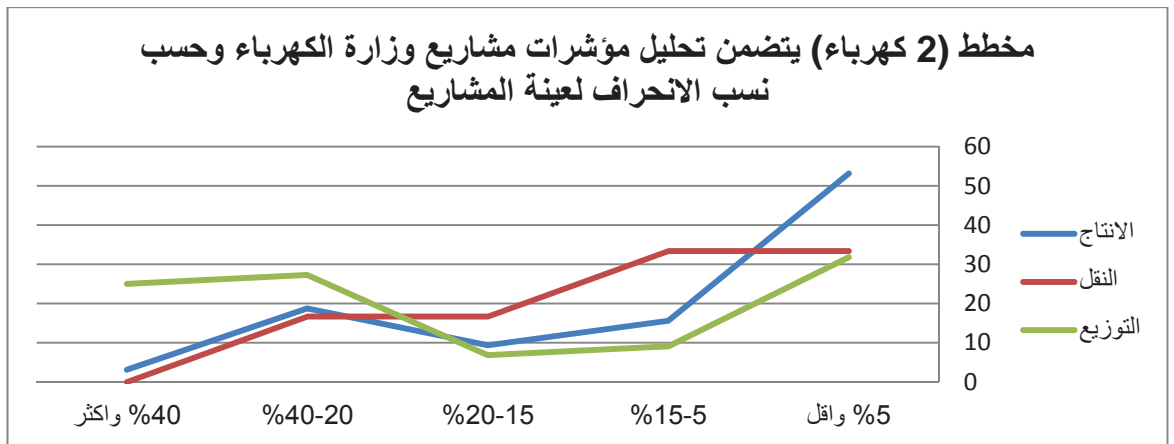

مؤشرات وزارة النفط

مشاريع وزارة النفط في موازنة عام ٢٠١٤

تتلخص اهداف وزارة النفط العامة خلال رؤيتها التنموية ل خطة التنمية لرفع واقع الصناعة النفطية في العراق الى مستويات أهدافها المستقبلية فقد وضعت الخطط والسياسات لتحقيق الاهداف التالية:

١. تحقيق زيادة هامة في الاحتياطات النفطية والغازية.
٢. تصعيد الطاقة الإنتاجية للنفط الخام والغاز بالجهد الوطني.
٣. تأهيل وتطوير منظومات الخزن للنفط الخام.
٤. تصعيد الطاقة الإنتاجية للنفط والمنتجات النفطية وتحسين نوعية المنتجات.
٥. تصعيد الطاقة الخزنية للمنتجات البيضاء.
٦. المشاريع البيئية.
٧. المشاريع الخدمية .

وندرج في أدناه نبذة عن الاهداف أعلاه

- ١- في مجال زيادة الاحتياطي النفطي والغازي المثبت اصبح الاحتياطي النفطي المثبت في العراق في بـ (١٤٣.١) مليار برميل نفط خام وفي مجال الغاز بلغ الاحتياطي الغازي المثبت بـ(١٢٦.٧) تريليون قدم مكعب وان وزارة النفط وضعت سياسات ورؤى لزيادة هذا الاحتياطي من خلال اجراء المسوحات الجيولوجية والمكمنية بالوسائل الحديثة لزيادة الاحتياطي للنفط والغاز من خلال أضافة احتياطات كبيرة للنفط والغاز خصوصا في جولة التراخيص الرابعة التي طرحت اثنا عشر رقعة أستكشافية في مناطق كثيرة من العراق.
- وفي ضوء ذلك بلغ مجموع تخصيصات المشاريع الخاصة بالمسوحات والاستكشافات النفطية (٩٤٦٣٩.٤٤) مليون دينار ما يشكل نسبة (٠,٥٣%) في اجمالي تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٤ لوزارة النفط.
- ٢- اما في مجال زيادة انتاج النفط الخام فأن سياسة الوزارة ركزت على زيادة عدد الحقول المستكشفة والمنتجة وزيادة عدد حفر الابار النفطية عليه اقامت وزارة النفط ثلاث جولات تراخيص خاصة بإنتاج النفط الخام وجولة تراخيص خاصة بإنتاج الغاز الطبيعي بالاضافة الى الجهد الوطني في حفر وتطوير الحقول غير المشمولة بالجولات أعلاه حيث وصل معدل إنتاج النفط الخام في العراق إلى (٣.٤) مليون برميل / يوم مقارنة بعام ٢٠٠٩ حيث كان يبلغ معدل الانتاج (٢.٣) مليون برميل / يوم .

عليه بلغت تخصيصات مشاريع تسديد مستحقات الشركات الاجنبية العاملة بالعراق (١٣٩٢٠٩١) مليون دينار وهو مايشكل (٧٧.٤٥%) من إجمالي تخصيصات مشاريع وزارة النفط لعام ٢٠١٤ فيما بلغت تخصيصات مشاريع استخراج النفط بالجهد الوطني (٥١٢٨٩٧.٩) مليون دينار مايشكل نسبة (٢.٨٥%)

مما تقدم أعلاه نلاحظ إن وزارة النفط تعتمد بشكل كلي على جولات التراخيص في رفع انتاج النفط الخام .

٣- من خلال مشاريع معالجة الغاز تهدف وزارة النفط زيادة انتاج الغاز الى انتاج (٨١٠٠) مقمق / يوم عام ٢٠١٧ ، ان وزارة النفط تأمل من خلال زيادة الطاقة الانتاجية للغاز تجهيز المحطات الغازية في وزارة الكهرباء بالوقود الذي تحتاجه.

ينتج العراق حالياً نحو ١٨٦٠ مقمق/ يوم من الغاز المصاحب للنفط تضيع منه نسبة ٤٠% بسبب عدم وجود محطات المعالجة اللازمة ، عليه تم تأسيس شركة غاز البصرة في منتصف عام ٢٠١٤ وهي شركة مساهمة لاستثمار الغاز المصاحب في حقول البصرة النفطية الامر الذي سيؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز ، وكذلك للظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة الشمالية فقد انخفضت تخصيصات مشاريع معالجة الغاز لتبلغ (١١٠) مليون دينار فقط .

٤- في مجال الطاقات الخزنية والتصديرية للنفط الخام فان الوزارة وضعت سياسات لزيادة هذه الطاقة من خلال مشاريع انشاء المستودعات (خزانات عدد ٤ في الطوبة) و (خزانات عدد ١٢ في الزبير ٢) و(خزانات عدد ٢ في الزبير ١) و (خزانات عدد ١ في PSI) وكذلك توسيع مستودع النفط الخام في الفاو ، وفي مجال تصدير النفط الخام والارتقاء بمستوى الطاقات التصديرية من خلال السياسات التي وضعتها من خلال زيادة منافذ التصدير بإنشاء منصات تحميل عائمة وتأهيل الموانئ النفطية القائمة وتأهيل خط أنابيب العراق-تركيا .

قد بلغت تخصيصات مشاريع نقل وخرن النفط الخام مقدار (١٠٦٩٦٤٤.٨) مليون دينار أي بنسبة (٥,٩٥%) اجمالي تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٤ لوزارة النفط .

٥- ان سياسة وزارة النفط ورؤيتها لزيادة المنتجات النفطية هو تعظيم انتاج المنتجات النفطية من المصافي وذلك من خلال انشاء مصافي كبيرة متطورة وتطوير المصافي الحالية تصنيع المصافي المتنقلة لزيادة الانتاج .

وقد بلغت تخصيصات مشاريع تصفية النفط مقدار (١٤٧٧٧٤٥) مليون دينار مايشكل نسبة (٨,٢٢٢%) من اجمالي تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٤ لوزارة النفط.

٦- أن وزارة النفط أضافه الى هدفها في زيادة الطاقة الانتاجية من المشتقات النفطية لسد الحاجة الاستهلاكية والاكتفاء الذاتي فأنها وضعت السياسات اللازمة لزيادة الطاقة الخزنه للمنتجات النفطية البالغة كمعدل استهلاك لمدة ٤٠ يوم لكل من البنزين وزيت الغاز والغاز السائل ولمدة ١٠ يوم للنفط الابيض من خلال إنشاء المستودعات الجديدة وتأهيل القديم منها وقد بلغت تخصيصات مشاريع خزن المنتجات البيضاء مقدار (٩٧٢١٤) مليون دينار اي بنسبة (٠,٥٤%) في اجمالي تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٤ لوزارة النفط.

٧- تهدف سياسات وزارة النفط من تقليل الانبعاثات الغازية وتقليل الغاز المحترق المصاحب للنفط من خلال انشاء وحدات عزل ومعالجة لهذه الغازات وقد انجزت وحدة معالجة في مصفى كركوك القديم وهناك وحدات معالجة في مصفى الدورة وبيجي والبصرة في قيد الانشاء. وقد حظت المشاريع البيئية حصة من التخصيصات الاستثمارية بلغت (٠,٣٦%) في اجمالي تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٤.

٨- من خلال المحاور التي تنفذها وزارة النفط ولكل قطاع تحتاج هذه المشاريع الى عدة مشاريع خدمية تشمل (المشاريع الخدمية للقطاع الاستخراجي ولتصفية النفط والغاز وتجهيز المختبرات والاجهزة والبرامجيات والالات التخصصية والبرمجيات والمواد والتدريب للعاملين وانشاء الورش والمعامل ومشاريع حماية المنشآت النفطية) . وقد حظت المشاريع الخدمية حصة من التخصيصات الاستثمارية بلغت (٢,٤٥%) في اجمالي تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعام ٢٠١٤ لوزارة النفط.

المشاكل والمعوقات في تنفيذ مشاريع وزارة النفط

١- اعتماد الوزارة بشكل شبه تام على الشركات الاجنبية في مجال القطاع الاستخراجي للنفط الخام والغاز الامر الذي أدى إلى تخصيص ما يقارب على ٧٧% من تخصيصات الوزارة كتسديد لمستحقات هذه الشركات كما أدى إلى انحسار دور عمليات الحفر بالجهد الوطني في رفع الانتاج كما إن عدم إكمال البنى التحتية للقطاع النفطي (منافذ تصديرية ، مستودعات ، شبكات أنابيب) بشكل اسهم بشكل كبير في عدم تحقيق الهدف الرئيسي المخطط لكمية النفط المنتج والمصدر.

٢- ان المشاكل والمعوقات التي تجابه الوزارة في زيادة الاستكشافات النفطية والغازية هوأن العراق مقبل على مرحلة أستكشاف كبيرة ربما تجعله الاول من ناحية الاحتياطيات النفطية ولو أنه تم التركيز على مناطق احتمالية وجود الغاز بها كبيرة ليرفع رصيده الاحتياطي من الغاز

الطبيعي ومن المعوقات المهمة هي اصطدام الشركات الأجنبية ببعض القوانين والتشريعات الجديدة بعض الاحيان وكذلك قلة منافذ التصدير المستقبلية وكذلك الكلف التي يجب صرفها لرغد الأحتياطي النفطي والغازي وكيفية الدفع بالأجل هل يدفع نفطا أم نقدا.

٣- اما بالنسبة للمشاكل والمعوقات فهي اعتماد وزارة الكهرباء على الغاز في تشغيل محطاتها الحالية والمستقبلية مما يجعل الطلب على الغاز بدرجة كبيرة وأن اعتماد اقتصاد العراق على إنتاج النفط وتصديره فإن وزارة النفط واضعة كل الخطط لأستغلال الغاز المصاحب بالصورة الأمثل لتحقيق التزامات وزارة النفط مع وزارة الكهرباء وقد أجتازت وزارة النفط الكثير من المشاكل في صناعة الغاز من خلال تعاقدها مع شركات عالمية لأستغلال الحقول الغازية من جهة وأستثمار الغاز المصاحب المحروق من جهة أخرى.

٤- ان الوزارة في المجال الطاقات الخزنية للنفط تجابه بعض المشاكل والمعوقات منها تاخر استحصال موافقات الاحالة من الجهات المخولة وتأخر منح أجازات الاستيراد او فتح الاعتماد وتخصيص المواقع.

٥- أما بالنسبة للمشاكل والمعوقات التي تجابه وزارة النفط في هذا المجال التصفية هو عدم اقبال المستثمرين في مجال التصفية وذلك لأسباب تتعلق بأسترداد رأس المال وذلك لحاجة المصافي لمليارات الدولارات وكذلك عن أمكانية تصدير المنتجات مستقبلا ومنافذ تصديرها واسباب كثيرة أخرى .

مؤشرات وزارة الصناعة لعام ٢٠١٤

أقسام وزارة الصناعة والمعادن :-

أولا : قسم الصناعات الميكانيكية

يعتبر قسم الصناعات الميكانيكية من القطاعات المهمة في وزارة الصناعة والمعادن حيث يضم (١٧) شركة تقوم بتنفيذ (٢٨) مشروع حيث بلغ نسبة المصروف التراكمي ٥٦% من إجمالي التخصيص وتقوم بإنتاج العديد من المواد و تدخل في العديد من الصناعات و يعتبر قسم الصناعات الميكانيكية من الأقسام المهمة جدا في عملية أعمار و تأهيل جميع مرافق الدولة الصناعية و الزراعية و الخدمية حيث يدخل هذا القسم في صناعة العديد من الأجزاء و العناصر الميكانيكية المهمة و كذلك أعمال نصب و تركيب الهياكل الحديدية و أعمال إنتاج المنظومات المختلفة و تطوير و تحسين البيئة الإنتاجية و يضم القسم العديد من الشركات و كما يلي:

الشركة العامة لصناعة السيارات : وتختص في صناعة (تجميع) السيارات الكبيرة و المتوسطة و من اهم المعوقات لها هي عملية الحصول على حق المعرفة من الشركات العالمية الرصينة .

الشركة العامة للصناعات الميكانيكية : وتختص في صناعة الجرارات الزراعية و ملحقاته و من أهم المعوقات لها هي عملية الحصول على حق المعرفة من الشركات العالمية الرصينة

شركة الفارس العامة : تقوم بإنتاج كافة أنواع الخزانات و منظومات التصفية بكافة الأنواع

شركة بدر العامة : من الشركات الهندسية المتميزة و التي ابتدأ العمل في تأهيلها عام ٢٠١٣ و حاليا تقوم الشركة بإعمال تنفيذ المقاولات الهندسية للاستفادة من الكوادر الهندسية ذات الخبرات الواسعة التي تمتلكها .

شركة الرضوان العامة : من الشركات الهندسية الرائدة و التي ابتدأ العمل في تأهيلها عام ٢٠١٣ و حاليا تقوم الشركة بإعمال تنفيذ المقاولات الهندسية للاستفادة من الكوادر الهندسية ذات الخبرات الواسعة التي تمتلكها .

شركة النهروان العامة : من الشركات الهندسية الرائدة و التي ابتدأ العمل في تأهيلها عام ٢٠١٣ و حاليا تقوم الشركة بإعمال تنفيذ المقاولات الهندسية للاستفادة من الكوادر الهندسية ذات الخبرات الواسعة التي تمتلكها .

شركة عقبة بن نافع العامة : من الشركات الهندسية الرائدة و التي ابتدأ العمل في تأهيلها عام ٢٠١٣ و حاليا تقوم الشركة بإعمال تنفيذ المقاولات الهندسية للاستفادة من الكوادر الهندسية ذات الخبرات الواسعة التي تمتلكها .

شركة الإخاء العامة : تقوم بأعمال إنشاء الخزانات و الأعمدة الكهربائية و البراميل المغلونة

شركة النعمان العامة : تقوم بإنتاج منظومات الري بالتنقيط و إنتاج الأغذية البلاستيكية و تخدم القطاع الزراعي بشكل أساسي .

شركة ابن ماجد العامة : تقوم بإنتاج كافة أنواع الخزانات و لكافة دوائر ووزارات الدولة و خاصة وزارة النفط و هي من الشركات المتخصصة الرائدة .

شركة الفداء العامة : تقوم بإنتاج المنظومات الهيدروليكية بكافة الأنواع و هي من الشركات المتخصصة بذلك

شركة ابن الوليد العامة : تقوم بأعمال تأهيل العجلات بمختلف الأنواع و أعمال تصنيع أجزاء من تلك المواد و كذلك أجزاء من المولدات الديزل و ان السبب الرئيسي لتلك التنفيذ هو عدم تمكن الشركة من استغلال أرضها بسبب اشغاله من قبل القوات الأمنية و تم حل الموضوع لاحقا .

شركة الربيع العامة : من الشركات الهندسية الرائدة و التي ابتدأ العمل في تأهيلها عام ٢٠١٣ و حاليا تقوم الشركة بإعمال تنفيذ المقاولات الهندسية للاستفادة من الكوادر الهندسية ذات الخبرات الواسعة التي تمتلكها .

شركة الإسناد الهندسي : تقوم بجمع مخلفات الحديد و السكراب من كافة محافظات العراق و إعادة تدويرها حيث تمتلك الشركة أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد العراقي .

شركة نصر العامة : تقوم بإنتاج و نصب الهياكل الحديدية و الأعمدة بمختلف الأنواع و الارتفاعات و إنتاج المعدات المستخدمة في شركات السمنت و وزارة النفط.

شركة الصمود العامة : تقوم بإنتاج و نصب الهياكل الحديدية و الأعمدة بمختلف الأنواع و الارتفاعات و كذلك إنتاج الكرفانات.

شركة الحديد و الصلب : تم استثمار الشركة من قبل احدى الشركات التركية (بريمر).

ثانياً: قسم الصناعات الكهربائية

يعتبر قسم الصناعات الكهربائية من القطاعات المهمة في وزارة الصناعة و المعادن حيث يضم (٨) شركة تقوم بتنفيذ (١٤) مشروع حيث بلغ نسبة المصروف التراكمي ٥٨% من أجمالي التخصيصات و تقوم بإنتاج العديد من المواد و تدخل في العديد من الصناعات و يعتبر قسم الصناعات الكهربائية من الأقسام المهمة جدا في عملية أعمار و تأهيل جميع مرافق الدولة الصناعية و الزراعية و الخدمية حيث يدخل هذا القسم في صناعة العديد من الأجزاء و العناصر الكهربائية المهمة و كذلك أعمال نصب و تركيب المحولات بمختلف الأنواع و أعمال إنتاج المنظومات الكهربائية المختلفة و يضم القسم العديد من الشركات و كما يلي:

شركة الشهيد العامة : تقوم بإنتاج السبائك النحاسية و الأسلاك و هي من الشركات المهمة في إنتاج القابلات الكهربائية بمختلف الأنواع و الأقطار .

شركة أور العامة : تقوم شركة أور بإنتاج القابلات الكهربائية بمختلف الأنواع و الأحجام و تجهز كافة دوائر الدولة بها و أهم معوق للشركة هو المنافسة الحادة من قبل المواد الاستيرادية في

الأسواق المحلية علما إن مواصفات المنتج للشركة أعلى مما هو عليه من المواد المستوردة و يرجع السبب في ذلك الى عدم تفعيل قانون حماية المنتج .

شركة الزوراء العامة : تقوم بإنتاج المقاييس و المحولات بكافة الأنواع و تقوم أيضا بأعمال نصب البوردا و غيرها من أعمال كهربائية .

شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية : وهي من الشركات الرائدة في صناعة المحولات بمختلف الأنواع و السعات و تقوم أيضا بإنتاج المقاييس العادية و الالكترونية .

شركة التحدي العامة : تقوم الشركة بانتاج و تاهيل كافة أنواع المحولات .

شركة المنصور العامة : تقوم بإنتاج الغازات الطبية و الصناعية و إنتاج الخلايا الشمسية و تمتلك خط لإنتاج المياه الصناعية و الصحية .

شركة صلاح الدين العامة : تقوم بإنتاج السيركيات الكهربائية و الأعمدة الكهربائية و الجوزات الكهربائية و العبوات البلاستيكية .

شركة العامة للصناعات الكهربائية : تقوم بتجميع المولدات الكهربائية و المحولات أيضا و دافعات الهواء للجلرات .

ثالثا: قسم الصناعات الغذائية و الدوائية

يعتبر قسم الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة في وزارة الصناعة و المعادن حيث يضم (٦) شركه تقوم بتنفيذ (١٢) مشروع حيث بلغ نسبة المصروف التراكمي ٥٥% من أجمالي التخصيصات و تقوم بإنتاج العديد من المواد الغذائية و المنظفات حيث يعتبر قسم الصناعات الغذائية من الأقسام المهمة جدا في عملية الاكتفاء الذاتي للدولة و يضم القسم العديد من الشركات و كما يلي:

الشركة العامة للزيوت النباتية : تقوم بإنتاج زيت الطعام و المنظفات (التايد و الزاهي و القاصر و الشامبو و الصابون بجميع أنواعها) معاجين الأسنان و الحلاقة و أهم مشاكل الشركة عملية تسويق المنتج بسبب عدم تفعيل قانون حماية المنتج المحلي و قدم بعض الخطوط الإنتاجية .

الشركة العامة لصناعة السكر : تقوم بإنتاج السكر من قصب السكر و البنجر السكري و لازالت الشركة في طور التاهيل حاليا.

الشركة العامة لمنتجات الألبان : تقوم بإنتاج كافة أنواع منتجات الألبان و تعاني من نقص في توفير الحليب بسبب عدم وجود حقول لتربية الأبقار .

الشركة العامة للتبوغ و السكر : لازالت الشركة قيد التاهيل و تعاني من مشاكل التسويق بسبب المنافسة الحادة من المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية .

الشركة العامة لصناعة الأدوية في نينوى : تم إحالتها إلى الاستثمار .

الشركة العامة لصناعة الأدوية و المستلزمات الطبية في سامراء : وهي من الشركات الرائدة في إنتاج كافة أنواع الأدوية و المراهم و الأمصال و بمواصفات عالية و تعاني من سوء التسويق بسبب عدم تعاون وزارة الصحة معها .

رابعاً: قسم الصناعات النسيجية

يعتبر قسم الصناعات النسيجية من القطاعات المهمة في وزارة الصناعة والمعادن حيث يضم (٦) شركة تقوم بتنفيذ (٢٢) مشروع حيث بلغ نسبة المصروف التراكمي ٦١% من إجمالي التخصيصات وتقوم بإنتاج العديد من المواد المنسوجة الصوفية و القطنية حيث يعتبر قسم الصناعات النسيجية من الأقسام المهمة جدا في عملية الاكتفاء الذاتي للدولة و يضم القسم العديد من الشركات و يعاني القطاع من سوء التسويق بسبب عدم تفعيل قانون حماية المنتج و كما يلي :

الشركة العامة للصناعات القطنية : تعتبر من الشركات المهمة و التي تقوم بإنتاج العديد من المنتجات القطنية أقمشة و ألبسة و غيرها و تعاني من سوء التسويق بسبب عدم تفعيل قانون حماية المنتج .

الشركة العامة للصناعات الصوفية : تعتبر من الشركات المهمة و التي تقوم بإنتاج العديد من المنتجات الصوفية السجاد و البطانية و غيرها و تعاني من سوء التسويق بسبب عدم تفعيل قانون حماية المنتج .

الشركة العامة للصناعات النسيجية في الحلة : تعتبر من الشركات المهمة و التي تقوم بإنتاج العديد من المنتجات القطنية أقمشة و ألبسة و اكياس بلاستيكية و بدلات و البسة و لادية غيرها و تعاني من سوء التسويق بسبب عدم تفعيل قانون حماية المنتج .

شركة واسط العامة للصناعات النسيجية : تعتبر من الشركات المهمة و التي تقوم بإنتاج العديد من المنتجات القطنية أقمشة و ألبسة داخلية و جوارب قطنية و غيرها و تعاني من سوء التسويق بسبب عدم تفعيل قانون حماية المنتج .

الشركة العامة لألبسة الجاهزة : تعتبر من الشركات المهمة و التي تقوم بإنتاج العديد من أنواع ألبسة الرجالي و النسائي و الولادي و البناتي و الأطفال و غيرها و تعاني من سوء التسويق بسبب عدم تفعيل قانون حماية المنتج .

الشركة العامة للصناعات الجلدية : تعتبر من الشركات المهمة و التي تقوم بإنتاج العديد من المنتجات الجلدية قماصل و أحذية بمختلف الأنواع و أحزمة و حقائب و غيرها و تعاني من سوء التسويق بسبب عدم تفعيل قانون حماية المنتج .

خامسا: قسم الصناعات الكيماوية

يعتبر قسم الصناعات الكيماوية من القطاعات المهمة في وزارة الصناعة والمعادن حيث يضم (٨) شركة تقوم بتنفيذ (٢١) مشروع حيث بلغ نسبة المصروف التراكمي ٦٠% من إجمالي التخصيصات وتقوم بإنتاج العديد من المواد الكيماوية و المنتجات الكيماوية مثل الإطارات و البطاريات و الإسفلت و الماسنك و الأحبار و الكلور و الصودا الكاوية حيث يعتبر قسم صناعات الكيماوية من الأقسام المهمة جدا في عملية الاكتفاء الذاتي للدولة و يضم القسم العديد من الشركات و يعاني القطاع من سوء التسويق بسبب عدم تفعيل قانون حماية المنتج و كما يلي :

شركة ذات الصواري العامة : تقوم الشركة بإنتاج الاحبار و الراتنجات و الجذور الكيماوية تعاني الشركة من سوء التسويق بسبب عدم تفعيل قانون حماية المنتج

الشركة العامة للصناعات الورقية : لازالت الشركة قيد التأهيل حيث لم يتم المباشرة بعملية التأهيل الرئيسية بالرغم من تخصيص المبالغ اللازمة لذلك و تم تنفيذ مشاريع ثانوية ليست من صميم عمل الشركة مثل خط إنتاج الورق الصحي

الشركة العامة لصناعة الإطارات في النجف : العمل مستمر في تجهيز و نصب الخطوط الإنتاجية للشركة و في نفس الوقت فان الشركة تعاني من سوء التسويق بسبب عدم تفعيل قانون حماية المنتج للمنتجات الحالية

الشركة العامة للصناعات المطاطية : لازالت الشركة قيد التأهيل حاليا

الشركة العامة لصناعة البطاريات: لازالت الشركة قيد التأهيل حاليا

شركة ابن سينا العامة : تقوم الشركة بإنشاء منظومات المعالجة البيئية و منظومات ال RO و إنتاج النتروجين السائل

الشركة العامة للصناعات التعدينية : تقوم الشركة بإنتاج المواد العازلة من لباد و ماسنك و فلانكوت و كذلك إنتاج الملح الصناعي و تشرف على عملية البحث و التنقيب و إنتاج الحديد الرسوبي المستخدم في صناعة الاسمنت و البنتونايت المستخدم في الصناعة النفطية

شركة الفرات العامة : تقوم بإنتاج حامض الهيدروكلوريد و الأكياس البلاستيكية المنسوجة و الصودا الكاوية و الكلور و هي لازالت قيد التأهيل و التطوير .

سادسا: قسم الصناعات البتروكيمياوية و الاسمدة

يعتبر قسم الصناعات البتروكيمياوية و الاسمدة من القطاعات المهمة في وزارة الصناعة والمعادن حيث يضم (٤) شركة تقوم بتنفيذ (٦) مشاريع حيث بلغ نسبة المصروف التراكمي ٥١% من إجمالي التخصيصات وتقوم بإنتاج العديد من المواد البتروكيمياوية والكبريت المصفى و الشب و حامض الكبريتيك و الاسمدة الفوسفاتية و الاسمدة الزراعية حيث يعتبر قسم الصناعات البتروكيمياوية من الأقسام المهمة جدا في عملية الاكتفاء الذاتي للدولة و يضم القسم العديد من الشركات كما يلي :

الشركة العامة لكبريت المشراق : من الشركات المهمة جدا لكونها الشركة الوحيدة التي لها الحق في التنقيب و استخراج و إنتاج الكبريت في العراق و تحتاج الى مبالغ كبيرة للنهوض بواقعها الانتاجي

الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية : من الشركات المهمة و التي تعاني بشكل كبير بسبب عدم توفر الغاز الطبيعي العامل الأساس في الشركة .

الشركة العامة للفوسفات : من الشركات المهمة جدا لكونها الشركة الوحيدة التي لها الحق في التنقيب و استخراج و إنتاج الفوسفات في العراق و تحتاج الى مبالغ كبيرة للنهوض بواقعها الإنتاجي من الأسمدة الفوسفاتية المختلفة

الشركة العامة للأسمدة الجنوبية : من الشركات المهمة و التي تختص بإنتاج الأسمدة الزراعية المختلفة و هي قيد التطوير و التحديث حاليا .

سابعا: قسم الصناعات الإنشائية و تنفيذ المشاريع

يعتبر قسم الصناعات الإنشائية من القطاعات المهمة في وزارة الصناعة والمعادن حيث يضم (١٤) شركة تقوم بتنفيذ (٣٢) مشروع حيث بلغ نسبة المصروف التراكمي ٥٣% من إجمالي التخصيصات وتقوم بإنتاج العديد من المواد من سمنت و طابوق بمختلف الأنواع الحراري و العادي و المواد الإنشائية من حصى و رمل و صخر و الأنابيب البلاستيكية بمختلف الأقطار و الهياكل الكونكريتية و الصب الجاهز و الأثاث و منظومات الاتصال حيث يعتبر قسم الصناعات الإنشائية و تنفيذ المشاريع من الأقسام المهمة جدا في عملية الاكتفاء الذاتي للدولة و يضم القسم العديد من الشركات كما يلي :

الشركة العامة للصناعات الإنشائية : تقوم بإنتاج العديد من المواد من سمنت و طابوق بمختلف الأنواع الحراري و العادي و المواد الإنشائية من حصى و رمل و صخر و الأنابيب البلاستيكية بمختلف الأقطار و الهياكل الكونكريتية و الصب الجاهز و لكن تعاني من سوء التسويق و قدم الخطوط الإنتاجية حيث أعاق تأهيل المعامل العديد من المشاكل المصرفية .

شركة جابر بن حيان العامة : تقوم بإنتاج منظومات الري بالرش البلاستيكية و إعادة تدوير البلاستيك و هي قيد التأهيل حاليا .

الشركة العامة للتصميم و الإنشاء الصناعي : تقوم بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية من خلال الخبرات المتراكمة في هذا المجال

الشركة العامة للزجاج و السيراميك : تقوم بإنتاج الزجاج و السيراميك و لكن عانت الشركة من سوء التوجيه في عملية تأهيل الخطوط الإنتاجية مما أدى إلى التأخر في انجاز التأهيل .

شركة العز العامة : تقوم بتجميع الأجهزة الكهربائية و الالكترونية التلفاز و الحاسبات و غيرها و كذلك منظومات الاتصالات و إنتاج الأثاث الخشبي من خلال معمل بغداد للأثاث .

شركة الكندي العامة : تقوم بإنتاج منظومات الإطفاء و الرقابة و كاميرات المراقبة

الشركة العامة لنظم المعلومات : تقوم بتنفيذ النظم المعلوماتية و الحوكمة إضافة إلى الحصول على الرخص الدولية من الشركات العالمية .

الشركة العامة للصناعات الحرارية : تقوم بإنتاج الطابوق الحراري و بمختلف الأنواع

شركة الرشيد العامة : تقوم بأعمال تنفيذ المقاولات الإنشائية و الميكانيكية .

شركة الكرامة العامة : تقوم بتنفيذ المقاولات الهندسية و هي قيد التأهيل حاليا .

شركة تبوك العامة : قيد التأهيل حاليا .

الشركة العامة للسمنت الجنوبية : تقوم بإنتاج السمنت و بنوعيات مختلفة ذات مواصفات عالية .

الشركة العامة للفحص و التأهيل الهندسي : تقوم بأعمال الفحص للمعدات و اللحام إضافة إلى تنفيذ المقاولات الهندسية

الشركة العامة للمنظومات : تقوم بأعمال الفحص للمعدات الدقيقة الخاصة بدوائر ووزارات الدولة

ثامنا: المشاريع المتفرقة

و تشمل المشاريع التي تنفذ من قبل المديريات و الهيئات التابعة لوزارة الصناعة و المعادن حيث بلغ نسبة المصروف التراكمي ١٦% من أجمالي التخصيصات و هي كما يلي :

هيئة المسح الجيولوجي العراقية : و تقوم بأعمال التنقيب عن المعادن و الثروات الطبيعية و المسوحات الجيولوجية .

المديرية العامة للتنمية الصناعية : وهي المسؤولة عن تنفيذ و إدارة المدن الصناعية في العراق

هيئة البحث و التطوير الصناعي : و تقوم بأعمال البحث في المجال الصناعي و تهدف إلى الارتقاء به من خلال الدراسات و الخطط البحثية .

المشاكل والتحديات :-

- عدم وجود رؤية واضحة لدى وزارة الصناعة و المعادن في تنفيذ المشاريع الخاصة بها .
- قدم التكنولوجيا المستخدمة في الخطوط الانتاجية و الحاجة الى إعادة تأهيل الشركات و ادخال بعض الخطوط الانتاجية الحديثة.
- تضخم عدد العاملين في الوزارة بعد عام ٢٠٠٣ من جراء اعادة الموظفين للعمل مما يتطلب اعداد تشريعات مركزية لمعالجتها.
- عند القيام بأقرار مشاريع صناعية جديدة لم يراعى مقومات تلك الصناعة بأقرارها في تلك المحافظة دون غيرها وذلك لعدم استخدام معايير فنية واضحة لقياس درجة التخصص و التنوع الصناعي لكل محافظة أو اقليم كمعيار معامل الموقع أو معيار تحليل الهيكل الصناعي وغيرها من المعايير التي تسهم في الاستثمار الصحيح و الكفوء للانشطة الصناعية .
- توسع وزارة الصناعة و المعادن في المشاريع الغير الاستراتيجية وهذا ادى الى تشتت التخصيصات المالية السنوية في تلك المشاريع .
- الصعوبة التنافسية نتيجة لاغراق السوق بالمنتجات الرخيصة الثمن الرديئة النوعية .

المقترحات :-


- اعطاء الاولوية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتي تعتمد في مدخلاتها على مواد أولية محلية وكذلك المشاريع التي تكون مخرجاتها مكملة لمشاريع أخرى
- التركيز على المشاريع الانشائية وخاصة صناعة السمنت والطابوق والسيراميك والصناعات الجبسية (الحص والنورة) ذات المردود الاقتصادي المربح .
- الاهتمام بالصناعات الكيماوية والفسفاتية التي تدعم الوزارات بالمواد الاولية وخاصة وزارة الزراعة .
- الاهتمام بالصناعات الغذائية وخاصة الشركة العامة للزويت النباتية والتي توفر في أنتاجها مفردات البطاقة التموينية ودعمها .
- النهوض بالواقع النسيجي وأخذ دوره كباقي الصناعات .
- اقرار قانون وزارة الصناعة والمعادن للتمكن من تفعيل دور الوزارة وفق منظور اقتصاد السوق تخدم بتحويل الوزارة من كونها مهتمة بصورة اساسية في الجوانب التفصيلية لعمل الشركات العامة الى تنظيم وتمكين الصناعة العراقية .
- الحاجة الى اصدار القوانين المهمة للقطاع الصناعي وإيجاد الحلول المناسبة للايدي العاملة الكبيرة التي أصبحت تشكل كاهل على الدولة .
- تفعيل نظام الرسوم الكمركية ولكافة البضائع المستوردة وبنسب متفاوتة اسوة بالرسوم الكمركية المفروضة على البضائع للدول المجاورة لحماية المنتج المحلي.
- الحاجة الى تفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية كنظام رقابي للسيطرة النوعية للمنتجات المستوردة الى العراق لمنع دخول المنتجات الرديئة الصنع.
- تشجيع الصناعة الوطنية واعتماد وزارات الدولة كافة على المنتج الوطني بدلا من المستورد .
- الحاجة الى اصلاح النظام المصرفي لتسهيل توفير رأسمال جديد لتشغيل الشركات.

المرفقات

- صور لبعض المشاريع
- جداول



مشروع محطة بزر كان / محافظة ميسان

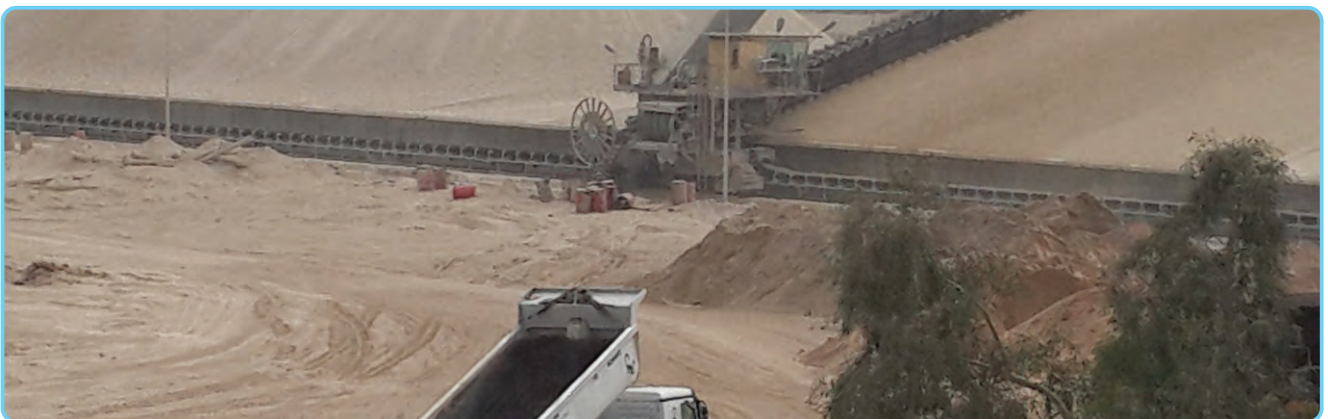

معمل سممت الكوفة / محافظة النجف



مشروع تطوير حقل النور / محافظة ميسان



مشروع انشاء مراكز سيطرة ميسان / محافظة ميسان

جدول القطاع الصناعي لعيبة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل و المعوقات	تاريخ الزيارة	تسلسل الزيارة	نسبة اجزاء المشروع الكلية			المحافظة	التكلفة مليون دينار	سنة الراج المشروع	الجهة المتفئة	اسم المشروع	التوبيخ			ت
				الانحراف	منفذ	مخطط									
	التاخير الحاصل من قبل الشركات المقاوله و عدم التزامها في التجهيز المعدات في التواريخ المحددة , الاجراءات الادارية و الروتين المعقد في الموانئ العراقية في تخصيص الكمركي	1	1	21.25	70	91.3	البصرة	137000	2003	وزارة النفط	تطوير وتأهيل وتحديث وحدات شركة غاز الجنوب (شركة غاز الجنوب)	1	2	6	1
	صعوبة إيقاف وحدات الإنتاج لغرض نصب العداات , تاخر بعض فقرات العمل بسبب قلة صلاحيات المهندسين المشرفين و المنفذين للمشروع , قلة الكادر المتخصص	1	1	45	55	100	البصرة	36100	2011	وزارة النفط	مستلزمات شراء عداات مع ملحقاتها لشركة غاز الجنوب (شركة غاز الجنوب)	3	2	6	2
متوقف لغيبة		1	1												
31/12/2013	مكتبي	11	1	40.93	50.6	91.5	ميسان		برنامج سنوي	وزارة النفط	توفير مستلزمات حماية البيئة في حقول ميسان / برنامج سنوي	9	5	1	3

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والموقات	تاريخ الزيارة	تسلسل الزيارة	نسبة اجزاء المشروع الكلية			المحافظة	التكلفة مليون دينار	سنة اذراج المشروع	الجهة المتفائة	اسم المشروع	التوبيخ	ت
				الانحراف	منفذ	مخطط							
	الاجراءات الادارية الروتينية التي تستهلك الكثير من الوقت و الجهد بالتالي تؤدي الى حيود المشروع عن المخطط الزمني المحدد له , تتكرر بعض الشركات المقاوله الثانويه في تنفيذ التزاماتها مثل شركة بيت التجبة مما ادى الى سحب العمل منها و توقف العمل تاخر طلبات بعض المواد الاستيرادية , رفض وزارة النفط بعض الاحالات لبعض الفترات مما ادى الى حيود المشروع , عدم وجود شبكة لتصريف مياه الامطار لجميع الموقع مما ادى الى فيضان الموقع عد مرات	1	1	26.92	64	90.9	السنوه	2008	وزارة النفط	انشاء مستودع السمولة (شركة توزيع المنتجات النفطية)	7	4	4
	تاخر طلبات بعض المواد الاستيرادية و عدم وصول مخططاتها المدنية , عدم وجود شبكة تصريف مياه الامطار	8	1		68	66	السنوه	2008	وزارة النفط				
	الاجراءات الروتينية التي تستهلك الكثير من الجهد و بالتالي تؤدي الى حيود المشروع عن المخطط الزمني , تتكرر بعض الشركات المقاوله الثانويه في التنفيذ , تاخر طلبات بعض المواد الاستيرادية , رفض وزارة النفط بعض الاحالات لفترات في المشروع	11	1		69	66							
	التاخر في احالة فقرة نصب المعدات المجهزة من قبل الشركة بروجيتي الإيطالية , قلة كادر الهندسي العامل في مكتب المتنى التابع لشركة الغاز , التاخر في تأمين مصدر للتغذية الكهربائية في محطة التحميل	1	1	4	76	80							
	التاخر في احالة فقرة نصب المعدات المجهزة من قبل الشركة بروجيتي الإيطالية , قلة كادر الهندسي العامل في مكتب المتنى التابع لشركة الغاز ,	11	1	20	80	100	السنوه	2005	وزارة النفط	انشاء موقع تحميل السمولة (شركة تغذية الغاز)	3	4	6
													5

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمعوقات	تاريخ الزيارة	تسلسل الزيارة	نسبة إنجاز المشروع الكلية			المحافظة	الكلية مليون دينار	سنة الراج المشروع	الجهة المنفذة	اسم المشروع	التوبيخ	ت		
				الانحراف	منفذ	مخطط									
	التاخر الحاصل بسبب تقسيم شركة غاز الجنوب ومن العوامل تلافية خلال عام 2014 , لم يتم احالة عدد من الطيبات وذلك لاسباب منها قلة الكلفة التخمينية او عدم كفاية العروض المقدمة او قفلها فنيا	1	1	7.4	78.6	86	البصرة	6850	2004	وزارة النفط	توفير مستلزمات حماية البنية لشركة غاز الجنوب (شركة غاز الجنوب)	12	5	6	
	التاخر في اطلاق صرف المبالغ المخصصة للشركة , عرقلة اجراءات فتح الاعتماد من قبل المصرف التجاري العراقي , قلة التخصيصات المالية المرصودة للشركة	1	1	27	73	100					شراء معدات ومستلزمات لتجهيز أجهزة الحفر العاملة و تاهيل الاجهزة القياسية و العاطلة (شركة الحفر العراقية)	34	1	1	7
	عرقلة اجراءات فتح الاعتماد من قبل المصرف التجاري العراقي , ورود بعض العروض الغير مطابقة للمواصفات الفنية , قلة التخصيصات المالية	11	1	16	84	100	بغداد	186021	2012	وزارة النفط	شراء معدات ومستلزمات للمنظومات العاملة في شركة الاستخدمات النفطية و شراء اجهزة وبرمجيات / برنامج سنوي (شركة الامتشافات النفطية)	4	5	1	8
	عرقلة اجراءات فتح الاعتماد من قبل المصرف التجاري العراقي , ورود بعض العروض الغير مطابقة للمواصفات الفنية	1	1	17	83	100	بغداد			وزارة النفط	التحديث والدعم الفني للمنظومات العاملة في شركة الاستخدمات النفطية و شراء اجهزة وبرمجيات / برنامج سنوي (شركة الامتشافات النفطية)	4	5	1	8

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمواقف	تاريخ الزيارة	تسلسل الزيارة	نسبة اجزاء المشروع الكلية			المحافظة	الثقل مليون دينار	سنة الراج المشروع	الجهة المتفذة	اسم المشروع	التوبيخ	ت	
				الانحراف	منفذ	مخطط								
نسبة الاجزاء تنهية 31/12/2013 لكون المشروع برنامج سنوي	تتخر المقاولين عن تنفيذ الاعمال المطلوبة للاسعر المقومة في جداول الكميات التعاقدية للطلبات , ترجيل العديد من الفقرات المدرجة ضمن البرنامج السنوي السابق الى البرنامج السنوي الحالي و هذا يؤدي الى عجز في تنفيذ الفقرات	2	1	45	55	100	ميسان	2001	وزارة النفط	مستلزمات المرافق الحكومية والصناعية لمواقع الانتاج لشركة نفط ميسان / برنامج سنوي (شركة نفط ميسان)	7	5	1	12
	تاخر الاجراءات التعاقدية للطلبات , ترجيل العديد من فقرات المدرجة ضمن البرنامج السنوي السابق الى برنامج سنوي الحالي و هذا يؤدي الى عجز في تنفيذ الفقرات	9	1	0	83	83								
نسبة الاجزاء تنهية 31/12/2013 لكون المشروع برنامج سنوي	التاخر في اقرار الموازنة الاتحادية التي ادت الى التاخر في الدخول بالالتزامات التعاقدية , ترجيل العديد من الفقرات المدرجة ضمن البرنامج السنوي السابق الى البرنامج السنوي الحالي و هذا يؤدي الى العجز في تنفيذ فقرات	2	1	33.2	66.8	100	ميسان	برنامج سنوي	وزارة النفط	مشروع عمليات الحفر لشركة نفط ميسان/ برنامج سنوي (شركة نفط ميسان)	10	1	1	13
	تتقدم اجهزة الحفر المرقبة تؤدي الى تاخير في الجدول الزمني لحفر البئر , الاجراءات الروتينية المتبعة من قبل شركة الحفر في عمليات صيقله اجهزة الحفر العاملة	10	1	64	21	85	ميسان							

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمواقف	تاريخ الزيارة	تسلسل الزيارة	نسبة إنجاز المشروع الحالية			المحافظة	القيمة المالية مليون دينار	سنة اذراج المشروع	الجهة المتفذة	اسم المشروع	التبويب	ت	
				الإحراف	منفذ	مخطط								
		2	1											
	المشاكل بين شركة غاز البصرة وشركة EX.mobi المستثمرة لحقل غرب القرية بسبب عدم التعامل بتود عقد الإستثمار للحقل على الإستثمار الغاز المصاحب وما يصاحب ذلك من تعقيدات ومشاكل تؤدي الى تأخر وتاخير مشاريع استثمار الغاز المصاحب والذي أصبح من مسؤوليات الجانب العراقي (شركة غاز البصرة)	12	1	5	95	100	البصرة		برنامج سنوي	وزارة النفط	إنشاء محطات كس الغاز حقل غرب القرية (شركة المشاريع النفطية)	24	1	14
	الاجراءات الادارية الروتينية التي تستهلك الكثير من الوقت و الجهد بالتالي تؤدي الى جود المشروع عن المخطط الزمني المحدد له ، وتأخر طلبات بعض المواد الاستيرادية و عدم وصولها في الوقت المناسب ، تعدد مواقع المشروع و الجهات التنفيذ يشكل ارباك في اعداد خطة عمل متكاملة للمشروع ، التأخر الحاصل في المسح البيني لمسارات الجريان نتيجة قلة امكانيات قسم البيئة في الشركة ، الظروف البيئية القاسية في المشروع التي تعاني بارتفاع درجات الحرارة في الصيف إضافة الى الغبار اغلب ايام السنة	2	1	87.6	12.4	100	البصرة			وزارة النفط	منظومة العزل و الضخ و النقل للنفط الخام و الغاز / برنامج سنوي (شركة نفط الجنوب)	44	1	15
	نسبة الانجاز لغاية عام 31/12/2013													
	تأخر اقرار الموازنة الإستثمارية لعام 2014 عكست سلبيا على مراحل تنفيذ فقرات المشروع ، تأخر الدراسات المقولية في التنفيذ الاصل التي تم التعاقد عليها ، تأخر طلبات المواد الاستيرادية	11	1	60	40	100								

جدول القطاع الصناعي لعيبة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمواقف	تاريخ الزيارة	تسلسل الزيارة	نسبة إنجاز المشروع الكلية			المحافظة	الكلية مليون دينار	سنة الراج المشروع	الجهة المنفذة	اسم المشروع	التعيين	ت		
				الانحراف	منفذ	مخطط									
	الإجراءات الروتينية الخاصة باستحصال الموافقات الاصولية لفتح الاعتماد و الاحالة و استهلاك الاراضي ، تلحق الشركات المجهزة في ايداء الراي بصدد التصاميم . سز الأحوال الجوية التي سادت على منطقة المشروع في الازنة الاخيرة من امطار غزيرة ادت الى انحراف التربة و عرقلة سير العمل ، عدم اتباع المواصفات الفنية للتلاء من قبل شركة اصباغ الحديدية	2	1	5	95	100	كربلاء		برنامج سنوي	وزارة النفط	انشاء مستودع كربلاء (شركة توزيع المنتجات النفطية)	6	4	6	16
تم اضافة مدد اضافية ولهذا تم تعديل نسب الانجاز	توقف كافة اصمال المشروع بسبب تاخر اقرار الموازنة ، تاخر احالة عقد مد انبوب ماء الاطفاء من شهر الفرات الى مستودع ، تاخر احالة انشاء وتجهيز محطة تحويل الثانوية	8	1	3	92	95									
نسبة الانجاز لعام 2013	عزوف المقاولين عن التقديم للمناقصات الخاصة بالمشاريع التابعة لشركة نفط ميسان بسبب الاجراءات الروتينية وصعوبة الدخال المعقدات الى مواقع العمل التابعة للشركة مما ادى الى اعادة اعلان بعض المناقصات لكثر من مرة	3	1	36	64	100	ميسان		2007	وزارة النفط	تطوير حقل العمدة / برنامج سنوي (شركة نفط ميسان)	1	1	1	17
	تاخر الموازنة لعام 2014 ، تتكا بعض المقاولين ادى الى تاخر عدد من فقرات المشروع	9	1	18.6	81.4	100									

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمواقف	تاريخ الزيارة	تسلسل الزيارة	نسبة إنجاز المشروع الكلية			المحافظة	الكلية مليون دينار	سنة الدراج المشروع	الجهة المفضلة	اسم المشروع	التوبيخ	ت	
				الاتحراف	منفذ	مخطط								
نسبة الاجاز لعام 2013	هناك مشكلة بخصوص استهلاك الاراضي التي يتم مد التيبس ربط الابار بالمحطات عبرها، تملك شركة الحفر العراقية في حفر ابار النفط في الحقل، عم توفّر شركة مسعود حامية متطورة لدى قسم التخطيط والمتابعة في شركة نفط ميسان	3	1	45	55	100	ميسان		برنامج سنوي	وزارة النفط	ربط الابار بالمحطات لشركة نفط ميسان /برنامج سنوي (شركة نفط ميسان)	3	1	18
	الاتباط الوثيق لهذا المشروع بمشروع عمليات الحفر ادى الى تاخر اجاز وربط بعض الابار بسبب عدم اجاز حفر هذه الابار او ظهور مشاكل فيها ، عدم اقرار الموازنة الاستثمارية السنوية لعام 2014 ادى الى عدم تنفيذ الفقرات	9	1	39.2	43.8	83			برنامج سنوي	وزارة النفط	ربط الابار بالمحطات لشركة نفط ميسان /برنامج سنوي (شركة نفط الجنوب)	3	1	19
	لا توجد بالوقت الحالي اي مشاكل بخصوص تنفيذ المشروع و بانتظار اقرار الموازنة الاتحادية لغرض البدء بتوقيع العقود والمباشرة باعمال تنفيذ المقاولات	3	1	24	1	25	النجسة		برنامج سنوي	وزارة النفط	تحسين اداء منظومات التصدير في المنطقة الجنوبية /برنامج سنوي (شركة نفط الجنوب)	43	1	19

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمورقات	تاريخ الزيارة	تسليم الزيارة	نسبة انجاز المشروع الكلية			المحافظة	العلقة مليون دينار	سنة ابراج المشروع	الجهة المنقذة	اسم المشروع	التوبيخ		ت	
				الإحراف	منفذ	مخطط						التوبيخ	ت		
	اجراءات الاستلام الاولى و التنفيذ التدريسي متوقفة لقلية تاريخه مع الاشارة الى انه سبق وان تم تسليم عدد من الملاحظات في شهادتي الاجاز الميكانيكي والسلامة المهنية الصادرة للمشروع , عدم تدريب كلار متخصص على الادارة و تشغيل المستودع	3	1	1.7	98.3	100	التجف		برنامج سنوي	وزارة النفط	انشاء مستودع التجف (شركة توزيع المنتجات النفطية)	5	4	6	20
	اصال اضافية معلقة ولحين اكتمال اجراءات نقل الملكية المشروع ومنها مساحة انتظار	9	1	0.01	99.9	100									
	تتكر الشركات المنقذة في انجاز اعمالها , عدم اطلاق على احداث المواصلات العالمية وبالتالي اعداد مواصلات لا تتناسب مع التطوير الذي يشهده العالم في جميع المجالات الصناعية	3	1	30	70	100	بغداد	101108	2005	وزارة النفط	مشروع انشاء خط تصنيع التجهيزات المحمية (الشركة العامة الهندسية العراقية)	10	1	9	21
	تتكر الشركات المنقذة في انجاز اعمالها , عدم اطلاق على احداث المواصلات العالمية وبالتالي اعداد مواصلات لا تتناسب مع التطوير الذي يشهده العالم في جميع المجالات الصناعية	10	1	29.43	70.6	100									
	عدم التزام شركة الحفر العراقية بالمخطط الزمعي بسبب مشاكل في صيانة الاجهزة و المعدات , حدوث توقفت بسبب تاخر وصول المواد اللازمة للحفر , تتعلق بالطبيعة الارض و الظروف تحت السطحية حيث ان تغير طبقات الارض الجاطية يبطئ من انجاز الاصل بالوقت المحدد اضافة الى بعض المشاكل التي تتعلق بفقدان دورة سائل الحفر	3	1	19	6	25		7465	2011	وزارة النفط	مشروع عمليات الحفر لشركة نفط الجنوب برنامج سنوي (شركة نفط الجنوب)	8	1	1	22

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمواقف	تاريخ الزيارة	تسليم الزيارة	نسبة إنجاز المشروع الكلية		المحافظة	الكلفة مليون دينار	سنة ادرج المشروع	الجهة المنفذة	اسم المشروع	التوبيخ		ت	
				الانحراف	منفذ									
نسب الاجزاء لعام 2013	لا توجد مشاكل	3	1	0	100	100	بغداد	برنامج سنوي	وزارة النفط	تطوير المرافق الخدمية في معهد التدريبي النفطي /بغداد (معهد التدريب النفطي)	22	6	11	23
	تتلك بعض المجهزين في تجهيز بعض الطلبات ، انغمر ساحات الابار في حقل نور وساحات الابار في حقل نور مشروف بياه السيول التاجمة عن الامطار الغزيرة ، كون المشروع برنامج سنوي وبسبب تاخر اطلاق الموازنة المالية فان تلك يودي الى حصول بعض المشاكل الفنية و الادارية بسبب حصر مدة التنفيذ خلال سبعة اشهر ،	4	1	33.2	66.8	100	ميسان	برنامج سنوي	وزارة النفط	مستلزمات حفر الابار لشركة نفط ميسان / برنامج سنوي (شركة نفط ميسان)	5	1	1	24
	تاخر الشركات المقاوله بتجهيز الطلبات و اعمل التشغيل الاولي، كون المشروع برنامج سنوي و سبب تاخر اطلاق الموازنة المالية فان ذلك يودي الى حصول بعض المشاكل الفنية و الادارية بسبب حصر مدة التنفيذ	10	1	30.3	69.7	100								
	تاخر الشركات المقاوله في تجهيز الطلبات	4	1	5	95	100								
	تاخر الشركات المقاوله في تجهيز الطلبات ، الاجراءات الروتينية الخاصة بالمصافقة على المتناقضات بين الشركة و الوزارة ادت الى تاخير تنفيذ اغلب فعاليات المشروع	9	1	4.3	95.7	100	ميسان	برنامج سنوي	وزارة النفط	مستلزمات شراء عدادات مع ملحقاتها لشركة نفط ميسان(شركة نفط ميسان)	4	1	1	25

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمورقات	تاريخ الزيارة	تسلسل الزيارة	نسبة إنجاز المشروع الكلية			المحافظة	الكلية مليون دينار	سنة الراج المشروع	الجهة المنفذة	اسم المشروع	التعيين		ت	
				الإحراف	منفذ	مخطط						التعيين	ت		
	عدم وجود خطة متكاملة للمشروع تبين جميع فقرات المشروع المطلوب تنفيذها و البرنامج الزمني للتنفيذ , صعوبة الدخول الى المواقع التطبيقية من حيث الاجراءات الادارية و الامنية , قلة الاليات التخصيصية في الشركة مقارنة بحجم العمل في الشركة	4	1	10	90	100									
	منجز	12	1	0	100	100	البحريرة	170516	2009	وزارة النفط	تطوير حقل غرب القرينة المحطة (8٥7) (الشركة المشاريع النفطية)	25	1	1	28
	تاخر تنفيذ المشروع في المراحل التعاقدية لاسباب مختلفة ,	4	1				بغداد	916120	1987	وزارة النفط	مشروع التوريد الذاتي للطاقة الكهربائية لشركة الوسط (شركة نفط الوسط)	11	1	7	29
	مكتبي	4	1				بغداد		برنامج سنوي	وزارة النفط	تاهيل حقل شرقي بغداد (شركة المشاريع النفطية)	41	1	1	30

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل و الموقوفات	تاريخ الزيارة	تسلسل الزيارة	نسبة العجز المشروع الكلية			المحافظة	التكلفة مليون دينار	سنة الدراج المشروع	الجهة المتفئة	اسم المشروع	التبويب			ت
				الانحراف	منفذ	مخطط									
	قمة الكادر الهندسي في الشركة المشاريع النفطية , قمة الاليات التخصصية في الشركة	4	1	100	100		البحرة	2004	النفط	اكمل محطة غاز حقل الزبير / المرحلة الاولى (شركة المشاريع النفطية)	22	1	1	31	
		4	1				الانبار	2001	النفط	اعادة تاهيل محطة K3 (شركة المشاريع النفطية)	21	1	1	32	
		5	1												
	تتكون بعض المقاولين في تنفيذ ضمن المشروع , تقع اغلب فقرات المشروع في مناطق زراعية	12	1				ميسان	2004	الكهرباء	تجهيز ونصب وتأهيل الشبكات الكهربائية ومغذيات (11كي في) في عدد من اقصيات نواحي في محافظة ميسان	73	3	10	33	

جدول القطاع الصناعي لعيبة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمورقات	تاريخ الزيارة	تسلسل الزيارة	نسبة إنجاز المشروع الكلية			المحافظة	الكلية مليون دينار	سنة الراج المشروع	الجهة المنفذة	اسم المشروع	التوبيخات			
				الإحتراف	منفذ	مخطط									
	تاخر في تجهيز المواد الحاكمة للمشروع, عدم تجهيز قضبان الخدم	5	1	10	44	93	البحيرة	131900	2005	النفط	انشاء وحدة الأزمرة في مصفى البصرة	22	1	6	37
		12	1	11	72	83									
	قلة العواد العاملة في الشركات العقارية, عدم الدقة في تحديد المنهاج الزمني لتنفيذ, مشكلة التشغيل حيث لم يتم تحديد من يقوم بعملية التشغيل	5	1	3	97	100	البحيرة	302912	2011	النفط	وحدة تحسين التزوين الثالثة مصفى البصرة	16	1	6	38
	قلة الاختصاصات الهندسية و الفنية, تاخر اطلاق الموازنة لعام 2014, عدم وجود خطة متكاملة لجميع فقرات المشروع المنفذ منها	5	1	36.8	48.2	85	بغداد	100242	2012	النفط	توسيع وتحسين الدنية مرافق الانتاج للنفط الخام والغاز لشركة نفط الوسط	42	1	1	39

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل و الموقوفات	تاريخ الزيارة	تسلسل الزيارة	نسبة ايجاز المشروع الكلية			المحافظة	الكلية مليون دينار	سنة الاراج المشروع	الجهة المنفذة	اسم المشروع	التوبيخ		ت	
				الاجراف	منفذ	مخطط									
	عدم وجود خطة عمل واضحة للمشروع ، التأخر في اجراءات فتح الاعتماد ، تاخر في اطلاق الصرف	5	1	30	70	100	بغداد ، البصرة	509323	2009	النفط	تطوير المرافق الخدمية والمناشئة لشركة الحفر العراقية	18	5	1	40
	تلكر بعض الشركات المنفذة لقررات ضمن المشروع ، البدء بالاصال المنية لمشروع مجمع تحسين البنزين ولم يتم اكمال جميع التصاميم التفصيلية للمشروع ، لم يتم توقيع عقد مع شركة منقطة النفطية	5	1	30	40	70									
	تلكر الشركات المنفذة لقررات ضمن المشروع ، البدء بالاصال المنية لمشروع مجمع تحسين البنزين ، لم يتم توقيع عقد مع الشركة المشريع النفطية	9	1	40	40	80	بغداد	7974.52	2012	النفط	مجمع الهدرجة وتحسين البنزين و البنية	19	1	6	41
	لا توجد مشاكل	5	1	6	92	86	كركوك		برنامج سنوي	النفط	مشروع الشفاء ورش و مختبرات للاقسام الطبية و وحداها الخدمية لمعهد التدريب النفطي / كركوك	27	6	11	42

جدول القطاع الصناعي لعيبة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمورقات	تاريخ الزيارة	تسلسل الزيارة	نسبة اجزاء المشروع الكلية			المحافظة	الكلية مليون دينار	سنة اذراج المشروع	الجهة المنفذة	اسم المشروع	التوبيخ			
				الانحراف	منفذ	مخطط						ت	6	5	
	مكتبي	9	1	2.3	63.2	65	البحيرة	44250	2002	النفط	اصلاح وتأهيل مستودع الخزن والتصدير ومرفأ التحميل (شركة غاز الجنوب)	5	2	6	46
	لم تتم المباشرة باستلام اوصول ومشروع من قبل شركة غاز الجنوب، والرياح العلية و الارتفاع ودرجات الحرارة خاصة كون موقع العمل قرب مناطق النفط، لم يتم تشكيل لجنة متابعة مواصفات للمواد المجهزة من قبل شركة GE	10	1	81.6	18.4	100	البحيرة	342500	2009	النفط	تطوير حقل غرب القرية المحطة 6 (شركة المشاريع النفطية)	26	1	1	47
	كبر الرقعة الجغرافية للشركة، تتعلق الكثير من فقرات المشروع بالجزائر مهام الهيئات الاخرى داخل شركة نفط الجنوب،	10	1	39.27	60.7	100									
	صعوبة نصب المعدات ضمن المواقع كون هذه المواقع هي داخل الخدمة، تاخر المواد المجهزة من قبل الشركات المجهزة، صعوبة دخول الجيراء الاجانب للفحص والتشغيل، الروتين الاداري المتبع وقلة الصلاحيات لدى مدراء المشاريع	12	1	38.7	61.3	100	البحيرة	76411	2009	النفط	مستلزمات شراء ونصب عدادات مع ملحقاتها لشركة نفط الجنوب (شركة نفط الجنوب)	14	1	1	48

جدول النطاق الصناعي لعينة المشاريع لمواقع متعددة المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمواقف	نسب الانجاز على مستوى الفقرات			تاريخ الزيارة	تسليم الزيارة	المحافظة	الكلفة مليون دينار	سنة اذراج المشروع	الجهة المتفئة	اسم المشروع	التبويب	ت		
		نسبة الانجاز المادي	المنفذ	المخطط											
	تاخر في احالة مقاولات المشروع	5.65	30.2	24.49	1	1	البحيرة / تحسين الواقع البيئي لشركة مصافي الجنوب								
	عدم تحديد الكلفة الكلية للمشروع فيما ادى الى توقف الشركة المنفذة للمشروع	37	63	100	5	1	منظومة معالجة فضلات المياه الصناعية في مصفى البحيرة	113370	2008	وزارة النفط	توفير مستلزمات حماية البيئة لشركة مصافي الجنوب / (شركة مصافي الجنوب)	1	5	6	1
	عدم تحديد كلفة الكلية للمشروع فيما ادى الى توقف الشركة المنفذة للمشروع	34.88	65.1	100	10	1	تجهيز وتقييم وحداثي معالجة المياه الصناعية لمصفي ميسان								
	لا توجد دائرة للمهنيين المقيم في موقع المشروع و الاكتفاء بالجنة فنية متخصصة لمتابعة سير الاعمال , عدم وجود تقدم الاعمال تفصيلي يضم كافة فقرات المشروع حيث يتم تنفيذ الفقرات كل على حدة	10	40	50	1	1	ميسان								
	عدم وجود جدول تقدم الاعمال تفصيلي يضم كافة الفقرات المشروع حيث يتم تنفيذ الفقرات كل على حدة , انخفاض منسوب ارض في موقع العمل عن مستوى الطريق العام مما يؤدي الى تجمع المياه الامطار الامر الذي يؤدي الى توقف العمل				9	1				وزارة النفط	تاهيل و تطوير معهد البحيرة و فرع معهد في ميسان (معهد التريب النفطي / بصرة)	24	6	11	2
	قائمة التفصيلات المالية للمشروع وقائمة الصلاحيات الممنوحة الى مدير المعهد	4	92	94	5	1		62170	2011						
	قائمة الصلاحيات الممنوحة الى مدير المعهد , لم يتم حسم موضوع استئلاك الارض الخاصة بالمعهد النفطي الجديد , تاخر المكتب الاستشاري لجامعة المستنصرية من اعداد التصاميم المعهد الجديد	2.5	95.5	98	10	1	البحيرة								

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع متعددة المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمعوقات	نسب الاجزاء على مستوى الفقرات			تاريخ الزيادة	تسلسل الزيادة	المحافظة	الكلفة مليون دينار	سنة اذراج المشروع	الجهة المنفذة	اسم المشروع	التبويب	ت
		نسبة الاضرار المادي	المنفذ	المخطط									
	تأخر نتائج الفحوصات المختبرية، الصلاحيات محدودة جدا للجهة المنفذ، عدم وجود محازن نظامية في موقع حيث يتم تخزين المعدات في الحاويات في العراء، الظروف الجوية السيئة في موقع العمل كونه يقع في منطقة صحراوية، عدم حسم موضوع استهلاك الأراضي التي يمر بها الانابيب، تأخر بعض المناقصات على الاحالة، عدم توفر عمالة وفتيين.		32.14	67.9	100	1	1	البصرة / تطوير حقل بين عصر					
	تأخر نتائج الفحوصات المختبرية، الصلاحيات محدودة لجهة المنفذة. عدم حسم موضوع استهلاك الأراضي التي تمر بها الانابيب، تأخر بعض المناقصات على الاحالة		27.07	72.9	100	8	1						
	تأخر نتائج الفحص، الصلاحيات محدودة جدا للجهة المنفذة، عدم وجود محازن نظامية، الظروف الجوية السيئة في موقع العمل، تأخر بعض المناقصات على الاحالة		23.81	76.2	100	12	1						
لم يتم ذكر نسب الاجاز في تقرير الفريق	الاجزاءات الازارية الروتينية المعقدة، تأخر طلبات بعض المواد الاستيرادية وعدم وصولها في الوقت المناسب، التأخر الحاصل في المسح البيئي لمسارات انابيب الجريان نتيجة قلة امكانيات قسم البيئة في الشركة وكثرة المعوقات غير المتوقعة، الظروف البيئية القاسية في المشروع التي تمتد بارتفاع درجات الحرارة					2	1	البصرة / تطوير حقل طوية					
	تأخر وصول بعض المواد الاستيرادية وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، الظروف الجوية السيئة في موقع العمل كونه يقع في منطقة صحراوية مقلوحة مما يؤدي الى توقف اعمال اللحام، تأخر نتائج الفحوصات المختبرية		11	89	100	11	1	ذي قار / تطوير حقل الناصرية					
	التأخر في احالة العقود بسبب تأخر اطلاق الصرف للتخصيصات المالية، ضعف كفاءة الشركات المقاولية في تنفيذ العقود لات عدم اطلاق الموازنة الاستثمارية المالية الاحادية، تلف بعض المقاولين المنفيين		8	85	93	11	1	البصرة / حقل ارطواي					
	الظروف الجوية، وعدم وجود معدات كافية لدى الشركة، قلة الكوادر العاملة في المشروع كون المشروع يتنفذ عن طريق التنفيذ المباشر، عزوف المقاولين عن التقديم على اغلب المناقصات ذات الخصوصية بالتنفيذ الفني		20.81	79.2	100	12	1						
	تأخر اقرار الموازنة لعام 2014، قلة الكوادر الفنية العاملة مقارنة بحجم العمل في المشروع، الظروف البيئية القاسية في المشروع التي تمتد بارتفاع درجات الحرارة		7	63	70	10	1	البصرة / حقل اللجيس					

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لمواقع متعددة المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمورقات	نسب الاجاز على مستوى			تاريخ الزيادة	تسليم الزيادة	المحافظة	القيمة مليون دينار	سنة اذراج المشروع	الجهة المنقذة	اسم المشروع	التبويب	ت				
		نسبة الاجاز المادي	المنفذ	المخطط													
	الاجراءات الروتينية المعقدة ، تتلك الشركات المجهزة في تنفيذ التراخيص التعاقدية . سو الاحوال الجوية		16		2	1	محافظة كربلاء										
	الاجراءات الروتينية المعقدة . تتلك الشركات المجهزة في تنفيذ التراخيص التعاقدية . سو الاحوال الجوية	29	41	70	5	1											
	عدم اقرار الموازنة المالية لعام 2014 ، تتلك شركة القار العامة لحد كبير في تنفيذ المرحلة الاولى المتمثلة باعمال التسوية الترابية وانشاء السباح الخارجي ، هناك مشكلة مع دائرة عقارات النوبة الرئيسية في بغداد التي لحد الان تعطلت في اجراءات تحويل ملكية المشروع					9	1			25443.5	2012	وزارة النفط	زيادة طاقة تخزين الغاز المسائل لموقفي / كربلاء و السملوة جديد (شركة تعبئة الغاز)	12	4	6	4
	مكتبي	70	15	85	4	1	محافظة السملوة										
	تتلك الشركات العامة للمعدات الهندسية الثقيلة	0	20	20	11	1											
	عدم تواجد الكادر الهندسي لشركة المقاوله وبالاخص مدير المشروع بصوره مستمرة قلة الكادر الفنية المختصة ، عدم توفر الطاقة الكهربائية و اعتماد المصفي على مولدات عدد 3 بطاقة 2/ مجاواط	26	74	100	3	1	مصفي النوبانية										
	قلة كوادر ، عدم توفير الطاقة الكهربائية واعتماد على المولدات الكهربائية ،	2	98	100	9	1											
	لم يتم ذكر نسب الاجاز من قبل فريق الزيادة في التقرير الزيادة المددانية				3	1	مصفي الجف	847381	2009	وزارة النفط	وحدة تطوير المرافق الصناعية والمصافي الخارجية (شركة مصافي الوسط)	18	1	6	5		
	عدم وجود رؤية واضحة بخصوص الاستمرار بتنفيذ وحدة تحسين البنزين على رخص من اميتها للمصفي ، لم تتم الاجابة على استفسارات الواردة في تقريرنا السابقة بخصوص موقف وحدة تحسين البنزين																
	تتلك الشركة المنقذة للاصلح الكهربائية ، اجراءات العمل تكون اصعب بسبب رفع الشبكه الكهربائية القديمة و شبكه الانابيب ، تاخر اطلاق السلقة التشغيلية لشركة القار	20	50	70	12	1											
	تتلك الشركة العامة للتصميم والاستشارات الصناعية في تنفيذ المشروع انشاء الخزانات ، الغاء التعاقد على مشروع انشاء وحدة تحسين البنزين في المصفي ، تاخير في اجالة منظومة الاطفاء ، عدم توفي				8	1	مصفي السملوة										

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لمتابعة المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل و المواقف	نسب الاجزاء على مستوى الفقرات			تاريخ الزيارة	تسلسل الزيارة	المحافظة	التكلفة مليون دينار	سنة الراج المشروع	الجهة المفضلة	اسم المشروع	التبويب	ت		
		نسبة الاحتراف المادي	المنفذ	المخطط											
	عدم احالة المشروع على شركات تخصصية رصينة	45	55	100	5	1	البصرة / تطوير مصفى الدهون								
	تكون شركة تعبير البصرة للمقاولات المحدودة عن تنفيذ العقد مما ادى الى توقف العمل	1	97	98	8	1	البصرة / تطوير المرافق الخدمية								
	تاخر قرار الموازنة الاستثمارية لعام 2014 مما ادى الى تاخر صرف مستحقات الشركات المتعاقدة , ظهور مشاكل في السطح العلوي لقواعد الخزانات	4	84	88	10	1	تطوير الطاقات الخزينية تطوير مصفى البصرة من حيث الانتاج والمواسمات والسلامة الادارية	222420	2003	وزارة النفط	تطوير مصفى البصرة	2	1	6	8
	مكتبي				12	1									
	عدم وجود خطة كاملة و واضحة للهوض و تطوير جميع مرافق المصفى , العواصف الرملية و المناخ السوى كون المصفى يقع في منطقة صحراوية , عدم وجود ممثل من مصفى ميسان في اللجان المشغلة من قبل الهيئة القنية	50	35	85	5	1	البصرة / انشاء وحدة البصرة FCC في مصفى البصرة								
					12	1									
	مكتبي				8	1	ذي قار / تطوير مصفى ذي قار	942490	2002	وزارة النفط	تطوير المصافي الجنوبية وتوسيع مصفى ميسان الحالي	3	1	6	9
	تكون شركة العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن تنفيذ العقد باسباب تعود الى مشاكل ادارية داخل الشركة المقولية	35	65	100	8	1	البصرة/ انشاء وحدة الغاز الجديدة								
	التغييرات الكبيرة في المدد الزمنية لتنفيذ المشروع	0	100	100	10	1	البصرة/ تغليف وصيغ الخزان مصفى البصرة								

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لمواقع متعددة المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمواقف	نسب الانجاز على مستوى الفقرات			تاريخ الزيارة	تسلسل الزيارة	المحافظة	التكلفة مليون دينار	سنة الراج المشروع	الجهة المنقطة	اسم المشروع	التبويب			ت
		نسبة الانجاز المادي	المنفذ	المخطط								1	2	3	
نسبة الانجاز لعام 2013	اسلوب الدعوة لمتاقصات القراء و تنفيذ الاعمال كونها تتم باسلوب الدعوة العامة وليست المباشرة ، تاخر الاعمال المحالة على شركة زبير الاسد للمقاولات	50	50	100	6	1	محافظة كركوك/ نطف الرطب في جمبور الشمالي	358340	2004	وزارة النطف	تطوير الحقول لشركة نطف الشمال	6	1	1	10
نسبة الانجاز لعام 2013	تلكر المجهزين في تنفيذ اعمال التجهيز للمعدات و الاجهزة ، تاخر في تصديق الوثائق وصحة الصور ،	7.17	42.8	50	6	1	بغداد	6585	2012	وزارة النطف	تطوير صناعة الخزانات والوانعية الضخفية	13	4	9	11
نسبة الانجاز لعام 2013	الوضع الامني وصعوبة دخول الشركات و وصول المواد ، تاخر وصول المواد الاستيرادية	70	17	87	6	1	بغداد								
	قلة تخصيصات المالية مقارنة مع حجم العمل المطلوب ، والتاخر في وصول الاجهزة والمعدات الاستيرادية الى موقع المشروع بسبب تغير في النطف الحدودي منمنفذ طربيل الى ميناء ام قصر بسبب الوضع الامني	51	36	87	12	1		187017	2010	وزارة النطف	تطوير وحدات مصفى النورة	21	1	6	12
	وجود عدة نواقص تظهر عند استلام الاعمال المنقطة ويبطئ انتهاء مدة العقد				6	1	بغداد								
								242000	2001	وزارة النطف	زيادة طاقات حزن المنتجات البيضاء وتطوير المستودعات ومحطات الضخ (شركة خطوط الانابيب	4	4	6	13
					12	1	واسط								

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل و المواقف	تاريخ الزيارة	تتضمن الزيارة	نسبة انجاز المشروع الكلية			المحافظة	المصرفوف التراكمي	التكلفة مليون دينار	سنة ادراج المشروع	الجهة المتقنة	اسم المشروع	التبويب	ت		
				الاجراف	مفتق	مخطط										
	قائمة الكوادر الفنية في مجال التخطيط و الدراسات حيث يختصر العمل فقط بصورة رئيسية على رئيس قسم التخطيط , لا توجد اي خطة و اضافة و مرسومة لدى محافظة فيما يخص مشاريع انعاش الاهوار , يطبق في التنفيذ لعدم وجود شركات رصينة , عدم وجود تنسيق ما بين الجهات ذات العلاقة بخصوص تنفيذ مشاريع انعاش الاهوار , عدم حصول موافقة شركة سكر ميسان على مرور خط نقل 33 كي في من خلال المرزعة						ميسان				محافظة ميسان	استحداث مفتق 33 كي في من محطة العمارة الجديدة الى ناحية العنل في اهوار محافظة ميسان / برنامج انعاش الاهوار	71	3	10	1
	يطبق تنفيذ بسبب تعارض مسارات المقننات مع المناطق السكنية , عدم وجود تنسيق ما بين الجهات ذات العلاقة بخصوص تنفيذ مشاريع الاهوار	9	1	5	60	65										
	قائمة الكوادر الفنية في مجال التخطيط و الدراسات حيث يختصر العمل فقط بصورة رئيسية على رئيس قسم التخطيط , لا توجد اي خطة و اضافة و مرسومة لدى محافظة فيما يخص مشاريع انعاش الاهوار , يطبق في التنفيذ لعدم وجود شركات رصينة , عدم وجود تنسيق ما بين الجهات ذات العلاقة بخصوص تنفيذ مشاريع انعاش الاهوار ,	1	1	40	60	100	ميسان				محافظة ميسان	انشاء شبكة كهرباء لقرى اهوار محافظة ميسان و تاهيل المتضرر منها / برنامج انعاش الاهوار	70	3	10	2
	يطبق تنفيذ بسبب تعارض مسارات المقننات مع المناطق السكنية , عدم وجود تنسيق ما بين الجهات ذات العلاقة بخصوص تنفيذ مشاريع الاهوار	9	1													

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمورقات	تاريخ الزيارة	تتسلسل الزيارة	نسبة إنجاز المشروع الكلية		المحافظة	المصروف التراكمي	التكلفة مليون دينار	سنة ادراج المشروع	الجهة المنظمة	اسم المشروع	التبويب	ت			
				الإحراف	منفذ											
لم يتم ذكر اسباب التلغو في التقرير من قبل فريق الزيارة	لا توجد مشاكل	1	1	10.1	80.8	90.9										
	تاخر اطلاق موازنة لعام 2014 الذي أدى الى تاخر الجاز بعض فقرات المشروع و الزيادة المستحقات المالية لشركة الصينية , عدم تجهيز مضخات الخاصة بخط نقل النفط الخام من حقل الإحلب مما يسبب مشاكل لوجستية بعدم إمكانية تشغيل الوحدة الجديدة , عدم تنفيذ خط نقل الغاز من حقل بيرة , عدم تنفيذ خطوط نقل الطاقة 400 ك.ف عدد 21 المرحلة الثانية , قلة الكوادر الهندسية المتخصصة , تعيين كوادر فنية وادارية تعمل بصفة عقول وواجور يومية بعدد يقارب 900 موظف مما يسبب عرقلة في عمل وانجاز الوحدات التوليدية	6	1	1.71	94.2	95.9	واسط	2516	2757000	1999	وزارة الكهرباء	محطة كهرباء واسط البخارية (المطوية العامة لمشروع انتاج الطاقة الكهربائية)	7	1	10	3
	تاخر اطلاق الموازنة الإستثمارية , عدم تنفيذ خط نقل الغاز من حقل بيرة , قلة الكوادر في الموقع	10	1	2.84	95	97.8										
	لم يتم اعداد خطة عام 2014 لغاية الآن مما قد يؤثر على توقيتات تنفيذ المشاريع الخاصة بالمحافظة	2	1	3	36	39	البصرة				محافظة البصرة	تحسين وتطوير شبكة كهرباء اهورا قضاء المدينة في محافظة البصرة/برنامج اعاش الأهورا (محافظة البصرة)	59	3	10	4

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمواقف	تاريخ الزيارة	تسلسل الزيارة	نسبة إنجاز المشروع الكلية			المحافظة	المصروف التراكمي	القيمة مليون دينار	سنة اذراج المشروع	الجهة المتفذة	اسم المشروع	التبويب			ت
				الإحراف	متفق	مخطط							التبويب	التبويب	التبويب	
		4	1				الاقاسية				محافظة الاقاسية	تنفيذ الشبكات الكهربائية لمختلف الأضية و التواحي في محافظة الاقاسية	40	3	10	10
		4	1				الاقاسية				محافظة الاقاسية	تاهيل الشبكة الكهربائية لحي الضباط و الزراعين في البوالتية	49	3	10	11
	قلة ساعات العمل للكان الروسي وتمتع تلك الكوار بالاهل في العراق و روسيا وخلال تلك المدة لايسمحون للمقاولين الثانويين بالعمل بدون وجود المشرفين ، ولم وجود الحنية من قبل الشركة الروسية في حل المشاكل الفنية التي تظهر أثناء تنفيذ العمل مما سبب توقف بعض الاصل ، تاخر الشركة الروسية في دفع مستحقات المقاولين الثانويين العاملين معها مما سبب تاخر في تنفيذ المشروع ، تاخر في تجهيز المواد والمعدات الخاصة .	4	1	55	45	100	البصرة	183.7	234140.88	2003	وزارة الكهرباء	اصلاح محطات التوليد الحرارية / تاهيل الوحدات 3.2 لمحطة كهرباء الهارثة	1	6	10	12
	عدم وجود الحنية من قبل شركة الروسية في انجاز كافة الفقرات المشروحة وضمن العدد التعاقدية بالرغم من المساعدة الكبيرة المقدمة من قبل ادارة المشروع ، التاخر في تجهيز المواد والمعدات الخاصة بالمشروع	9	1	37.6	62.4	100					محافظة النجف	تاهيل شبكة كهرباء منطقة ام النواصر في العباسية	54	3	10	13
	مكتبي	4	1	0	10	10	النجف									

جدول القطاع الصناعي لعيبة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمورقات	تاريخ الزيارة	تتضمن الزيارة	نسبة اجزاء المشروع الكلية		المحافظة	المصرف	التراكمي	القيمة مليون دينار	سنة الدراج المشروع	الجهة المتقدمة	اسم المشروع	التوبيخ		ت	
				الاحراف	منفذ								مخطط	التوبيخ		ت
	لا توجد	4	1	7	30	ذقي قار					محافظة ذقي قار	كهربية وتحسين قري في ناحية القهود في محافظة ذقي قار / برنامج انعاش الاوار	68	3	10	14
	تلك الشركات المقولة المنفذة للمشروع , قلة التخصيصات المالية المرصودة للمشروع	4	1	0	93	بغداد	100372	750000	2007	2007	وزارة الكهرباء	تغيير الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في الكرخ/ بغداد (المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ)	28	3	10	15
	قلة الكوادر الفنية . صعوبة الحصول على قطع اراضي لغرض انشاء المحطات الثانوية	4	1	20	80	بغداد	53698378	28578	2008	2008	وزارة الكهرباء	محطات التوزيع وشبكات الايصال في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصخر / برنامج سنوي (المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصخر)	11	2	10	16
نسبة الانجاز لغاية 31/12/2013																
		5	1									تجهيز ونصب وتأهيل الشبكات الكهربائية ومغنيات (1 اكي في) في عدد من اقصية ترواجي في محافظة ميسان	73	3	10	17
	تلك بعض المقاولين في تنفيذ ضمن المشروع , تقع اغلب فقرات المشروع في مناطق زراعية	12	1			ميسان					محافظة ميسان	تجهيز وتحسين شبكات وايصال الشبكة الكهربائية لاربعة عشر قرية في اوار محافظة ميسان / برنامج	36	3	10	18
		5	1			ميسان										

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمعوقات	تاريخ الزيارة	تشميل الزيارة	نسبة إنجاز المشروع الكلية		المحافطة	المصرف	التراكمي	الكلية مليون دينار	سنة ادراج المشروع	الجهة المتفذة	اسم المشروع	التوبيخ		ت	
				الإحراف	مخطط								التوبيخ	ت		
	تاخر اطلاق الموازنة لعام 2014 مما اثر سلبا على فتح الاعمال والاطلاق المسبق الى الشركات المنفذة ,	5	1	0	0	التخف الاشراف					العتبة العلوية	كهرباء الصحن العلوي الشريف	77	3	10	19
	لا توجد مشاكل	5	1		83	الكربلاء المقسمة					العتبة العباسية	تبريد اجزاء الصحن العباسي / العتبة العباسية	74	3	10	20
	تاخر اطلاق الموازنة لعام 2014 مما اثر سلبا على تقدم العمل في مشاريع العتبة الحسينية	5	1	0	0	الكربلاء المقسمة					العتبة الحسينية	تجهيز ونصب وتشييد وتأهيل المنظومة الكهربائية للآجرة الحديدية للعتبة الحسينية	75	3	10	21
	تاخر اطلاق الموازنة لعام 2014 مما اثر سلبا على تقدم العمل في مشاريع العتبة الحسينية	5	1	5	95	الكربلاء المقسمة					العتبة الحسينية	تطوير وتحديث المنظومة الكهربائية للعتبة الحسينية المقسمة / المرحلة الثانية	79	3	10	22
	لا توجد مشاكل	5	1		30	الكربلاء المقسمة					العتبة العباسية	مد قابليات محطة الدرمين الكهربائية العباسية المقسمة	78	3	10	23

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمعوقات	تاريخ الزيارة	تتضمن الزيارة	نسبة إنجاز المشروع الكلية			المحافظة	المصروف التراكمي	التكلفة مليون دينار	سنة اذراج المشروع	الجهة المتقنة	اسم المشروع	التوبيخ	ت		
				الإحراف	مخطط	مخطط										
	قلة التخصيصات المالية , انخفاض منسوب مياه تهر القرات	5	1	18	82	100										
	قلة التخصيصات المالية , اوجود كميات من الماء مع النقط الخام	10	1	20	80	100	بابل	54228	60954.8	2004	وزارة الكهرباء	تأهيل محطات التوليد البخارية المسبب (المحترية العامة لانتاج الطاقة الكهربائية / القرات الاوسط)	9	6	10	24
	وجود تجاوزات على مسار قبة المشروع , طبيعة الارض التي يتقف فيها المشروع كونها ارض زراعية , مشاكل استملاكات الاراضي	5	1	43	57	80	القاسية				محافظة القاسية	تنفيذ شبكة كهرباء هي الصكبان و انازة جزء من هي الجهاز والجيدة في البعير	45	3	10	25
	وجود تجاوزات على مسار قبة المشروع , طبيعة الارض التي يتقف فيها المشروع كونها ارض زراعية , مشاكل استملاكات الاراضي , عد البت يامر الغير الخاص بالمشروع من قبل المحافظة والذي بخلافه لا يمكن الاستمرار بالعمل قبة	5	1	20	60	80	القاسية				محافظة القاسية	تنفيذ ومد شبكات مغذي 11 كي في في مناطق مختلفة في عماس والسدير في محافظة القاسية	41	3	10	26
	لا توجد مشاكل	5	1	0	100	100	القاسية				محافظة القاسية	تنفيذ مصطلر محطة كهرباء الامكان من محطة كهرباء شرق الدوابية بهينة قابلو	42	3	10	27
	لا توجد مشاكل	5	1	0	100	100	البصرة				محافظة البصرة	تجهيز وتنفيذ مقنيات 11ك ف في ناحية النقر في محافظة البصرة / برنامج انعاش الاهور	62	3	10	28

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمعوقات	تاريخ الزيارة	تشميل الزيارة	نسبة إنجاز المشروع الكلية			المحافظة	المصرف التركمي	التكلفة مليون دينار	سنة ادراج المشروع	الجهة المتفائة	اسم المشروع	التوبيخ		ت	
				الإحراف	متفق	مخطط										
نسبة الإجاز لعام 2013	كثرة التجاوزات على الشبكة الوطنية، الإجراءات الروتينية المتتمة بصعوبة استحصال اجازة الحفر من امانة بغداد، قلة التخصيصات المالية	6	1	42.63	57.4	100	بغداد	267432	744500	2007	وزارة الكهرباء	تحويل الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في الرصافة/ بغداد (المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ)	27	3	10	29
نسبة الإجاز لعام 2013	تلكر من قبل الشركات العقولة المنفذة، قلة التخصيصات المالية المرصودة	6	1	7	93	100	بغداد	285334	104613	2004	وزارة الكهرباء	محطات التوزيع وشبكات الأيصال في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ / برنامج سنوي (المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ)	10	2	10	30
نسبة الإجاز لعام 2013	تاخر الشركة المنفذة في إنجاز الاعمال	8	1	9	91	100	محافظة ذي قار				محافظة ذي قار	تاهيل وتحسين وايصال الشبكة الكهربائية لسبعة قرى في محافظات ذي قار	38	3	10	31
	تاخر الشركة المنفذة بإنجاز الاعمال	12	1	7	92	100	محافظة ذي قار				محافظة ذي قار	تاهيل وتحسين وايصال الشبكة الكهربائية لسبعة قرى في محافظات ذي قار	38	3	10	31
	عدم اقرار الموازنة بسبب ارباك كبير في تنفيذ فقرات المشروع	8	1				محافظة القادسية				محافظة القادسية	تاهيل مغذيات في مناطق عديدة في محافظة النواحية	51	3	10	32
	لا توجد مشاكل	8	1	0	100	100	محافظة القادسية				محافظة القادسية	تنفيذ الشبكة الكهربائية لقرية آل بريس الثانية في ناحية السدير	47	3	10	33
	لا توجد مشاكل	8	1	25	75	100	محافظة النجف				محافظة النجف	تجهيز مواد تاهيل وفتح مغذيات لكهرباء النجف	52	3	10	34
	لا توجد مشاكل	12	1	5	95	100	محافظة النجف				محافظة النجف	تجهيز مواد تاهيل وفتح مغذيات لكهرباء النجف	52	3	10	34

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمورقات	تاريخ الزيارة	تتسلم الزيارة	نسبة إنجاز المشروع الحالية		المحافظة	المصرف التركمي	التكلفة مليون دينار	سنة ابراج المشروع	الجهة المنفذة	اسم المشروع	التوبيخ		ت	
				الاحراف	منفذ							مخطط	مخطط		
	لا توجد مشاكل	8	1	0	100	100				محافظة البصرة	تحسين وتطوير كهرباء احوار الدواي في محافظة البصرة	55	3	10	35
	لا توجد مشاكل	8	1	0	100	100				محافظة البصرة	تحسين وتطوير كهرباء احوار المسحب في الهارثة في محافظة البصرة	56	3	10	36
	تأخر في استحصال الموافقات الاصولية من امانة بغداد باستلام الارضي، وضعف تنفيذ المقاولين المحليين وتكول البيض منهم، تجاوز الاهلي على بعض مواقع المشروع	8	1	5	90	95				وزارة الكهرباء	محطات التوزيع وشبكات الايصال في الرصافة / برنامج سنوي (المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة)	1	2	10	37
	قلة التخصيصات المرصدة للمشروع مع تاخير اقرار الموازنة لاستئجار لعام 2014، وجود تجاوزات على الاراضي المخصصة لإنشاء النجاة السيطرة المركزية	8	1	15	70	85				وزارة الكهرباء	تشبيذ مراكز السيطرة في بغداد- المديرية العامة لتوزيع كهرباء المصدر (المديرية العامة لتوزيع كهرباء المصدر)	31	3	10	38
	تأخر في المصفاة على المناقصات	9	1		13					محافظة ميسان	انشاء محطات كهرباء تحويلة (1/33)كي في / في ناحية احمد الرفاعي وناحية الخير	76	3	10	39

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمواقف	تاريخ الزيارة	تتمثل الزيارة	نسبة إنجاز المشروع الكلية			المحافظة	المصرف التراكمي	الكلفة مليون دينار	سنة ابراج المشروع	الجهة المتقنة	اسم المشروع	التبويب		ت	
				الاحراف	مخطط	100							التبويب	ت		
	لا توجد	9	1	10	90	100	النجف				محافظة النجف	تاهل شبكة كهرباء لحي الصدر الثالث في العوقة	54	3	10	40
	صعوبة العمل بسبب حركة الزلزالين , زحمة المكان بسبب عدد الاجهزة (جرات , باضات , انابيب نقل الماء)	9	1	5	70	75	كربلاء				العتبة الحسينية	الاتصال التكميلية للتكيف المركز الجديد للعتبة الحسينية المقدسة (المرحلة الثانية)	72	3	10	41
	تأخر اقرار الموازنة , تتكف الشركات المقاولنة	9	1	26.4	48.6	75	بغداد	51876	14150	2004	وزارة الكهرباء	كهرباء الاحياء السكنية الجديدة في الكرخ	9	3	10	42
	اعراض الاهالي مسر الخطوط بوزن سلبيا على سير العمل	10	1	1	99	100	البيصرة				محافظة البيصرة	تحسين وتطوير شبكة كهرباء احوار (النصر, الشريفة الوسيطة) في محافظة البصرة/برنامج التعاون الاهوار	57	3	10	43
	منجز	10	1				البيصرة				محافظة البيصرة	تعمير وصيانة محطات الشبكة الكهربائية ثلاث عشر قرية في احوار محافظة البيصرة / برنامج	37	3	10	44

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمعوقات	تاريخ الزيارة	تستكمل الزيارة	نسبة إنجاز المشروع الكلية			المحافظة	المصرف التراكمي	التكلفة مليون دينار	سنة ادراج المشروع	الجهة المتفائة	اسم المشروع	التوزيع			
				الإحراف	منفذ	مخطط							ت	ت	ت	
	تأخر اقرار الموازنة الاستثمارية, وتأخر وصول المواد الاستيرادية في مواجدها المحددة	10	1	18.78	76.2	95	بغداد	10299	13583	2007	وزارة الكهرباء	تشبيبه مراكز السيطرة في الرصافة (المطرية العامة) لتوزيع كهرباء الرصافة)	20	3	10	45
		10	1	0	0	0	بغداد	6.65E+09	310500	2008	وزارة الكهرباء	تطوير وتاهيل وتوسيع المحطات والمعامل والورش والابنية	32	3	10	46
	الإجراءات الروتينية في فتح وتفعيل الاعتمادات, الاوضاع الامنية المتردية في موقع العمل, قلة التخصيصات المالية وتأخر اطلاق الدفعات المالية	9	1	18	67	85	بغداد	47406	50500	2005	وزارة الكهرباء	تطوير وتاهيل وتوسيع المحطات والمعامل والورش والابنية	9	4	10	47

جدول القطاع الصناعي لقيمة المشاريع لمواقع متعددة المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل و المعوقات	نسب الاجراء على مستوى القترات			تاريخ الزيارة	تتمثل الزيارة	المحافظة	المصرف التراحي	الكلفة مليون دينار	سنة ادرج المشروع	الجهة المتقاة	اسم المشروع	التوبيخ	ت		
		نسبة الاجراء المادي	المنفذ	المخطط												
عام 2013	التاخر في تجهيز المواد اللازمة لتنفيذ المشروع من قبل المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب , قدم الشبكات توزيع الطاقة الكهربائية في محافظة ميسان و التوسيع السكني الكبير فيها , قلة الكادر الفني و الهندسي ادى المديرية العامة لتوزيع كهرباء ميسان	32	68	100	1	1	ميسان									
	تاخر اقرار الموازنة لعام 2014 مما ادى الى تاخر بعض القترات , قلة التخصيصات المالية , قلة الكوادر الفنية	40	50	90	10	1										
لم يتم ادرج في الايجاز في التقرير من قبل فريق الزيارة	قلة الكوادر الفنية في المديرية مقارنة بجمم الاصل الواجب تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية , قلة الابيات التخصيصية مقارنة بالحاجة الفعلية للمديرية , الاجراءات الادارية و القانونية و الحسابية الروتينية المتبعة تؤدي الى تاخر في اجاز المشاريع و تاجيل تنفيذ قسم اجر				1	1	ذي قار	339102346	232226	1990	وزارة الكهرباء	توسيع و تطوير شبكات التوزيع في المحافظات الجنوبية / برنامج سولي / المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب)	3	3	10	1
	تاخر نتائج الفحوصات المختبرية , الصلاحيات محدودة جدا للجهة المنفذ , عدم وجود مخازن نظامية في موقع حيث يتم خزن المعونات في الحاويات في العراق , الظروف الجوية السيئة في موقع العمل كونه يقع في منطقة صحراوية , عدم حسم موضوع استملاك الاراضي التي يمر بها الاتابيب , تاخر بعض المناقصات على الاحالة , عدم توفر عمالة و قنين .	32.14	67.9	100	1	1	البحريرة									
	قلة التخصيصات المالية و التي لا تتناسب مع حجم العمل , قلة الكوادر الفنية المتخصصة , قلة الابيات المتخصصة	40	35	75	8	1										
	قلة الكوادر الفنية مقارنة بجمم الاصل الواجب تنفيذها				8		المتقى									

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع المتعددة المشمولة بالمناظرة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل و المورقات	نسب الاجاز على مستوى الفقرات			تاريخ الزيارة	تسلسل الزيارة	المحافظة	المصرف التراكمي	التكلفة مليون دينار	سنة اذراج المشروع	الجهة المنفذة	اسم المشروع	التوبيخ			
		نسبة الاجازات المادي	المنفذ	المخطط									ت	ت	ت	
لم يتم اذراج نسب الاجاز في التقرير من قبل فريق الزيارة	وجود حفريات كبيرة في الشارع المؤدي الى المركز بسبب انشاء خطوط تصريف المياه الثقيلة ، عدم المتابعة بانتيت و نصب المعدات اذراية لان				1	1	ذي قار									
		5	95	100	11	1										
نسب الاجاز لعام 2013	وجود كتل كونكريتية امام موقع البناء تعيق عملية تنفيذ الحذر الامامي ومد قنبلو 11 كي في ، تكثف مديرية في معالجة انسداد و طمخ مياه المجاري لموقع المشروع	10	90	100	3	1	ميسان	29805908	5400	2007	وزارة الكورباء	تشبيد مراكز السيطرة في المحافظات الجنوبية (المديرية العامة لتوزيع كورباء الجنوب)	23	3	10	2
	التاخر في اصدار الترخيف الواجبه الامامية بسبب قرار مجلس محافظة ميسان بايقاف الترخيف بالاكوبريد اذراية الى عدم استلام البناء	3	97	100	9	1										
	لا توجد مشاكل ولا نسب اجاز				3	1	البصرة									
	تلك الشركة المنفذة ، عدم اكتمال جميع التفاصيل الخاصة بتصميم البناء ، قلة الكوادر الهندسية في المديرية لتوزيع كورباء الفنى	47	53	100	11	1	المتى									

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمعوقات	نسب الأجزاء على مستوى الفقرات			تاريخ الزيارة	تسلسل الزيارة	المحافظة	المصرف التراكمي	الكلفة مليون دينار	سنة ادراج المشروع	الجهة المتفذة	اسم المشروع	التبويب	ت	
		نسبة الأجزاء الملمة	المنفذ	المخطط											
لم يتم ادراج نسب الأجزاء في التقرير من قبل فريق الزيارة	الإجراءات الروتينية الخاصة باستكمال المواقف الاصولية ب (فتح الاعتماد , اعلان و احالة المناقصات , صرف المبالغ المخصصة) اثر سلبيا في تنفيذ الاعمال , الحالة الأمنية في المحافظة و كثرة العطل الرسمية و المناسبات الدينية ادى توقف المستمر للمشروع				1	1	القاسمية /محطة الديوانية الغازية								
	الإحتراف في اعمال التصيب بسبب وجود اعمال اضافية تتمثل باعمال الركاز الخرسانية ولهذا تم توقيع ملحق عقد , الوضع الأمني الاخير مما ادى الى سفر العمال كادر الشركة المقاول , العطل الرسمية و المناسبات الدينية ادى الى توقف مستمرة	25.8	54.2	80	8	1									
	ممتعة دائرة المصب العام انشاء ماخذ الماء قرب تنوع المحدد لإنشاء المآخذ و عليه يجب انتظار رأي دائرة المصب العام بخصوص الموضوع , عدم تخطيط الطريق الرئيسي المؤدي الى موقع المحطة	7.6	50.2	57.8	2	1	البصرة / محطة شط البصرة								
	على رغم من العمل يتفقد من قبل شركات متخصصة و الموقع ايعاني من صعوبات أمنية بالإضافة الى قربه من الموانئ , عدم وجود خطة وقائية واضحة , تأخر الاجراءات الخاصة بتخليص المعدات من الموانئ,	21.6	58.3	79.9	8	1									
	الاجراءات الروتينية الخاصة باستكمال المواقف الاصولية , عدم مطابقة مواصفات التربة لموقع المشروع مع تصاميم الأولية المعدة للمحطة مما ادى الى حصول الانحراف في نسب الاجزاء	5.3	94.7	100	2	1	كربلاء / محطة الخيرات								
	قلة المواد الاحتياطية اللازمة لاعمال الصيانة الموزي	5	95	100	5	1									
	منجز	0	100	100	9	1									
								8488253	1556774	2009	وزارة الكهرباء	محطات غازية جديدة (المديرية العامة للمشاريع لإنتاج الغازية)	10	1	10
														3	

جدول القطاع الصناعي لجمعية المشاريع المتعددة المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل و الموقفات	نسب الاجزاء على مستوى القدرات			تاريخ الزيادة	تسلسل الزيادة	المحافظة	المصرف التراكمي	الكثافة مليون دينار	سنة الدراج المشروع	الجهة المنظمة	اسم المشروع	التوبيخ		ت		
		نسبة الاحراف المالي	المنتج	المخطط									1	2			
	تاخر اطلاق الصرف التخصيصات, انخفاض ضغط الغاز المجهز الى محطة السموذ الغازية, سوء مواصفات الوقود المجهز حيث تعمل المحطة على نوعين من الوقود الثقيل, وزيادة نسب الاطيان عند ماطف المياه بسبب عدم الكري, زيادة نسبة الاملاح في مياه التهر وزيادة العسرة بسبب انسداد انابيب التبريد		25	75	100	3	1	محافظة ذي قار / الناصرية الغازية	8488253	15556774	2009	وزارة الكهرباء	محطات غازية جديدة (المدرية العامة لمشاريع الانتاج الغازية)	10	1	10	3
	تلك شركة B.G.R في تنفيذ اعمال تنصيب المحطة بالاضافة الى تاخر الشركة العامة للتصاميم وتنفيذ المشاريع في انشاء المسقفات الخزنية عدد6 التابعة للمحطة		40	10	50	11	1	ميسان / توسيع محطة بزركان الغازية									
	وجود الغازات الحامضية بنسبة عالية في الغاز المرزح تجهيزه للمحطة مما يؤدي الى تلف الكاسبات وتقليل كفاءتها		8	92	100	3	1	ميسان / توسيع محطة بزركان الغازية									
	صعوبة الاجراءات الحالية الخاصة بفتح الاعتماد ببدية العقد اثرت سلبا على نسب الاجاز, رفض شركة سيمنس المجهز الرئيسي للمعدات التعامل مع الشركة الايرانية المنقذة لتنصيب, تاخر في تجهيز المعدات التصميمية للمعدات الرئيسية من قبل شركة سيمنس تاخر الاجراءات الكمركية الخاصة بدخول المعدات.		19.6	64	83.6	4	1	بغداد/ محافظة الصدر الغازية									
	ان موقع المشروع هو ضمن منطقة منخفضة واعمال اللقن جارية لكن مواسم الامطار اثر على مراحل تقدم العمل		24.7	42.1	66.8	5	1	ميسان / محطة العصاره الغازية									
	تاخر الحاصل على استحصال الموافقات على استهلاك الارض, التاخر في اتخاذ القرار بخصوص وحدة التحلية الغاز		5.49	73	78.5	10	1	ميسان / محطة العصاره الغازية									
	ضعف في دراسة الجدوى الفنية و الاقتصادية للمشروع بالاضافة الى عدم وجود تنسيق مسبق مع وزارة النفط بخصوص توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطة. تاخر الشركة المقاوله بتنفيذ اثار اساتجها التعاقدية بموجب المخطط الزمني		10.35	89.7	100	5	1	كربلاء/ محافظة كربلاء الغازية									
	تاخر وتلك الشركات المنقذة بانجاز الاصل المكلفه بها ضمن المدد المحددة, عدم ايصال الغاز الطبيعي الى محطة الغازية.		8	92	100	9	1										

جدول القطاع الصناعي لعيثة المشاريع لمواقع متعددة المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل و المواقف	نسب الاجاز على مستوى القدرات			تاريخ الزيرة	تسلسل الزيرة	المحافظة	المصرف المصرفي	التكلفة مليون دينار	سنة اذراج المشروع	الجهة المنفذة	اسم المشروع	التوبيخ		ت
		نسبة الاجاز المادي	المنفذ	المخطط											
	تلك بعض الشركات المنفذة في اتمام بعض الاعمال في المحطة	6	94	100	5	1	بابل /محطة الحلة الغازية/2								
	تلك الشركات المنفذة في اجاز اعمل (المنبئية والكهربائية والميكانيكية)	2.5	97.5	100	10	1	بغداد / محطة القاس الغازية /3/	8488253	15556774	2009	وزارة الكهرباء	محطات غازية جديدة (المديرية العامة لمشاريع انتاج الغازية)	10	1	10
	لا توجد مشاكل	0.5	99.5	100	5	1	كركوك /محطة كركوك /1/ محطة تارة الغازية								
	لا توجد مشاكل	0.5	99.5	100	6	1									
	عدم كفاية ضغط الغاز الواصل الى المحطة ادى الى عدم استغلال الطاقات التوليدية المتاحة , والتاخير في اجاز ماخذ المياه الامر الذي اضغ الماء بصورة مباشرة الى محطة وما يحتوي على الطيان ووعالي ,	0.03	100	100	8	1	النجرة / محطة الرميثة الغازية								
	قلة الغاز الواصل للمحطة مما ادى الى عدم الاستقرار السعات الانتاجية , وتأخر اجاز ماخذ المياه بالرغم من عمل المحطة وتجهيز المحطة بالمياه عن الطريق ضخ الماء , وتأخر اجاز المحازن , صعوبة الدخول الى موقع ماخذ المياه لانه يقع ضمن حدود موقع شركة نفط الجنوب	0.3	99.7	100	12	1									
	عدم المباشرة بخط الوحد الخاص بالمحطة , عدم تحديد خط KVA 400 لتعرض نقل الطاقة الكهربائية	17.3	83.7	100	9	1	البصرة / محطة التجميع الغازية								

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع المتعددة المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمواقف	نسب الأجزاء على مستوى الفقرات			تاريخ الزيارة	تسلسل الزيارة	المحافظة	المصروف التراكمي	التكلفة مليون دينار	سنة ابراج المشروع	الجهة المتقنة	اسم المشروع	التوبيخات			
		نسبة الانحراف المالي	المنفذ	المخطط									ت	ت	ت	
لم يتم اذراج نسب الاجاز في التقرير من قبل فريق الزيارة	عدم توفير الطاقة الكهربائية اللازمة التي تلبي حاجة العمل الفنية، اشغال المتجاوزين للمناطق المخصصة للمقايح، عدم توفير المواد الضرورية للاجزاء بعض فقرات التأهيل				1	1	محافظة واسط	26012	31609	2007	وزارة الكهرباء	تشييد مراكز محطات الوسط (المديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط)	22	3	10	4
لم يتم اذراج نسب الاجاز في التقرير من قبل فريق الزيارة	عزوف الشركات المقاوله المحلية عن تقديم عروضهم للمقاولات المدنية و تضمينهم اعمال النصب و التجهيز، قلة التخصصات المرصدة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط حيث لا تغطي فقرات المشاريع الخاصة بالمديرية و الاجازات الروتينية الخاصة باستكمال المواقف الاصولية (فتح الاعمد، اعلان و احالة المقاصات				1	1	القياسية					تشبيد مراكز السيطرة في محافظات الفرات الأوسط (المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط)	19	3	10	5
	قطة التراس الفنية	75	25	100	10	1	النجف	24850	28137	2007	وزارة الكهرباء					
	تقرير مكتبي				3	1										
	المشاكل الامنية في البلد ادت الى انسحاب الشركة الكورية و تم لقاء مع الشركة بتاريخ 22/6/2014 ولم يتم التوصل الى اتفاق حول مزاولة ماكمل من جديد، لم يتم لحد لان اعطاء الصلاحيات لعزم البيئات من قبل هيئة الاعلام العراقية للمشروع بالرغم من الموافقات الاصولية من وزارة الاتصالات	40.8	38.3	79.1	8	1	بابل									
لتافية	منجز				1	1	واسط و									
31/2/2013																
	تلحق الشركات المقاوله المتقنة للمشروع قلة التخصيصات المرصودة للمشروع، تأخر في اجراءات فتح الاعمد، قلة الكوادر الفنية و الهندسية	5	95	100	4	1	بغداد	2441	10003.4	2002	وزارة الكهرباء	تطوير و تحسين شبكات النقل في المنطقة الوسطى / برنامج سنوي (المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى)	2	2	10	6

جدول القطاع الصناعي لمتابعة المشاريع المتعددة المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل و المورقات	نسب الاجاز على مستوى الفقرات			تاريخ الزيارة	تشميل الزيارة	المحافظة	المصرف التركمي	الكلفة مليون دينار	سنة اذراج المشروع	الجهة المتقعة	اسم المشروع	التوبيخات				
		نسبة الاجازات	المنفذ	المخطط									ت	ت	ت		
نسب الاجاز لغاية 31/1/2014	قلة الكوادر الهندسية ، قلة الالات التخصصية ، قلة التخصيصات المالية	20	80	100	1	1	واسط	79612	103804	2004	وزارة الكهرباء	توسيع و تطوير شبكات التوزيع في محافظات الوسط / برنامج سنوي (المديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط)	10	3	10	7	
نسبة الاجاز لغاية 31/1/2013	عدم اطلاق السلفة التشغيلية مما دفع الشركة المقولة الى المباشرة بالأعمال بدون استلام مستحقات مالية ، تاخر المواد الاستيرادية بسبب عدم فتح الاعتمادات .	30	70	100	2	1	البصرة / تاهيل محطات الانتاج الهارثة البصرة / محطة الشعبية										
							ميسان / محطة الكحلاء	10763	28025	2002	وزارة الكهرباء	تاهيل محطات انتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية / (المديرية العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية / المنطقة الجنوبية)	4	6	10	8	
	اغلب العاملين في الموقع بصفة عقود و اجور يومية ولا يمكن تسليهم مسؤوليات و الالمهم ، و يوجد كميات كبيرة من زيت الغاز استنفاد منه ويشكل خطورة على الموقع ، اجراءات الصيانه على الوحدة الثانية لم تنجز منذ دخول الوحدة الى العمل ولغاية تاريخ الزيارة	0	70	70	5	1	ميسان / محطة بزركان										
	تاخير تجهيز المواد المطلوبة و المواد الاحتياطية بسبب الاجراءات الروتينية ، قلة الكوادر التشغيلية في المحطة و حاجة المحطة الى كوادر تشغيلية جديدة التوسعات المحطة ،						البصرة / محطة حور الزبير										
عام 2014 كونه برنامج سنوي	منجز لعام 2014	0	100	100	10	1	البصرة / محطة حور الزبير / البصرة / محطة النجيبية										
منجز لعام 2014	منجز لعام 2014	0	100	100	10	1											

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لمواقع متعددة المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمواقف	نسب الاجزاء على مستوى الفقرات			تاريخ تسلسل الوزارة	المحافظة	المصرف المصرفي	الكلفة مليون دينار	سنة اذراج المشروع	الجهة المتقدمة	اسم المشروع	التوبيخات	
		نسبة الاجزاء المتكاملة	نسبة المتكامل	نسبة المتكامل									
	قبة الكوارث الفنية و المتخصصة العاملة، قبة الالبيات التخصصية اللازمة لتنفيذ الاعمال الخاصة بالمشروع	12	88	100	3	1							
	تأخر اجراءات اطلاق التخصصات المالية للمشروع قبة توفير المواد الضرورية لتنفيذ المشروع التعاون مع دوائر البلدية وصعوبة استكمال الاراضي لغرض انشاء محطات ثانوية	0	100	100	5	1		2005	وزارة الكهرباء	كهرية الريف (المديرية العامة لمشاريح التوزيع)	17 3 10 11		
	عزوف المقاولين عن تقديم الطاعات، قبة الكوارث الفنية	50	50	100	9	1							
	نسب الاجزاء لعام 2013	0	100	100	3	1							
	التأخر البدء باعمال الصيانة الى الشهر التاسع بسبب تأخر اقرار الموازنة الاستثمارية، احتياج كوارث المحطة الى اكتساب مهارات فنية تتناسب مع التطور الحاصل في تصاميم وصيانة المحطات الحرارية، تأخر تنفيذ بداية الاستعمالات الخارجية بسبب وجود بعض المشاكل الفنية في اعمال البناء	5	95	100	4	1	5981	6993	2003	وزارة الكهرباء	تاهل محطات كهرية / ابر تاج سفي (المديرية العامة لمشاريح انتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى)	6 6 10 12	
	تأخر اقرار الموازنة، تأخر استكمال المواقف الاصلية اللازمة لأغراض التعاقبية				11	1							
	قبة التخصصات المالية و التي لا تتناسب مع حجم العمل و التي حالت دون اكمال خطة مديرية شبكات المشي، قبة الكوارث الفنية و المتخصصة، قبة الالبيات التخصصية اللازمة لتنفيذ الاعمال، تأخر تجهيز المواد اللازمة الحاكمة لاجزاء اعمال المشروع، تأخر اطلاق صرف التخصصات المالية	16	84	100	4	1		3746	9227	2002	وزارة الكهرباء	تطوير وتحسين شبكات النقل والمحطات الثانوية في شبكات المنطقة الجنوبية / ابر تاج سفي (المديرية العامة اقل الطاقة الكهربائية / المنطقة الجنوبية)	5 2 10 13
	قبة التخصصات المالية و التي لا تتناسب مع حجم العمل و التي حالت دون اكمال خطة مديرية شبكات المشي، قبة الكوارث الفنية و المتخصصة، قبة الالبيات التخصصية اللازمة لتنفيذ الاعمال، تأخر تجهيز المواد اللازمة الحاكمة لاجزاء اعمال المشروع، تأخر اطلاق صرف التخصصات المالية												
	محدودية الصلاحيات مقارنة بحجم الاعمال التي تنفذ، صعوبة وضع خطط لاطفاء المبرمج، قبة الالبيات التخصصية				5	1							
	عدم صرف اي مبلغ الخطه الاستثمارية لعام 2014، قبة كوارث الفنية، قبة الالبيات التخصصية				10	1							
	صعوبة قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق و اجراء اعمال التأهيل بسبب معارضة الاهلي،	18	82	100	8	1							

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لمواقع متعددة المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل و الموقفات	نسب الانجاز على مستوى الفقرات			تاريخ الزيادة	تسلسل الزيادة	المحافظة	المصرف التركمي	التكلفة مليون دينار	سنة اذراج المشروع	الجهة المتفئة	اسم المشروع	التبويب			
		نسبة الانحراف المالي	المنفذ	المخطط									ت	ب	ج	
	عدم وجود خطة تجهيز بالوقود مستقرة للوحداتين على رغم من اشتغال المحطة منذ عام 2009	2	98	100	4	1	التجف / محطة التجف الغازية	2046063	2107092	2000	وزارة الكهرباء	الوحدات الغازية في محافظات العراق كافة	4	1	7	14
					4	1	ذي قار									
							السلموة	106124.58	126000	2007	وزارة الكهرباء	تبدال الشبكات الكهربائية لمراكز المدن في محافظات الجنوبية (المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب)	29	3	10	15
							البصرة									
	تاخر تقديم تقرير تقييم من قبل الشركة التمساوية	0.4	99.6	100	5	1	التجف / كوفة									
	صعوبة استحصال عروض مناسبة لتأهّل الوحدات المتوقعة	0.4	99.6	100	9	1										
	صعوبة تجهيز المواد الاستيرادية الخاصة بالوحدات التي لتلبية , قلة الدعم المالي للمحطة	0.3	99.7	100	5	1	بابل / الهديبة	3311	3649.8	2004	وزارة الكهرباء	تاهل محطات التوليد الكهرومائية في القران الاوسط / برناج سنوي (المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية / القران الاوسط)	11	6	10	16

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لمواقع متعددة المشمولة بالمناظرة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل و الموقفات	نسب الأجزاء على مستوى الفقرات			تاريخ الزيارة	تسلسل الزيارة	المحافظة	المصروف التراكمي	الكلفة مليون دينار	سنة ابراج المشروع	الجهة المتنفذة	اسم المشروع	التوبيخات			
		نسبة الأجزاء المطري	المنفذ	المخطط												
نسبة الأجزاء لعام 2013	لا يوجد لدى مديرية توزيع كهرباء الوسط خطة عمل متكاملة يوضح فيها نسبة الأجزاء لكل قفلة ، و سوء توزيع الكوابل الفنية العاملة في مديرية كهرباء الوسط حيث يوجد اعداد كبيرة على الملاك الدائم لم يتم الاستغلة منهم بسبب اضرارهم الكبيرة و سوء حالتهم الصحية	0	100	100	6	1	محافظة وسط		193604	2007	وزارة الكهرباء	تحويل شبكات مراكز المدن في محافظات الوسط (المديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط)	25	3	10	20
	عدم اقرار الموازنة الاحتياطية بسبب ارباك كبير في تنفيذ فقرات المشروع ، قلة الأليات التخصصية مقارنة بالحاجة الفعلية للمديرية						بابل									
	عدم اقرار الموازنة بسبب ارباك في اجراء فقرات المشروع ، قلة كوادر الفنية في المديرية ، قلة الأليات التخصصية مقارنة بالحاجة الفعلية للمديرية	25	75	100	8	1	كربلاء	93288	96870.8	2004	وزارة الكهرباء	توسيع و تطوير شبكات التوزيع في محافظات الفرات الأوسط / برنامج سنوي (المديرية العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط)	10	3	10	21
	قلة الكوابل	0	95	95	10	1	القادسية									
	انخفاض الضغط المحضف للمحطة وقيام الوحدات ، قلة المواد الاحتياطية	30	50	80	8	1	محطة الحلة الغازية									
	عدم استقرار الغاز المحضف من قبل وزارة النفط كما ان وحدات الثلاثة قديمة ، قدم خزانات الغاز عدد 2/ ، تاخر اقرار الموازنة الاحتياطية ، عدم وجود خطة عمل متكاملة لكل الفقرات ،	60	40	100	8	1	محطة النخف الغازية	60138	63531.7	2004	وزارة الكهرباء	تاهيل محطات التوليد الغازية (المديرية العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية /الفرات الأوسط)	10	6	10	22

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لمواقع متعددة المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل و المعوقات	نسب الاجزاء على مستوى القورات			تاريخ الزيارة	تسلسل الزيارة	المحافظة	المصرف التركمي	التكلفة مليون دينار	سنة اذراج المشروع	الجهة المقتدة	اسم المشروع	التبويب			
		نسبة الاجزاف المادي	المنفذ	المخطط									1	2	3	
					9	1	محافظة كربلاء									
	عزوف المقاولين عن تقديم المطامات , قلة الكوادر	85	15	100	10	1	بابل	4344	6826.8	2004	وزارة الكهرباء	كهربة الاجزاء السكنية في محافظات الفرات الاوسط/البراماج السنوي	11	3	10	23
	المديرية العامة لتوزيع الفرات الاوسط ابرمت عدة عقود وراى لم يتم تنفيذ اعمال النصب	64	36	100	12	1	التجف				وزارة الكهرباء					
	لا يوجد لدى مديرية توزيع كهرباء الوسط خطة عمل متكاملة يوضح فيها نسبة الاجزاء لكل فترة , سواء توزيع الكوادر الفنية العاملة في مديرية كهرباء الوسط حيث يوجد اعداد كبيرة على الملاك الدائم لم يتم الاستفادة منهم بسبب اعمارهم الكبيرة و سوء حالتهم الصحية	0	100	100	6	1	محافظة واسط	5681	13967	2001	وزارة الكهرباء	كهربة الاجزاء السكنية الجديدة في محافظات الوسط / برنامج سنوي (المديرية العامة لتوزيع كهرباء محافظات الوسط)	6	3	10	24
	لا توجد مشاكل	0	100	100	11	1	محافظة البصرة									
	مكتبي				11	1	ميسان									
	عدم تجهيز المواد المطلوبة وتوفيرها , قلة الكوادر الفنية والمتخصصة العاملة , قلة الالات المتخصصة	34	66	100	12	1	ذي قار									
	سوء الاوضاع الامنية وقلة التخصيصات المرصدة للمشروع الذي تاخر اجاز , صعوبة الوصول للمواد المجهزة	32	68	100	12	1	بغداد	2580	7705	2005	وزارة الكهرباء	انشاء واصالة تاهيل مراكز التهرب في بغداد والمحافظات الاخرى (دارة التهرب والتطوير)	10	4	10	26
								74289320	14996	2001	وزارة الكهرباء	كهربة الاجزاء السكنية الجديدة في محافظات الجنوبية / برنامج سنوي (المديرية العامة لتوزيع كهرباء محافظات الجنوب)	6	3	10	25

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمورقات	تاريخ الزيادة	تسليم الزيادة	نسبة إنجاز المشروع الحالية			المحافظة	المصرف التراكمي	الثقله مليون دينار	سنة ابراج المشروع	الجهة المتابعة	اسم المشروع	التقويم				
				الأحراف	منفذ	مخطط							ت	ت	ت	ت	ت
	تنفيذ المشروع على عدة مراحل مما يؤثر سلباً في النتائج اقممية، بمواصفات قياسية ذات قابلية على تنافس مع بقية المنتجات المعروفة في الأسواق المحلية، عدم اعطاء سياسة دعم المنتج المحلي وعدم الارام الشركات الحكومية بالمبتوج المحلي ادى الى تراكم الانتاج مما اثر سلباً على ايرادات المعمل و توقير اجور المتسبين فيه ، عدم توفر الوقود لتشغيل المعمل ، وجود عمالة فائضة اى سلباً على الحالة المالية للمعمل ، تقادم الاتييب الخاصة بالمرجل البخارية و التاكل الحاصل في مقلها مما اثر سلباً قوة تحملها للمخلف البخاري		1				القادسية	985.5	10500	2012	وزارة الصناعة و المعادن	تطوير خط الاحمال في البوابية	10	9	3	4	
	لا يوجد خطة عمل كاملة للقرارات المشروع، تاخر اقرار الموازنة ويسبب ارباك في عمل المشروع،	5	1	20	40	60											
	التاخر صرف المبالغ العالية المخصصة للمشروع من قبل وزارة الطاقة ، الاجراءات الروتينية المتبعة في وزارة الصناعة و المعادن لاستحصل الموافقات في التعاقد اثر سلبياً في تنفيذ قرارات المشروع	1	1	4	96	100	بغداد	6562.79	7000	2009	وزارة الصناعة و المعادن	تاهيل وتطوير المراكز الهندسي للشركة العامة للتصاميم و الاستشارات الصناعية (الشركة العامة للتصاميم والاستشارات)	8	6	11	5	

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمطابقة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل و المواقف	تاريخ الزيارة	تتضمن الزيارة	نسبة إنجاز المشروع الكلية			المحافظة	المصروف التراكمي	الثقله مليون دينار	سنة ابراج المشروع	الجهة المانحة	اسم المشروع	التوبيخ				
				الاجراف	متفق	مخطط							ت	ت	ت		
لم يذكر نسب الاجاز في تقرير التزيق	لا توجد خطة عمل متكاملة للمشروع يتضمن كافة الفقرات المشروع , المشكله الرئيسية التي تواجه المشروع هي مشكله تسويق المنتج	2	1				بابل	1449.67	8000	2012	وزارة الصناعة و المعادن	تطوير خط انتاج التسيج و تحضيرات التسيج (الشركة العامة للصناعات التسيجية)	4	1	3	9	
	تأخر الاجراءات الادارية و المالية الخاصة بالمواد من ناحية فتح الاعتماد , محدودة الأفضاء مع عدم ملامة توقيتات تسليم التخصيص المالي	9	1														
لم يذكر المشكل الاحرف في تقرير الفريق	لا توجد مشكل	2	1	34	66	100											
	تأخر في الحالة و توقي عقد الوحدة البيئية الرئيسية في مقر الشركة , دخول شركات المحلية و الوسيطة كجهات منفذة لمقاولات المشروع , امتناع وصول الخبراء المختصين لاجراء التخصيب ونقل المعرفة	9	1	34	66	100	بابل	5125.05	11400	2008	وزارة الصناعة و المعادن	المشايخ البيئية لشركة الفرات العامة (شركة الفرات العامة)	4	6	5	10	
	ارتفاع منسوب المياه في البزل الخاص بالمرزعة مما يؤثر سلبا على خصوبة الارض	3	1	50	50	100											
	تأخر اقرار الموازنة , تتلقى بعض المقاولين في اجاز الاعمال الموكلة لهم , عدم وجود خطة واضحة لاعمال التاهل تتضمن مدد و اوزان الفقرات التي سيتم تاهلها	11	1	30	20	50	ميسان	14780934	67000	2013	وزارة الصناعة و المعادن	تاهل مصانع و مرزعة الشركة و تحويل معلى العمود و الكحول (الشركة العامة لصناعة السكر)	3	4	2	11	

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل و الموقفات	تاريخ الزيارة	تشمّل الزيارة	نسبة الجواز المشروع الكلية			المحافظة	المصرف التراكمي	التكلفة مليون دينار	سنة ابراج المشروع	الجهة المانحة	اسم المشروع	التوبيخات			
				الإحراف	منفذ	مخطط										
	الإجراءات الروتينية الخاصة المواقفات الامويلية و التي تؤثر سلبا في تنفيذ فقرات المشروع ، سو الحالة الامنية التي سادت منطقة المشروع في الوبه الاخيرة و التي ادت الي توقف الدوام الرسمي ، التأخر الحاصل بإطلاق الصرف التخصيمات المالية للمشروع	3	1	0	15	15	بغداد	3338.5	18000	2013	وزارة الصناعة و المعادن	انشاء مصنع انتاج اسمدة العناصر الصغرى الضلعية و السائلة(شركة ابن سينا العامة)	6	1	5	15
	اعادة اعلان المناقصات لآخر من مرة مما يمنع سلبا على المسقف الزمني المحدد لتنفيذ الفقرات ، التأخر في تفعيل الاعتماد مع المصرف التجاري العراقي	3	1	15	10	25	بغداد	28.225	8500	2013	وزارة الصناعة و المعادن	تاهيل معمل السجاد الميكانيكي و التانق ومخبرات السيطرة النوعية(الشركة العامة للصناعات السوفية)	12	9	3	16
	التأخر في تفعيل الاعتماد مع المصرف التجاري	9	1	5	40	45										
	لم تتوفر التخصيمات المالية المرصودة للمشروع منذ بدء تنفيذه	3	1	15	85	100	بغداد	650	22000	2013	وزارة الصناعة و المعادن	منظومة معالجة المياه الصناعية (شركة الزوراء العامة)	14	4	9	17
	الإجراءات الروتينية الخاصة باستحصل المواقفات الامويلية و التي تؤثر سلبا في تنفيذ فقرات المشروع ، سو الحالة الامنية التي سادت المنطقة المشروعة في الوبه الاخيرة ، التأخر الحاصل بإطلاق صرف التخصيمات المالية للمشروع	3	1	5	20	25	بغداد	563.76	8000	2013	وزارة الصناعة و المعادن	تاهيل معمل شركة الرضوان العامة(شركة الرضوان العامة)	15	4	9	18

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمطابقة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل و المواقف	تاريخ الزيارة	تتضمن الزيارة	نسبة إنجاز المشروع الكلية			المحافظة	المصرف التراكمي	الثقل مليون دينار	سنة ابراج المشروع	الجهة المنقذة	اسم المشروع	التوبيخ				
				الإحراف	منفذ	مخطط							ت	ت	ت		
لم يكن نسب الاجاز في تقرير الزيارة	التاخر في الاجراءات التعاقبية و استحصال الموافقت حيث لوحظ ان الاجراءات هي نهائية عام 2013 وبداية عام 2014 , علم استجابة الشركات التي احل عليها العمل اكتمال الاجراءات الخاصة بتوقيع العقود	3	1	0	0	0	بغداد	2	15000	2013	وزارة الصناعة و المعادن	تاهيل معامل البلاستيك و النشام محطة 2 ميكا واط (الشركة العامة للصناعات الاشمائية)	9	6	7	19	
	الاجراءات الروتينية الخاصة باستحصال الموافقت الامولية و التي تؤثر سلبا في تنقيح فترات المشروع , سوء الحالة الامنية التي سادت المنطقة المشروع في الاونة الاخيرة , التاخر الحاصل بطرق صرف التخصصات المالية للمشروع	3	1	1.4	5.6	7	بغداد	138.6	65000	2013	وزارة الصناعة و المعادن	تاهيل شركة ابن الوليد العامة والمرحلة الثالثة (شركة ابن الوليد العامة)	19	4	9	20	
	عدم موافقة محافظة النجف على تسليم موقع الكفل لادارة المشروع مما يؤثر سلبا على مخطط الانتاج , العمالة الواسطة غير كافية في المشروع	4	1	2	8	10											
	تاخر في اقرار الموازنة, نقص في الكادر العامل الواسطي, عدم ملازمة الكادر العامل في المشروع , توقف العمل في موقع الكفل بسبب عدم واقفه محافظة بابل على المبادرة بالعمل , تاخر في استحصال الموافقة وزارة النفط لوصول الكوريم الوطنية للموقع بسبب تعارضه مع الخط الاستراتيجي	11	1	31	20	49	كربلاء	0	12000	2013	وزارة الصناعة و المعادن	معمل غربية و غسل الرمل العادي والمرشحات (الشركة العامة للصناعات الاشمائية)	10	6	7	21	

جدول القطاع الصناعي لقيمة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمواقف	تاريخ الزيارة	تتضمن الزيارة	نسبة إنجاز المشروع الحالية			المحافظة	المصروف التراكمي	التكلفة مليون دينار	سنة ابراج المشروع	الجهة المتابعة	اسم المشروع	التوبيخ				
				الأحرف	منفذ	مخطط							ت	ت	ت		
	قائمة التخصيصات للمشروع بالنسبة لحجم العمل , صمودية الاجراءات الروتينية عند فتح الاعتماد بسبب تاخر الفتح لمدة تصل احيانا 3 اشهر	4	1	10	35	45	النجف	3341.02	10000	2013	وزارة الصناعة و المعادن	تاھل مطلع سميت الكوفة (الشركة العامة للسمت الجنوبية)	2	1	7	22	
	قائمة التخصيصات للمشروع بالنسبة لحجم العمل , صمودية الاجراءات الروتينية عند فتح الاعتماد بسبب تاخر الفتح لمدة تصل احيانا 3 اشهر	9	1	17	83	100											
	التاخر الحاصل في مرحلة التعاقد و الذي ادى الى تاخر في المباشرة بالمشروع	4	1	0	0	0	ذي قار	0	45000	2013	الصناعة و المعادن	انتاج قلابات المضط المتوسط (شركة اور العامة)	23	2	9	23	
	مكتبي	12	1														
	التاخر في اجراءات فتح الاعتماد	4	1	35	5	40											
	تاخر في اجراءات فتح الاعتماد لعدم اقرار الموازنة لعام 2014	12	1	35	5	40	بغداد	0	11000	2013	الصناعة و المعادن	استحداث خطوط جديدة و استعمل مكنن انتاج الاقمشة (الشرك العامة لصناعة القطنية)	7	1	3	24	
	الاجراءات المتعلقة بامتصاص المواقف الاصولية من وزارة الصناعة لغرض اعطاء العقود , تاخر فتح الاعتماد للشركة وذلك بسبب التاخر في المصالحة على الموازنة	4	1	44	30	74											
	تاخر اقرار الموازنة , الاجراءات الروتينية المتعلقة بفتح الاعتماد , قائمة التخصيصات ملية	9	1	2.75	24.8	27.5	بغداد		25000	2013	الصناعة و المعادن	انتاج البطاريات المتقدمة عديمة الادمية MF وبطاريات الطاقة الشمسية (الشركة العامة لصناعة البطاريات)	16	5	5	25	

جدول القطاع الصناعي لعيبة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمواقف	تاريخ الزيادة	تسليم الزيادة	نسبة إنجاز المشروع الكلية			المحافظة	المصرف التراكمي	الثقل مليون دينار	سنة ابراج المشروع	الجهة المنفذة	اسم المشروع	التوقيب				
				الاحراف	منفذ	مخطط							ت	ت	ت		
	مكتبي	4	1				بغداد		15000	2013	الصناعة والمعادن	معمل انتاج غاز وسائل (الاورسجين) شركة المصنوع العامة)	19	6	5	26	
	صعوبة تجهيز الوثائق الخاصة ببعض معدات المشروع مما يؤدي الى تاخر الشركات المقولة في تنفيذها التعاقدية	5	1	8	92	100	بابل	32764.25	43500	2008	الصناعة والمعادن	تحديث خط انتاج الصودا الكورية والكلور (شركة الفرات العامة)	4	5	5	27	
	صعوبة تجهيز الوثائق الخاصة ببعض معدات المشروع مما يؤدي الى تاخر الشركات المقولة في تنفيذها التعاقدية , القطاع التير الكورياني	10	1	8	92	100											
	مشاكل في التسويق المنتجات , قلة التخصيصات	5	1	5	65	70											
	مشاكل في التسويق المنتجات , قلة التخصيصات	10	1	5	95	100	بابل	10016.5	11700	2010	الصناعة والمعادن	توسيع الاطيس البلاستيكية و معمل القايقة في الحلة و تحديث الخدمات الصناعية (الشركة العامة للخدمات النسيجية)	6	1	3	28	
	الاجراءات الروتينية الخاصة باستحصل المواعيد الامورية لاعلان المتلفعات , قلة التخصيصات	5	1	10	10	20	بابل	4.325	7500	2013	الصناعة والمعادن	تصنيع المدرفلات الحديدية (شركة الميكانيكية)	6	3	9	29	
	قلة التخصيصات	5	1				بابل	2.557	8000	2013	الصناعة والمعادن	تحديد انتاج الصودا السائلة الى قشرية (شركة الفرات العامة)	5	5	5	30	

جدول القطاع الصناعي لعمية المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والموقوفات	تاريخ الزيارة	تسليم الزيارة	نسبة الجاز المشروع الفعلي		المحافظة	المصرف التراكمي	التكلفة مليون دينار	سنة المشروع	الجهة المتفئة	اسم المشروع	التوبيخ			
				الأحرف	منفذ							مخطط	ت	ت	ت
	ان متطلبات العقد التخصصية يشكل كبير وان التأخر الحاصل بسبب هذا السبب	5	1	0	0	بغداد	4.325	48000	2013	الصناعة والمعادن	انتاج الجورات بنسبة تصنيع 40% العامة للصناعات الميكانيكية)	5	3	9	31
	تأخر اقرار الموازنة الاستثمارية لعام / 2014 , الاجراءات الروتينية المتتالية يتأخر المصافاة على الاحالات , اذراج المشروع نهاية عام 2013 وعدم حصوله على الوقت الكافي	5	1	0	8	بغداد	0	18232	2013	الصناعة والمعادن	معمل الصب الجاف (الشركة العامة للتصميم والانشاء الصناعي)	11	6	7	32
	الصعوبة في تسويق منتجات الشركة	5	1	0	35	بغداد				الصناعة والمعادن	تاهل شركة الربيع العامة (شركة الربيع العامة)	11	1	8	33
	الصعوبة في تسويق منتجات الشركة	11	1	0	42	بغداد	2945.6	90000	2013	الصناعة والمعادن	تاهل شركة الربيع العامة (شركة الربيع العامة)	11	1	8	33
	تتاكل من شركتي الكرامة و الإخاء في تجهيز المعدات , الاجراءات الروتينية في الوزارة حول المصافاة على العقود الاعوام الروتينية المتتالية للحصول على الموافقات الاصولية , تتلخ الشركات المجوزة للمواد	5	1	75	25	بغداد	13349	22000	2010	الصناعة والمعادن	تاهل الشركة العامة للصناعات الكورينية (الشركة العامة للصناعات الكورينية)	16	2	9	34

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل و الموقوفات	تاريخ الزيارة	تتضمن الزيارة	نسبة إنجاز المشروع الحالية			المحافظة	المصرف التراكمي	التكلفة مليون دينار	سنة ابراج المشروع	الجهة المتابعة	اسم المشروع	التوبيخ		ت	
				الأحرف	منفذ	مخطط										
	لا يوجد خطة عمل متكاملة للمشروع , تأخر الشركات المتقدمة في ارسال سمات الدخول , التجهيز بإجلاء موقع الشركة بسبب احالة مساحات كثيرة مجاورة للشركة للاستثمار عدم استلام كامل التخصيصات المالية لعام 2013	5	1	9	25	36	بغداد	3142.98	11600	2013	الصناعية والمعادن	تطوير الطاقات وتوسيع مصانع شركة التحدي العامة (شركة التحدي العامة)	25	2	9	35
	التأخر في تنفيذ الأعمال بسبب عدم أقرار الموازنة الاتحادية , تتكرر الشركات المتأخرة في الالتزام بالتنفيذ وفق سقف الزماني المتفق عليه وفق العقود الموقعة	12	1	5	60	65										
	التأخر في فتح الاعتماد من قبل البنك المرابي التجاري	5	1	5	35	40	بغداد	1042.302	12000	2013	الصناعية والمعادن	تاهيل شركة الكرامة العامة (شركة الكرامة العامة)	16	4	9	36
	تأثير الوضع الأمني بصورة عامة , تأخر في الاجراءات التعاقدية وفتح الاعتمادات	5	1	45	15	60	النجف	427.5	41500	2011	الصناعية والمعادن	معالجة النفايات المخلقة من الوحدات الانتاجية لحماية البيئة	13	6	5	37
	التأخر في موقع الشركة وصعوبة وصول الشركات المقاوله للموقع	6	1				بغداد	168017	5500	2013	الصناعية والمعادن	تاهيل شركة عتية بن تايح	20	4	9	38

جدول القطاع الصناعي لبيئة المشاريع لموقع واحد المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمواقف	تاريخ الزيارة	تتضمن الزيارة	نسبة إنجاز المشروع الحالية			المحافظة	المصرف التراكمي	التكلفة مليون دينار	سنة ابراج المشروع	الجهة المتفئة	اسم المشروع	التوبيخ			
				الأحرف	منفذ	مخطط							ت	6	7	46
	عدم وجود جدول تقدم عمل المعمل لدى الشركة المقابلة , تاخر الفحوصات	8	1	68	32	100	بغداد	162,413	10398	2013	الصناعة والمعادن	تطوير مصنع الاظمنة الهيدروكربونية و إنتاج العناصر الهيدروكربونية (شركة القادح)	26	2	6	44
	مكتبي	9	1				البصرة	650	22000	2013	الصناعة والمعادن	وحدة معالجة المياه الصناعية المصروفة (شركة الأسمدة الجوفية)	18	6	5	45
	لا توجد خطة عمل متكاملة لجميع مقولات المشروع تحدد وزن كل مقول له العدد الرمزية المتوقعة لاجل , تتفق الشركات المجوزة	11	1	30	70	100	بغداد	22957,64	50000	2010	الصناعة والمعادن	تاهل الشركة العامة للزيوت التيانية / المرحلة الثانية	6	8	7	46

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لمواقع متعددة المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمواقف	نسب الاجاز على مستوى الفقرات			تاريخ الزيادة	تسلسل الزيادة	المحافظة	المصرف الزراعي	الكثافة مليون بيلتر	سنة ابراج المشروع	الجهة المنفذة	اسم المشروع	التبويب	ت		
		نسبة الاجاز	المنفذ	المخطط												
	وجود متجاوزين ضمن ارض المشروع ، كثرة السرقات للمواد وكذلك التهديد لكوادر المشروع ، عدم توفير حماية للمشروع سواء من الشرطة او الجيش ، سوء الاحوال الجوية في منطقة المشروع ، عدم وجود جدول تقدم العمل واضح للمشروع ، ولما اقتصر جدول تقدم العمل لكل مقارئة (مرحلة) على حده	23.4	76.6	100	1	1	البصرة									
	لا يوجد خطة عمل متكاملة لجميع الفقرات المشروع تحدد وزن كل مقارئة والمدد الزمنية ، عدم استحصان المورقات للارض التي سبقم عليها ملخز المياه والايوب الناقل ، التفريات الكثيرة في فقرات وكلف المشروع ، سوء الاحوال الجوية ، عدم الالتزام بالمدد التعاقدية في تنفيذ المشروع من قبل الشركة العامة للتصاميم وتنفيذ المشروع ، كثرة ملاحق العقود بين عدم وجود خطة عمل ومنهاج للمشروع	3	97	100	10	1										
	لم يتم توفير تخصيص لايصال الماء ولم يتم المباشرة بإنشاء محطة كهرباء خاصة بالمدينة او ربطها على الشبكة الوطنية ، ولم يتم تجهيز وحدة معالجة المياه الصناعية	20	80	100	12	1	ذي قار									
	لا توجد خطة عمل متكاملة لجميع فقرات المشروع تحدد وزن كل فقرة ونسبة الاجاز فيها و الفقرات المنفذة والغر منفذة في المشروع ، لم يتم استحصان المورقات الخاصة بالماء بسحب الماء ولم يتم المباشرة بإنشاء محطة كهرباء خاصة بالمدينة او الربط على الشبكة الوطنية ، لم يتم تجهيز وحدة معالجة المياه الصناعية	0	98	98	3	1	الناصرية									
								27918.433	80000	2007	وزارة الصناعة والمعادن	المجمعات الصناعية (المديرية العامة للتنمية الصناعية)	1	23	6	1

جدول القطاع الصناعي لعينة المشاريع لمواقع متعددة المشمولة بالمتابعة لعام 2014

الملاحظات	المشاكل والمورقات	نسب الانجاز على مستوى الفقرات			تاريخ الزيارة	تسلسل الزيارة	المحافظة	المصرف التراكمي	الكلفة مليون دينار	سنة الراج المشروع	الجهة المنقذة	اسم المشروع	التبويب	ت		
		نسبة الاحراف المادي	المنفذ	المخطط												
لم يتم الراج في نسب الاجاز في قبل التقرير من قبل فريق الزيارة	قدم الخطوط الانتاجية مما تبرزت سلبيات على الطاقات الانتاجية المتاحة و يزيد من الضمان اثناء الانتاج , اقلنس مصرف الوركان للاستثمار و الذي تم فتح الاعتماد فيه لمشروع تجهيز خطوط انتاجية جديدة لمعامل الطابوق , عدم وجود خطة تمويقية واضحة لدى الشركة للمنافسة مع معامل طابوق القطاع الخاص				1	1	القاسمية	20648.0335	66000	2009	وزارة الصناعة و المعادن	تاهيل معامل الطابوق الفخاري في الشركة العامة للصناعات الاششائية (الشركة العامة للصناعات الاششائية)	3	6	7	2
	قدم الخطوط الانتاجية مما تبرزت سلبيات على الطاقات الانتاجية المتاحة و يزيد من الضمان اثناء الانتاج , اقلنس مصرف الوركان للاستثمار و الذي تم فتح الاعتماد فيه لمشروع تجهيز خطوط انتاجية جديدة لمعامل الطابوق , عدم وجود خطة تمويقية واضحة لدى الشركة للمنافسة مع معامل طابوق القطاع الخاص															
	تقدم خط الانتاج للعمل , تاخر العقود الاستثمارية , قلة الصلاحيات للادارة	20	80	100	5	1	بابل									
					1	1	واسط									
					2	1	ميسان									
	مكتبي															
	عدم كفاية التخصيص السنوي المقر و لا يتوافق مع خطة الشركة لتنفيذ فقراتها	0	10	10	5	1	بغداد	8000	90000	32013	وزارة الصناعة و المعادن	تاهيل خطوط انتاج الزبوت السائلة و مسحق التتطبيق و صلبون التواليت - محافظة ميسان (الشركة العامة لزبوت التبتلية)	5	3	2	3
