



الادارة التنفيذية لاستراتيجية
التخفيف من الفقر

تقرير متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعامي (2019 - 2020)

أيار 2021

جمهورية العراق
وزارة التخطيط



الادارة التنفيذية لاسراتيجية
التخفيف من الفقر



تقرير متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعامي 2019-2020

أيار 2021

المحتويات

١	المقدمة
٣	المحصلة الأولى (دخل اعلى ومستدام من العمل للفقراء)
٨	المحصلة الثانية (تحسين المستوى الصحي)
٣١	المحصلة الثالثة (تحسن تعليم الفقراء)
٤٥	المحصلة الرابعة (سكن ملائم وبيئة مستجيبة للتحديات)
٤٥	• تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية
٦٦	• إعادة وتأهيل وتسوية تجمعات السكن العشوائي
٧٦	المحصلة الخامسة (حماية اجتماعية فعالة للفقراء)
٩١	المحصلة السادسة (الأنشطة المستجيبة للطوارئ)
٩٦	البوابة الالكترونية لأنشطة وبرامج استراتيجية التخفيف من الفقر
٩٨	الصندوق الاجتماعي للتنمية
١٠٧	خلاصة بالمشاريع الخاصة بالمحافظات والوزارات لعامي ٢٠١٩-٢٠٢٠
١١٢	تقييم نسب انجاز المحافظات

المقدمة

شهد العراق في السنوات الماضية احداثاً سياسية واقتصادية وامنية جسيمة تمثلت بأحتلال التنظيم الإرهابي لعدد من المحافظات وبروز ازمة النزوح وما رافقها من انخفاض أسعار النفط الممول الرئيسي للموازنة العامة للبلد، بالإضافة الى الحراك الشعبي والتظاهرات التي شهدتها بعض محافظات العراق واخيراً ازمة Covid-19 وما صاحبها من تدهور لاسعار النفط وعدم إقرار الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٠.

كل هذه الاحداث اثرت ولا زالت تؤثر على مسيرة التنمية في العراق وعلى جهود الحكومة في تحقيق أهدافها التي تسعى اليها من خلال الخطط والاستراتيجيات المعدة بهذا الخصوص ومنها استراتيجية التخفيف من الفقر ٢٠١٨ – ٢٠٢٠ .

بدأ العمل في خطة شاملة متدرجة بالاهداف منذ عام ٢٠١٢ من خلال تخصيص مالي لتنفيذ الاستراتيجية وصل الى حوالي ٤٤٥ مليار دينار ، شملت المحافظات السبعة الأكثر فقراً فضلاً عن الوزارات الخدمية ذات الصلة بالفقر وابعاده المختلفة وفي عام ٢٠١٣ ارتفع سقف التخصيص الى حوالي ٦٠٥ مليار دينار وتوسع التنفيذ ليشمل محافظات العراق كافة عدا إقليم كردستان ، وعلى الرغم من تحديات إقرار الموازنة في عام ٢٠١٤ فقد نجحت الإدارة التنفيذية في توفير حوالي ٢٥٢,٤٠١ مليار دينار للحفاظ على ديمومة واستمرار تنفيذ مشاريع تخفيف الفقر ، وبعد ازمة ٢٠١٤ المزدوجة انخفضت تخصيصات الاستراتيجية لعام ٢٠١٥ الى ٢٠٩,٤٠٠ مليار دينار تم توزيعها على جهات التنفيذ حسب نسب الفقر مع مراعاة ديمومة تمويل المشاريع المستمرة ، اما في عام ٢٠١٦ فقد انخفضت التخصيصات لتصل الى ١٢٩,١١٧ مليار دينار وكذلك عام ٢٠١٧ تم تخصيص ٥٥,٢٥٠ مليار دينار والذي اثر بشكل كبير على مستوى التنفيذ خاصة اذا ما قارنا هذه التخصيصات بالمبالغ الممولة فعلاً والتي انعدمت في بعض المشاريع مما أدى الى توقف اغلبها .

اما في عام ٢٠١٨ خصص للاستراتيجية مبلغ ٤٠ مليار من الموازنة الاستثمارية وكذلك تم تخصيص مبلغ من الموازنة الجارية تم توزيعها على وفق نسب الفقر .

والتقرير الذي بصده نحن الان يتحدث عن عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ حيث تم تخصيص مبلغ ١٠٠ مليار دينار لتنفيذ أنشطة الاستراتيجية لعام ٢٠١٩ ووزعت على جهات التنفيذ وفق نسب الفقر والنسبة السكانية بالإضافة الى التخصيصات المناقلة من تخصيصات تنمية الأقاليم وبنسبة (٥%) اذ بلغت (٨٧,٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ، الا ان الظروف الأمنية والتظاهرات التي شهدتها عدد من محافظات العراق حالت دون استغلال بعض المحافظات لتخصيصاتها ، وفي اطار دعم أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر تم تاسيس الصندوق الاجتماعي للتنمية الممول بقرض من البنك الدولي البالغ (٣٠٠) مليون دولار امريكي لمدة خمس سنوات، وبأشر الصندوق وفرقه في المحافظات المستهدفة في المرحلة الاولى وهي (صلاح الدين، المثنى، دهوك) ومن خلال الكوادر الهندسية في عام ٢٠١٩، وبكلفة اجمالية للمحافظات المستهدفة بلغت ١٠,٦٣٩,٥٩١ دولار امريكي.

أما في عام ٢٠٢٠ التي لم تقر فيها الموازنة العامة بالإضافة الى ظروف جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط الامر الذي اثر بشكل كبير على سير عملية تنفيذ أنشطة الاستراتيجية.

يسرنا اليوم ان نطلق تقريرنا الدوري السنوي لمتابعة أنشطة ومشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر لعامي (٢٠١٩ - ٢٠٢٠) والذي تعذر صدوره لعام ٢٠١٩ بسبب ظروف الجائحة وتبدل الإدارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر.

والله الموفق

الإدارة التنفيذية
لاستراتيجية التخفيف من الفقر

المحصلة الأولى
دخل اعلى ومستدام من العمل
للفقراء



المحصلة الأولى

دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء

تسعى الإستراتيجية إلى تحسين أوضاع الفقراء، وانتشالهم من حالة الفقر، سواء من خلال تحسين دخولهم، أو من خلال تحسن فرص وصولهم إلى الخدمات ذات النوعية المناسبة، يُعد الدخل المستدام وسيلة رئيسة في تخليص الفقراء من فقرهم، لأنَّ نقص الدخل ومن ثم الإنفاق على (السلع والخدمات الأساسية) هو من يضع الأفراد والأسر تحت خط الفقر في أوضاع مستقرة لا يتعرض فيها الفقراء إلى أزمات أو صدمات .

برنامج إقراض لتنفيذ أنشطة مدرة للدخل للفقراء:

أولاً: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:

نشاط دعم مشروع صندوق القروض الصغيرة للفقراء وبكلفة كلية (١٦٨,٧٥٠) مليار دينار(مدرج في عام ٢٠١٢):

يشمل النشاط منح قروض صغيرة وفق ضوابط واليات محددة تشمل فئات كل من (المعوقين ، المهجرين العائدين، الارامل والمطلقات والمعيلات لاسرهن، المطلق سراحهم من السجون، المتضررين من العمليات الارهابية، معيلي الاسر غير المستقرة من سكنة مناطق الطمر الصحي، المتسولين) لتوفير فرص عمل من شأنها تحسين وضعهم المعيشي.

بدأ البرنامج في ٢٠١٢/٩/١ بشمول المحافظات السبعة الاكثر فقرا واستمر العمل فيه للاعوام ٢٠١٢-٢٠٢٠ بعد ان تم التوسع به ليشمل محافظات العراق كافة (عدا اقليم كردستان) ضمن عدد معاملات مخططة بلغت ٢٠٨٧٧ معاملة وهو عدد المستفيدين من المشروع ، تتراوح قيمة كل قرض بين (٥-١٠) مليون دينار، وتمنح استنادا الى تقرير اللجان المختصة، وان هذه القروض تكون بدون فوائد وبمدة سماح تبلغ سنة واحدة من تاريخ تسلم القرض، فيما تسدد الاقساط على مدى ثماني سنوات، وتمنح هذه القروض دفعة واحدة لكل الفئات باستثناء المتسولين وسكان مناطق الطمر الصحي، والتي تكون بدفعتين، اذ تدفع الدفعة الثانية بعد المباشرة بالمشروع وبناء على تقرير من اللجنة الفرعية في المحافظة يصدر خلال (٣٠) يوما من تاريخ تسلم الدفعة الاولى .كما يمنح المقترض مبلغ مليون دينار كقرض اضافي في حالة تشغيله لاي عامل اضافي بعد مرور فترة لا تقل عن ستة اشهر من تنفيذ المشروع وبما لا يتجاوز سقف الاقراض المقرر واستنادا الى توصيات

اللجنة المركزية في المحافظة ومصادقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ويعفى ورثة المقرض المتوفي مما تبقى بزمته في حالة غلق المشروع وعدم قدرة الورثة على ادارته واستنادا لتقرير اللجنة المركزية في المحافظة والمصادقات الأصولية.



صور مشروع اقراض الفقراء/ محافظة الديوانية

يجري توزيع القروض وفق خطط أعدتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن الملاحظ محدودية مراعاتها لتقليل التفاوت بين النساء والرجال والذي لم يدعم تمكين المرأة، اذ تم توزيع اغلب القروض في المحافظات للرجال وبنسبة ٩٥,٥% مقابل نسبة ٤,٤% للنساء.

وقد بينت تقارير وزارة العمل ان النسبة الاكبر من القروض استثمرت لتنفيذ مشاريع تجارية مدرة للدخل بنسبة (٧٥,٣%) ومشاريع خدمية بنسبة (١٥%) وصناعية بنسبة (٧,٨%) وزراعية بنسبة (١%).

اهداف المشروع:

يهدف المشروع الى توفير القروض الميسرة والتي تعد الأساس لبدء مشاريع صغيرة مدرة لدخل الفقراء تساعد في تمكينهم وتهيئة الأرضية التي يستند لها النمو الاقتصادي المستدام المرتبط بزيادة الانتاجية وخلق فرص عمل للفئات المهمشة والفقيرة.


الشرائح المستفيدة:

تم التخطيط لاقراض (٢٠٨٧٧) مستفيد من العاطلين الفقراء.

في طريق الانجاز

- استمر العمل في اقراض الفقراء وبشكل محدود لقلة التخصيصات السنوية لعام ٢٠١٩ ليصبح مجموع ما تم إقراضه للأعوام السابقة (١١٤٤٧) منذ اطلاق البرنامج عام ٢٠١٢ وبسبب تأخر التمويل اثر ذلك سلباً على سير المشروع .

الشكل (١) : يوضح توزيع القروض على المستفيدين خلال السنوات ٢٠١٢-٢٠٢٠

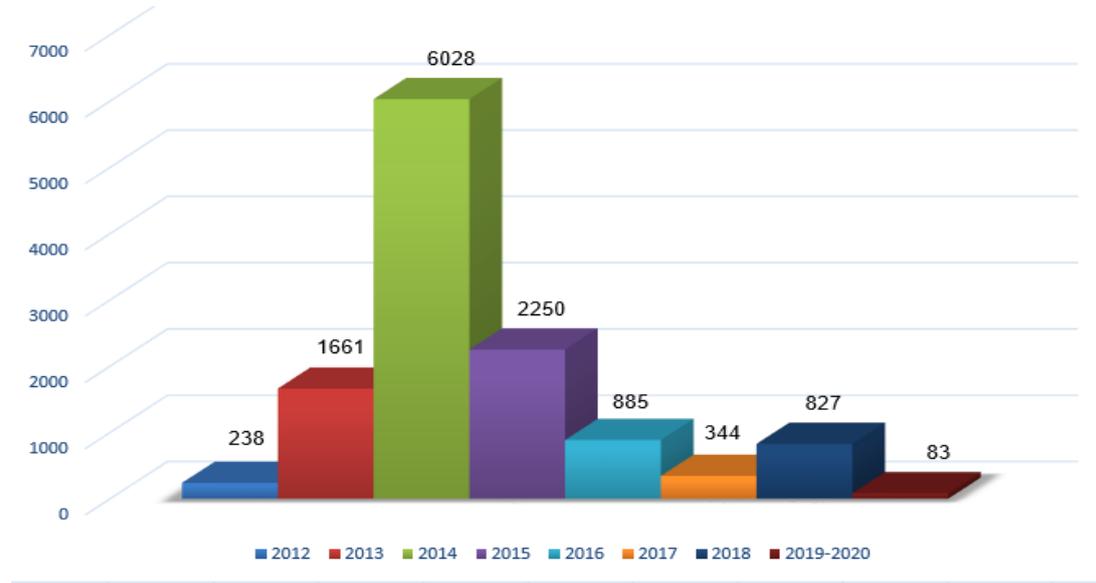

تأسيس جمعيات محلية لصغار الفلاحين أو تعاونية لتقديم الخدمات الزراعية كالتسويق، التمويل، استخدام المياه والصيانة والمكننة، الخزن والتبريد، النقل في المجتمعات الزراعية الصغيرة:

اولاً: محافظة ديالى:

تبليط (١٠) طرق في قرى ريفية متعددة في المحافظة بطول ٣٢,٨٠٠ كم وبكلفة (٤,٧٧٠) مليار دينار (مدرج في عام ٢٠١٣)

اختارت المحافظة ضمن اولوياتها لتخفيف الفقر في عام ٢٠١٣ مشروع تبليط طرق لقرى متعددة ، نظرا لحاجة تلك القرى والتي (تمتاز بكثافة سكانية عالية) الى انشاء شوارع لربط المناطق مع بعضها البعض وربطها بالمدن بهدف اوصول الخدمات الأساسية الى جميع مواطني المحافظة وتسهيل اوصول المحاصيل الزراعية من المزارع الى مراكز البيع في المدن يبلغ طول هذه الطرق (٣٢,٨٠٠) كم .



شارع امام طالب / محافظة ديالى

أهداف المشروع:

- يهدف المشروع الى:
- توفير الطرق للقرى السكنية.
- ربط المناطق الريفية بمركز المحافظة.
- ايصال الخدمات الأساسية الى جميع المواطنين.
- تسهيل ايصال المحاصيل الزراعية من المزارع الى الاهالي والاسواق.

الشرائح المستفيدة :

- سكان القرى التي تصل بينها تلك الطرق والبالغ عددهم (٢٩٧٥٠) فردا.



شارع قرية الحبيب العبدالله / ديالى

في طريق الانجاز :

تم انجاز (٧) طرق وهي:

- طريق المد الاخضر ١٠٠%.
- طريق قرية امام طالب وحي سارة ١٠٠%.
- طرق في الحديد ١٠٠%.
- طريق قرى جميلة – حاتم – صالح حبيب ١٠٠%.
- طريق قرية كاظم صالح ولفته العنكود ١٠٠%.
- طريق ريفي لقرية حبيب العبد الله ١٠٠%.
- طريق قرية الحاج جاسم حسين ١٠٠%.

المشاريع قيد الإنجاز:

- انشاء طريق الحساوية -العروبة- طريق المدارس بطول ١ كم ٢٥%.

المشاريع المرفوعة من خطة عام ٢٠١٦

- تبليط طريق بطول ٧ كم في قضاء كفري / قرية الشيخ خليل مدرج عام ٢٠١٣ بكلفة ٩٨٩,٢٥٠ مليون دينار.
- تبليط طريق بطول ٦ كم في قضاء المقدادية / قرية الكفاح مدرج عام ٢٠١٣ بكلفة ١٠٤,٨١٧ مليون دينار.

جدول رقم (١) المشاريع المدرجة ونسب انجازها ضمن المحصلة الاولى

ت	اسم المشروع	الوزارة أو المحافظة	الكلفة الكلية (بالمليون)	المصروف التراكمي (بالمليون)	نسبة الانجاز	الملاحظات
١	تأسيس جمعيات محلية لصغار الفلاحين أو تعاونية لتقديم الخدمات الزراعية كالتسويق، التمويل، استخدام المياه والصيانة والمكننة، الخزن والتبريد، النقل في المجتمعات الزراعية الصغيرة	محافظة ديالى	٤٧٧٠	٢٩٢٦	٩٠	
٢	شمول أوسع للفقراء ببرنامج الإقراض لإنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل.	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	١٦٨,٧٥٠	٦٦,٦٤٠	٥٤,٨	

المحصلة الثانية تحسين المستوى الصحي



المحصلة الثانية

تحسين المستوى الصحي

يبقى القطاع الصحي من القطاعات الحيوية في الدولة العراقية ويحظى بأولوية في السياسة الوطنية للبلد خاصة انه يعني بحياة المواطن وأمنه الصحي. تهدف محصلة الصحة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية المتكاملة والشاملة لكافة المواطنين ولجميع المناطق وخصوصاً المناطق النائية والفقيرة مع تحقيق سهولة الوصول إليها لخلق مجتمع عراقي معافى جسدياً ونفسياً واجتماعياً تسعى الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر الى تحقيقها مع التأكيد على الخدمات الصحية الوقائية الى جانب الصحة العلاجية وتشمل هذه السياسات خدمات الرعاية الصحية الأولية المحسنة والتي تضم عدد من الأنشطة والمشاريع.

إنشاء وتأهيل وتجهيز مراكز أو بيوت صحية أو عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة:

أولاً : وزارة الصحة :

بناء وتأهيل وحدات التدرن مع توفير متطلباتها بكلفة (٥٠) مليار دينار (مدرج في عام ٢٠١٢) : يضم المشروع بناء وحدة تدرن لكل محافظة من محافظات العراق (عدا اقليم كردستان)، ويهدف الى تحسين المستوى الصحي من خلال توفير خدمات رعاية صحية اولية محسنة للفقراء يسهل عليهم الوصول اليها عن طريق بناء (٢٨) وحدة تدرن موزعة على المحافظات (ميسان ٢، ذي قار ١ ، المثنى ٢ ، الديوانية ١ ، بغداد ٣ ، صلاح الدين ٢ ، كركوك ٢ ، كربلاء ٢ ، واسط ٢ ، بابل ٢ ، الانبار ٣ ، النجف ١ ، ديالى ١ ، نينوى ٢ ، البصرة ٢) حددت مواقع وحدات التدرن في المحافظات تبعاً الى انتشار المرض في الرقعة الجغرافية ضمن المحافظة ونسبة الفقر فيها، اذ يعد هذا المرض من الامراض الصديقة للفقراء .

مساحة الوحدة الواحدة (٦٠٠) متر مربع، تتكون من ثلاث طوابق، يضم الطابق الأرضي عيادة استشارية تتكون من غرفة طبيب ومختبر وصيدلية وغرفة أشعة ومكتب إحصائي وقاطع تذاكر، اما الطابق الثاني والثالث فيضم شقق سكنية للكادر العامل في الوحدات، وسيتم أشغال هذه الوحدات بواسطة ٢ طبيب و ٢ مساعد مختبر و ٢ مساعد صيدلي و ٢ مصور اشعة و ٢ إحصائي وقاطع تذاكر، وتكون كل وحدة مسؤولة عن تشخيص ومتابعة حالات التدرن وتزويد المرضى بالعلاج اللازم للقضاء على هذا المرض.

اهداف المشروع:

تعد هذه الوحدات مراكز استشارية لفحص مرضى التدرن في المناطق الفقيرة التي تغطيها تلك المراكز فضلا عن توفير الأدوية اللازمة لعلاج المرضى.

الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد المستفيدين من المشروع بـ(١٥٠) ألف فرد للمركز الواحد ومجموع المراكز ممكن ان يقدم الخدمة لـ ٤ مليون مستفيد .

في طريق الإنجاز

- يتم تنفيذ المشروع بمرحلتين هي البناء والتجهيز ضمن نفس المقابلة :
 - **المرحلة الأولى (البناء):** استكمل بناء هياكل ٢٤ مركز تدرن في المحافظات (كركوك ، صلاح الدين ، الأنبار ، بغداد ، ديالى ، بابل ، واسط ، النجف ، كربلاء، ميسان ، القادسية ، البصرة ، المثنى) ، تأخر استكمال باقي الهياكل بسبب الوضع الأمني في محافظة نينوى وسيتم إعطائها أولوية أولى في التنفيذ حال توفر تمويل كافي .
 - **المرحلة الثانية (التجهيز):** التي تضم تجهيزها بالمواد والأجهزة و المستلزمات الطبية الخاصة بمراكز التدرن والذي توقف العمل بها بسبب عدم توفر تمويل كافي .
- بلغت نسبة الانجاز الكلي ٧٤%.
- تم افتتاح وإدخال (٧) مراكز للتدرن في الخدمة على الرغم من وجود بعض المنقوصات والتي لا تحول دون افتتاح المركز مثل تجهيز بعض غرف مبيت الكادر الطبي وبعض قطع أجهزة التبريد ... الخ).
- بالرغم من توقف التنفيذ في اغلب المشاريع منذ نهاية عام ٢٠١٤ بسبب الأزمة المالية واحتلال داعش لبعض المحافظات ألا انه تم توفير تمويل لاستكمال بعض المراكز وأيضا دفع مستحقات للمقاولين عن الأعمال المنفذة سابقاً.



منسقية التدرن / محافظة المثنى



منسقية التدرن / محافظة بابل

جدول رقم (٢) موقف ونسب إنجاز وحدات التدرن حسب المحافظات

ت	المحافظة	نسبة الانجاز	الملاحظات
١	نينوى / النهروان	٦٩%	قيد التنفيذ
	نينوى / الكرامة	٦٥%	قيد التنفيذ
٢	كركوك / داقوق	٣٠%	متوقف انتهاء عقد
	كركوك / الحويجة	٣٠%	متوقف انتهاء عقد
٣	ديالى	٣٠%	مستمر
٤	الانبار / القائم	٦٥%	متوقف
	الانبار / الفلوجة	٦٥%	متوقف
	الانبار / حديثة	٦٥%	متوقف
٥	بغداد / الكرخ	١٠٠%	منجز
	بغداد / الكاظمية	١٠٠%	منجز
	بابل / الاساتذة	١٠٠%	منجز
٦	بابل / المحاويل	١٠٠%	منجز
	كربلاء / الحي العسكري	٧٧%	مستمر
٧	كربلاء / حي النصر	١٠٠%	منجز
	واسط / الكوت	٧٧%	مستمر
٨	واسط / الحي	٩٠%	مستمر
	صلاح الدين / بيحي	٣٠%	متوقف
٩	صلاح الدين / تكريت	٣٠%	متوقف
	النجف / الحرية	١٠٠%	منجز
١٠	الديوانية	١٠٠%	منجز
١٢	المتنى / الخضر	١٠٠%	منجز
	المتنى / السماوة	١٠٠%	منجز
١٣	ذي قار / الزهراء	٧٢%	متوقف انتهاء عقد
١٤	ميسان / العزيز	٨٩%	متوقف انتهاء عقد
	ميسان / علي الغربي	٨٠%	متوقف انتهاء عقد
١٥	البصرة / القبلة	٨٠%	متوقف انتهاء عقد
	البصرة / الزبير	٦٥%	متوقف انتهاء عقد

ثانياً : محافظة ديالى :

بناء مراكز رعاية صحية عدد (٢) مركز وبكلفة (١,٢٥٠) مليار دينار (مدرج عام ٢٠١٢) :
يضم المشروع بناء مركزين صحيين في قرىتي (كهريزه ،النظام) في قضاء خانقين ، ويرمي الى تحسين المستوى الصحي من خلال توفير خدمات رعاية صحية للفقراء يسهل عليهم الوصول اليها ، يتكون مركز قرية كهريزه من بناية من طابق واحد على مساحة (٨٠٠) متر مربع ،اما مركز قرية النظام فيتكون من طابق واحد على مساحة (٣٠٠) متر مربع، وسيتم تجهيز المركزين بكادر طبي وادوية بالتنسيق مع وزارة الصحة .

أهداف المشروع:

الهدف من انجاز هذه المراكز الصحية هو توفير خدمات صحية للفقراء تشمل تقديم العلاجات و فحص المرضى في المناطق الفقيرة التي تبنى فيها تلك المراكز.

الشرائح المستفيدة:

يخدم كل مركز صحي حوالي (١٥٠٠٠) فرد من الفقراء ضمن الرقعة الجغرافية التي يغطيها.

في طريق الانجاز

- تم احالة المشروع نهاية كانون الاول ٢٠١٣ وتم توقيع العقد بمدة (٢١٠) يوماً
- نسبة انجاز احد المراكز ١٠٠% ونسبة إنجاز المركز الثاني ٩٨%
- تمت المباشرة في تنفيذ مركز واحد بعد توفر التمويل بمبلغ (٢٠٠) مليون دينار
- العمل متوقف في تنفيذ المركز الثاني بسبب تأخر التمويل
- سيتم تجهيز المركزين من قبل وزارة الصحة



مركز صحي في قرية النظام / محافظة ديالى

ثالثاً : محافظة الأنبار:

مشروع تجهيز عيادات متنقلة عدد (٩) عيادات بضمنها عيادة طب اسنان عدد (١) واشعة نسائية عدد(١) ضمن برنامج إغاثة النازحين بكلفة (١٤٩٠) مليون دينار (مدرج عام ٢٠١٥)

اهداف المشروع:

الهدف من المشروع تقديم الخدمات الصحية والعلاج اللازم للعوائل النازحة والعائدة لمحافظة الأنبار.

الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد المستفيدين من المشروع بحوالي (١٨٠٠٠) فرد من العوائل النازحة ضمن الرقعة الجغرافية التي يغطيها.

في طريق الإنجاز

- تم أستثناء المشروع من توصيات لجنة الامر الديواني رقم (٣٠) لعام ٢٠١٥ حسب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد: س.ل/ ٧٣٨ بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٦ من اجراءات الاحالة وتوقيع العقد.
- لم يتعاقد على المشروع خلال العامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ لعدم توافر سيولة مالية.
- تم انتفاء الحاجة من المشروع بسبب عودة النازحين ، وطالبت المحافظة برفع المشروع من الخطة بكتابها ذي العدد ٧٧٩٦ في ١٢/٤/٢٠٢١.

رابعاً : محافظة نينوى:

انشاء ابنية مراكز صحية فرعية مع الأجهزة والاثاث عدد (٣) في مركز قضاء الموصل – ناحية القيروان وبكلفة (١٥١٦) مليون دينار (مدرج عام ٢٠١٩) :

يضم المشروع بناء ثلاثة مراكز صحية في قرى (عين فتحي ،عين الحصان ،حلبية) في قضاء سنجار ناحية القيروان وقضاء الموصل ، ويرمي الى تحسين المستوى الصحي من خلال توفير خدمات رعاية صحية للفقراء يسهل عليهم الوصول اليها وسيتم تجهيز المراكز بكادر طبي والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة .

أهداف المشروع:

الهدف من انجاز هذه المراكز الصحية هو توفير خدمات صحية للفقراء تشمل تقديم العلاجات و فحص المرضى في المناطق الفقيرة التي تبنى فيها تلك المراكز.

الشرائح المستفيدة:

يخدم كل مركز صحي حوالي (١٠٠٠٠) آلاف فرد او اكثر من الفقراء ضمن الرقعة الجغرافية التي يغطيها.

في طريق الانجاز

- تمت المباشرة في تنفيذ المركزين الأول والثاني بعد توفر التمويل وتنفيذها من قبل المحافظة.
- تمت احالة مشروع المركز الصحي الثالث في قرية حليبة الى شركة الاحساء في عام ٢٠١٩ وبلغت نسبة إنجازة ٥٥% .
- نسبة انجاز المركز الأول بلغت ٣٥% ونسبة إنجاز المركز الثاني بلغت ٥٠% .
- سيتم تجهيز المراكز بالتنسيق مع وزارة الصحة.

خامساً : محافظة واسط :

انشاء بيت صحي وتجهيز عيادة طبية متنقلة وبكلفة (١٤٩٧) مليون دينار (مدرج عام ٢٠١٩) :

يضم المشروع :

- ١- انشاء بيت صحي في ناحية واسط (قرية شاخة ٨) وناحية شيخ سعد (هور المصندك) وبكلفة ١١٧ مليون دينار.
- ٢- تجهيز عيادة طبية متنقلة الى مديرية صحة واسط في ناحية واسط / ناحية شيخ سعد / ناحية جصان وبكلفة ١,٣٨٠ مليون دينار.
- لم يحال المشروع بسبب الوضع الأمني في المحافظة .

سادساً : محافظة ذي قار :

انشاء مجموعة صحية (١٠) مقاعد مع جناح إضافي سعة (٣) صف الى مدرسة المجد الابتدائية وبكلفة (١٨٣,٣) مليون دينار (مدرج في عام ٢٠١٩) :

- يضم المشروع انشاء مجموعة صحية (١٠) مقاعد مع جناح إضافي سعة (٣) صف الى مدرسة المجد الابتدائية في ناحية الحمار / منطقة البوشامة وبكلفة (١٨٣,٣) مليون دينار.
- لم يحال المشروع بسبب الوضع الأمني في المحافظة.

سابعاً : محافظة النجف الاشرف :

توسعة وتأهيل مركز صحي وبكلفة (٢٨٧,٤) مليون دينار (مدرج في عام ٢٠١٩) :

يضم المشروع توسعة وتأهيل مركز صحي في ناحية الحيدرية وبكلفة (٢٨٧,٤) مليون دينار.
- لم يحال المشروع بسبب الوضع الأمني في المحافظة.

ثامناً : محافظة كركوك :

بناء مراكز صحية في الاقضية والقرى وبكلفة (١٣٦٢) مليون دينار (مدرج في عام ٢٠١٩) :

يضم المشروع :

- ١- بناء مركز صحي في الحويجة/ قرية المنصورة وبكلفة ١٨٨ مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت ٩٠%.
- ٢- بناء مركز صحي في الحويجة / قرية الشهيد وبكلفة ١٨٨ مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت ٩٠%.
- ٣- بناء مركز صحي في داقوق / قرية غيدة وبكلفة ١٨٨ مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت ٩٠%.
- ٤- بناء مركز صحي في دبس/ قرية قوش قاية وبكلفة ١٨٨ مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت ٥٠% بسبب تقديم المحافظة طلب بتغيير الموقع وذلك لتبني اعادة تأهيل هذا المركز من قبل منظمة دولية.
- ٥- بناء مركز صحي في داقوق / مجمع النور وبكلفة ١٨٨ مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت ٩٠%.
- ٦- بناء مركز صحي في داقوق / توسيع مركز صحي البشير وبكلفة ٥٥ مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت ٩٠%.

تاسعاً : محافظة المثنى :

١- انشاء بيوت صحية في المناطق الفقيرة في كل من (الرميثة ، السماوة ، السوير ، المجد ، الوركاء) بعدد (٥) وبكلفة (١٥٧٠) مليون دينار (مدرج في عام ٢٠١٩) :

يضم المشروع :

أ- انشاء بيت صحي في منطقة العكشة (طريق الحمزة السياحي) في الرميثة وبكلفة ٣١٤ مليون دينار ونسبة انجاز بلغت ٤٠%.

ب- انشاء بيت صحي في منطقة وادي ثنان في السماوة وبكلفة ٣١٤ مليون دينار ونسبة انجاز بلغت ٤٥%.

ج- انشاء بيت صحي في قرية الإصلاح في السوير وبكلفة ٣١٤ مليون دينار ونسبة انجاز بلغت ٤٠%.

د- انشاء بيت في منطقة شاطي الغربية (ام العكف) في المجد وبكلفة ٣١٤ مليون دينار ونسبة انجاز بلغت ٤٠%.

هـ- انشاء بيت صحي في منطقة الذيل (ال جريب) في الوركاء والنور وبكلفة ٣١٤ مليون دينار ونسبة انجاز بلغت ٥٧%.

- العمل مستمر في المشاريع اعلاه.

٢- انشاء مراكز صحية فرعية في المناطق الفقيرة عدد /٤ في السماوة والسوير والمجد والهلال وبكلفة (١٨٨٠) مليون دينار (مدرج في عام ٢٠١٩) :

يضم المشروع :

أ- انشاء مركز صحي فرعي ال جساب في السوير وبكلفة ٤٧٠ مليون دينار ونسبة انجاز بلغت ٣٥%.

ب- انشاء مركز صحي فرعي في منطقة ال بو جراد في السماوة وبكلفة ٤٧٠ مليون دينار ونسبة انجاز بلغت ٣٥%.

ج- انشاء مركز صحي فرعي ال بو موسى في الهلال وبكلفة ٤٧٠ مليون دينار ونسبة انجاز بلغت ٣٠%.

د- انشاء مركز صحي فرعي ال إبراهيم في الوركاء وبكلفة ٤٧٠ مليون دينار ونسبة انجاز بلغت ١٠%.

- العمل مستمر في المشاريع اعلاه.

تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية:

اولاً: محافظة ديالى :

مشروع تنفيذ مجمعات ماء صالح للشرب بكلفة (٢,٦٥٠) مليار دينار (مدرج في عام ٢٠١٢) :
يتضمن المشروع مد شبكات ماء لقرى (ابو صيدا ، الاصلاح ، الأحيمر، المخيسة)

اهداف المشروع :

تجهيز المناطق في المحافظة والتي يصعب الحصول فيها على الماء الصالح للشرب ضمن القرى المشار اليها اعلاه فضلا عن توفير فرص عمل للعاطلين في تلك المناطق.

الشرائح المستفيدة:

يخدم هذا المشروع سكان القرى والذي يبلغ عددهم (١٤٥٠) فردا.

في طريق الانجاز:

- تم احالة مشروع قرية الاصلاح وبلغت نسبة الانجاز ٧٥% توقف المشروع بسبب الازمة المالية.
- تم احالة مشروع قضاء المقدادية / قرية المخيسة ولم تنفذ الشركة اي انجاز وذلك بسبب قلة التخصيصات المالية .
- تم رفع مشروع (قرية ابو صيدا , قرية الاحيمر) استنادا الى كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية المرقمة ٦٥١ في ٢٠١٥/١٢/٩.

ثانياً : محافظة نينوى :

١- مشروع تجهيز سيارات حوضية عدد ٧ وتأهيل الطرق في ناحية الشمال بكلفة (١٠) مليار دينار(مدرج في عام ٢٠١٣)

يتضمن المشروع (تطوير مجمعات ماء حطين - اليرموك - خنصور القديمة ، فرش الحصى الخابط للطرق الرابطة بين القرى وتبليط الشوارع المؤدية الى المجمعات المائية التابعة لناحية الشمال وتجهيز سيارات حوضية عدد ٧ لمديرية ماء نينوى) والتي تتولى مهام توزيع المياه الصالحة للشرب الى القرى النائية، وينفذ المشروع في ناحية الشمال في محافظة نينوى والتي تعاني من نقص في الماء الصالح للشرب وذلك لبعدها عن مصادر المياه والاعتماد على مياه الابار لهذا الغرض.

اهداف المشروع:

تجهيز مناطق في المحافظة تعاني من قلة توفر الماء الصالح للشرب، فضلا عن توفير فرص عمل للعاطلين في تلك المناطق، كما ان هذا المشروع يخدم مناطق تضم قرى تعاني من تدني نسبة الطرق والشوارع الداخلية المبلطة مما يؤدي الى صعوبة الوصول الى المراكز الخدمية وخاصة في ظل صعوبة التنقل كون تلك المناطق جبلية.

الشرائح المستفيدة:

يخدم هذا المشروع سكان تلك القرى والبالغ عددهم (٢١٤) الف نسمة.

في طريق الإنجاز:

- تم احالة مشروع تبليط الطرق الرابطة بين القرى وبلغت نسبة الانجاز ٢٥% ، توجد مستحقات مالية وتم اجراء تسوية حسب قرار ٣٤٧ لسنة ٢٠١٩.
- تم احالة مشروع فرش الحصى الخابط للطرق المؤدية الى المجمعات السكنية في ناحية الشمال ٩٠% ، توجد مستحقات مالية . تم اجراء تسوية حسب قرار ٣٤٧ لسنة ٢٠١٦ .
- تم احالة مشروع تجهيز سيارات حوضية عدد ٧ ولم يوقع العقد وبعد التحرير لم تراجع الشركة لغاية الان مما دفع المحافظة بطلب رفع المشروع.
- لم يحال مشروع تطوير مجمعات ماء (حطين - اليرموك - خنصور القديمة) بسبب الوضع الأمني.
- توقفت جميع المشاريع بسبب الوضع الامني التي تلت احداث حزيران عام ٢٠١٤ .
- تمت المصادقة على خطة المحافظة لعام ٢٠١٨ وبسبب معوقات في الإجراءات الإدارية تم وضع مبلغ التخصيص في صندوق حسابات المحافظة كأمانات.

٢- مشروع تجهيز سيارات حوضية سعة ١٦ الف لتر عدد ٦٤ بكلفة (١٥٩٨٤) مليون دينار

(مدرج في عام ٢٠١٩) :

يتضمن المشروع تجهيز سيارات حوضية سعة ١٦ الف لتر من المياه الصالحة للشرب عدد ٦٤ لمديرية ماء نينوى والتي تتولى مهام توزيع المياه الصالحة للشرب الى القرى النائية، وينفذ المشروع في الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة والتي تعاني من نقص في الماء الصالح للشرب وذلك لبعدها عن مصادر المياه.

اهداف المشروع:

تجهيز مناطق في المحافظة تعاني من قلة توفر الماء الصالح للشرب، فضلا عن توفير فرص عمل للعاطلين في تلك المناطق .

الشرائح المستفيدة:

يخدم هذا المشروع سكان المناطق الفقيرة في الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة.

في طريق الإنجاز:

تم احالة المشروع الى شركة حلال السلطان للتجارة والمقاولات العامة وبلغت نسبة الانجاز ٥٠% .

٣- مشروع تأهيل مشاريع الماء في نواحي (القيروان – ربيعة) بكلفة (٥٥٤) مليون دينار (مدرج في عام ٢٠١٩) :

يتضمن المشروع تأهيل آبار عدد (٥) مع تأهيل محطة ضخ في قرية كوجو التابعة لناحية القيروان وانشاء محطة ماء بئر الواقعة في قرية ابطخ الشور في ناحية ربيعة ، وينفذ المشروع في الاقضية (سنجار – تلعفر) والنواحي (القيروان – ربيعة) التابعة للمحافظة والتي تعاني من نقص في الماء الصالح للشرب.

اهداف المشروع:

تجهيز المناطق التي تعاني من قلة توفر الماء الصالح للشرب في المحافظة.

الشرائح المستفيدة:

يخدم هذا المشروع سكان المناطق الفقيرة في الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة.

في طريق الإنجاز:

- مشروع تأهيل الآبار عدد (٥) وبلغت نسبة إنجازها ٥٠% وتم مفاتحة المحافظة على الموافقة على استبدال العمل وتبديل شبكات ماء لعدة قرى وبموجب الكتاب المرقم (١٩٥٠) في ٢٠٢١/١/١٩.
- تم احالة مشروع محطة الماء الى شركة خيرات نينوى للمقاولات العامة وبلغت نسبة الانجاز ٩٠% وهناك مفاتحة من قبل المحافظة مع معاونية الاعمار حول موقف العمل بسبب عدم صرف سلفة الشركة.

٤- مد وتبديل شبكات ماء في مركز قضاء البعاج ونواحي (ربيعة - الشورة) بكلفة (١٠٥٥) مليون دينار (مدرج في عام ٢٠١٩) :

يتضمن المشروع مد شبكات ماء داخلية لقرى (تلول ناصر ، حضرة الفاضل ، شويرات ، هرارة) التابعة لناحية الشمال في مركز قضاء الموصل / ناحية الشورة ، ومد شبكة ماء لقرية (خراب العرنة ، صالحية الشاهين) في مركز قضاء البعاج ، وتأهيل وإصلاح شبكة ماء اليرموك في مركز قضاء البعاج ، وتبديل شبكات ماء في قضاء تلعفر / مركز ناحية ربيعة ، وايصال الماء ومد شبكات الى قرية سروج التابعة لمركز قضاء البعاج وينفذ المشروع في الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة والتي تعاني من نقص في الماء الصالح للشرب.

اهداف المشروع:

تجهيز المناطق في المحافظة التي تعاني من قلة توفر الماء الصالح للشرب، فضلا عن توفير فرص عمل للعاطلين في تلك المناطق.

الشرائح المستفيدة:

يخدم هذا المشروع سكان المناطق الفقيرة في الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة.

في طريق الإنجاز:

- مشروع مد شبكات ماء داخلية لقرى (تلول ناصر ، حضرة الفاضل ، شويرات ، هرارة) التابعى لناحية الشورة تنفيذ امانة وبكلفة ٢٦١ مليون دينار وبلغت نسبة إنجاز ه ٧٠%.
- مشروع مد شبكة ماء لقرية (خراب العرنة ، صالحية الشاهين) في مركز قضاء البعاج احيل الى شركة الرؤى الذهبية للمقاولات العامة وبكلفة ٢٧٨ مليون دينار وتم انجاز العمل بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٠ وبنسبة ١٠٠% .
- مشروع تأهيل وإصلاح شبكة ماء اليرموك في مركز قضاء البعاج / تنفيذ امانة وبكلفة ٩٦ مليون دينار وبلغت نسبة إنجاز ه ١٠٠%.
- مشروع تبديل شبكات ماء في قضاء تلعفر / مركز ناحية ربيعة / تنفيذ امانة وبكلفة ٧٤ مليون دينار وبلغت نسبة إنجاز ه ٩١%.

- مشروع اىصال الماء ومد شبكات الى قرية سروج التابعة لمركز قضاء البعاج اهيل الى شركة الرؤى الذهبية للمقاولات العامة وبكلفة ٣٤٦ مليون دينار وتم انجاز العمل بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢ وبنسبة ١٠٠% .

٥- تجهيز ونصب خزان ماء هوائي سعة ٣٢٥٠ م^٣ في مركز تشغيل ربيعة بكلفة (٢٤٨) مليون دينار (مدرج في عام ٢٠١٩) :

يتضمن المشروع تجهيز ونصب خزان ماء هوائي سعة ٣٢٥٠ م^٣ في قضاء تلعفر / مركز تشغيل ربيعة اذ يخدم المشروع المناطق الفقيرة التابعة للمحافظة والتي تعاني من نقص في الماء الصالح للشرب.

اهداف المشروع:

تجهيز المناطق في المحافظة التي تعاني من قلة توفر الماء الصالح للشرب، فضلا عن توفير فرص عمل للعاطلين في تلك المناطق.

الشرائح المستفيدة:

يخدم هذا المشروع سكان المناطق الفقيرة في المناطق التابعة للمحافظة.

في طريق الإنجاز:

احيل المشروع الى شركة الرؤى الذهبية للمقاولات العامة وبكلفة ٢٤٨ مليون دينار وبلغت نسبة إنجازه ١٠٠% وتم انجاز العمل بتاريخ ٢٠٢١/٤/١ .

ثالثاً : محافظة واسط :

١- تجهيز ونصب وتوسيع مجمعات مائية مختلفة السعات مع خطوط ناقلة مختلفة الأقطار لتغذية وايصال الماء الصالح للشرب الى القرى الغير مخدمة في ريف ناحية البشائر وبكلفة (١,٣٤٤) مليون دينار (مدرج في عام ٢٠١٩) :

يضم المشروع :

- أ- تأهيل وتوسيع مجمع ماء البشائر من (٢٠٠-٤٠٠) م^٣/س لتغذية قرى (القدس-بلاسم-الشهيد أبو كرار-البلابلة) وبكلفة ١٦٩ مليون دينار.
- ب- توسيع مجمع ماء سينا والقدانيين من (٢٠٠-٤٠٠) م^٣/س لايصال ماء لقرى (بغداد-الشمس-العاصمية-جرف الشط) وبكلفة ١٥٩ مليون دينار.

- ج- توسيع مجمع العكار من (٢٠٠-٤٠٠) م^٣/س لتغذية وايصال ماء لقرى (محمد الحائري - المشاركة) وبكلفة ١٣٧ مليون دينار.
- د- تبديل وتوسيع الخط الناقل الرئيسي نوع دكتابل بطول ٢ كم لمجمع ماء البشائر لزيادة كميات الماء لقرى (القدس الجانب الايسر-الثورة-الجولان) وبكلفة ٢٤٠ مليون دينار.
- هـ - تجهيز ونصب مجمعات طاقة ١٠٠ م^٣/س لايصال الماء لقرى (الحسيني-جرف الشط-الطلائع) وبكلفة ١١٧ مليون دينار.
- و- تجهيز ومد خطوط ناقلة نوع بلاستيك بطول ٦ كم لايصال الماء لقرى (انصار الحسين-المشاركة-الانوار-اطراف الخلود-سيد حيدر) وبكلفة ١٩٠ مليون دينار.
- ز- تجهيز ومد خطوط ناقلة وشبكات نوع بلاستيك بطول ١٠ كم لايصال الماء لقرى متفرقة البلايلة وخط الكركة الجانب الأيمن والصلايط وقرية سيد سلمان وقرى الانوار والثورة والطلائع في ناحية البشائر وبكلفة ٣٣٣ مليون دينار.
- لم يحال المشروع بسبب الوضع الأمني (التظاهرات).

٢- تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة ١٠٠ م^٣/ساعة وتوسعة مجمع ماء بطاقة ٢٠٠ م^٣/ساعة الى ٤٠٠ م^٣/ساعة مع مد شبكات وخطوط ناقلة مختلفة الأقطار وبطول كلي (٤٣٩٩٠ متر) لايصال الماء الى القرى الغير مخدومة في ريف ناحية واسط وبكلفة (١,١٠٠) مليون دينار (مدرج عام ٢٠١٩) :

يضم المشروع :

- ١- تجهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء مجمعة طاقة ١٠٠ م^٣/س مع الشبكة بطول كلي ١٤٧٣٠ م لقرى (سيد عيسى-البو حسين-علوان محيسن-بيت ضويحي-البدو-وسكن متناثر في ريف ناحية واسط) وبكلفة ٤٢٢ مليون دينار.
- ٢- توسعة مجمع ماء كيلو ٥١ من (٢٠٠-٤٠٠) م^٣/س مع الشبكة بطول ١٤٨٣٠ م لقرى (المعالي-علاوي هبسي-نجمان عبيد-عطية عرنوص-حسين عرمش-اثار واسط-شجاع فنجان-وسكن متناثر في ريف ناحية واسط) وبكلفة ٤٢٩ مليون دينار.

٣- تجهيز ومد انابيب بلاستيك بطول ١٤٤٣٠م لقرى كيلو ٣٦ (خليل داود-القدس-البو خليفة- حسان هويدي مع مدرسة ابتدائية وسكن متناثر في ريف ناحية واسط) وبكلفة ٢٤٩ مليون دينار.

- لم يحال المشروع بسبب الوضع الأمني (التظاهرات) .

رابعاً : محافظة ذي قار :

انشاء مجمعات ماء بسعات مختلفة (٣م٦٠٠/ساعة و ٣م٥٠٠/ساعة و ٣م٤٠٠/ساعة و ٣م٢٠٠/ساعة) وتأهيل مجمعات ماء مع مد شبكات ماء وخطوط ناقلة وبكلفة (١٣٠٧٥) مليون دينار (مدرجة في عام ٢٠١٩) :

تضم المشاريع الآتية:

- ١- انشاء مجمع ماء سعة ٣م٤٠٠/س قرب المجمع الخمسة لتغذية مناطق حي اريدو وحي سومر ومجمع ماء سعة ٣م٢٠٠/س قرب المجمع السبعة لتغذية مناطق الفجوة في الناصرية وبكلفة ٢٢٨١ مليون دينار وان عدد المستفيدين من هذا المشروع (٣٣٠٠).
- ٢- انشاء مجمع ماء سعة ٣م٤٠٠/س قرب محطة ضخ الفضلية لتغذية مناطق (دور الأساتذة - الإسكان القديم- مجمع الشموخ) في الناصرية وبكلفة ١٨٦٤ مليون دينار وان عدد المستفيدين من هذا المشروع (٢٢٠٠).
- ٣- مد شبكات ماء في الجبايش وبكلفة ١٥٤,١ مليون دينار وان عدد المستفيدين من هذا المشروع (٤٠٨٧٥).
- ٤- انشاء مجمع ماء سعة ٣م٥٠٠/س مع خط ناقل وشبكة ماء في ناحية الطار وبكلفة ٢٠٩١,٥ مليون دينار وان عدد المستفيدين من هذا المشروع (٢٨٠٠).
- ٥- انشاء مجمع ماء سعة ٣م٤٠٠/س لتغذية مناطق (الصخبين- العليمين- حي الرسول- شارع ٣٠) في حي اور في الناصرية وبكلفة ١٩٧٨ مليون دينار وان عدد المستفيدين من هذا المشروع (٢٢٠٠).
- ٦- انشاء مجمع ماء سعة ٣م٦٠٠/س قرب محطة ضخ الفضلية لتغذية المناطق (ال حبوش- السكك- قرية عبد ميس- خلف الكناوزة- المنصورية- البوابة) في الناصرية وبكلفة ٢٦٣٣ مليون دينار وان عدد المستفيدين من هذا المشروع (٣٣٠٠).
- ٧- انشاء مجمع ماء سعة ٣م٢٠٠/س لتغذية شبكات ماء في سوق الشيوخ وبكلفة ١٠٨٧ مليون دينار وان عدد المستفيدين من هذا المشروع (١١٠٠).

- ٨- تأهيل مجمعات ماء مع مد شبكات ماء وخطوط ناقلية في سيد دخيل وبكلفة ٩٨٥ مليون دينار وان عدد المستفيدين من هذا المشروع (١٦٨٠٦).
- لم يحال المشروع بسبب الوضع الأمني (التظاهرات).

خامساً : محافظة النجف الاشرف :

تطوير مجمع ماء الحيدرية مع مد الخط الناقل للماء بقطر (٥٠٠) ملم شمال الكوفة وبكلفة (٢٠٥٩) مليون دينار (مدرجة في عام ٢٠١٩) :

يضم المشروع :

- ١- تطوير مجمع ماء الحيدرية لايصال الماء الصافي للمناطق المحرومة في ناحية الحيدرية وبكلفة ١٠٥١,٣ مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت ٧٠%.
- ٢- مد الخط الناقل للماء بقطر (٥٠٠) ملم من مشروع مجمع ماء شمال الكوفة لتغذية الاحياء الفقيرة في شمال مدينة النجف وبكلفة ٦٠١,٦٨ مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت ١٠٠%.

سادساً : محافظة كركوك :

تجهيز ونصب وحدات تحلية في اضية ونواحي المحافظة وبكلفة (١٢٥٠) مليون دينار (مدرجة في عام ٢٠١٩) :

يضم المشروع :

- ١- تجهيز وحدات تحلية في ناحية الرشاد وبكلفة ٢٦٠ مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت ١٠٠%.
- ٢- تجهيز ونصب وحدات تحلية في قضاء داقوق وبكلفة ٢٤٩ مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت ١٠٠%.
- ٣- تجهيز ونصب وحدات تحلية في قاطع الرشاد وبكلفة ٢٤٩ مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت ١٠٠%.
- ٤- تجهيز ونصب وحدات تحلية في قاطع الدبس وبكلفة ٢٤٩ مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت ١٠٠%.
- ٥- تجهيز طواقم غطاس في مناطق محررة مختلفة وبكلفة ٢٤٥٨ مليون دينار وبنسبة انجاز بلغت ١٠٠%.

سابعاً : محافظة كربلاء :

١- تأهيل المجمعات المائية وتجهيز وتنفيذ انابيب وملحقات بلاستيكية وبكلفة (١٨٢٤) مليون دينار (مدرجة في عام ٢٠١٩) :

أ- تجهيز وتنفيذ انابيب وملحقات بلاستيكية لفتح الاختناقات وايصال الماء الى كافة مناطق القرى والارياف وبكلفة ١٣٨٢ مليون دينار المشروع محال وحسب عقد المقولة رقم (١) في ٢٠٢٠/٦/٥ ولم يتم المباشرة لعدم التمويل.

ب- تأهيل المجمعات المائية لايصال الماء الصالح للشرب للقرى التي تعاني من الفقر في (الحسينية, الخيرات , الجدول الغربي , الحر) وبكلفة ٤٤١ مليون دينار تم الإعلان عن المشروع ولم يحال بسبب قلة التخصيصات.

٢- تجهيز ونصب وحدات ماء بسعات مختلفة (٣٥٠٠م^٣/ساعة و ٣٢٠٠م^٣/ساعة) مع مد خط ناقل بقطر ٤٠٠ملم وبطول ١٢٠٠م وبكلفة (٢٥٢٩) مليون دينار (مدرجة في عام ٢٠١٩) :

أ- تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة ٥٠٠ متر^٣/ساعة في منطقة الوند / قضاء الحسينية وبكلفة ١٠٤٧ مليون دينار، تم الإعلان عن المشروع وفي طور الاحالة.

ب- تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة ٢٠٠ متر^٣/ساعة اضافي مع مشروع الخيرات والفارس مع مد خط ناقل قطر ٤٠٠ملم وبطول ١٢٠٠متر وبكلفة ٦٣٠ مليون دينار، تم الإعلان عن المشروع ولم يحال بسبب قلة التخصيصات.

ج- تجهيز و نصب وحدة ماء مجمعة سعة ٢٠٠ متر^٣/ساعة في (الجديّة , الزعبية , الابراهيمية , اطراف منطقة الجديّة) وبكلفة ٤٧٥ مليون دينار ، تم الإعلان عن المشروع وفي طور الاحالة.

٣- تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة لخدمة ارياف الحر وخط ناقل بقطر ٤٠٠ملم في قضاء عين تمر وبكلفة (٨٧٩) مليون دينار (مدرجة في عام ٢٠١٩) :

أ- تجهيز وتنفيذ الخط الناقل قطر ٤٠٠ ملم في قضاء عين تمر وبكلفة ٤٨٠ مليون دينار، تم الإعلان عن المشروع ولم يحال بسبب قلة التخصيصات.

ب- تنفيذ الخطوط الناقلة لخدمة ارياف الحر (السواده و الحر الصغير و الحيدرات) وبكلفة ٣٩٨ مليون دينار، تم الإعلان عن المشروع ولم يحال بسبب قلة التخصيصات.

٤- مد شبكة انابيب وخط طوارئ وتجهيز وتنفيذ شبكة ماء في قضاء (الحسينية ، الحر) وبكلفة (٣٣٧) مليون دينار (مدرجة في عام ٢٠١٩) :

- أ- مد شبكة انابيب وخط طوارئ في قضاء الحسينية / منطقة البو حويمد البزل وبكلفة ١٣٣ مليون دينار، تم الإعلان عن المشروع ولم يحال بسبب قلة التخصيصات.
- ب- تجهيز وتنفيذ شبكة ماء في قضاء الحر / منطقة الانوار وبكلفة ٢٠٤ مليون دينار، تم الإعلان عن المشروع ولم يحال بسبب قلة التخصيصات.

ثامناً : محافظة ديالى :

تجهيز ونصب مجمعات ماء بسعات مختلفة (٣م٥٠٠/ساعة و ٣م١٠٠/ساعة) وصيانة وتأهيل مجمع ماء وبكلفة (٣٣٢٦) مليون دينار (مدرجة في عام ٢٠١٩) :

- ١- تجهيز ونصب مجمع ماء سعة ١٠٠ م٣/ساعة في قرية امام عسكر / بلد روز ولم يتم المباشرة لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.
- ٢- تجهيز ونصب مجمع ماء سعة ٥٠٠ م٣/ساعة في بعقوبة الغربي / بعقوبة ولم يتم المباشرة لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.
- ٣- صيانة وتأهيل مجمع ماء في الزركانية / السد العظيم ولم يتم المباشرة لعدم التمويل.
- ٤- انشاء ونصب مجمع ماء ربع مليون غالون في احمد دبي / كنعان ولم يتم المباشرة لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.
- ٥- تجهيز ونصب مجمع ماء سعة مليون غالون في حي الحسين / الخالص ولم يتم المباشرة لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.

تاسعاً : محافظة بغداد :

كشف وتأهيل مجمعات وشبكات ماء وتأهيل خطوط ناقلية وتجهيز ونصب مجمعات ماء بسعات مختلفة (٣م٢٠٠/ساعة و ٣م١٠٠/ساعة) وبكلفة (١٧١١١) مليون دينار (مدرجة في عام ٢٠١٩) :

- يضم المشروع كشف وتأهيل مجمعات وشبكات ماء وتأهيل خطوط ناقلية وتجهيز ونصب مجمعات ماء بسعات مختلفة (٣م٢٠٠/ساعة و ٣م١٠٠/ساعة) وبكلفة (١٧١١١) مليون دينار وبعدها (٥٥) مكون في مناطق متعددة في المحافظة .
- لم يتم المباشرة بالعمل بسبب لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.

عاشراً : محافظة ميسان :

تأهيل وتوسيع مجمعات ماء بسعات مختلفة (٣٥٠م^٣/ساعة و ٣٢٠٠م^٣/ساعة الى ٣٢٥٠م^٣/ساعة)
وتجهيز آليات تخصصية وإيصال الماء الى ناحية بني هاشم وبكلفة (١٦٠١) مليون دينار (مدرجة
في عام ٢٠١٩) :

يتضمن المشروع :

١- تأهيل وتوسيع مجمع ماء المهدي ٣٥٠م^٣/ساعة مع الخط الناقل وبكلفة ٣٠٤ مليون دينار، ولم
يتم المباشرة بالعمل بسبب لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.

٢- تأهيل وتوسيع مجمع ماء الاكرح من ٣٢٠٠م^٣/ساعة الى ٣٢٥٠م^٣/ساعة وبكلفة ٢٤٣ مليون
دينار، ولم يتم المباشرة بالعمل بسبب لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.

٣- استبدال الأجزاء المتضررة من شبكة ماء الاكرح وتوسيعها للقري (البزون ،النعناعه ،ام
سميجه ،العليل ،الخشاشة ، ام ساعة) وبكلفة ٥٦٤ مليون دينار، ولم يتم المباشرة بالعمل
بسبب لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.

٤- تجهيز آليات تخصصية لناحية بني هاشم وبكلفة ٤٨٨ مليون دينار، ولم يتم المباشرة بالعمل
بسبب لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.

- لم يتم المباشرة بالعمل بسبب لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.

احدى عشر : محافظة المتنى :

١- مد شبكات ماء في المناطق والقرى الفقيرة في كل من (سيد عقيل ، ام لحم الشبانات ، سيد
كهيو ، ناجح هادي) بعدد (٤) وبكلفة (٦٦٦) مليون دينار (مدرج في عام ٢٠١٩) :

يتضمن المشروع مد شبكات ماء لمناطق سيد عقيل وام لحم الشبانات وقرية سيد كهيو المرحلة
الثانية وقرية ناجح هادي عبادي وبكلفة ٦٦٦ مليون دينار ونسبة انجاز بلغت ١٠٠% ، وانجز
المشروع من قبل شركة ضياء العراق الأول بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٨ وبموجب كتاب الاحالة المرقم
١٠٨٢ في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ .

٢- مد شبكات ماء مع انشاء خزان ارضي سعة ٢٠٠ م٣ في المناطق الفقيرة وبكلفة (٦٦٥) مليون دينار (مدرج في عام ٢٠١٩) :

يتضمن المشروع مد شبكات ماء مع انشاء خزان ارضي سعة ٢٠٠ م٣ مع محطة رفع ومولدة للقوى الممتدة على طريق السبيس بين الشوفة والنجمي المرحلة الثانية وبكلفة ٦٦٥ مليون دينار ونسبة انجاز بلغت ٨٥% ، وينفذ المشروع من قبل شركة ارض المجالس للمقاولات العامة المحدودة وبموجب كتاب الإحالة المرقم ١٠٩٧ في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

٣- تجهيز ونصب وتشغيل وحدة مجمعة سعة ٢٤٠ م٣/ساعة مع الشبكة لمناطق البو ناصر والنخيلة والمنصورية في المناطق الفقيرة وبكلفة (١٢١٨) مليون دينار (مدرج في عام ٢٠١٩) :

يتضمن المشروع تجهيز ونصب وتشغيل وحدة مجمعة سعة ٢٤٠ م٣/ساعة مع الشبكة لمناطق البو ناصر والنخيلة والمنصورية وبكلفة ١٢١٨ مليون دينار ونسبة انجاز بلغت ٤٣% ، وينفذ المشروع من قبل مجموعة المقداد العراقية للمقاولات وبموجب كتاب الإحالة المرقم ١٠٩٠ في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ .

٤- تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة ٥٠ م٣/ساعة في منطقة عجوير ومنطقة سيد رعد مع خط ناقل ٨ انج بلاستيك في ناحية المجد وبكلفة (٤٢٣) مليون دينار (مدرج في عام ٢٠١٩) :

يتضمن المشروع تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة ٥٠ م٣/ساعة في منطقة عجوير ومنطقة سيد رعد مع خط ناقل ٨ انج بلاستيك في ناحية المجد وبكلفة ٤٢٣ مليون دينار ونسبة انجاز بلغت ٢٥% ، وينفذ المشروع من قبل شركة الرواية البيضاء للمقاولات العامة المحدودة وبموجب كتاب الإحالة المرقم ٢٠٦ في ١٩ / ٢ / ٢٠٢٠ .

جدول رقم (٣) المشاريع المدرجة ونسب انجازها ضمن المحصلة الثانية

ت	اسم المشروع	الوزارة او المحافظة	الكلفة الكلية (بالمليون)	المصرف التراكمي (بالمليون)	نسبة الإنجاز (%)	الملاحظات
١	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	كركوك	١٢٥٠		١٠٠	
٢	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	المثنى	٦٦٦	٥٧٥,٠٦	١٠٠	
٣	انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	الصحة	٥٠٠٠	٢٨,٥٤٩	٧٤	
٤	انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	ديالى	١٢٥٠	٨١٩	٩٩	
٥	انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	نينوى	١٥١٦	٣٥٣,٥١٥	٥٠,٤	
٦	انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	كركوك	١٣٦٢	-	٧٣	
٧	انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	المثنى	١٥٧٠	١٨٥,٣٩	٤٤,٤	
٨	انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	المثنى	١٨٨٠	٢٥,٠٠	٢٧,٥	
٩	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	ديالى	٢٦٥٠	٣٤٥	٣٧,٥	

١٠	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	نينوى	١٠٠٠٠	-	٣٢,٢
١١	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	نينوى	١٥٩٨٤	-	٥
١٢	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	نينوى	٥٥٤	-	١٠,٧
١٣	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	نينوى	١٠٥٥	١٠٨,٣	٣٦,٦
١٤	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	نينوى	٢٤٨	-	١٢
١٥	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	النجف الاشرف	٢٠٥٩	٤٤٤,٩٠٦	٨١
١٦	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	المنشي	٦٦٥	٤٩٦,٧٩	٨٥
١٧	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	المنشي	١٢١٨	٣٢٨,٣٧	٤٣
١٨	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	المنشي	٤٢٣	-	٢٥
١٩	انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	الانبار	١٤٩٠	-	-
٢٠	انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	واسط	١٤٩٧	-	-
٢١	انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	ذي قار	١٨٣٣	-	-

	-	-	٢٨٧٤	النجف الاشرف	انشاء وتاهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	٢٢
	-	-	١٣٤٤	واسط	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	٢٣
	-	-	١١٠٠	واسط	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	٢٤
	-	-	١٣٠٧٥	ذي قار	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	٢٥
	-	-	١٨٢٤	كربلاء	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	٢٦
	-	-	٢٥٢٩	كربلاء	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	٢٧
	-	-	٨٧٩	كربلاء	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	٢٨
	-	-	٣٣٧	كربلاء	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	٢٩
	-	-	٣٣٢٦	ديالى	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	٣٠
	-	-	١٧١١١	بغداد	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	٣١
	-	-	١٦٠١	ميسان	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	٣٢

المحصلة الثالثة تحسين تعليم الفقراء



المحصلة الثالثة

تحسين تعليم الفقراء

يسهم التعليم في تحريك عملية التنمية والتخفيف من الفقر وتحسين في مستوى صحة الأفراد والمساواة بين الجنسين وضمان الاستقرار في المجتمع وإشاعة السلم المجتمع. ويحقق عوائد ودخول أعلى ومستدام .

تبنيت الاستراتيجية مجموعة من الأنشطة للوصول الى تحسين تعليم الفقراء في ضوء مبادئ الاستراتيجية الرامية الى تمكين الاطفال الفقراء ذكورا واناثا من اكمال دراستهم ضمن خطة تزامنت وتوازت مع اهداف أجندة ٢٠٣٠ الهدف الرابع الذي نص على "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع" . باعتبار بعد التعليم من الأبعاد الأساسية للفقراء، كل ذلك دفع الجهات القائمة على الاستراتيجية الى توجيه اهتمامها بالغا لتوفير البيئة الدراسية المناسبة من خلال تبني مشروع هدم واعادة بناء المدارس الطينية في العراق وهو من اهم ما نفذته الاستراتيجية فضلا عن مشاريع كانت تستهدف تحسين الواقع التعليمي للفقراء في العراق .

بناء و تأهيل و صيانة المدارس في المناطق الفقيرة:

أولا : وزارة التربية:

مشروع ازالة المدارس الطينية في العراق بكلفة (٢٨٣٩١٠) ملياردينار (مدرج عام ٢٠١٢):
تم تخصيص مبلغ (١٤٠) مليار دينار في عام ٢٠١٢ لمشروع ازالة المدارس الطينية ، والذي يشمل هدم (٤٠٩) مدرسة طينية، وبناء مدارس بديلة وفق نمط البناء التقليدي او الجاهز وحسب ما تقتضيه عملية فحص التربة في تلك المنطقةشمل المشروع محافظات العراق عدا اقليم كردستان كما لم يشمل التخصيص المحافظات الانبار ،كربلاء ،النجف لعدم وجود مدارس طينية فيها.
لتنفيذ المشروع خضعت (٢٢٧) مدرسة في الوسط والجنوب الى نمط البناء التقليدي ، في حين واجهت مدارس محافظات ديالى، صلاح الدين، كركوك، نينوى تحديات البناء الجاهز(الكونكريتي) بسبب طبيعة تلك المناطق.

عانى النشاط من تأخير في التنفيذ بسبب تلك الشركات المنفذة وخاصة للمدارس التي بنيت وفق نمط البناء الجاهز وقد تم تشخيص الخلل في الاعوام السابقة والذي يعود الى محدودية شركات البناء

الجاهز وحدائة تجربة البناء وفق هذا الاسلوب في العراق مما حدانا الى مخاطبة الجهات المعنية بهدف حل تلك التحديات وتمت الاستجابة من خلال تغيير جهة التنفيذ الى الإدارات المحلية وتغيير أسلوب البناء في بعض المواقع من أسلوب البناء الجاهز الى أسلوب البناء التقليدي. علماً ان المشروع أحيل الى ثلاث شركات حكومية هي:

- الشركة العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية رقم المقاوله (٣٣) وزارة الصناعة والتي تنفذ (١٢٧) مدرسة في المحافظات (البصرة ، ميسان ، المتنى، ذي قار).
- شركة المنصور العامة رقم المقاوله (٣٤) وزارة الأعمار والإسكان والتي تنفذ (١٠٠) مدرسة في المحافظات القادسية، واسط، بابل، الكرخ ١ ، الكرخ ٢ ، الكرخ ٣.
- شركة الصمود العامة رقم المقاوله (٣٦) وزارة الصناعة والتي تنفذ (٦٢) مدرسة بأسلوب البناء الجاهز و(٥٥) مدرسة بأسلوب البناء التقليدي ،في المحافظات ديالى ، صلاح الدين، كركوك، نينوى ، تنفذ هذه المدارس وفق نمط البناء الجاهز ، وبسبب الظروف الأمنية والعمليات العسكرية فيها تم الغاء المقاوله خلال عام ٢٠١٨ بالاستناد الى قرار (٤١٧) لسنة ٢٠١٤.
- تم تحويل جهة التنفيذ لـ (٦٥) مدرسة في محافظات (صلاح الدين ، نينوى ، ديالى ، كركوك) من وزارة التربية (شركة الصمود) الى الإدارات المحلية في المحافظات المذكورة أعلاه. والتي تم الغاءها ضمن المقاوله رقم (٣٦) وزارة الصناعة والمعادن .

اهداف المشروع:

يهدف المشروع الى القضاء على المدارس الطينية كافة واستبدالها بمدارس ذات مواصفات تؤدي الى تحسين كفاءة التعليم في المدارس التي يرتادها الفقراء بشكل خاص وتشكل عاملا حاسما في اجتذاب المزيد منهم الى مقاعد الدراسة وضمان عدم تسربهم من المدارس.

الشرائح المستفيدة:

تخدم المدارس حوالي ١٢٩ الف طالب في المناطق الفقيرة التي انشأت ضمنها.

في طريق الانجاز:

- تم انجاز (١٤٤) مدرسة في حين ماتزال (١٠٨) مدرسة قيد التنفيذ والمشروع متوقف بسبب قلة التخصيص المالية .

- تم الغاء (١٥٧) مدرسة ضمن مقابلة (٢٦) حسب قرار (٤١٧) لسنة ٢٠١٤ .
- بلغت نسبة الإنجاز الكلي للمشروع (٧٩%)



مدرسة الوردة البيضاء / محافظة واسط

الجدول رقم (٤) نسب انجاز مشروع ازالة المدارس الطينية في العراق

ت	الموقع	عدد المدارس الكلي	الملاحظات
١	نينوى	(٣٨) مدرسة	- تم انجاز ٥ مدارس من المجموع الكلي قبل احداث حزيران ٢٠١٤ التي تسببت بتوقف المشروع. - تم الغاء (٣٣) مدرسة .
٢	كركوك	(٢٩) مدرسة	-تم انجاز ٣ مدارس من المجموع الكلي. - تم الغاء (٢٦) مدرسة.
٣	ديالى	(١٧) مدرسة	- تم انجاز ٤ مدارس من المجموع الكلي. - تم الغاء (١٣) مدرسة.
٤	بغداد	(١٩) مدرسة	- انجز المشروع/ عدد المدارس المنجزة ١٩ مدرسة.
٥	بابل	(١٠) مدرسة	- انجز المشروع / عدد المدارس المنجزة ١٠ مدرسة.
٦	واسط	(٢٦) مدارس	- انجز المشروع / عدد المدارس المنجزة ٢٦ مدرسة.
٧	صلاح الدين	(٩٨) مدرسة	

٨	القادسية	(٤٥) مدرسة	- المشروع منجز/عدد المدارس المنجزة (٤٥) مدرسة
٩	المنثى	(١٥) مدرسة	- المشروع متلكئ/عدد المدارس المنجزة (٦) مدرسة وبقية المدارس (٩) مدارس تتراوح نسب الإنجاز من ٣٢% - ٩٣%
١٠	ذي قار	(١٠٦) مدرسة	- المشروع متلكئ/عدد المدارس المنجزة (١١) مدرسة وبقية المدارس (٩٥) مدرسة تتراوح نسب الإنجاز من ٢٦% - ٩٠%
١١	ميسان	(٥) مدارس	- المشروع متوقف في (٥) مدارس.
١٢	البصرة	(١) مدرسة	- انجز المشروع/ عدد المدارس المنجزة (١) مدرسة
	المجموع	٤٠٩ مدرسة	

ثانياً: محافظة النجف:

١-أنشاء (٤) مدارس ذات ١٨ صف بكلفة (٧,٦٤٣) مليار دينار مدرج في عام (٢٠١٣):

تبنت المحافظة ضمن أولوياتها لتخفيف الفقر انشاء (٤) مدارس تتألف المدرسة من طابقين وتضم ١٨

صف يتسع كل صف الى ٣٥ طالب . موزعة على المناطق الآتية:



- حي السلام/ قضاء الكوفة.

- ناحية الحيدرية/ قضاء النجف.

- حي ميسان/ قضاء الكوفة.

- حي الزهراء / قضاء المناذرة.

اهداف المشروع:

يهدف المشروع الى:

- فك الاختناقات الحاصلة في المدارس ذات الدوام المزدوج.
- توفير فرص عمل في المحافظة خلال مدة انجاز المشروع.

الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد الطلاب المستفيدين من المشروع بحوالي ٢٥٢٠ طالب.

في طريق الإنجاز:

- تم احالة المشروع الى شركات القطاع الخاص خلال عام ٢٠١٣.
- انجز مشروع انشاء مدرسة في قضاء الكوفة/حي ميسان وتم افتتاح المدرسة من قبل الحكومة المحلية والإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر.
- تم انجاز مشروع انشاء مدرسة ١٨ صف في منطقة حي السلام بنسبة ١٠٠% وتم تحويل المشروع الى فرصة استثمارية استناداً الى قرار رقم (٣٤٧) لعام ٢٠١٥.
- العمل مستمر و بنسبة انجاز ٥٠% بالنسبة لمكون الحيدرية.
- العمل متوقف في مدرسة حي الزهراء وبنسبة انجاز بلغت ٧٠%.
- تمت مناقلة مبلغ التخصيص لانجاز مشروع مجمع ماء سعة (١٠٠٠) م^٣/سا لاستكمال عمل المدارس المذكورة انفاً.

٢- بناء مدرسة ١٢ صف بكلفة ١١٩٩ مليون دينار في خطة محافظة النجف لعام ٢٠١٩:

يشمل المشروع انشاء مدرسة في ناحية القادسية

أهداف المشروع:

يهدف المشروع الى:

- تعليم الفقراء في المناطق الريفية الفقيرة.
- تقليل المسافة الفاصلة بين القرى الفقيرة والمدارس الابتدائية.

الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد الطلاب المستفيدين من المشروع بحوالي (٣٠٠) طالب.

في طريق الإنجاز:

نسبة الإنجاز (١٠%) بسبب قلة التمويل المالي

ثالثاً: محافظة كربلاء:

١- من المشاريع المستمرة مشروع بناء مدرسة ابتدائية سعة ١٨ صف مع التأثيث في منطقة

اللايح ناحية الحسينية بكلفة (١,٩٠٠) مليار دينار ادرج عام ٢٠١٣:

يشمل المشروع إنشاء مدرسة ابتدائية في منطقة اللايح في ناحية الحسينية والتي تخلو من مدارس ابتدائية ، تتكون المدرسة من (١٨) صف وجناح إدارة مع مجموعة صحية ومجموعة صحية للطلاب وبمدة انجاز ٤٢٠ يوم.

أهداف المشروع:

يهدف المشروع الى:

- تعليم الفقراء في المناطق الريفية الفقيرة.
- تقليل المسافة الفاصلة بين القرى الفقيرة والمدارس الابتدائية.

الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد الطلاب المستفيدين من المشروع بحوالي ٤٥٠ طالب.

في طريق الانجاز:

- اعلن عن المشروع بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٣
- تم رفعها من خطة عام ٢٠١٦ بموجب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد س.ل/ ٦٥١ في ٢٠١٥/١٢/٩ لعدم المباشرة من قبل الشركة بسبب قلة التخصيصات المالية .
- بعد توفر الغطاء المالي تم إعادة ادراج المشروع في عام ٢٠١٨
- باشرت الشركة بالتنفيذ ونسبة الإنجاز الفعلية تبلغ ٢٤% اعمال بناء الطابوق،تأخر نسب الانجاز يعزى لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.

٢- بناء مدارس ابتدائية ١٨ صف عدد(٦) بكلفة ٧٣٨١ مليون دينار في خطة محافظة كربلاء لعام ٢٠١٩:

- انشاء مدرسة ابتدائية في قضاء الحر مدرسة هيثم اليساري.
- انشاء مدرسة ابتدائية في قضاء الحر حي الامن الداخلي مقاطعة ٢١ حيدرية.
- انشاء مدرسة ابتدائية في ناحية الخيرات مقاطعة (١٤٤) ام البط.
- انشاء مدرسة ابتدائية في قضاء عين تمر مقاطعة (٢٠) الجزيرة.
- انشاء مدرسة ابتدائية في قضاء الحسينية مقاطعة (١) الصلامية.
- انشاء مدرسة ابتدائية في ناحية الجدول الغربي مقاطعة (٥) أبو علوش.

أهداف المشروع:

- تعليم الفقراء في المناطق الريفية الفقيرة.
- تقليل المسافة الفاصلة بين القرى الفقيرة والمدارس الابتدائية.

الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد الطلاب المستفيدين من المشروع بحوالي (٣٢٤٠) طالب.

في طريق الإنجاز:

- بناء مدرسة في قضاء الحر مدرسة هيثم اليساري بكلفة (١٢٠٩) مليون وعدد مستفيدين مايقارب (٥٤٠) طالب والمشروع في طور الاحالة.
- بناء مدرسة في قضاء الحر حي الامن الداخلي مقاطعة ٢١ حيدرية بكلفة (١٢٦٩) مليون وعدد مستفيدين مايقارب (٥٤٠) طالب صدر أمر بالتريث من قبل الوزارة.
- بناء مدرسة في ناحية الخيرات مقاطعة (١٤٤) ام البط بكلفة (١٢٠٦) مليون وعدد مستفيدين مايقارب (٥٤٠) طالب صدر أمر بالتريث من قبل الوزارة.
- بناء مدرسة في قضاء عين تمر مقاطعة (٢٠) الجزيرة بكلفة (١٢٨٠) مليون وعدد مستفيدين مايقارب (٥٤٠) طالب والمشروع في طور الاحالة.
- بناء مدرسة في قضاء الحسينية مقاطعة (١) الصلامية بكلفة (١١٣٤) مليون وعدد مستفيدين مايقارب (٥٤٠) طالب صدر أمر بالتريث من قبل الوزارة.
- بناء مدرسة في ناحية الجدول الغربي مقاطعة (٥) أبو علوش بكلفة (١٢٨١) مليون وعدد مستفيدين مايقارب (٥٤٠) طالب صدر أمر بالتريث من قبل الوزارة.

رابعاً : محافظة بغداد:

بناء مدارس ابتدائية عدد (٣) بكلفة ٢٨٠١ مليون دينار في خطة محافظة بغداد لعام ٢٠١٩:

يشمل المشروع أنشاء (٣) مدرسة ابتدائية في

- ناحية المشاهدة – اركية وفاضل بناء مدرسة ابتدائية سعة (١٨) صف.
- ناحية المشاهدة – أبو عظام المسارة بناء مدرسة ابتدائية سعة (١٢) صف.
- ناحية المشاهدة – الضباعي بناء مدرسة ابتدائية سعة (١٢) صف.

أهداف المشروع:

يهدف المشروع الى:

- تعليم الفقراء في المناطق الريفية الفقيرة.
- تقليل المسافة الفاصلة بين القرى الفقيرة والمدارس الابتدائية.

الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد الطلاب المستفيدين من المشروع بحوالي (١٢٦٠) طالب.

في طريق الإنجاز:

تمت المصادقة على خطة المحافظة وتمويل المشروع لم يتم اطلاق الصرف من قبل وزارة المالية وذلك بسبب تقديم الطلب بالاطلاق بعد تاريخ اغلاق ميزانية عام ٢٠١٩ مما أدى الى تأخر في تنفيذ المشروع.

خامساً : محافظة ذي قار:

بناء مدارس ابتدائية عدد (٢) بكلفة ٢٨٠١ مليون دينار في خطة محافظة ذي قار لعام ٢٠١٩:

يشمل المشروع أنشاء (٢) مدرسة ابتدائية في

- ناحية الجبايش بناء مدرسة ابتدائية سعة (١٢) صف بكلفة (٨٣٨) مليون
- ناحية الحمار هدم وإعادة بناء مدرسة ابتدائية سعة (١٢) صف بكلفة (٧٨٩) مليون

أهداف المشروع:

يهدف المشروع الى:

- تعليم الفقراء في المناطق الريفية الفقيرة.
- تقليل المسافة الفاصلة بين القرى الفقيرة والمدارس الابتدائية.

الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد الطلاب المستفيدين من المشروع بحوالي (٦٠٠) طالب.

في طريق الإنجاز:

المشروع غير محال بسبب الوضع الأمني .

سادساً: محافظة نينوى:

بناء مدارس ابتدائية ذات (١٨) صف عدد (١) وبناء مدارس ذات (١٢) صف عدد (٣) وبناء مدارس ذات (٦) صف عدد (٤) مع إضافة اجنحة ذات (٦) صف عدد (٣) مع الوحدات الصحية بكلفة (٥٠٠١) مليون دينار مدرج في خطة المحافظة لعام ٢٠١٩:

يشمل المشروع:

- بناء مدرسة ٦ صف في قرية تل الهصر التابعة لناحية المحلية.
- بناء وحدات صحية ذات ٨ مقاعد عدد ٣.
- بناء مدرسة ١٢ صف عدد ٣.
- بناء جناح ذو ٦ صف مع الوحدات الصحية.
- بناء مدرسة ذات ٦ صف في مركز ناحية تل عبطة.
- هدم و اعادة بناء مدرسة جدالة الابتدائية في ناحية القحطانية.
- بناء مدرسة ذات ١٨ صف طابقين في كوكجلي.
- بناء جناح ذات ٦ صف مع الوحدات الصحية.

أهداف المشروع:

يهدف المشروع الى:

- تعليم الفقراء في المناطق الريفية الفقيرة.
- تقليل المسافة الفاصلة بين القرى الفقيرة والمدارس الابتدائية.

الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد الطلاب المستفيدين من المشروع بحوالي (٢٤٠٠) طالب.

في طريق الإنجاز:

- مشروع بناء مدرسة ذات (١٨) صف محال حسب قرار الإحالة ذي العدد ١٣٠ في ٢٠٢٠/١/٧.
- مشروع بناء مدرسة (١٢) صف باشر حسب الكتاب المرقم (١٧٢٣١) في ٢٠٢٠/١/٢٢ .
- اما باقي المشاريع تحولت الى تنفيذ امانة وهي قيد التنفيذ وكما يلي :-
 - بناء مدرسة (٥) صف في قرية تل الهصر التابعة لناحية المحلية وبنسبة انجاز (٥٥%) .
 - بناء وحدات صحية ذات (٨) مقاعد عدد (٣) في مدرسة الرضوان ، مدرسة المحلية للبنين ، ثانوية المحلية للبنين وبنسبة انجاز (٧٥%) .
 - بناء مدرسة (١٢) صف عدد (٣) في (المركز ، حي المشرق ، حي الخضراء) تصميم خاص تابع لناحية حمام العليل . وبنسبة انجاز (٣٩%) .
 - بناء جناح ذات (٦) صف مع الوحدات الصحية ذات (٤) مقاعد في مدرسة العريج الثانية للبنين وبنسبة انجاز (٤٥%) .
 - بناء مدرسة ذات (٦) صف في مركز ناحية تل غبطة لم تتم المباشرة لوجود ثكنة عسكرية .
 - هدم وإعادة بناء مدرسة جدلة الابتدائية في ناحية القحطانية ، لم تتم المباشرة بسبب الأوضاع الأمنية .
 - بناء مدرسة ذات (١٨) طابقين في كوكجلي التابعة لناحية بعشيقة وبنسبة انجاز (٣٧%) .
 - بناء جناح ذات (٦) صف مع الوحدات الصحية ذات ٤ مقاعد عدد (٢) في مدرسة (مجمع يورك ، مدرسة قرطبة الثالثة للبنين) التابعة لناحية الشمال بنسبة انجاز (٤٠%) .

سابعاً : محافظة ميسان:

إعادة تاهيل مدارس عدد(١٦) بكلفة (٧٧٢) مليون دينار في خطة محافظة ميسان لعام ٢٠١٩:

يشمل المشروع إعادة تاهيل (١٦) مدرسة في ناحية السيد احمد الرفاعي:

- تاهيل مدرسة جعفر بن ابي طالب بكلفة (٧٣) مليون.

- تاهيل مدرسة ام عبيدة بكلفة (٨٣) مليون.

- تاهيل مدرسة الوفاء بكلفة (٢٧) مليون.

- تاهيل مدرسة ام القرى بكلفة (٣٩) مليون.

- تاهيل مدرسة خيبر بكلفة (٤٨) مليون.
- تاهيل مدرسة ورقة بن نوفل بكلفة (٣٥) مليون.
- تاهيل مدرسة الرمضانية بكلفة (٧٨) مليون.
- تاهيل مدرسة الدوحة بكلفة (١٥) مليون.
- تاهيل مدرسة ثانوية السيد احمد الرفاعي بكلفة (٤٣) مليون.
- تاهيل مدرسة ذوالفقار بكلفة (٤٩) مليون.
- تاهيل مدرسة الرفاعي بكلفة (٦٩) مليون.
- تاهيل مدرسة ابي الانبياء بكلفة (٤٤) مليون.
- تاهيل مدرسة العفة بكلفة (٣١) مليون.
- تاهيل مدرسة صفين بكلفة (٢٤) مليون.
- تاهيل مدرسة البلاغة بكلفة (٣٧) مليون.
- تاهيل مدرسة الحكمة بكلفة (٧١) مليون.

أهداف المشروع:

يهدف المشروع الى:

- تعليم الفقراء في المناطق الريفية الفقيرة.
- تقليل المسافة الفاصلة بين القرى الفقيرة والمدارس.

الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد الطلاب المستفيدين من المشروع بحوالي (٢٤٠٠) طالب.

في طريق الإنجاز:

المشروع لم يمول لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.

ثامناً : محافظة المثني:

في خطة محافظة المثني لعام ٢٠١٩ تم ادراج مشروع انشاء مدراس متوسطة للبنات عدد / ١١ بكلفة (٩٠٢٣) في المناطق الفقيرة في كل من (الوركاء - الخضر - النجمي - الهلال - الدراجي - الرميثة - السماوة):

يشمل المشروع أنشاء (١١) مدرسة متوسطة للبنات في:

- انشاء مدرسة متوسطة للبنات (٩ صف) في منطقة الجرعة ال جريب بكلفة (٧٠٦) مليون.
- انشاء مدرسة متوسطة للبنات (٩ صف) في منطقة ال عنتر بكلفة (٧٠٦) مليون.
- انشاء مدرسة متوسطة للبنات (٩ صف) في منطقة ال توبة بكلفة (٧٠٦) مليون.
- انشاء مدرسة متوسطة للبنات (٩ صف) في منطقة ال سميح بكلفة (٧٠٦) مليون.
- انشاء مدرسة متوسطة للبنات (٩ صف) في منطقة ال حطوط بكلفة (٧٠٦) مليون.
- انشاء مدرسة متوسطة للبنات (٩ صف) في منطقة الهكيشية بكلفة (٧٠٦) مليون.
- انشاء مدرسة متوسطة للبنات (٩ صف) في منطقة الهويشلي بكلفة (٧٠٦) مليون.
- انشاء مدرسة متوسطة للبنات (٩ صف) في منطقة ال غليظ بكلفة (٧٠٦) مليون.
- انشاء مدرسة ثانوية للبنات سعة ١٢ صف في مركز ناحية الهلال بكلفة (١١٠٧) مليون.
- انشاء مدرسة سعة ١٢ صف في حي عبد العباس بكلفة (١١٣٤) مليون.
- انشاء مدرسة سعة ١٢ صف في حي العزل بكلفة (١١٣٤) مليون.

أهداف المشروع:

يهدف المشروع الى:

- تعليم الفقراء في المناطق الريفية الفقيرة.
- تقليل المسافة الفاصلة بين القرى الفقيرة والمدارس.

الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد الطلاب المستفيدين من المشروع بحوالي (٦٠٠) طالب.

في طريق الإنجاز:

المشروع قيد التنفيذ بنسبة انجاز ٤٥% وكما يلي:

- انشاء مدرسة متوسطة للبنات (٩ صف) في منطقة الجرعة ال جريب بنسبة انجاز ٤٥%
- انشاء مدرسة متوسطة للبنات (٩ صف) في منطقة ال عنتر بنسبة انجاز ٨٥%
- انشاء مدرسة متوسطة للبنات (٩ صف) في منطقة ال توبة بنسبة انجاز ٦٠%
- انشاء مدرسة متوسطة للبنات (٩ صف) في منطقة ال سميح بنسبة انجاز ٤٥%
- انشاء مدرسة متوسطة للبنات (٩ صف) في منطقة ال حطوط بنسبة انجاز ٤%
- انشاء مدرسة متوسطة للبنات (٩ صف) في منطقة الهكيشية بنسبة انجاز ٦٥%
- انشاء مدرسة متوسطة للبنات (٩ صف) في منطقة الهويشلي بنسبة انجاز ٩٠%
- انشاء مدرسة متوسطة للبنات (٩ صف) في منطقة ال غليظ بنسبة انجاز ٠%
- انشاء مدرسة ثانوية للبنات سعة ١٢ صف في مركز ناحية الهلال بنسبة انجاز ٢%
- انشاء مدرسة سعة ١٢ صف في حي عبد العباس بنسبة انجاز ٢%
- انشاء مدرسة سعة ١٢ صف في حي العزل بنسبة انجاز ٤٨%

جدول رقم (٥) المشاريع المدرجة ونسب انجازها ضمن المحصلة الثالثة

ت	اسم المشروع	الوزارة او المحافظة	الكلفة الكلية (بالمليون)	المصرف التراكمي (بالمليون)	نسبة الانجاز	الملاحظات
١	مشروع ازالة المدارس الطينية في العراق	وزارة التربية	٢٨٣٩١٠	٩٦٧٩٧	٧٩%	
٢	بناء مدرسة متوسطة سعة ١٨ صف	النجف الاشراف	٧٦٤٣	٣٥٥٩	٥١%	
٣	بناء مدارس ١٢ صف	النجف الاشراف	١١٩٩		١٠%	
٤	بناء مدرسة ابتدائية سعة ١٨ صف مع التأسيس	كربلاء المقدسة	١٩٠٠		٢٤%	
٥	بناء مدارس ابتدائية عدد (٦) سعة ١٨ صف	كربلاء المقدسة	٧٣٨١	-	٠	
٦	بناء مدارس ابتدائية عدد (١) سعة ١٨ صف عدد (٢) سعة ١٢ صف	بغداد	٢٨٠١	-	٠	
٧	بناء مدارس ابتدائية عدد (٢) سعة ١٢ صف	ذي قار	١٦٢٨	-	٠	
٨	بناء مدارس ابتدائية ذات (١٨) صف عدد (١) وبناء مدارس ذات (١٢) صف عدد (٣) وبناء مدارس ذات (٦) صف عدد (٤) مع اضافة اجنحة ذات (٦) صف عدد (٣) مع الصحيات	نينوى	٥٠٠١	-	٥٨,٢%	
٩	إعادة تاهيل مدارس عدد (١٦)	ميسان	٧٧٢	-	٠	

المحصلة الرابعة
سكن ملائم وبيئة مستجيبة
للتحديات



المحصلة الرابعة

سكن ملائم وبيئة مستجيبة للتحديات

يُعد السكن أحد المستلزمات الأساسية كالتعليم والصحة، وتتحمل الحكومات سواءً في البلدان المتقدمة أم النامية، مسؤولية ضمان سكن لائق وملائم لشرائح المجتمع كافة. وللسكن آثار وارتباط بنواحي أخرى من مناحي الحياة، بالنظر للنقص الكبير في الوحدات السكنية الملائمة مما حدا بالدولة إلى إطلاق مبادرة السكن الوطنية للتخفيف من تلك الأزمة والتخفيف من حدة الآثار التي يتركها السكن العشوائي وعلى أساس أنها إحدى السياسات التي تؤسس الأمان الاجتماعي للسكان كافة. لقد أدى العجز السكني في المناطق الفقيرة وارتفاع معدلات نمو السكان والفقراء غير القادرين على امتلاك وحدات سكنية إلى تفاقم الحاجة السكنية للفقراء إلى حوالي ٢٥٠ ألف وحدة سكنية ويتطلب بناء ٧٥ ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الخمسة القادمة والتي تمثل % ٣٠ من الحاجة الفعلية. قد أسهم تدمير الوحدات السكنية في المحافظات التي تعرضت لإرهاب داعش في تفاقم هذه المشكلة وإضافة أبعاد بيئية خطيرة لها. لذا صبت الإستراتيجية جل اهتمامها لتوفير بيئة سكن مناسبة للفقراء والذي تبلور في عدد مشاريع السكن والبنى التحتية .

تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية:

اولا : وزارة الاعمار والاسكان :

بناء مجمعات سكنية اقتصادية بكلفة (٥٩٠) مليار دينار (مدرج عام ٢٠١٢) :

اولت استراتيجية التخفيف من الفقر اهتماما خاصا لمشاريع بناء مجمعات سكنية اقتصادية في خمس محافظات فقيرة هي (بابل، ذي قار، صلاح الدين، الديوانية ، المثنى) ... بواقع ١٣٨٩ وحدة سكنية.

اهداف المشروع:

يهدف المشروع الى توفير بيئة سكن مناسبة للفقراء من خلال توفير سكن اقتصادي ملائم يحل مشاكل تدني نوعية السكن والاكتظاظ.

في طريق الانجاز:

فيما يلي جدول يبين الموقف من مشروع بناء وحدات سكنية في خمسة محافظات الذي تنفذه وزارة الاعمار والاسكان بحسب المحافظات وعدد الوحدات السكنية وعدد المستفيدين:

جدول رقم (٦) المجمعات السكنية ونسب انجازها التي تنفذها وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة

المحافظة	موقع المشروع	عدد الوحدات	نسبة الانجاز	الملاحظات
الديوانية	الشامية الجبسة	١٤٤	٣٩%	- تم ادراج المشروع ضمن خطة الدائرة لعام ٢٠١٩ .. توجد احالات جديدة للمشروع بسبب انتهاء العقد مع الشركة المنفذة وهي في مرحلة تحليل العطاءات للفقرات المتبقية من العقد والغير منفذة.
	الشفافية	٣٣١	صفر	- لم يتم المباشرة بالمشروع بعد توقيع العقد بسبب الازمة المالية التي يمر بها البلد في حينها تم استلام الموقع من قبل الشركة المنفذة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٢ تمهيداً للمباشرة بالعمل .. تم توقيع ملحق العقد مع الشركة المنفذه للمشروع بموجب كتاب دائرة الاسكان ١٢٠٣٣ في ٢٠١٩/٩/٢٦.
	السنية	٦٥	٧,٦%	- تم ادراج المشروع ضمن خطة الدائرة لعام ٢٠١٩ ، ويعزى سبب تأخر ادراج المشروع لعدم وجود تخصيصات مالية كافية تتلائم مع حجم الاعمال الخاص بمشاريعنا، تم انجاز جداول الكميات الخاصة بتغيير نظام البناء وهي حالياً قيد التسعير
المتنى	طحربة	١١٢	٢٠%	- تمت المباشرة بالمشروع بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢١ وكما جاء بكتاب د.م.م المشروع العدد ١ في ٢٠١٩/٩/٢١ .. تم توقيع ملحق عقد استئناف العمل في المشروع مع الشركة المنفذة.

ذئ قار	عككة	٢٦٠	٦%٠	- تم ءءمءء المءءروع بموءب الفقرة ٥/ب/٢ من قرار مجلس الوزراء ٣٤٧ لسنة ٢٠١٥ (ايقاف كافة اءمال المءءروع والبرنامء الزمئ للءءروط المنفذة على ان يعاء اسءءناف العمل عند النقطة الءئ ءوقف فئها المءءروع ءال ءوفر ءءءصفاء المائة) ومن المقءرء اءراء المءءروع ضمن ءطة دائرة الاسكان لعام ٢٠٢٠.
باءل	الشوملئ	٢٤٠	صفر	- تم اءراء المءءروع ضمن ءطة دائرة الاسكان لعام ٢٠١٤.
صلاء الءفن	(بءرب ١ + بءرب ٢)	٢٣٧	صفر	- ان هءه المءءراءع هئ من المءءراءع المسءقبلة الءئ لم ىءم اءراءها ضمن ءطء دائرة الاسكان و هئ من المءءراءع المسءقبلة.



مءءع الشامفة / مءافظة الءفوانفة

ءانفاً : مءافظة نفنؤى :

أنشاء مءءع سكنئ واطئ الكلفة فئ مءافظة نفنؤى بكلفة (٢٤٥٠٠) ملفنؤ ءفنار (مءرء عام ٢٠١٣) :

بناء مءءع سكنئ اقءصاءئ على مساةة ارض ءقءر بـ (٢١٥٢٧١) مءر مءربع ، ىءمل المءءروع بناء (٥٠٠) وءة سكنفة بمساةة (١٥٠) مءر مءربع للوءة السكنفة الواءة وبمساةة بناء (١٠٠) مءر مءربع، ىءكون الءار من طابق واءء ... ىضم ءرفءئ نوم ومطبخ وصالة ومءءع ءءماء ، وسىءم ءبلفط الشوارع الرئفة والفرعة وصب الأرففة وءوفر ءءماء الكهراء والمءارئ وىصال الماء للءور ضمن ءءصفاء ءءمفة الأقالئم، فضلا عن أنشاء مبائئ ءءمفة ءءضمن الاءئ :

➤ مءرسة ابءءائفة ءاء (١٢) صف، مساءءها ١٠٠٠ مءر مءربع.

➤ مءرسة ءانؤفة ءاء (١٢) صف، مساءءها ١٠٠٠ مءر مءربع.

- جامع مساحته ٤٠٠ متر مربع.
- مستوصف مساحته ٧٠٠ متر مربع.
- مجموعة مواقف سيارات ومواقع تجارية ومناطق خضراء .

اهداف المشروع:

يهدف المشروع الى:

- توفير سكن ملائم للعوائل الفقيرة
- المساهمة بالحد من ازمة السكن الحاد في المحافظة
- تشجيع الهجرة العكسية (الهجرة من المدينة الى الريف) حيث ان موقع المشروع يقع خارج مدينة الموصل.
- خلق فرص عمل اضافية تساهم بالحد من ظاهرة البطالة.
- تقليل الاضرار الاجتماعية التي يمكن ان تنشأ لمثل هذه الشرائح عند عدم توفر سكن ملائم لهم.
- يعد هذا المشروع نواة لمشاريع مشابهة تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام ويمكن ان تساهم بها الحكومات المحلية مستقبلا لرفع المستوى المعاشي لمواطنيها.

الشرائح المستفيدة:

- يخدم المشروع حوالي ٥٠٠ اسرة فقيرة اي ما يعادل ٣٠٠٠ فرد.

في طريق الإنجاز:

- بعد أدراج المشروع تأخرت المحافظة إجراءات الإعلان للمشروع بسبب قطعة الارض المخصصة من قبلها لانها لم تكن كافية وتم استبدالها بقطعة ارض أخرى .
- تم اعداد الدراسات والتصاميم الجديدة بعد استبدال قطعة الأرض بأخرى تابعة لنفس القضاء، وتم تسليم المخططات الجديدة الى دائرة تخطيط القطاعات وحصلت المصادقة عليها.
- توقفت بعدها كافة الإجراءات بسبب الأوضاع الأمنية.
- بعد تحرير المحافظة من عصابات داعش الإرهابية صادقت المحافظة على خطتها لعام ٢٠١٨ لكن لعدم معرفة مصير المشروع تم وضع مبلغ التخصيصات في صندوق حسابات أمانات المحافظة .

ثالثاً : محافظة كركوك :

١- تنفيذ مجمعين سكنيين ، بكلفة (١٥) مليار دينار (مدرج عام ٢٠١٣) :

يتكون المشروع من بناء مجمعين سكنيين على عرصه مساحتها (٣٥) دونم تقريبا، يضم كل مجمع (١٥٠) وحدة سكنية.

اهداف المشروع:

يهدف المشروع الى توفير سكن ملائم لشريحة من المواطنين المتعفيين وذوي الدخل المحدودة وتوفير فرص عمل في المدينة طيلة فترة انجاز المشروع.

الشرائح المستفيدة:

توفير السكن الاقتصادي لـ (٣٠٠) اسرة فقيرة اي ما يعادل (١٨٠٠) فرد .

في طريق الإنجاز:

- نسبة الإنجاز ١٠٠% وتم استلام المشروع .
- تم اختيار العوائل المستحقة حسب استمارة المفاضلة ووزعت على المستحقين في المحافظة.



٢- انشاء مجمع سكني واطى الكلفة (١٩٢) وحدة سكنية في المناطق الفقيرة المتضررة في ناحية

الملتقى بكلفة (١٠,٢٦٠) مليار دينار عراقي :

- لم يحال المشروع وقد فاتحت المحافظة وزارة التخطيط لغرض تغيير اسم و موقع المشروع من ناحية الملتقى الى اطراف مدينة كركوك.

- تم الابقاء على موقع المشروع الاساسي كونه الاكثر فقرا حسب الية الاستهداف المعتمدة من قبل الاستراتيجية التخفيف من الفقر.

٣- انشاء مجمع سكني واطى الكلفة (١٢٠) وحدة سكنية في المناطق الفقيرة المتضررة جنوب محافظة كركوك قرب دوميز بكلفة (٦٤٤١) مليون دينار عراقي :
- تمت المباشرة بالتنفيذ وبنسبة انجاز فني ٧٢%.

رابعاً : محافظة ديالى:

١- تنفيذ مجمع سكني اقتصادي لإسكان الفقراء ، بكلفة (٧) مليار دينار (مدرج عام ٢٠١٢) :
يضم المشروع تنفيذ ثلاث مجمعات سكنية في قرى (الكبة، بهرز، الاحيمر) في قضاء بعقوبة في محافظة ديالى ، ويتكون من (١٠٥) وحدة سكنية موزعة على القرى المذكورة.

الموقف الخاص بالمشروع:

- ادرج المشروع أعلاه عام ٢٠١٢ لتنفيذ مجمع سكني اقتصادي لإسكان العوائل الفقيرة .
- اهيل المشروع لاحدى شركات القطاع الخاص وتم الإحالة والتعاقد خلال شهر اب / ٢٠١٣.
- تم رفعه من خطة عام ٢٠١٦ بموجب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد س.ل/ ٦٥١ في ٢٠١٥/١٢/٩. بسبب تخصيص الارض المراد الأنشاء عليها لكونها اراضي زراعية .
- بعد توفر الغطاء المالي ، طالبت المحافظة وزارة التخطيط بإعادة ادراج المشروع بكتابها المرقم ١٩٥٩٦ بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠١٨.
- تم استحصل الموافقات الأصولية واعادة ادراج المشروع ضمن خطة عام ٢٠١٩ بإعادة ادراج المشروع وحسب الشروط :
- أ- تحديد موقع المشروع في النواحي الفقيرة المستهدفة حسب دليل أولويات الأنشطة والمناطق الخاصة بوثيقة ستراتيجية التخفيف من الفقر ٢٠١٨-٢٠٢٢.
- ب- تقليل مساحة البناء وكلفة الوحدة السكنية بما تتلائم مع السكن الاقتصادي للفقراء .
- ج- تاخر انجاز المشاريع لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.

٢- تاهيل وتنفيذ شبكات كهرباء في المناطق الريفية بكلفة (٥,٢٣٠) مليار دينار (مدرج في عام ٢٠١٣) :

يتألف من (١٢) مشروع ويشمل تنفيذ وتاهيل شبكات كهرباء في قرى متعددة داخل المحافظة.

تم رفع مشروعين من الخطة ليصبح العدد ١٠ مشاريع وبنسبة انجاز فني ٨٩%.

اهداف المشروع:

- توفير شبكة الكهرباء بصورة مستمرة للمناطق والقرى الفقيرة.
- تأهيل الطاقة الكهربائية للقرى والمناطق البعيدة.

الشرائح المستفيدة:

سكان القرى المشار اليها أعلاه والبالغ عددهم (١٤٨٤٧) فردا.

في طريق الانجاز :

بسبب تأخر اطلاق صرف التخصيصات لعام ٢٠١٨ لم يستأنف العمل في بعض المكونات

- السلام – قرية الكبة بنسبة انجاز كلي ١٠٠%.
- العبارة – قرية الاعور بنسبة انجاز كلي ١٠٠%.
- بني سعد – قرية محمد الكاظم بنسبة انجاز كلي ١٠٠%.
- الخالص - قرية سفيط بنسبة انجاز كلي ١٠٠%.
- مركز قضاء بلد روز – قرية جواد الحجي بنسبة انجاز كلي ١٠٠%.
- مندلي – قرية عبد الله كيطان بنسبة انجاز كلي ١٠٠%.
- العظيم – قرية الابو طريمش بنسبة انجاز فعلي ٩٨% العمل متوقف لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.
- مركز قضاء المقدادية بنسبة انجاز فعلي ٦٠% العمل متوقف لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.
- مركز قضاء خانقين – قرية جسر حلوان بنسبة انجاز ٥٤% العمل متوقف تأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.
- المنصورية – قرية حبيب العبد الله العمل متوقف لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.

المكونات المرفوعة من خطة عام ٢٠١٦ بموجب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد

س.ل/ ٦٥١ في ٢٠١٥/١٢/٩.

- جلولاء - منطقة السكك في حي الطليعة
- الخالص – قرية السنديّة

خامساً : محافظة الانبار:

- ١ - بناء مجمعات اقتصادية (المرحلة الأولى) بكلفة قدرها (١٥) مليار دينار (مدرج عام ٢٠١٣): ويشمل المشروع بناء (٣٦٥) دار اقتصادية في اقصية الرمادي ، الفلوجة ، هيت ، حديثة ، عنه ، راوه، القائم، الرطبة، تشيد الدار الواحدة على قطعة ارض بمساحة ٢٠٠ متر مربع وتضم غرفة نوم كبيرة واخرى صغيرة وصالة ومطبخ وحمام ومرافق صحية مع حديقة وكراج، مدة انجاز المشروع هي ٦ اشهر من تاريخ تسلم الارض.
- تم فسخ عقد كل من (مجمع قضاء راوه / مجمع قضاء الرمادي) بسبب تعرض المشروع الى اضرار كبيرة نتيجة العمليات العسكرية (اعتبر ان اكماله غير مجدي).

اهداف المشروع:

يهدف المشروع الى تقليل معاناة الفقراء من مشكلات تدني نوعية السكن والاكتظاظ والتلوث وعدم ملائمة البنى التحتية والتي تعكس الحرمان الذي يعاني منه الفقراء كما يهدف المشروع الى توفير السكن الملائم لفقراء المحافظة.



الشرائح المستفيدة:

يخدم المشروع (٣٦٥) اسرة فقيرة اي ما يعادل (٢١٩٠) فردا، وتمت اضافة (٥) دور في ناحية (النخيب) من المبالغ الفائضة.

في طريق الانجاز:

● بلغت نسبة الانجاز الفعلي ٩٠% .

● باشرت الشركات بالعمل وحسب ما مبين:

- مجمع قضاء القائم (١٠٠%) في طور التوزيع.

- مجمع قضاء حديثة (١٠٠%) في طور التوزيع.

- مجمع قضاء الرطبة (٩٠%) بسبب عدم وجود

سيولة كافية.

- مجمع قضاء الفلوجة (١٠٠%) في طور التوزيع.

- مجمع قضاء هيت (٨٩%) بسبب عدم وجود

سيولة كافية.

- مجمع قضاء عنة (١٠٠%) في طور التوزيع.

- مجمع النخيب (١٠٠%) في طور التوزيع.



٢- بناء دور واطئة الكلفة عدد (٢٥) بكلفة ٢,٥ مليار دينار:

- وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بتغيير طبيعة وموقع المشروع الى وحدات سكنية واطئة الكلفة بعد ان كان تجهيز كرفانات.
- يشمل المشروع مجمع سكني في عامرية الفلوجة وبنسبة انجاز فني ١٠٠% في طور التوزيع.

٣- بناء دور واطئة الكلفة (المرحلة الثانية) في عموم المحافظة بكلفة (١٧٧١٥) مليون دينار:

يشمل المشروع بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة موزعة في ٩ اضية وبنسبة انجاز فني ٨٠% وكما موضح ادناه:

- مجمع قضاء الرطبة (١٠٠%) في طور التوزيع.
 - مجمع قضاء الرمادي (٨٠%) بسبب عدم وجود سيولة كافية.
 - مجمع قضاء عامرية الفلوجة (١٠٠%) في طور التوزيع.
 - مجمع قضاء القائم (٦٠%) بسبب عدم وجود سيولة كافية.
 - مجمع قضاء حديثة (١٠٠%) في طور التوزيع.
 - مجمع قضاء راه (١٠٠%) في طور التوزيع.
 - مجمع قضاء عنه (١٠٠%) في طور التوزيع.
 - مجمع قضاء هيت (١٠٠%) في طور التوزيع.
 - مجمع قضاء الخالدية (١٠٠%) في طور التوزيع.
- تمت اضافة مكون لا يصل الخمات لدور واطئة الكلفة في عموم المحافظة بواقع (١٠) مواقع لتكتمل البنى التحتية للمشروع.

سادساً: محافظة بابل:

تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقراء في محافظة بابل مع اوصول الخدمات

الاساسية (روضة ، حضانة، مسجد ،طرق داخلية،شبكة مجاري ،مساحات خضراء) وبكلفة (

١٨) مليار دينار (مدرج في عام ٢٠١٢) وينفذ على مدى ثلاث سنوات :

حددت المحافظة اولوياتها من تخصيصات استراتيكية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية

لعام ٢٠١٢ بناء مجمعات سكنية اقتصادية للفقراء وقد خصصت لتحقيق هذا الهدف قطعة ارض

مساحتها (١٢) دونم في ناحية ابي غرق وبواقع (١٥) عمارة، كل عمارة تحتوي على (١٢)

شقة وبعدها كلي (١٨٠) شقة، مساحة الشقة الواحدة (١٠٠) متر مربع.

اهداف المشروع:

- يهدف المشروع الى تحسين بيئة السكن للفقراء من خلال توفير مجمع سكني متكامل مع الخدمات الاساسية.

الشرائح المستفيدة:

يستهدف المشروع توفير بيئة سكن مناسبة لـ ١٨٠ اسرة فقيرة في المحافظة اي ما يعادل (١٠٨٠) فرد.

- نسبة الانجاز الفعلي بلغت ٦٥,٨٦٧% وتم اعداد جدول تقدم عمل محدث بعد ان تمت المصادقة على مدد اضافية.



سابعاً: محافظة واسط:

تنفيذ مشاريع بناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقراء في محافظة واسط بكلفة (٣٥) مليار دينار :

يتكون المشروع من مكونين بأربع مواقع في كل من الاقضية و النواحي (الكوت ، الزبيدية، واسط، تاج الدين) بكلفة كلية قدرها (٣٥) مليار دينار ، تم تخصيص مبلغ (١١٩٠٠) مليون دينار عام ٢٠١٢ لبناء مجمع سكني بواقع ٢٨٤ وحدة سكنية على قطعة ارض بمساحة (٥٠٠) دونم في قضاء الكوت حيث تم اختيار موقع المشروع حسب الكثافة السكانية والمساحة المتوفرة في الاقضية والنواحي لتوفير سكن مناسب لشريحة الفقراء، وتم تخصيص مبلغ (٢٣١٠٠) مليون دينار لبناء الثلاث مجمعات السكنية الاخرى بواقع (٤٠٦) وحدة سكنية.

اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى حل مشكلة سكن الفقراء في محافظة واسط من خلال مشروع ينجز باكثر من مرحلة يستهدف شريحة مهمة من المجتمع ذات الدخل المحدود (دخل دون خط الفقر) فضلاً عن تدني نوعية السكن والتلوث وعدم ملائمة البنى التحتية .

الشرائح المستفيدة:

استهدف المشروع في مرحلته الاولى حل مشكلة سكن(٤١٤٠) فرد من الفقراء .

في طريق الإنجاز:

• المكون الاول:

تنفيذ بناء مجمع سكني في محافظة الكوت بعدد ٢٨٤ وحدة سكنية بكلفة كلية بلغت ١١,٩٠٠ مليون دينار.

➤ تم توزيع استثمارات المفاضلة على العوائل الفقيرة وتم التركيز على المناطق العشوائية وبؤر الفقر في قضاء الكوت.

➤ تم ملئ (١٠٢٤) استمارة من قبل الاسر المستهدفة الراغبين بالحصول على سكن وجرى تدقيق الاستمارات وادخالها الكترونياً والمفاضلة بين المتقدمين.

➤ تم استخراج (٢٨٤) اسرة فقيرة مستحقة ، تم تسليم قوائم الأسماء الى المحافظة وتم الإعلان عنها .

➤ تم توزيع الوحدات السكنية على الاسر المستحقة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١ .



• المكون الثاني : تنفيذ بناء وحدات سكنية بعدد ٥٩١ وحدة سكنية في اضية الحي والصويرة

والعزيزية (إعادة ادراج في عام ٢٠١٨):

➤ بسبب عدم المباشرة بالمشروع تم رفع المكون من قبل دائرة تخطيط القطاعات

أستنادا الى كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية المرقمة ٦٥١ في ٢٠١٥/١٢/٩ .

- تم الطلب من المحافظة بضرورة إعادة النظر بتصميم ومواصفات البناء للوحدات السكنية والتحول الى نظام البناء التقليدي.
- أعيد أدراج المشروع ضمن صلاحيات وزير التخطيط بالاستناد الى الفقرة (٩-أ) من صلاحياته وصلاحيات السيد المحافظ استنادا الى الفقرة (١٧-أ) من الصلاحية الواردة في التعليمات الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٧.
- تم تخفيض عدد الدور لتكون (٤٠٦) دار وبكلفة (٤٤) مليون دينار للدار الواحدة بضمنها الخدمات الأساسية حسب توصيات الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر (شبكة ماء ، شبكة مجاري ، خزانات تعفين للمجاري، تبليط شوارع) كما تضمن المشروع إنشاء مدارس مع التأسيس عدد (٢).
- تم المصادقة على خطة المحافظة في شهر اب / ٢٠١٨ بعد مناقلة مبلغ (١) مليار دينار.
- تم التمويل والمباشرة في موقع ناحية واسط بواقع ١٥٥ وحدة سكنية وبنسبة انجاز فعلي ٧٠%.
- لم تباشر الاعمال في ناحية تاج الدين و قضاء الزبيدية وذلك لتاخر اطلاق التمويل.

ثامناً : محافظة صلاح الدين:

بناء مساكن اقتصادية للفقراء ، بكلفة كلية (٢٠) مليار دينار(مدرج في عام ٢٠١٣):

تألف المشروع من (٤٣٨) دار، ولا تقل مساحة بناء الدار الواحدة عن (١٠٠) متر مربع، وموزعة على الاقضية (الدجيل، طوزخورماتو، بلد ، بيبي، تكريت، سامراء) ومن المؤمل ان يخدم عدد من سكان المحافظة ، كما انه سيؤدي الى تحسين بيئة الانسان ليكون له دور فاعل في التنمية الوطنية ورفع المستوى الخدمي السكني الذي يؤدي الى خفض الأنفاق ورفع المستوى المعاشي للمواطنين وتخفيض معدلات الفقر . كما أن المشروع سيقدم خدمة اجتماعية لسكان المحافظة من خلال توفير السكن والبنية التحتية المتطورة وسيتم تقديم الخدمات من قبل المحافظة ضمن خطة تنمية الأقاليم.

في عام ٢٠١٨ تم استحصال الموافقات الأصولية لزيادة الكلفة الكلية للمشروع الى (٢٥) مليار دينار ليتم ادراج (٤٠) مدرسة كرفانية و(٣٠) بيت صحي وزعت في اقضية المحافظة لكون المحافظة

تعرضت للدمار جراء العمليات العسكرية وتعتبر اول محافظة تم تحريرها من عصابات داعش الإرهابية التي دمرت الكثير من الممتلكات الخاصة والعامة ولغرض البدء بدمج العوائل العائدة في المجتمع وتوفير الخدمات الازمة .

اهداف المشروع:

- يهدف المشروع الى توفير سكن اقتصادي ملائم للفقراء فضلاً عن توفير فرص عمل للعاطلين خلال فترة إنجاز المشروع
- تقديم التعليم اللائق للعوائل الفقيرة والعائدة بعد موجة النزوح .
- توفير الخدمات الصحية في المناطق الفقيرة .

الشرائح المستفيدة:

ستوزع الدور على (٤٣٨) اسرة وبما يعادل (٢٦٢٨) فردا من الشرائح الإجتماعية المتضررة بالاعتماد على استمارة المفاضلة التي اعدتها الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر منها:

- عوائل الشهداء التي استشهد معيها جراء الانفجارات ولا تملك وحدة سكنية.
- العوائل المتعففة التي ليس لها معيل او شخص يعمل في القطاع الحكومي ويفضل العوائل التي تعيها امراة.

في طريق الانجاز:

- تم أستثناء المشروع حسب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد:س.ل/ ٧٣٨ بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٩ من اجراءات الاحالة وتوقيع العقد.
- تم استئناف العمل خلال عام ٢٠١٨ بعد توفر سيوله نقدية وبلغت نسبة الإنجاز الفعلية ٤٨%
- لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.
- تم توجيه انذارات للشركة المنفذة بسبب تلوؤها في الاعمال لغرض حثها على الاسراع في تنفيذ المشروع.

تاسعاً : محافظة الديوانية:

١- تنفيذ مشاريع لبناء مجمعين سكنيين اقتصاديين للفقراء في محافظة الديوانية وبكلفة (٤) مليار دينار لكل مجمع من المجمعين (افقي وعمودي) (مدرج في عام ٢٠١٢):

تم تخصيص قطعة الأرض المرقمة (٢١/٨) مقاطعة (٥) ام العباسيات بمساحة (٢٧٠) دونم، لبناء مجمعات سكنية افقية بعدد (٩١) وحدة سكنية وعمودية بعدد (٩٤) وحدة سكنية اقتصادية، تكون مساحة الوحدة السكنية في المجمعات السكنية الأفقية (٩٠) متر مربع بناء (عدا مساحة الحديقة والكراج)، وتتكون الوحدة السكنية من غرفتي نوم وصالة ومطبخ وحمام، اما بالنسبة للبناء العمودي فتكون مساحة الوحدة السكنية (٨٠) متر مربع وتتكون من غرفة نوم وصالة ومطبخ وحمام.



أهداف المشروع:

يهدف المشروع الى حل مشكلة السكن للعوائل الفقيرة في المحافظة من خلال نوعين من البناء العمودي والافقي في المحافظة والتي تعد من المحافظات الفقيرة في العراق.

الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد المستفيدين من المشروع بـ (١٨٥) اسرة، وبما يعادل ١١١٠ فرداً.

في طريق الإنجاز:

- بعد اعلان المشروعين وفتح العطاءات تمت الاحالة الى الشركة المنفذة، حيث باشرت الشركة عملها في شهر شباط/٢٠١٤
- بلغت نسبة الانجاز الفعلي للمجمع السكني العمودي هي ١٠٠% وحاليا في طور المفاضلة بين المتقدمين لغرض التوزيع .
- بلغت نسبة الانجاز الفعلي للمجمع السكني الافقي ٩٨% وحاليا في طور المفاضلة بين المتقدمين لغرض التوزيع .

٢- انشاء وحدات سكنية اقتصادية مع مجمع ماء بكلفة (١٥) مليار دينار(مدرج عام ٢٠١٣) :

المشروع هو احد أولويات المحافظة من تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر لعام ٢٠١٣ ، ويتكون من:

- أنشاء وحدات سكنية عمودية مع مجمع ماء في ناحية الشافعية – مقاطعة ٥ أم العباسيات جنوب غرب المحافظة، وبمدة تنفيذ (٢٤٠) يوماً...يضم المشروع ١٦٢ مبنى سكني عمودي ، يتكون كل مبنى سكني من شقتين تستوعب كل منها (٦) اشخاص وتتكون كل شقة من غرفتي نوم ومطبخ وغرفة معيشة ومجموعة صحية ، علماً ان الخدمات اللازمة للمشروع (شبكة الماء، الكهرباء، الطرق) وغيرها ستنفذ كمرحلة ثانية بعد انجاز مشروع البناء.
- مشروع تجهيز ونصب مجمع ماء سعة (٢٠٠) متر مكعب/ ساعة مع مد شبكة انابيب بلاستيكية باقطار (٢٥٠، ١٦٠، ١١٠، ٣١٥) ملم وبنائة خدمة وحوض تغطيس ومولدة كهربائية (٥٠٠) KV وتعد مديرية ماء محافظة الديوانية هي المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

أهداف المشروع:

يهدف المشروع الى التخفيف من ظاهرة انتشار دور المتجاوزين للعوائل الفقيرة في احياء المحافظة من خلال توزيع الوحدات السكنية لهم بعد اكمال هذا المشروع كما يسهم المشروع بتشغيل الايدي العاملة والتي معظمها من ذوي الدخل المحدود، اما مجمع الماء فسيؤمن الماء الصالح للشرب للعوائل الفقيرة التي تسكن المجمع.

الشرائح المستفيدة:

يخدم المشروع (٣٢٤) اسرة اي ما يقارب (١٩٤٤) فردا من الفقراء في المحافظة ،وسيكون توزيع المساكن بحسب العوائل الاشد فقرا وحرماناً وفق استمارة المعايير المعدة لهذا الغرض.

في طريق الإنجاز:

- اعلن عن المشروع واحيل الى الشركة المنفذة وباشرت في شباط/ ٢٠١٤ .
- خصص مبلغ (٢،٢٠٩٨) للمشروع لعام ٢٠١٨ لاستئناف العمل .

- المشروع في المراحل النهائية والعمل مستمر حيث بلغت نسبة الانجاز ٩٨% وحاليا في طور المفاضلة بين المتقدمين لغرض التوزيع ، وسيتم تنفيذ مجمع الماء لاحقاً مع الخدمات .



مجمع سكني اقتصادي مع مجمع ماء/ محافظة الديوانية

عاشراً: محافظة المثنى:

تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقراء في محافظة المثنى بكلفة (٤٥) مليار دينار (مدرج في عام ٢٠١٢):

تبنت المحافظة انشاء مجمعات سكنية مخصصة للفقراء مع كافة الخدمات والبنى التحتية اللازمة لها وبواقع (١٠٠٠) وحدة سكنية، توزع حسب النسبة السكانية للوحدات الادارية في المحافظة مع اجراء بعض التعديل للوحدات التي تعاني من نسب فقر اكبر .تتكون كل وحدة سكنية من طابق واحد وتحتوي على غرفتين وصالة ومطبخ وصحيات فضلا عن حديقة امامية وكراج، وتختلف مساحة الاراضي المخصصة في اقضية المحافظة اذ تم تخصيص (٢٠٠) متر مربع لكل وحدة سكنية في قضاء السماوة، و (٢٥٠) متر مربع لكل وحدة سكنية في اقضية (الخير، الرميثة، السلطان و (٣٠٠)متر مربع لكل وحدة سكنية في كل من النواحي(الوركاء، الكرامة، النجمي، السوير، الدراجي، بصية، الهلال، المجد) الا ان مساحة البناء لكل وحدة سكنية ولكل الاقضية هي (١٠٦) متر مربع.

اهداف المشروع:

يهدف المشروع الى توفير سكن اقتصادي ملائم لفقراء المحافظة فضلا عن توفير البنى التحتية الملائمة والتي تؤدي بمجملها الى تحسين بيئة السكن الخاصة بالفقراء.

الشرائح المستفيدة:

يستهدف المشروع تحسين الواقع السكني لـ (١٠٠٠) اسرة وبما يعادل (٦٠٠٠) فردا في المحافظة.

في طريق الانجاز:

- ادرج المشروع عام ٢٠١٢ ولم توفق المحافظة في احالة المشروع خلال عامي ٢٠١٢-٢٠١٣ .
- نظرا لمحدودية عدد المساكن الاقتصادية في (قضاء السلطان ، ناحية البصية) قامت المحافظة بأعداد الكشوفات والدراسات والتصاميم للمشروع
- تم إحالة مجمعين في (قضاء السلطان ، ناحية البصية) الى الشركة المنفذة بواقع ٧٠ وحدة سكنية وباشرت الشركة بالتنفيذ في ك٢ / ٢٠١٤ ، وتم الانجاز بشكل نهائي وتم توزيع الدور على مستحقيها.
- اما بخصوص باقي الوحدات الإدارية قد تم رفعها من الخطة بسبب تلوها في التنفيذ حسب قرار (٣٤٧) لعام ٢٠١٥ .



مجمع سكني في ناحية البصية / محافظة المثنى

احد عشر:محافظة ذي قار:

بناء مجمع سكني اقتصادي وبكلفة (٤٠) مليار دينار(مدرج في عام ٢٠١٣):

يتضمن انشاء مجمع سكني افقي اقتصادي ضمن مدينة الناصرية، يضم دور سكنية افقية تتلائم مع بيئة الحضر التي تعيشها العوائل، وبعدد دور اجمالي يصل الى (٧١٢) دار سكنية وابنية خدمية متكاملة مع شبكات البنى التحتية لهذا المجمع.

اهداف المشروع:

- توفير الوحدات السكنية لمواطني المحافظة التي تعاني من الفقر، وسد جزء من الحاجة السكنية في المحافظة.
- تطوير المنطقة الحضرية من خلال انشاء مجمعات سكنية مخدومة بابنية عامة كمحلة سكنية متكاملة لخدمة اهالي القضاء ، بالاضافة الى توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل من خلال اعمال البناء في المجمع السكن.
- تحسين دخل الاسر الفقيرة بتوفير المبالغ التي كانت تدفع بدلاً للإيجار.

الشرائح المستفيدة:

يخدم المشروع حوالي (٧١٢) اسرة اي بما يعادل (٤٣٢٠) نسمة من الفقراء في البيئة الحضرية.

في طريق الانجاز:

- احيل المشروع باسلوب الدعوات المباشرة الى احدى الشركات المختصة للتنفيذ .
- توقف المشروع عن العمل بسبب الازمة المالية وتم فسخ العقد رضائياً مع الشركة المنفذة بموجب قرار (٣٤٧) لعام ٢٠١٥ .
- تم اعادة ادراج المشروع ضمن خطة عام (٢٠١٩) بعد تخصيص مبلغ (٥٠٠) مليون دينار.
- تمت المباشرة بالاعمال و العمل مستمر وبنسبة انجاز فني ١٥%، وتم فسخ العقد رضائياً مع الشركة المنفذة بموجب قرار (٣٤٧) لعام ٢٠١٥ .
- تم الاعلان عن المشروع للمرة الثانية.

اثنا عشر: محافظة ميسان:

١. انشاء دور واطئة الكلفة في قضاء قلعة صالح:

يتمثل المشروع بانشاء دور سكنية واطئة الكلفة للفقراء عدد (١٠٨) دار بكلفة (٤٦٩٣) مليون دينار،بالاضافة الى خدمات البنى التحتية للمشروع بكلفة (١٣٤٥) مليون دينار، ادرج المشروع ضمن خطة عام (٢٠١٩) ولم تتم المباشرة بالاعمال لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.

٢. انشاء دور واطئة الكلفة في قضاء العمارة:

يتمثل المشروع بانشاء دور سكنية واطئة الكلفة للفقراء عدد (١١٥) دار بكلفة (٤٩٩٧) مليون دينار،بالاضافة الى خدمات البنى التحتية للمشروع بكلفة (١٧٨٥) مليون دينار، ادرج المشروع ضمن خطة عام (٢٠١٩) ولم تتم المباشرة بالاعمال لتأخر اقرار الموازنة وعدم تمويل المشاريع.

ثلاثة عشر: محافظة البصرة:

انشاء دور سكنية اقتصادية للفقراء في محافظة البصرة بكلفة (٤٠) مليار دينار:

يتضمن المشروع انشاء (١٠٠٠) دار سكنية للفقراء في محافظة البصرة ناحية ابي الخصيب بمساحة (١٠٠) متر مربع للدار الواحد حيث يخدم المشروع ما يقارب ال(٦٠٠٠) فرد من ابناء المحافظة. ادرج المشروع ضمن خطة عام (٢٠١٩) وبشرت الشركة بالاعمال وبنسبة انجاز فني بلغت ٨%. حيث طالبت المحافظة بزيادة الكلفة الكلية للمشروع بموجب كتابهم ذي العدد (٣٠١٦) في ٢٠٢٠/١٢/٩، وقد تطلب الامر حضور المعنيين لدراسة الطلب بشكل متكامل.

اربعة عشر: محافظة كربلاء:

١- مشروع توفير البنى التحتية لمنطقة الزكاريط في قضاء عين التمر ولمجمع دور واطنة الكلفة عدد

(١٠٠٠) دار في مركز المحافظة :

المكون الاول : انشاء البنى التحتية لمجمع دور اقتصادية (١٠٠٠) دار، بكلفة (١٢) مليار دينار (مدرج عام ٢٠١٢) :

نذ المشروع مطلع عام ٢٠١٣ ويمثل مشروع توفير البنى التحتية لمجمع دور اقتصادية الذي تم بناءه سابقاً من تخصيصات المحافظة بعدد (١٠٠٠) دار وتبنت الاستراتيجية تنفيذ البنى التحتية لهذا المجمع (تنفيذ شبكة مجاري ثقيلة وشبكة امطار، ايصال خط الماء المغذي، اعمال تبليط للشوارع).

اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى تحسين بيئة السكن من خلال توفير البنى التحتية لمجمع دور (١٠٠٠) دار تم بناءها سابقا ضمن موازنة تنمية الاقاليم.

- يقدر عدد المستفيدين من المشروع بحوال (٦٠٠٠) فرد.
- تم انجاز المشروع في شهر اذار ٢٠١٤.
- تم توزيع الدور على العوائل الفقيرة من قبل المحافظة حيث تم اعداد استمارة بالتنسيق ما بين المحافظة ومجلس محافظة كربلاء ، شملت الاستمارة الفئات (الارامل وعوائل الشهداء، الفقراء ضمن المناطق المتجاوز عليها في المحافظة ، عوائل شهداء الحشد الشعبي من الفقراء).

المكون الثاني : توفير البنى التحتية لمنطقة الزكاريط في قضاء عين التمر ، بكلفة (١٢) مليار دينار (مدرج عام ٢٠١٢) :

يتألف المشروع من ٦ مكونات تشمل تنفيذ شبكة مجاري مع محطة المعالجة وتنفيذ بناية لمقر الصيانة وتنفيذ شبكة ماء ، تنفيذ شبكة كهرباء مع مركز للصيانة وشبكة اتصالات وتبليط الطرق.

اهداف المشروع :

ويهدف المشروع الى توفير خدمة ملائمة لشريحة من المواطنين المتعفين وذوي الدخل المحدودة وتوفير فرص عمل في المنطقة طيلة فترة انجازه.

- يقدر عدد المستفيدين من المشروع بحوال (٣٠٠٠) فرد.
- تم التعاقد والمباشرة بتنفيذ شبكة المجاري مع محطة معالجة ونسبة انجاز ٨١% وتوقف المشروع منذ عام ٢٠١٥ بسبب قلة التخصيصات .

٢- دراسة وتصميم مشروع توفير البنى التحتية لمشاريع السكن في منطقة الشريفات بكلفة قدرها (٤٥٠) مليون دينار (مدرج في عام ٢٠١٣) :

يتضمن المشروع اعداد دراسة لإنشاء مجمع سكني متكامل في منطقة الشريفات / محافظة كربلاء والتي ستنفذه المحافظة ضمن مبالغ تخصصها الادارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر بعد اكمال الدراسة والتصاميم والمخططات بواقع (١٠٠٠) وحدة سكنية . ويشمل المشروع توفير دراسة وتصاميم تم انجازها لـ:

- تنفيذ شبكة كهرباء.
- انشاء بناية مركز صيانة الكهرباء.
- استحداث مغذي من محطة الوند.

خمسة عشر: ديوان الوقف الشيعي:

تنفيذ مجمع سكني اقتصادي لإسكان الفقراء بعدد (٣١٦) وحدة سكنية في محافظة كربلاء المقدسة، بكلفة (٢٠) مليار دينار (مدرج في عام ٢٠١٥) :

- المشروع مستثنى من اجراءات الادراج والاعلان واحالة والتعاقد حسب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد:س.ل/ ٧٣٨ بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٦
- بسبب قلة التخصيصات لم يتم المباشرة باجراءات المشروع من (اعلان ، إحالة ، تعاقد).
- اجريت مناقلة للمشروع بمبلغ (٢) مليار دينار وبسبب تأخر اطلاق الصرف لم يحال المشروع عام ٢٠١٨.
- احيل المشروع وتمت المباشرة في العمل بتاريخ ٣٠/٥/٢٠١٩ وبنسبة انجاز ١٩%، و العمل مستمر.

إعادة تأهيل و تسوية تجمعات السكن العشوائي:

العشوائيات هي مجتمعات ومباني تم انشاؤها من غير ترخيص في ارض تملكها الدولة او يملكها اخرون في منطقة حضرية وبما لايتلائم مع النسيج العمراني للمجتمعات التي تنمو بداخلها او حولها ومتعارضة مع الاتجاهات الطبيعية للنمو والامتداد وهي مخالفة للقوانين المنظمة للعمران وقد بدأت ظاهرة العشوائيات منذ عقود طويلة في العراق كمشكلة محدودة ثم تنامت بشكل واضح بعد عام ٢٠٠٣ بشكل بات يهدد المجتمع والدولة اقتصاديا وامنيا ، حتى اخذت تشكل حتى عام ٢٠١٣ مانسبته تتجاوز ٧,٣% من اجمالي عدد المساكن في العراق ، ٧,٧% من مجموع السكان ونشأت وتنامت هذه الظاهرة لاسباب عديدة مما يستدعي دراستها ووضع الحلول لها .

تبنت اللجنة الفنية لإستراتيجية التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط رصد هذه المشكلة وإقتراح آلية معالجتها وأستمراراً على منهج توفير سكن ملائم للفقراء في الستراتيجية السابقة (٢٠١٠-٢٠١٤) ،جاءت وثيقة ستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق (٢٠١٨-٢٠٢٢) والتي اقرها مجلس الوزراء بالقرار ٤١ لسنة ٢٠١٨ ، وفي محصلتها الرابعة (سكن ملائم وبيئة مستجيبة للتحديات) ولكون المناطق العشوائية هي بؤرا للفقر ولأهمية حل مشكلة العشوائيات وتوفير سكن ملائم للسكان الفقراء في العشوائيات ، بهدف توفير إطار متكامل عن حجم العشوائيات وعدد سكانها ومواقعها وعائدية الارض المتجاوز عليها .

تبنت اللجنة الفنية لاستراتيجية التخفيف من الفقر وبدعم فني من منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) مشروعاً متكاملًا يحقق أكثر من هدف لستراتيجية تخفيف الفقر ، وتشكلت لجنة توجيهية عليا لمعالجة العشوائيات والتي تضم ممثلين كل من وزارات (التخطيط ، الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ، امانة بغداد) تحت مظلة وزارة التخطيط .

وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٥ تم اقرار خارطة طريق للبرنامج الوطني لاعادة تأهيل وتسوية تجمعات السكن العشوائي في العراق والتي اعدت بدعم فني من منظمة الهيباتات ويهدف البرنامج الى الاتي :

- معالجة مشاكل التجمعات العشوائية في العراق من خلال تطبيق الحلول العلمية المنصفة والفعالة والتي تناسب ظروف كل منطقة بعد اجراء تقييم لها استنادا الى مؤشرات قياسية .
- تعزيز قدرات السلطات المركزية والمحلية التنسيقية لتطبيق آليات تخفيف الزحف الحضري غير المنضبط والعشوائي .

اما اطر العمل في خارطة طريق برنامج تأهيل ومعالجة التجمعات العشوائية فهي :

- المحور الفني / الاداري.
- المحور القانوني التشريعي.
- المحور المالي.
- المحور المؤسسي.

وتأسيسا على نموذج الاستراتيجية فأن المراحل الاساسية لاطر العمل كالآتي :

- مرحلة التهيئة والاعداد للمباشرة بالمعالجة.
- مرحلة المعالجة والحد من تفاقم الظاهرة.
- مرحلة معالجة اسباب نشوء الظاهرة لمنع تكرارها مستقبلا.


وان لكل محور ، فقراته وحسب المراحل ، وكذلك لكل فقرة ، اجراءاتها وحسب المرحلة ايضا .
تستند خارطة الطريق للبرنامج الوطني تأهيل وتسوية السكن العشوائي الى الآليات المطبقة بالفعل في المؤسسات المعنية في اقرار الخطط والبرامج السنوية وسيدعم هذا البرنامج الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع ذات الصلة لتنفيذ الحلول المنشودة .

❖ في إطار العمل الفني والاداري :

مرحلة تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي:


- شكلت لجان فرعية عليا في المحافظات برئاسة نائب المحافظ وممثلين عن الدوائر القطاعية المعنية ولجان فنية سائدة لانجاز المهام الموكلة بموجب خارطة الطريق .
- تم تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في العراق عدا اقليم كردستان ومحافظة نينوى خلال عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧ بموجب صور فضائية عالية الدقة تم توفيرها من قبل منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) .
- اعداد برنامج تفصيلي لدعم تنفيذ المشروع حيث تم استخدام برنامج Access والمعد على اساس نموذج مبني على بيانات إجتماعية وإقتصادية سابقة ضمن المواصفات العالمية ، ويتم ادخال المعلومات الخاصة بالمسح الجديد بعد حصر العشوائيات وربط بياناتها بالصور الفضائية التي تنظم في جداول هذا البرنامج وتدخل ضمن معادلات صممت من وفق منهجية دولية في مجال العشوائيات وعلى اساس هذه المدخلات يحدد نوع التدخل (ارتقاء ، اعادة توطين) لكل عشوائية .
- اطلقت نتائج مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي سنة ٢٠١٧ وادناه اهم النتائج :-

- بلغ عدد تجمعات السكن العشوائي في ١٤ محافظة شملها المسح حوالي (٤٠٦٠) تجمعاً عشوائياً .
- بلغ عدد الوحدات السكنية العشوائية (٥٤٤٨٣٧) وحدة سكنية ، تشكل مانسبته (١٥,٣%) من مجموع الوحدات السكنية في العراق .
- تم تقدير اعداد السكان القاطنين في المساكن العشوائية (٣,٤٥٠,٥٤٧) نسمة يشكلون نسبة قدرها (١١,٩%) من مجموع السكان في العراق .
- اظهرت نتائج المسح ان نسبة (٩٠%) من عائدية الاراضي المشيد عليها تجمعات السكن العشوائي تعود للقطاع الحكومي و(١٠%) منها تعود عائديتها للقطاع الخاص .
- بلغت نسبة استعمالات الارض (السكني) لتجمعات السكن العشوائي (٢٧%) ونسبة استعمالات الارض (غير السكنية) (٧٣%) ، وان اعلى نسبة للاستعمال لجنس غير السكني كانت في مناطق خضراء بلغت (٣٥%)

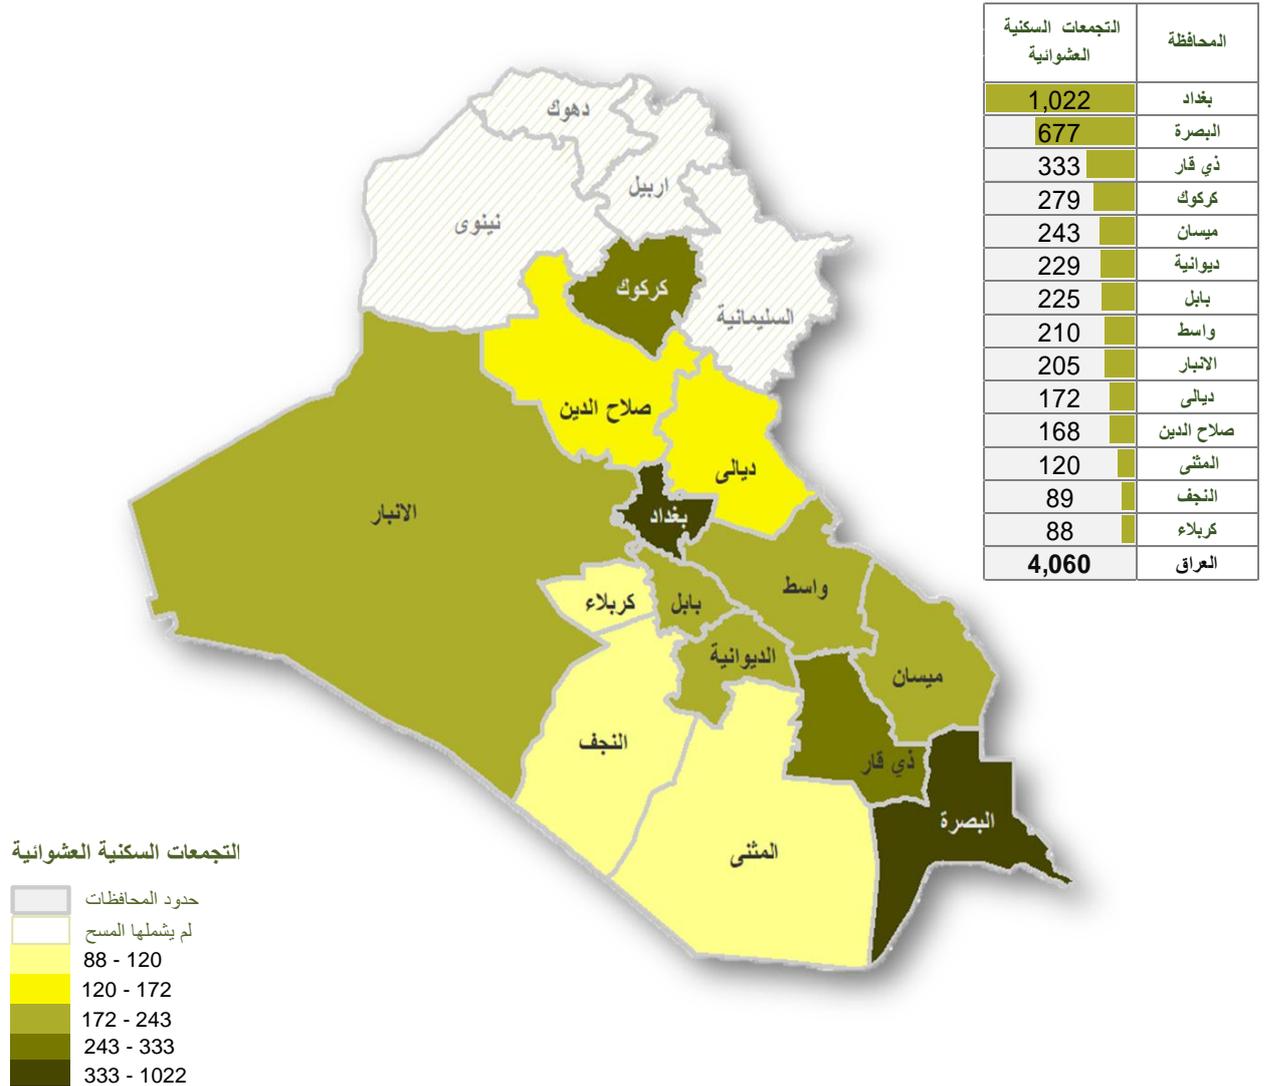

البيئة التجريبية في بغداد:

وفي اطار تنفيذ خارطة الطريق لمعالجة تجمعات السكن العشوائي بعد تثبيت مواقع التجمعات فيها تم تنفيذ بيئة تجريبية من خلال اختيار تجمعين عشوائيين في بغداد / كاظمية / محلة ٤٠٥ كمشروع رائد لاختيار المعالجات المطلوبة للتجمعات العشوائية وتوفير البيانات على مستوى التجمع والاسر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وقياس مؤشرات الفقر بالاضافة الى النسيج العمراني لهذه التجمعات والخدمات المتوفرة ، وقد تم اصدار تقرير المسح التجريبي في محافظة بغداد لمشروع البرنامج الوطني لاعادة تأهيل وتسوية تجمعات السكن العشوائي في عام ٢٠١٩ .

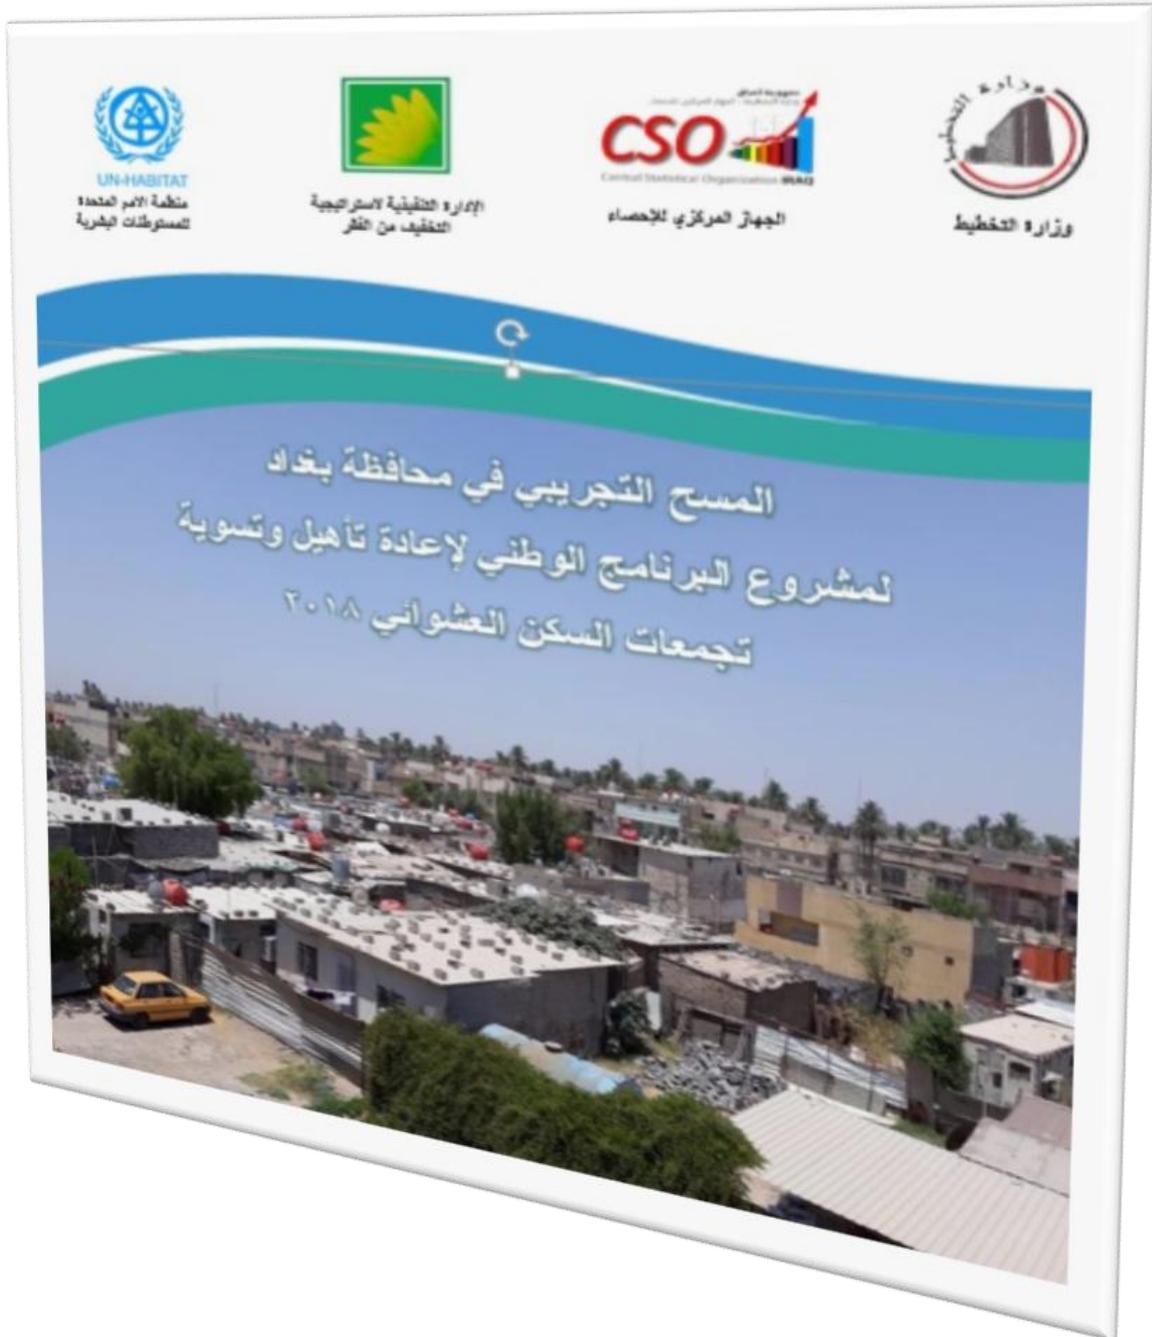

وإدناه أهم النتائج التي توصل إليها المسح :

- استمرار التوسع لحدود التجمع وعدد المساكن العشوائية وعدد سكان العشوائية مقارنة بنتائج تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي ٢٠١٦ حيث بلغت نسبة الزيادة ١٠٠% ، بلغ عدد المساكن العشوائية في سنة ٢٠١٦ حوالي (٣٣٢) مسكن ازيد سنة ٢٠١٨ ليصبح (٦٥١) مسكن ، يقدر عدد سكان العشوائية سنة ٢٠١٦ (٩٣٨) نسمة ازيد سنة ٢٠١٨ ليصبح (١٩٤٦) نسمة.



- نسبة المساكن العشوائية المتهرئة بحدود ١١% والمتوسط ٢٧% والجيدة ٦٢% .

- المساكن المشيدة من قبل ساكنيها لا تتجاوز ٦٤% والباقي (ايجار ١٣% ، مشتراة ١٨% ، مجانا ٥%).

- متوسط مساحة المسكن العشوائي ١٠٩ م^٢.


- معظم الجدران للمساكن من المواد الثابتة (طابوق، حجر، بلوك، ثرمستون)

بنسبة ٩٨% اما الجدران من

المواد الغير ثابتة (سندويج بنل، طين، قصب، قماش،... الخ) لا تتجاوز ٢% .

- مادة السقف الثابت (صب مسلح، شيلمان) بنسبة ٧٦% ، والغير ثابت مثل (سندويج بنل، خشب،... الخ) لا تتجاوز ٢٤% .


- نسبة الشوارع المبلطة للعشوائية ١٨% والغير مبلطة (ترابي ٥٥% ، سبيس ٢٧%) .
- نسبة جمع النفايات من قبل البلدية ١٤% و ٥٦% مقبول بالاتفاق مع الاسر ، نسبة ٩% .
- توضع في حاويات مخصصة ونسبة ٢١% (ترمي او تحرق او تطمر بشكل غير نظامي) .
- مصدر الماء الرئيسي من الشبكة العمومية بنسبة ٩٨% وحنفية عامة بنسبة ٢% .

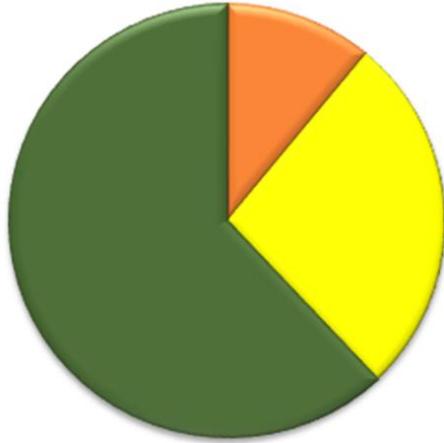

جيدة متوسطة متهترئة

- مصدر الكهرباء بنسبة ٩٨% من الشبكة العمومية ٢% من المولدات .
- استعمال الارض للعشوائية المختارة زراعي بموجب التصميم الاساس والنسيج العمراني لها غير منتظم وعائدية الارض تتوزع بين املاك زراعية خاصة وملكيات عامة (البلدية،المالية،السكك) .

- الاسترشاد من نتائج المشروع الرائد اعلاه في تنفيذ مسح ميداني شامل في محافظات العراق لتجمعات السكن العشوائي في المناطق الحضرية يتضمن استمارتين لتوفير البيانات الاولى تتضمن معلومات عن التجمع (الموقع،الاستعمال،توفر الخدمات،تاريخ التشييد....الخ)



والاستمارة الثانية تتضمن معلومات اجتماعية واقتصادية عن الاسر الساكنة.

بالإضافة الى أطر وتعليمات ساندة لتنفيذ العمل والتي سوف توفر مؤشرات تفصيلية عن الخصائص

الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسكن والخدمات وتساعد نتائج المسح في تحديد نوع التدخل المطلوب (تأهيل وترقية ، او اعادة توطين).

● عقدت اللجنة التوجيهية لمعالجة العشوائيات اجتمعاها برئاسة السيد وزير التخطيط بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٤ وبحضور مدير برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق لغرض



ايجاد الحلول المناسبة لظاهرة العشوائيات وبما يسهم في خلق حياة افضل لسكانها وفق ما تسمح به الظروف في البلد والاستفادة من تجارب الدول الاخرى، و في ظل تأخر اقرار قانون معالجة التجاوزات السكنية ومن اجل تحديد حجم المشكلة ومدى انتشارها قررت اللجنة تحديث مسح العشوائيات.

واهم الاجراءات المتخذة في هذا الصدد:

- اعداد خارطة طريق ومنهجية العمل في المرحلة الخاصة بتحديث مسح تحديد مواقع تجمعات السكن العشوائي في العراق في ضوء توصيات اجتماع اللجنة العليا لمعالجة السكن العشوائي الذي عقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٤ وتمت الموافقة عليها من قبل السيد وزير التخطيط .
- تم اجراء اجتماع تشاوري افتراضي بين اعضاء اللجنة التوجيهية العليا لمشروع معالجة العشوائيات ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهاييتات) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٨ لغرض بلورة محاور ومنهجية نموذج التكافل الحضري المستدام باستحداث الانشطة الاقتصادية في تجمعات السكن العشوائي من خلال سياسة التمكين .
- العمل جاري حالياً لتشكيل اللجان في المحافظات لمتابعة تنفيذ العمل الميداني و كالتالي:
 - ١- لجنة فرعية ترتبط باللجنة التوجيهية العليا تتولى مهام ادارة المشروع بالتنسيق مع اللجنة العليا وتكون برئاسة نائب المحافظ وعضوية (مدير الاسكان ، مدير البلديات في المحافظة، مدير البلدية المعنية ، مدير تخطيط المحافظة، مدير أحصاء المحافظة).
 - ٢- تشكيل لجنة فنية من المديریات أعلاه برئاسة مدير تخطيط المحافظة.

❖ في طار العمل القانوني/التشريعي:

- قانون معالجة التجاوزات السكنية في العراق:
- اعداد مسودة قانون معالجة التجاوزات السكنية بديل للقرارين ١٥٤،١٥٦ لسنة ٢٠٠١ الذي يتناول ازالة التجاوزات الجديدة ومعالجة العشوائيات القائمة.
- صادق مجلس الوزراء على مسودة قانون معالجة التجاوزات السكنية بالقرار رقم (٢٨٨) بتاريخ ٢٠١٧/٧/٤ وتم ارسالها الى مجلس النواب لتشريعه.
- دمج مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية مع مشروع قانون صندوق تطوير العشوائيات مع اضافة فصل في مسودة القانون والخاص بمعالجة التجاوزات على الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساس لمدينة بغداد والبلديات وهو حالياً في مجلس النواب .

مذكرة التفاهم:

- اعداد مذكرة التفاهم بين وزارة التخطيط ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهاييتات) حول تقديم الدعم الفني للمشروع من خلال تقديم الدعم للفقراء في ايجاد السكن الملائم لهم وإعادة تأهيل التجمعات السكنية العشوائية .

➤ توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التخطيط ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) في ٢٠٢٠/١١/٤ وإن الهدف من مذكرة التفاهم هذه هو توفير إطار للتعاون وتسهيل الشراكة بين الطرفين في النشاطات والفعاليات المتعلقة بالبرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتسوية تجمعات السكن العشوائي في العراق ، علاوة على ما تتطلبه من اسناد من قبل الهابيتات في ظل جائحة كورونا .



❖ في الأطار المالي:

➤ اعداد مسودة قانون صندوق تطوير العشوائيات لتسهيل توفير التمويل لمشاريع الترقية والتطوير لتجمعات السكن العشوائي في المدن العراقية وترميم وتأهيل الدور السكنية فيها .

➤ دمج مقترح مشروع قانون صندوق تطوير العشوائيات بأضافة مادة الى قانون معالجة التجاوزات السكنية والذي يناقش حالياً في مجلس النواب .

جدول رقم (٧) المشاريع المدرجة ونسب انجازها ضمن المحصلة الرابعة

ت	اسم المشروع	الوزارة او المحافظة	الكلفة الكلية (بالمليون)	المصروف التراكمي (بالمليون)	نسبة الانجاز (%)	الملاحظات
١	بناء دور واطئة الكلفة	الانبار	٢٥٠٠	١٣١٥,٦٤	١٠٠	
٢	بناء وحدات سكنية اقتصادية	كر كوك	١٥٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠	
٣	انشاء وحدات سكنية عمودية اقتصادية للفقراء	الديوانية	٤٠٠٠	٥٣٠,٣٩٥	١٠٠	
٤	انشاء وحدات سكنية افقية اقتصادية للفقراء	الديوانية	٤٠٠٠	٢١٤٩,٢٩٦	٩٨	
٥	انشاء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	الديوانية	١٥٠٠٠	٣٥٥٨,٠٦١	٩٨	
٦	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء (المرحلة الاولى)	الانبار	١٥٠٠٠	١٢٩٨٠,٧٢١	٩٠	
٧	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء (المرحلة الثانية)	الانبار	١٧٧١٥	١٠٠٤٢,٤٧٣	٨٠	
٨	بناء وحدات سكنية اقتصادية	بابل	١٨٠٠٠	٧٦٩٦,٤	٦٣	
٩	بناء وحدات سكنية اقتصادية	صلاح الدين	٢٥٠٠٠	١٠٣٢٨	٤٨	
١٠	بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة	واسط	٣٥٠٠٠	٣٣٩٠	٥٦,٨٨	
١١	بناء وحدات سكنية اقتصادية	كر كوك	٦٤٤١	-	٦٠	
١٢	بناء وحدات سكنية اقتصادية	الوقف الشيعي	٢٠٠٠٠	١٨٠٩,٩٦٠	١٩	
١٣	بناء وحدات سكنية اقتصادية	الاعمار والاسكان	٥٠٠٠٠٠	٩٢٨٩,٢	٧,١٣	
١٤	بناء وحدات سكنية اقتصادية	البصرة	٤٠٠٠٠	-	٨	
١٥	انشاء مجمع سكني واطئ الكلفة	ذي قار	٤٠٠٠٠	٤١٦٦,٨٦	١٥	
١٦	انشاء مجمعات سكنية مخصصة للفقراء	المثنى	٤٥٠٠٠	٣٦١٠,٩	١٠٠	
١٧	انشاء دور واطئة الكلفة	ميسان	٤٦٩٣	-	٠	
١٨	انشاء دور واطئة الكلفة	ميسان	٤٩٩٧	-	٠	
١٩	بناء وحدات سكنية	نينوى	٢٤٥٠٠	-	٠	
٢٠	انشاء دور واطئة الكلفة	ديالى	٧٠٠٠	-	٠	
٢١	انشاء مجمع سكني واطئ الكلفة	كر كوك	١٠٢٦٠	-	٠	

المحصلة الخامسة حماية اجتماعية فعالة للفقراء



المحصلة الخامسة

حماية اجتماعية فعالة للفقراء

تسهم الحماية الاجتماعية في إرساء دعائم المساواة والعدالة الاجتماعية والحد من الفقر والتهميش في المجتمع. وتتضمن منظومة الحماية الاجتماعية نظام التوزيع العام (البطاقة التموينية)، ونظام شبكة الحماية الاجتماعية، ونظام التقاعد الوطني، ونظام التأمين الاجتماعي الذي لم ينجز لحد الآن. وهذه الأنظمة بحاجة إلى تصحيح للتشوهات التي أصابها منذ بدء تطبيقها، وأهم تلك التشوهات عدم مراعاة الأهمية حصول مبدأ الاستهداف للفئات أو المناطق الجغرافية بحسب خريطة الفقر. وتتابع الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر تنفيذ هذه الأنظمة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بآليات المتابعة الخاصة بها.

إصلاح نظام لبطاقة التموينية وربطها بقاعدة بيانات المشمولين بشبكة

الحماية الاجتماعية:

لقد قُدمت محاولات ومبادرات عديدة من الحكومات المتعاقبة بعد ٢٠٠٣ لإجراء إصلاحات حول نظام البطاقة التموينية الذي تم إنشائه في العراق في ظل ظروف اقتصادية سيئة وارتفاع خط الفقر ليشمل أغلب فئات الشعب العراقي في أعقاب الحصار الاقتصادي الشامل الذي فرض عليه عقب أحداث آب ١٩٩٠، إذ تحول هذا النظام الى عبء كبير على الموازنة العامة، حيث بلغت نسبة الانفاق على البطاقة التموينية ١٠,٩% من اجمالي الانفاق العامة للمدة ٢٠٠٤-٢٠٠٩، وهي تفوق نسبة الانفاق على الصحة ٤,٥%، او التعليم العالي ٦,٩% لنفس المدة، وهي نسب لم تتغير كثيراً للسنوات اللاحقة، كما أن النظام فقد أهم ركيزة يستند اليها وهي (إستهداف) الفقراء مقابل (إستبعاد) غير المستحقين، إذ انه لا يزال يوزع على كافة العراقيين تقريباً بغض النظر عن مستويات دخولهم او ثروتهم (رغم المحاولات غير المكتملة لاستبعاد من يحصلون على دخل فوق المليون ونصف)، لكن جل هذه المحاولات والحجج لم تفلح في إجراءات إصلاحات حقيقية في البنية الاساسية للنظام، وبقي مستمراً رغم ما شابهه من

عشرات خاصة عدم وصول المواد الغذائية الى المستحقين بانتظام وبشكل كامل، فضلا عن تقلص هذه المواد ورداءتها.

ركزت المحصلة الخامسة من وثيقة استراتيجية التخفيف من الفقر في العراق ٢٠١٨-٢٠٢٢ في احد أنشطتها على بناء نظام حماية اجتماعية فعالة للفقراء والذي يتضمن وضع إجراءات لجعل نظام الحصة التموينية اكثر عدلا من خلال استهداف الفقراء والفئات الأكثر حاجة عن طريق نظام متكامل لرصد وتقويم و اصلاح نظام البطاقة التموينية . يأتي في مقدمة تلك المشاريع مشروع تطوير الاهداف والدمج النظامي للبطاقة التموينية و الحماية الاجتماعية تأكيداً من القائمين على الاستراتيجية بأهمية وفاعلية هذا المشروع لتخفيف عبء الفقر عن شريحة كبيرة من المجتمع العراقي .

بداية الإصلاح وتشكيل اللجنة:

تشكلت لجنة عليا لإصلاح نظام البطاقة التموينية بأمر ديواني رقم (١١) لسنة ٢٠٠٩ برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء و ١٤ عضواً من مجلس النواب ، ووكلاء وزارات التخطيط والتجارة والعمل ومستشارين وممثلو المحافظات)، واعدت تشكيل هذه اللجنة بموجب الامر الديواني رقم (٧٤) لسنة ٢٠١٧ .

عقدت اللجنة عدة اجتماعات توصلت فيها الى تشكيل ثلاث لجان فرعية بموجب الامر الديواني رقم (١٢٠) لسنة ٢٠٠٩ هي (لجنة الاهداف / برئاسة وكيل وزارة التخطيط ، لجنة إدارة مواد البطاقة برئاسة مستشار رئيس الوزراء، لجنة مواد البطاقة برئاسة وكيل وزارة التجارة) وقد عدت هذه اللجان ثلاثة دراسات بهذا الصدد .

فيما يتعلق بالاهداف : حاولت الدراسة وضع مجموعة سيناريوهات على قاعدة التدرج في عمليات استهداف الفئات السكانية المحتاجة لدعم البطاقة التموينية .

وفي ضوء ذلك وضعت التصورات الآتية :

● الاستهداف الجغرافي (عدم المساس بالريف)

أن استثناء الريف من الاستهداف له ما يبرره ، لان شمول الريف بالاستهداف يعني أثارا إضافية على الفقراء وتصاعدا في نسبة الفقر في الريف و عموم البلد.

● السير الوئيد:

عدم التوسع في تقليص عدد المشمولين في المدى القصير.

● الربط بنظام الحماية الاجتماعية:

ان آلية الربط الجديدة تستلزم ان تضع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نظاما فعالا وديناميكيا للتعامل مع نظام الحماية الاجتماعية، وقادر على الارتباط مع نظام البطاقة التموينية.

وفيما يتعلق ب**مواد البطاقة** اوصت اللجنة بتقليص مواد البطاقة الى خمس مواد هي (الطحين، الرز، السكر، الزيت النباتي، حليب الاطفال).

اما بخصوص **ادارة نظام البطاقة التموينية** وضعت اللجنة بديلين لنظام الادارة هما:

● ابقاء النظام على صيغته الحالية (الادارة المركزية).

● اعتماد اللامركزية بأناطة اعتماد الاستيراد والخرن والنقل والتوزيع بالحكومات المحلية.

ورأت اللجنة تبني الخيار الاول بالابقاء على ادارة نظام الحصة التموينية مركزيا على ان يعزز هذا النظام بألية مراقبة وتقييم تتولاها الادارات المحلية.

في طريق التنفيذ:

صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة بموجب قراره رقم (٣٦٩) لسنة ٢٠٠٩ على ان تتولى وزارة التجارة العمل بما جاء بالتوصيات من خلال متابعة التنفيذ، وتخويل الوزارة صلاحية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيقها بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولغرض وضع خطة للاستهداف وتحديد المشمولين بالحجب تم تنفيذ عدد من الاجراءات هي:

أ. حجب البطاقة عن الأسر التي يزيد دخلها عن مليون وخمسمائة الف دينار من العاملين في القطاع الحكومي والعام وقد تم حجب البطاقة التموينية عن حوالي (٩٠٠) الف مواطن لغاية عام ٢٠٢٠ على الرغم من عدم تعاون الوزارات والجهات مع وزارة التجارة في ما يتعلق بتزويد الوزارة بالموظفين التي تزيد رواتبهم عن الحد المقرر انفا.

ب- بخصوص العاملين في القطاع الخاص كالمقاولين والتجار والصناعيين وغيرهم، تعذر الحصول على اسماء واعداد المسجلين حسب أصنافهم او درجاتهم ، لاعتمادها في تحديد المستهدفين الذين يزيد دخلهم عن الحد المقرر لشمولهم في الحجب ايضا لامتناع اغلب الجهات عن تزويد وزارة التجارة بالاسماء .

ج- عرضت وزارة التجارة مقترح استمارة التنفيذ مسح الشمول لاستهداف الفئات الفقيرة أوصت اللجنة العليا بعد مناقشتها بتشكيل لجنة فرعية لدراستها ورفع التوصيات بشأنها .

وقد توصلت اللجنة الفرعية اضافة عدد من البيانات إلى استمارة الشمول التي اعدتها الوزارة والتي تشمل بيانات عن عدد افراد العائلة واعمارهم وحالتهم العملية ، وقد تم توزيعها على وكلاء المواد التموينية ولكن الوزارة أخفقت في تحقيق الهدف من هذه الاستمارة بسبب عدم افصاح المواطنين عن بياناتهم الحقيقية على الرغم من تحميلهم المسؤولية القانونية عن صحة البيانات .

سيناريو تبني نظام البطاقة الذكية:

في ضوء الجدول الذي دار حول اليات اصلاح نظام البطاقة التموينية مع الأخذ بنظر الاعتبار المطالبات الوطنية و الوضع المعيشي للأسرة العراقية ، وبعد الاطلاع على تجارب الدول خلال اجتماعات اللجنة العليا لإصلاح نظام البطاقة التموينية ، تم تقديم المقترح الآتي :

- اصدار بطاقة ذكية لكل اسرة ترغب الحصول عليها . وتوفر هذه البطاقة إمكانية الحصول على تسهيلات التموين للسلع المدعمة للجميع ، الطحين ، الوقود ، وكل ما يتقرر إخضاعه للتموين أو الدعم.
- اصدار بطاقة ذكية للتموين للسلع ضمن سلة غذائية تؤمن حدا مناسباً من السعرات الحرارية (بحدود ١٠٠٠ / سعرة) للفرد الواحد في اليوم الواحد ، ويعتمد في مستوى الشمول المعايير التي سبق أن تم اقرارها في خطة اصلاح نظام البطاقة التموينية.
- - اصدار بطاقة ذكية للتموين والدعم للفئات الهشة (دون خط الفقر) يضاف فيها الى السلة الغذائية المشار اليها في الفئة الثانية عدد من المواد الغذائية الأخرى التي توفر عناصر تغذية اخرى كالبروتينات تشمل (البيض ، الحليب ، او غيرها) .

مع ملاحظة ما يأتي :

- امكانية تصميم البطاقة بحيث تعكس عملية الترميز صنف الأسرة (للفئات الثلاثة المذكورة) ،
- أن يكون النظام مرناً يسمح بانتقال الأسرة من فئة الى اخرى في ضوء معايير تصنيف الأسر الى الفئات الثلاثة.
- يعتمد النظام على حق الأسر بالتجهيز من الأسواق المحلية التي سيتم الاتفاق فيها عبر شركات مجهزة تؤمن وكلاء لها في كل المناطق .
- تعتمد الية تصميم البطاقة الذكية ، على أن يتوفر القاري الالكتروني في الأسواق التي يتم الاتفاق عليها.

- التشديد على التقيد بمفردات المواد التي يتم الاتفاق عليها مع وضع مرونة في تغيير بعض المواد أخذًا بالاعتبار الاحتياجات او التفضيلات القائمة حسب المناطق وما هو متوفر في اسواقها.
- أن هذه الأفكار أولية ، يتطلب تطويرها في ضوء مراجعة موضوعية لإصلاح النظام وتوجهات الدولة.

تم الاتفاق على اعداد ورقة أولية في ضوء ما تقدم ، تناقش في ورشة عمل يحضرها خبراء البنك الدولي في بغداد ويتطلب ذلك تنظيم سلسلة لقاءات مع الجهات المختصة (اللجنة العليا الإستراتيجية التخفيف من الفقر ولجنة إصلاح البطاقة التموينية ، اللجان المختصة في مجلس النواب ، مجالس المحافظات ، منظمات المجتمع المدني).

البيئة التجريبية:

نفذت بيئة تجريبية في محافظة النجف - ناحية الحرية حول كيفية توزيع مفردات البطاقة التموينية باستخدام البطاقة الذكية بالتعاون بين وزارات التخطيط ، التجارة ، الاتصالات) وكانت هذه التجربة الفريدة تحت اشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء / اللجنة العليا لإصلاح نظام البطاقة التموينية. اذ بلغ عدد سكان هذه الناحية حوالي (٣٤٨٤٤) فرد أي حوالي (٦٥٨٨) اسرة تزود كل اسرة ببطاقة ذكية ورقم تعريفى بحسب عدد أفرادها لتنفيذ بيئة تجريبية خلال شهري آذار ونيسان وايار عام ٢٠١٧ وبنظام تقني عالي وحديث يوفر السرعة في التوزيع و العدالة وعدم نقص التجهيز والقضاء على الفساد .

وفي عام ٢٠١٩ تم تقييم هذه التجربة من قبل منظمة الغذاء العالمي ووضع التوصيات وتم رفع التقرير الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، والذي أوصت فيه :

- تمديد وتوسيع الفترة التجريبية و النطاق الجغرافي
- اعتماد نهج تجريبي
- تقوية أنظمة الرقابة والمتابعة
- مراجعة ترتيبات التعاقد

- تطوير آلية تسعير شفافة .
- تعزيز أنظمة المعلومات .
- تعزيز دور وزارة التجارة كضامن لتجهيزات المواد
- تقديم المزيد من المرونة للمستفيدين .

ومن الجدير ذكره هنا ان مجلس الوزراء كان قد قرر بجلسته الاعتيادية الثالثة والأربعين المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١١/٧ قراره رقم (٣٩٣) لسنة ٢٠١٧ بالموافقة على اعتماد قاعدة بيانات الفقر التي أعدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كمرتكز أساسي في تخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج الاجتماعية التي تتوجه وتهدف الفقراء في الوزارات والمؤسسات كافة العاملة في هذا الشأن.

التطورات الاخيرة:

التطورات الجديدة في هذا الملف هو ما قرره المجلس الوزاري للاقتصاد بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٧، والمبلغ الى الجهات المعنية بموجب كتاب المجلس الوزاري للاقتصاد ذي العدد ٤٣٤ بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٠ والذي قرر بموجبه عقد اجتماع تداولي برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية وكلاء وزارات (المالية، التخطيط، التجارة، الصناعة والمعادن، الزراعة) والهيئة الوطنية للاستثمار واتحاد الصناعات العراقي، لتقديم رؤى وافكار حول معالجة وضع البطاقة التموينية بما يستهدف تأمين المواد الغذائية الاساسية للفقراء وذوي الدخل المحدود في ظل انخفاض اسعار النفط وكيفية توفير تلك المواد.

وبالفعل عقد هذا الاجتماع التداولي وتمخض عنه الاتفاق على عدد من الاجراءات المتعلقة بتحسين الاستهداف وتحسين اليات التنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص وكذلك اهم الاجراءات المتعلقة بالمتابعة المستقبلية والتحسين، والجدول ادناه يلخص تلك الاجراءات والذي تم رفعه الى المجلس الوزاري للاقتصاد:

جدول رقم (٨) اجراءات تنفيذية لإصلاح نظام البطاقة التموينية

ت	الاجراء	الجهة المسؤولة	المدة الزمنية	النتائج المتوقعة
الاستهداف	١	مجلس الوزراء - وزارة التجارة - وزارة العمل - ديوان الرقابة المالية	٣ اشهر	انخفاض عدد المشمولين بالبطاقة التموينية بنسبة تصل الى ٢٠-٢٥% مما يوفر فرص اضافية لتحسين مفردات البطاقة للفئات المستهدفة.
	٢	وزارة التجارة	٦ اشهر	انخفاض عدد المشمولين بالبطاقة التموينية بنسبة ١٠-١٥%.
اليات التنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص	٣	وزارة التجارة وزارة الداخلية وزارة التخطيط	٦ اشهر	تعزيز لمبدأ الشفافية وخفض حالات الهدر والفساد
	٤	وزارة التجارة	٦ اشهر	اعطاء مرونة اكثر للمتسوق في اختيار المواد بالجودة والنوعية المرغوبة - تطوير وتشجيع القطاع الخاص - افساح المجال لوزارة التجارة للاهتمام بملفات اخرى.
المتابعة المستقبلية والتحسين	٥	وزارة التجارة - وزارة العمل	٦ اشهر	تحقيق الاستهداف الامثل والمرونة في تحديد المستحقين.
	٦	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	مستمر	تحقيق مبدأ العدالة في استهداف فئات المجتمع.

وبعد اطلاع المجلس الوزاري للاقتصاد بجلستة العاشرة المنعقدة بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٠ قرر (قيام السادة المذكورين بالاجتماع السابق بأعادة تقديم الدراسة في ضوء الملاحظات التي تم طرحها ومناقشتها خلال اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد مع الاستعانة بعدد من الخبراء المتخصصين بهذا الشأن، على ان تكون الشريحة المستهدفة بالدعم هي الاسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود).

وفي ضوء ملاحظات المجلس الوزاري للاقتصاد عقدت عدة اجتماعات لبلورة الورقة النهائية للاصلاح تمخض عنها ما يأتي:

اولاً: الثوابت:

١ - كل عائلة عراقية يكون لديها بطاقة تموينية (اصدار بطاقة الكترونية)

٢ - مراجعة وتعديل استمارة المعلومات عن مستوى معيشة المواطنين من قبل وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفي مدة اقصاها شهر واحد.

٣ - استمرار تولي وزارة التجارة بناء قاعدة بيانات مستوى الدخل و المعيشة للعراقيين جميعاً ، و محدثة في ضوء نتائج تحليل الاستمارة المشار اليها في اعلاه وعلى ضوء تحديد المستهدف الحقيقي اي بعد استبعاد الفئات غير المشموله بمفردات الحصة التموينية.

ثانياً: اجراءات تنفيذ اصلاحات نظام البطاقة التموينية:

اكمال وزارة التجارة متطلبات البطاقة الالكترونية بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي للوصول الى البيانات الحقيقية للمستهدين وبالتعاون مع وزارة الداخلية لمقاطعة بيانات البطاقة الموحدة مع بيانات البطاقة التموينية ويكون العمل بموجب البطاقة الالكترونية مباشرة عند الاصدار.

الحجب المؤقت من منافع البطاقة ويشمل:

١ . الحجب الفردي:

- أ. الهاربين من العدالة
 - ب. النزلاء في السجون
 - ج. المقيم خارج العراق
 - د. العراقيون في الخارج (الذين يحملون جنسية البلد المستضيف)
- (يكون الحجب فردي اذا كان هو ليس رب الاسرة)

٢ – الحجب الاسري:

- أ- رب الاسرة اذا كان موظف يكون راتبه الكلي ١,٥٠٠,٠٠٠ مليون وخمسمائة الف دينار واكثر.
- ب- اصحاب المهن الذين تكون مدخولاتهم الشهرية مليون وخمسمائة الف دينار واكثر.
- ج- اتحاد الغرف التجارية.
- د- اتحاد المقاولين.
- هـ- اتحاد الصناعات.
- و- نقابة الاطباء واطباء الاسنان.
- ز- نقابة الصيادلة.
- ح- اتحاد رجال الاعمال.
- ط- مسجلين الشركات (المدير المفوض والمساهمين).

ملاحظة:

تتولى وزارة العمل اصدار اعمام بكتاب رسمي الى الجهات ضمن فقرة الحجب اعلاه بتزويد وزارة التجارة بالبيانات الخاصة بالموظف الذي يكون دخله الشهري ١,٥٠٠,٠٠٠ واكثر وتزودها بالفئات المشمولة بالحجب وتتم المتابعة عن طريق تشكيل فريق عمل ميداني مع وزارة التجارة .

الفئات المستهدفة وتشمل (الاولوية):

- ١ - المستفيدون من شبكة الحماية الاجتماعية
- ٢- ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة
- ٣- المسجلين في قاعدة بيانات العاطلين عن العمل
- ٤ - العمال المضمونين والمتقاعدين
- ٥- كل اسرة عراقية يكون مدخولها الشهري اقل من مليون وخمسمائة الف دينار.

ثالثاً: التوصيات:

- ضمان استهداف الفئات المدرجة في الاولويات لـ ١٢ شهر وللمفردات الاساسية وتعمل وزارة التجارة بقرار حكومي لاستبعاد الفئات المحددة في فقرة الحجب المؤقت.
- اطلاق البطاقة التموينية الالكترونية وبالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي ووزارة الداخلية .
- اطلاق استمارة الشمول بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة العمل ووزارة الاتصالات للمواطنين والاستفادة من امكانيات الوزارات المذكورة في انجاح الاستمارة وتتولى وزارة التجارة تدقيق هذه الاستمارة حيث تذكر فقرة (يتحمل المواطن كافة التبعات القانونية اذا لم تكن المعلومات صحيحة) على ان تحدد الفقرة القانونية بصورة واضحة في هذه الاستمارة

- الزام كافة الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة بارسال قوائم الرواتب الخاصة بالموظفين على ان تتضمن رقم البطاقة التموينية ورقم مركز التموين ولا يتم اطلاق الرواتب الا بعد ورود اشعار من وزارة التجارة الى وزارة المالية بتدقيق القوائم وحجب ذوي الدخل العالية على ان يكون هذا الاجراء بوقت مناسب لايوثر على توزيع الرواتب.
- الزام وزارة الداخلية بتزويد وزارة التجارة بقاعدة بيانات البطاقة الوطنية الموحدة المنجزة والتحديث دورياً.
- الزام المفوضية العليا للانتخابات بتزويد وزارة التجارة بقاعدة بيانات المواطنين المحدثين للبطاقة البايومترية في داخل العراق والمقيمين في الخارج.
- الزام وزارة الصحة بتزويد وزارة التجارة بالبيانات الخاصة بالمتوفين والولادات.
- تشكيل لجنة عليا يترأسها وزير العمل ويشرف عليها رئيس مجلس الوزراء تتولى اجراء عمليات التعاقد وتمنح هذه اللجنة كافة الصلاحيات فيما يتعلق بالاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وايه اجراءات اخرى لتسهيل عملية التعاقد مقترحين ان تكون هذه اللجنة ممثلة من وزارة التجارة ووزارة التخطيط ووزارة المالية والدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء وللجنة حق الاستعانة باية جهات اخرى على ان تحدد مهام هذه اللجنة وصلاحياتها بموجب قرار من مجلس الوزراء.
- اللجوء الى القطاع الخاص المنضبط والملتزم لتجهيز مفردات البطاقة التموينية من خلال عقود طويلة الامد(لمدة سنة) على ان تراجع الاسعار شهريا من خلال اللجنة المذكورة اعلاه ينظر لاحقا بامكانية الاستفادة من البطاقة الالكترونية حسب الرؤيا بعد تطبيق الفقرات اعلاه
- تستمر وزارة التجارة ببناء قاعدة البيانات وتحديثها للمشمولين بالبطاقة التموينية الالكترونية والعمل باليات التوزيع والفحص والخزن والنقل.

- قيام وزارة الاتصالات بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ضمن اللجنة المشكلة للامر الديواني رقم(٢٢) باكمال عمليات الربط الشبكي بين الوزارات لسهولة نقل البيانات وتحديثها
- تقوم وزارة التجارة بانجاز البطاقة التموينية الالكترونية وباسرع وقت وبالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي .
- يحق ممن حجت عنهم البطاقة التموينية رفع الحجب عنها اذا قدموا ما يثبت عكس ذلك وفي اي وقت
- امكانية الاستفادة من تجارب الدول وعلى سبيل المثال التجربة المصرية باتمة نظامها الغذائي.
- تلتزم وزارة المالية بتمويل التعاقدات لتحقيق الامن الغذائي ضمن التوقييات المحددة لكون الامن الغذائي يعتبر ضمن الاولويات الاساسية في المجتمع.

الخلاصة والرؤيا:

خلاصة ماتقدم فأن اصلاح نظام البطاقة التموينية يتطلب العمل على جانبين مهمين هما عملية تحسين الالاستهداف ومحاولة الوصول للفئات المستحقة للدعم وتوجيه الدعم بالشكل الصحيح، والجانب الاخر هو تطوير وتحسين اليات التنفيذ لضمان وصول المواد بالوقت والنوعية المناسبة للمستحقين وتفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في العملية مع الابقاء على الدور الحكومي في عمليات المتابعة والرصد والتدخل في الحالات الطارئة.

ويمكن تلخيص هذه الرؤيا في الالاصلاح من خلال المصفوفة الاتية التي توضح الاجراءات والفئات المستهدفة من كل اجراء مع تحديد المديات الزمنية اللازمة للتنفيذ.

جدول رقم (٩) ملخص الرؤيا في اصلاح البطاقة التموينية

ت	الاجراءات	الفئات المستهدفة	المدى الزمني المدى القصير: (١ - ٣) اشهر المدى المتوسط: (٦ اشهر - سنة) المدى الطويل : (١-٢) سنة
١	الابقاء على شمول الجميع بمادة الطحين.	كل الاسر الراغبة في الحصول على مادة الطحين كونها سلعة شعبية .	قصير متوسط طويل
٢	تأمين مفردات البطاقة التموينية لباقي الاسر عدا الذين يتم استبعادهم كونهم من اصحاب الدخول المرتفعه .	الاسر التي تصنف على انها دون الفئات ذات الدخول المرتفعة .	قصير متوسط طويل
٣	التركيز على الفئات الهشة وغير الامنة غذائيا من خلال اعطاؤها الاولوية في التجهيز لمفردات البطاقة التموينية مع امكانية تعزيزها بمواد اخرى.	<ul style="list-style-type: none"> - المستفيدون من شبكة الحماية الاجتماعية . - ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة - المسجلين في قاعدة بيانات العاطلين عن العمل . - العمال المضمونين والمتقاعدين. 	قصير متوسط طويل
٤	حجب البطاقة التموينية عن ذوي الدخول المرتفعة . (مع ملاحظة ان الحجب يكون مؤقت كمرحلة اولى لحين اكمال اجراءات منح بطاقات متعددة للتمايز)	<p>الحجب الاسري ويشمل :</p> <ul style="list-style-type: none"> - العوائل التي يكون دخل رب الاسرة اكثر من (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة الف . - اصحاب المهن الذي يزيد دخلهم اكثر من (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة الف . - اعضاء اتحاد الغرف التجارية. - المسجلين في اتحاد الصناعات. - المقاولين المسجلين . - اعضاء نقابة الاطباء واطباء الاسنان . - اعضاء نقابة الصيادلة . - اتحاد رجال الاعمال . - المسجلين في الشركات (الاعضاء والمساهمين) . الحجب الفردي ويشمل : - الهاربين من العدالة . - النزلاء في السجون . - المقيمون خارج العراق . - العراقيون في الخارج الذين يحملون جنسية البلد المستضيف. 	قصير متوسط طويل

٥	الانتقال تدريجيا الى البطاقة التموينية الذكية ويكون لكل فئة بطاقة تموينية ذكية خاصة لغرض التمايز الفاعل في الاستهداف والمرونة في الاستجابة (الشمول والحجب)، ويكون التجهيز من خلال القطاع الخاص عن طريق تعبئة هذه البطاقات بقيمة السلع وحسب كل فئة .	تصدر بطاقة لكل فئة من الفئات المستهدفة وكما يلي : - بطاقة لذوي الدخل المرتفعة (وتستخدم للشمول بسلعة الطحين مع امكانية اضافة بعض السلع في اوقات الشحة والطوارئ بدون دعم كالوقود وغيرها) . - بطاقة لمن هم دون فئة الدخل المرتفعة واعلى من الفئات الهشة (وتستخدم للشمول بمواد البطاقة التموينية مع امكانية اضافة بعض السلع في اوقات الشحة والطوارئ بدون دعم) . - بطاقة للفئات الهشة وغير الامنة غذائيا (وتستخدم للشمول بمواد البطاقة التموينية مع اعطاؤها الاولوية في التجهيز وضمان حصصها وامكانية تعزيزها بمواد اخرى).	قصير	متوسط	طويل
٦	اكمال عملية الربط الشبكي بين الوزارات العراقية لتحديد المستهدفين مستقبلا بشكل دقيق من خلال تقاطع المعلومات الخاصة بالمرتبات وشبكة الحماية الاجتماعية		قصير	متوسط	طويل
٧	اكمال المسوح الاحصائية التفصيلية والتعداد العام لتحديد العوائل الفقيرة والاشد فقرا		قصير	متوسط	طويل
٨	تشكيل لجنة عليا لادارة ملف البطاقة التموينية .	تكون اللجنة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية .	قصير	متوسط	طويل
٩	الزام وزارة التجارة بتوفير خزير استراتيجي تتم ادارته بشكل فعال لمواجهة اي ازمة طارئة .		قصير	متوسط	طويل

المحصلة السادسة الأنشطة المستجيبة للطوارئ



المحصلة السادسة

الأنشطة المستجيبة للطوارئ

في ضوء التخصيصات المرصودة ضمن الموازنة الجارية لإستراتيجية التخفيف من الفقر لعامي ٢٠١٨-٢٠١٩ لتنفيذ الأنشطة المستجيبة للطوارئ (البرامج الخاصة). تشكلت لجنة عليا في وزارة التخطيط لإدارة عملية التنفيذ والاشراف كما شكلت لجان (حصر الاحتياجات وتحديد الأولويات ، لجنة تنفيذ امانة ، لجنة مشتريات ، لجان لإعداد الكشوفات وتدقيقها).

من خلال التنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء عبر مديرياته في المحافظات تم اختيار قرى متضررة جراء العمليات الإرهابية في المحافظات (صلاح الدين ، الانبار ، نينوى) للبدء بعملية تنفيذ مشاريع ضمن الأنشطة المستجيبة للطوارئ بأجراء حصر للاحتياجات وتحديد الأولويات للمجتمعات

اولا: محافظة صلاح الدين:

تنفيذ المشاريع في محافظة صلاح الدين ضمن الموازنة الجارية:

صادق وزير التخطيط بتاريخ ٢٠١٨/٧/٣١ على المضي في تنفيذ اعمال ترميم ٤ مدارس في محافظة صلاح الدين في قرى (ام شعيفة ، سنجار، جوائزرات) المتضررة وبكلفة تخمينية قدرها (١٥٠) مليون دينار .

باشرفريق متخصص من قبل الوزارة بتنفيذ الاعمال مع شرط توفير تكون الايدي العاملة من سكان القرى حصراً. وتجهيز المواد من الأسواق المحلية مما يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتوفير فرص عمل مؤقتة للعاطلين وكما يلي:-

اسم المشروع	نسبة الانجاز
تأهيل (٤) مدارس	١٠٠
تأهيل شبكات كهرباء	١٠٠
تجهيز بيت صحي عدد (١)	١٠٠

الأهداف المتحققة من المشروع:

- إعادة النازحين بنسبة تقارب (٨٠%).
- تحريك العجلة الاقتصادية في تلك المناطق.
- تشغيل (١٥٠) عاطل عن العمل في سكان تلك المناطق.
- تخفيض كلفة التنفيذ بنسبة تزيد عن (٤٠%) من الكلفة المقدرة .

ثانيا: محافظة الانبار:

تنفيذ المشاريع في محافظة الانبار ضمن الموازنة الجارية:

بغية استكمال تنفيذ المشاريع ضمن الموازنة الجارية لإستراتيجية التخفيف من الفقر في المحافظات المتضررة ، صادق وزير التخطيط بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٩ على تنفيذ مشروع صيانة مجمعات الماء عدد (٦) في قرى محافظة الانبار والتي تشكل على اثرها لجنة من وزارة التخطيط لتنفيذ الاعمال بموجب امر إداري .

باشرت اللجنة مهام عملها في نهاية شهر أيار بعد استلام سلفة مالية وزيارة موقع العمل والتنسيق مع مديرية ماء الانبار وتسمية أعضاء من المديرية في لجنة الاستلام والاتفاق على خطة العمل الموضوع لغرض الانتهاء من العمل في اسرع وقت لا يصلح الماء الصالح للشرب الى المواطنين.

استهدفت المشاريع المواقع الآتية:-

● ٢ مجمعات ماء في عامرية الفلوجة .

● ٢ مجمع ماء في كرامة الفلوجة .

● ١ مجمع في الرمادي

● ١ مجمع في هيت

● ١ مجمع تل احمد

بكلفة مقدارها (٢٤٩) مليون دينار وبلغ عدد العاملين في تنفيذ المشاريع ٢٣٠ عامل ماهر وغير ماهر.

الأهداف المتحققة من المشروع:

١. إيصال الماء الصالح للشرب الى اكثر من ٥٠٠٠٠ عائلة أي بما يعادل ٢٤٥٠٠ مواطن في القرى المستهدفة بعد تأهيل محطات التصفية العاملة في قراهم .
٢. تقوية عملية دفع الماء لايصال المياه الى المنازل البعيدة عن محطات التصفية وتقويتها لجميع المنازل.
٣. تشغيل أهالي المناطق المستهدفة بتأهيل محطات التصفية لرفع مستواهم المعاشي لهم وتوفير فرص عمل مؤقتة بواقع ٢٣٠ عامل طيلة فترة التنفيذ.
٤. شراء اغلب المواد الداخلة في العمل من الأسواق المحلية مما ساهم بانعاش الواقع الاقتصادي لتلك الأسواق .
٥. تحسن العلاقة وزيادة ثقة المواطن في الدوائر الخدمية من خلال سرعة الإجراءات المتبعة في التحضير والتنفيذ.

المشاكل والتحديات التي واجهت تنفيذ المشروع:

١. الوضع الأمني في بعض المناطق وصعوبة الدخول الى مناطق العمل .
٢. تباعد المسافة بين مواقع المجمعات (الرمادي ، الفلوجة ، هيت) وصعوبة التنقل بينهم ونقل الكادر والمواد.
٣. صعوبة توفير بعض المواد والأجهزة التخصصية في محافظة الانبار .
٤. صعوبة العمل في ظروف الأجواء الحرارة المرتفعة وخلال شهر رمضان المبارك
٥. عدم تواجد فريق العمل في مواقع العمل بشكل مستمر والاكتفاء بزيارات دورية لتنفيذ الاعمال المطلوبة .
٦. انشغال جميع أعضاء لجنة التنفيذ باعمال أخرى داخل دوائرهم وعدم إمكانية تفرغهم بشكل تام لمتابعة العمل
٧. صعوبة الاعتماد على العمالة المحلية في العمل بسبب قلة الاختصاصات الفنية الماهرة (الحدادة ، الكهرباء ، الصبغ ...الخ).

ثالثاً: محافظة نينوى:

تنفيذ المشاريع في محافظة نينوى ضمن الموازنة الجارية:

قامت اللجان المكلفة بحصر احتياجات وتحديد الاولويات لقرى المستهدفة والمرشحة من قبل الجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية احصاء نينوى ومدراء الدوائر القطاعية في محافظة نينوى (التربية – الصحة – الماء- الكهرباء) واهالي القرى المستهدفة. حيث تم اختيار القرى المستهدفة على اساس عدم شمولها باي دعم من قبل اي جهة او منظمة دولية او من المحافظة بحيث لا تتعارض مع مشاريع خطة الموازنة الاستثمارية وتنمية الاقاليم او اي تخصيص اخر في المحافظة.

جدول رقم (١٢) القرى المستهدفة باعادة التأهيل

ت	المنطقة	القرية	الاحتياج حسب الاولوية
١	قضاء الحمدانية / ناحية النمرود	الخضر	تاهيل مدرسة الخضر والبساطلية للبنات
٢	مركز قضاء تلييف	الكنهش	بيت صحي (كرفان)
٣	مركز قضاء تلييف	القوسيات	بيت صحي (كرفان)
٤	مركز قضاء تلييف	شريخان	اضافة اربع صفوف بيت صحي كرفان
٥	مركز قضاء الموصل / ناحية بعشيقية	طور سياط	بيت صحي كرفان

- ولكن لم يتم تنفيذ المشاريع وذلك تاخير بعض المخاطبات مع الدوائر القطاعية في المحافظة وايضا الوضع الامني غير المستتب في بعض المناطق.

جدول رقم (١٣) المشاريع المدرجة ونسب انجازها ضمن المحصلة السادسة

ت	اسم المشروع	الوزارة او المحافظة	نسبة الانجاز (%)	الملاحظات
١	تاهيل ٤ مدارس	صلاح الدين	١٠٠%	
٢	تاهيل شبكة كهرباء	صلاح الدين	١٠٠%	
٣	تجهيز بيت صحي عدد (١)	صلاح الدين	١٠٠%	
٤	٢ مجمعات ماء عامرية الفلوجة	الانبار	١٠٠%	
٥	٢ مجمع ماء الكرمة الفلوجة	الانبار	١٠٠%	
٦	١ مجمع ماء الرمادي	الانبار	١٠٠%	
٧	مجمع ماء هيت	الانبار	١٠٠%	
٨	مجمع تل احمد الرمادي	الانبار	١٠٠%	
٩	تاهيل مدرسة الخضر والبساطلية للبنات قضاء تلييف	نينوى	٠%	
١٠	بيت صحي (كرفان) عدد ٢ قضاء تلييف	نينوى	٠%	
١١	بيت صحي (كرفان) قضاء الموصل	نينوى	٠%	
١٢	اضافة اربع صفوف قضاء تلييف	نينوى	٠%	

البوابة الالكترونية لانشطة وبرامج استراتيجية التخفيف من الفقر:

استرشاداً بالمبادئ التوجيهية التي اقترتها وثيقة الاطار العام للخطة الوطنية والتي اقترت بموجب قرار مجلس الوزراء ٢٥٩ لسنة ٢٠١٧ تم اطلاق المنصة الوطنية في شهر

اذار ٢٠١٩ بالتعاون مع

منظمة الامم المتحدة

للمستوطنات البشرية (

الهايئات) وتماشياً مع

مبدأ خطة التنمية الوطنية

للأعوام ٢٠١٨-٢٠٢٢

،ارتأت الحكومة

العراقية أنه قد يكون

من الضروري إتباع

آلية لضمان الرصد و

المراقبة والمتابعة

للمشاريع، وتحقيق

الهدف و التنسيق بكفاءة

وفعالية كما لا تملك

الحكومات المحلية

معلومات شاملة و

مركزة عن مشاريع

إعادة التأهيل والاعمار

و بالتالي يجعل من

الصعب على السلطات و



الجهات الفاعلة الإنسانية و الدولية على حد سواء انشاء خطط متكاملة لإعادة التأهيل فكان انطلاق المنصة لسد الفجوة في المعلومات الشاملة عن مشاريع إعادة التأهيل.

تشارك دوائر وتشكيلات وزارة التخطيط والمتمثلة ب دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية

ودائرة تخطيط القطاعات ودائرة التعاون الدولي ودائرة التنمية المحلية والأقليمية والأدارة

التنفيذية لأستراتيجية التخفيف من الفقر والجهاز المركزي للإحصاء ودائرة تكنولوجيا المعلومات ومركز نظم المعلومات الجغرافية في عمليات جمع بيانات المشاريع ومعالجتها وتحويلها من بيانات وصفية الى بيانات رقمية جغرافية وبناء هيكلية متكاملة لقاعدة البيانات المكانية وترجمتها من اللغة العربية الى الانكليزية واخراجها ونشرها جغرافياً وبشكل رقمي تفاعلي على موقع المنصة.

تتضمن البوابة الالكترونية أنشطة وبرامج استراتيجية التخفيف من الفقر النواذ التالية :

- الموقع الجغرافي لمشاريع التخفيف من الفقر.
- مشروع إعادة وتأهيل تجمعات السكن العشوائي في العراق.
- مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
- مشروع إصلاح نظام البطاقة التموينية.

ونبين ادناه الانجازات التالية:

- التهيئة والتحضير لانشاء بوابة الكترونية لانشطة وبرامج سترراتيجية التخفيف من الفقر.
- اعداد واجهة البوابة الالكترونية .
- ادخال التقارير الصادرة عن سترراتيجية التخفيف من الفقر بالاضافة الى البيانات المتعلقة بالسترراتيجية في البوابة الالكترونية .
- تنفيذ زيارات ميدانية في محافظات (كركوك ،بابل ، واسط ، كربلاء، الديوانية ، ذي قار،المثنى
- إدخال البيانات المكانية والوصفية لمشاريع سترراتيجية التخفيف من الفقر في البوابة الالكترونية .
- التهيئة والتحضير لنشر البيانات المكانية والوصفية بنظام Arc GIS Online للمحافظات.

الصندوق الاجتماعي للتنمية



الصندوق الاجتماعي للتنمية

المرحلة التنفيذية محافظات (صلاح الدين، المثنى، دهوك):

المرحلة الاولى:

إن المعلومات والبيانات المتوفرة جراء تنفيذ المشاريع الفرعية في محافظات المرحلة الأولى (صلاح الدين، المثنى، دهوك) تُمكن ادارة الصندوق الاجتماعي للتنمية من الحصول على تصور أولي عن كلفة المشروع الفرعي الواحد، أعداد العقود المطلوبة لإدارة تلك المشاريع، فضلاً عن الموارد البشرية التي يتطلبها التنفيذ والإشراف والمدد المتوقعة لإنجاز المشاريع وهذا ما يمثل رؤية التوسع في المرحلة القادمة.

باشر الصندوق الاجتماعي للتنمية - وزارة التخطيط ومديرياتها في المحافظات الثلاث المستهدفة ومن خلال الكوادر الهندسية بتنفيذ المرحلة الاولى من المشاريع بالتعاقد على تنفيذ (٦٢) مشروع وبكلفة اجمالية بلغت (١٠,٦) مليون دولار وكما مبين في الجدول ادناه:

جدول رقم (١٤) مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية

ت	المحافظة	عدد القرى	عدد المشاريع	الكلفة دولار امريكي
١.	صلاح الدين	١٠	١٩	٣,٩٧٠,٩٨٤
٢.	المثنى	٩	٢٢	٣,٩٧٦,١٢٦
٣.	دهوك	١٠	٢١	٢,٧١٢,٤٨١
	المجموع	٢٩	٦٢	١٠,٦٠٠,٩٤٧

المستفيدين وفرص العمل:

- ✓ عدد الافراد المستفيدين من المشاريع في المحافظات الثلاثة بحدود (٦٢) ألف نسمة.
- ✓ وفر تنفيذ المشاريع الفرعية فرص عمل مؤقتة تقدر بـ (١٠,٦٢) الف واثنان وستون فرصة عمل.

معايير استهداف الوحدات الادارية للصندوق الاجتماعي للتنمية:

- ❖ يكون الاستهداف بناء على قاعدة البيانات المتوفرة من مسح التنمية الريفية وباعتماد معايير (عدد السكان والحرمان من الخدمات).
- ❖ وتم اعتماد استراتيجيات جديدة في المرحلة القادمة باختيار قرية النواة وقرى مجاورة لها ليكون المشروع الذي يتم اختياره يشمل اكبر عدد من السكان وبطريقة تشاركية فضلا عن اعتماد الية الانتشار في المحافظة.

طبيعة المشاريع الممولة من القرض:

- يشمل العمل في الصندوق الاجتماعي للتنمية قطاعات محددة مثل التعليم والصحة والزراعة والري والوصول إلى شبكة الطرق على أن تُعطى أولوية لما يلي:
- ❖ المشروعات الفرعية التي تحقق منافع لشرائح السكان الأشد فقرا؛
 - ❖ المشروعات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية؛
 - ❖ المشروعات الفرعية التي تخلق فرص عمل دائمة؛
 - ❖ المشروعات الفرعية التي تحقق منافع للشرائح ذات الاحتياجات الخاصة: المعوقين والأطفال ذوي الحالات الخاصة أو المعرضين للمخاطر(والنساء اللاتي يواجهن ظروفًا صعبة) أو المعرضات لمخاطر
 - ❖ المشروعات الفرعية التي تساعد على زيادة رأس المال التنظيمي أو الفني أو الاجتماعي للمجتمعات المحلية والمستفيدين.

آلية إختيار المشاريع:

- تساهم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بتمكين الصندوق الاجتماعي للتنمية من الوصول الى المجتمعات المحلية الفقيرة والمستضعفة (الاولى بالرعاية)، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والاسهام في تصميم واستدامه المشروعات الفرعية
 - قيام المنظمات غير الحكومية بدورها في تعبئة وحشد المجتمعات المحلية، وتدعيم تقييم الاحتياجات، ومساندة تحديد المشروعات الفرعية والاولويات، ودعم التنفيذ على المستوى المحلي (استكمال دور الحكومة المحلية).
- بعد اختيار المشاريع وتحديد اولويتها تقوم ادارة الصندوق الاجتماعي للتنمية بدراسة الطلبات وفق الاتي:

- ❖ تحديد المشاريع القابلة للتنفيذ وفق التخصيصات المعدة لتلك القرية
- ❖ مطابقة المشاريع للنوع المقبول بموجب الاتفاقية

- ❖ التنسيق مع الدوائر القطاعية في المحافظة من استلام وتشغيل وادامة المشروع بعد الانجاز
- ❖ المباشرة باجراءات التعاقد والتنفيذ والاشراف بكوادر وزارة التخطيط والدوائر القطاعية المستفيدة في المحافظات.

المشاريع المنجزة:

محافظة المثنى:

جدول رقم (١٥) مشاريع محافظة المثنى ضمن مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية

اسم المشروع	القرى المشمولة بالمشروع	نسبة الانجاز (%)	الكلفة التعاقدية
تاهيل شبكة الكهرباء في خمسة قرى	(العكشة، ابو صريفة، ال ظويهر ، الطوارة، الخضرة)	١٠٠	٧٥٨١٠٢,٥
تاهيل شبكة الكهرباء في اربعة قرى	(ال دببىس، ابو كنبارة، فنجان ال ظاهر، الكريم)	١٠٠	٦٣٥٦٤٧
تاهيل شوارع بطول ٢٥,٥٣٠ كم في (٦) قرى	(ابو صريفة، ال ظويهر، الكريم، فنجان ال ظاهر، ال دببىس، ابو كنبارة)	١٠٠	١١٤٩٣٠٦
انشاء جسر مشاة حديدي	قرية فنجان ال ظاهر	١٠٠	
تاهيل محطة ماء ومد خطوط ناقلة وانشاء شبكة ماء ونصب محطة تحلية مياه سعة (١٠٠) م ^٣ /ساعة في (٦) قرى	(فنجان ال ظاهر، ابو كنبارة، العكشة، ابو صريفة، ال ظويهر، الطوارة)	١٠٠	١٤٣٢٠٨٤

محافظة صلاح الدين:

جدول رقم (١٦) مشاريع محافظة صلاح الدين ضمن مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية

اسم المشروع	القرى المشمولة بالمشروع	نسبة الانجاز (%)	الكلفة التعاقدية
تأهيل شبكة الكهرباء في ثلاث قرى	(البوطعمة والاحباب والبودلف)	١٠٠	٣٥٥٤٦٥
انشاء شبكة ماء	قرية الخانوكة	١٠٠	٢٧٩٦٥٠
تأهيل محطة تصفية المياه	قرية عزيز بلد	١٠٠	
تبليط الطرق الرئيسية بطول (٢) كم في خمسة قرى	(الاحباب والبو شران والجوزرات والعوينات والعرب الكبيرة)	٩٣	١٤٦٧٨٠٠
تبليط الطرق الرئيسية بطول ٢,٤ كم	قرية الخزيبي	٩٣	
انشاء قنطرة	قرية جوزيرات	٩٣	
انشاء ٤ مراكز صحية في اربعة قرى	(العرب الكبيرة، الخزيبي، جوزيرات، عزيز بلد)	١٠٠	١١٨٩٣٦٥
وانشاء مدرسة ٦ صف	قرية الخانوكة	١٠٠	
انشاء مدرسة (٦) صف	قرية البو طعمة	١٠٠	٣٣٩٥٧٤
انشاء مدرسة (٦) صف في قرية	قرية البو دلف	١٠٠	٣٣٨٧٨٠

جدول رقم (١٧) مشاريع محافظة دهوك ضمن مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية

اسم المشروع	القرى المشمولة بالمشروع	نسبة الانجاز (%)	الكلفة التعاقدية
تاهيل الشوارع بطول (٧,٩٥) كم في ثلاث نواحي	١- ناحية مانكيش (مركز الناحية , قرية بروشكا سعديني ٢- ناحية قسروك (قرية بيبافا) ٣- ناحية اتروش (قرية الوكا)	١٠٠	٤٤٧٣٦٣
انشاء وتاهيل الشوارع بطول (٨,٨٥) كم في ناحيتين	١- ناحية ديرالوك (قرية كهلكا ومهيدي) (قرية سركلي) ٢- ناحية سرسناك (٤) قرى (بليجانكي , همزيكي , بوتيا , به رى كر)	١٠٠	٦٧٤٥٧٥
انشاء شوارع بطول ٣,١٥ كم في ناحيتين	١- ناحية باعدري (مركز الناحية) قرية نيسيان ٢- ناحية باتيل (مركز الناحية)	١٠٠	٦٦٤٢٥٨
انشاء شبكات ماء وخزائين كونكريتين (٢٠٠ , ٥٠٠) ٣م	ناحية مانكيش (المركز وقرية بروشكا سعديني)	١٠٠	٤٠٥٧٩٢
وانشاء شبكات ماء في ثلاث نواحي	(ناحية باتيل , ناحية اتروش , ناحية سرسناك) في خمسة (٥) قرى (بليجانكي , همزيكي , بوتيا , به رى كه رل , بيبادي)	١٠٠	
انشاء وتوسيع وترميم خمسة مدارس في خمسة نواحي في محافظة دهوك	١- ناحية قسروك (قرية بيبافا) ٢- ناحية باعدري (مركز الناحية) ٣- ناحية اتروش (مركز الناحية) ٤- ناحية ديرالوك (قرية برجي (٥- ناحية مانكيش (قرية بروشكا سعديني)	١٠٠	٤٦١٨٥١

❖ جانب من مشاريع (محافظة دهوك)



تهيئة الارض لبناء مدرسة ٦ صف في قرية بيبافا - ناحية قسروك



طرق قريتي كه له كا ومهيدى - ناحية ديرلوك

❖ جانب من مشاريع (محافظة صلاح الدين)



قنطرة جوائزرات - قضاء الضلوعية



بناء مدرسة ٦ صف في قرية البو طعمة - ناحية المعتصم

الفصل الثالث : مرحلة التوسع في المشاريع الفرعية:

محافظات (بغداد، نينوى، ميسان، الانبار، ذي قار، السليمانية، بابل، القادسية)

المرحلة القادمة:

بناء على توجيهات معالي السيد وزير التخطيط، باشر الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتوسع في استهداف القرى المنتشرة في ثماني محافظات عراقية والتي تنطبق عليها معايير الدخول في خطة التوسع ومن خلال فريق الاستهداف ومديريات التخطيط في المحافظات.

أبرز الاجراءات المتحققة خلال المرحلة الاولى في المحافظات الجديدة:

✓ انجز فريق الاستهداف بشكل شبه نهائي تحديد القرى المستهدفة بالاعتماد على مبدأ القرية الرئيسية والقرى المجاورة لشمول أكبر عدد من المستفيدين؛

✓ تم تشكيل الفرق الفرعية للصندوق الاجتماعي للتنمية في كافة المحافظات المستهدفة

✓ يجري العمل حالياً التحضير لورشة عمل تعريفية لمديريات التخطيط التابعة لوزارة

التخطيط بفكرة مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية والمباشرة بتدريب الكوادر القائمة

على عملية الحشد المجتمعي في القرى المختارة لغرض حصر الاحتياجات والمباشرة

بالتنفيذ فضلا عن ورش تدريبية اخرى لفرق العمل في الصندوق.

الاستهداف:

باشر الصندوق الاجتماعي للتنمية بالشروع بخطة التوسع التدريجية في عدد من محافظات العراق

تماشياً مع ما جاء في وثيقة تقييم المشروع (PAD) وهي كل من محافظات (القادسية – ميسان -

ذي قار – بابل – بغداد – الانبار – نينوى - السليمانية) والتي تمثل الحزمة الثانية .

حدد فريق الاستهداف القرى المستهدفة في تلك المحافظات بالاعتماد على بيانات مسح القرى الريفية

لغرض تنفيذ المشاريع الفرعية فيها، بالإضافة إلى تحديد القرى المستهدفة في محافظات الحزمة

الأولى – المرحلة الثانية (صلاح الدين، المثنى)، إما فيما يخص محافظتي دهوك والسليمانية فلم

تحسم القرى لغاية تاريخه لوجود ملاحظات حولها. يوضح الجدول رقم (٣) اعداد القرى المستهدفة

موزعة على المحافظات المشمولة عدا القرى القريبة أو المجاورة.

جدول رقم (١٨) اعداد القرى المستهدفة في محافظات الحزمة الثانية

ت	المحافظة	عدد القرى
١.	الديوانية	٥
٢.	بابل	٥
٣.	الانبار	٧
٤.	ميسان	١٠
٥.	نينوى	٦
٦.	ذي قار	٨
٧.	بغداد	٧
٨.	المتنى	١١
٩.	صلاح الدين	١٠
	المجموع	٦٩

المشاريع والعقود:

١. عدد القرى المستهدفة في محافظات المرحلة الثانية هو (٦٩) قرية رئيسية في كل محافظة، بالإضافة إلى (١٥) قرية متوقع إضافتها في محافظتي دهوك والسليمانية، وعليه سيصبح العدد الكلي (٨٤) قرية رئيسية؛ مع العرض ان المشروع المنفذ في القرية الرئيسية ستستفيد منه قرية فرعية واحدة او أكثر.
٢. بمعدل مشروعين لكل قرية سيكون عدد المشاريع المتوقع شمولها (١٦٨) مشروعاً.
٣. بفرض احتواء كل عقد على معدل (٥) مشاريع فرعية، سيكون عدد العقود المتوقع ادارتها وبإشراف فريق التعاقدات المركزي هي (٣٣) عقد^٢، (٢٩) عقد منها تُدار في مركز الوزارة و (٤) عقود في محافظتي دهوك والسليمانية.

خلاصة بالمشاريع



خلاصة بالمشاريع الخاصة بالمحافظات والوزارات لعامي ٢٠١٩-٢٠٢٠

ت	المحافظة	اسم المشروع	الكلفة (بالمليون)
١	كرجوك	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	٣٤٣١٣
		انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	
		بناء وحدات سكنية اقتصادية	
		بناء وحدات سكنية اقتصادية	
		انشاء مجمع سكني واطى الكلفة	
٢	المتنى	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	٥١٤٢٢
		انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	
		انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	
		تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	
		تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	
		تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	
		انشاء مجمعات سكنية مخصصة للفقراء	


١٨٩٩٦	انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	ديالى	٣
	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية		
	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية		
	انشاء دور واطنة الكلفة		
	تأسيس جمعيات محلية لصغار الفلاحين أو تعاونية لتقديم الخدمات الزراعية كالتسويق، التمويل، استخدام المياه والصيانة والمكننة، الخزن والتبريد، النقل في المجتمعات الزراعية الصغيرة		
٥٨٨٥٨	انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	نينوى	٤
	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية		
	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية		
	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية		
	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية		
	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية		
	بناء مدارس ابتدائية ذات (١٨) صف عدد (١) وبناء مدارس ذات (١٢) صف عدد (٣) وبناء مدارس ذات (٦) صف عدد (٤) مع إضافة اجنحة ذات (٦) صف عدد (٣) مع		
	الصحيات		
بناء وحدات سكنية			

١٣٧٧٥	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	النجف الاشرف	٥
	انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة		
	بناء مدرسة متوسطة سعة ١٨ صف		
	بناء مدارس ١٢ صف		
٣٦٧٠٥	انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	الانبار	٦
	بناء دور واطئة الكلفة		
	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء (المرحلة الاولى)		
	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء (المرحلة الثانية)		
٣٨٩٤١	انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	واسط	٧
	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية		
	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية		
	بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة		
٥٦٥٣٦	انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	ذي قار	٨
	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية		
	بناء مدارس ابتدائية عدد (٢) سعة ١٢ صف		
	انشاء مجمع سكني واطئ الكلفة		
١٩٩١٢	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	بغداد	٩


	بناء مدارس ابتدائية عدد (١) سعة ١٨ صف عدد (٢) سعة ١٢ صف		
١٤٨٥٠	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	كربلاء	١٠
	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية		
	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية		
	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية		
	بناء مدرسة ابتدائية سعة ١٨ صف مع التأثيث		
	بناء مدارس ابتدائية عدد (٦) سعة ١٨ صف		
١٢٠٦٣	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة والنائية	ميسان	١١
	إعادة تاهيل مدارس عدد (١٦)		
	انشاء دور واطنة الكلفة		
٢٣٠٠٠	انشاء وحدات سكنية عمودية اقتصادية للفقراء	الديوانية	١٢
	انشاء وحدات سكنية افقية اقتصادية للفقراء		
	انشاء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء		
١٨٠٠٠	بناء وحدات سكنية اقتصادية	بابل	١٣
٢٥٠٠٠	بناء وحدات سكنية اقتصادية	صلاح الدين	١٤
٤٠٠٠٠	بناء وحدات سكنية اقتصادية	البصرة	١٥

ت	الوزارة	اسم المشروع	الكلفة (بالمليون)
١	وزارة الصحة	انشاء وتأهيل وتجهيز مراكز او بيوت صحية او عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	٥٠٠٠
٢	وزارة التربية	مشروع ازالة المدارس الطينية في العراق	٢٨٣٩١٠
٣	الاعمار والاسكان	بناء وحدات سكنية اقتصادية	٥٠٠٠٠٠
٤	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	شمول أوسع للفقراء ببرنامج الإقراض لإنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل	١٦٨
٥	الوقف الشيعي	بناء وحدات سكنية اقتصادية	٢٠٠٠٠

مخطط تقييم نسب انجاز المحافظات

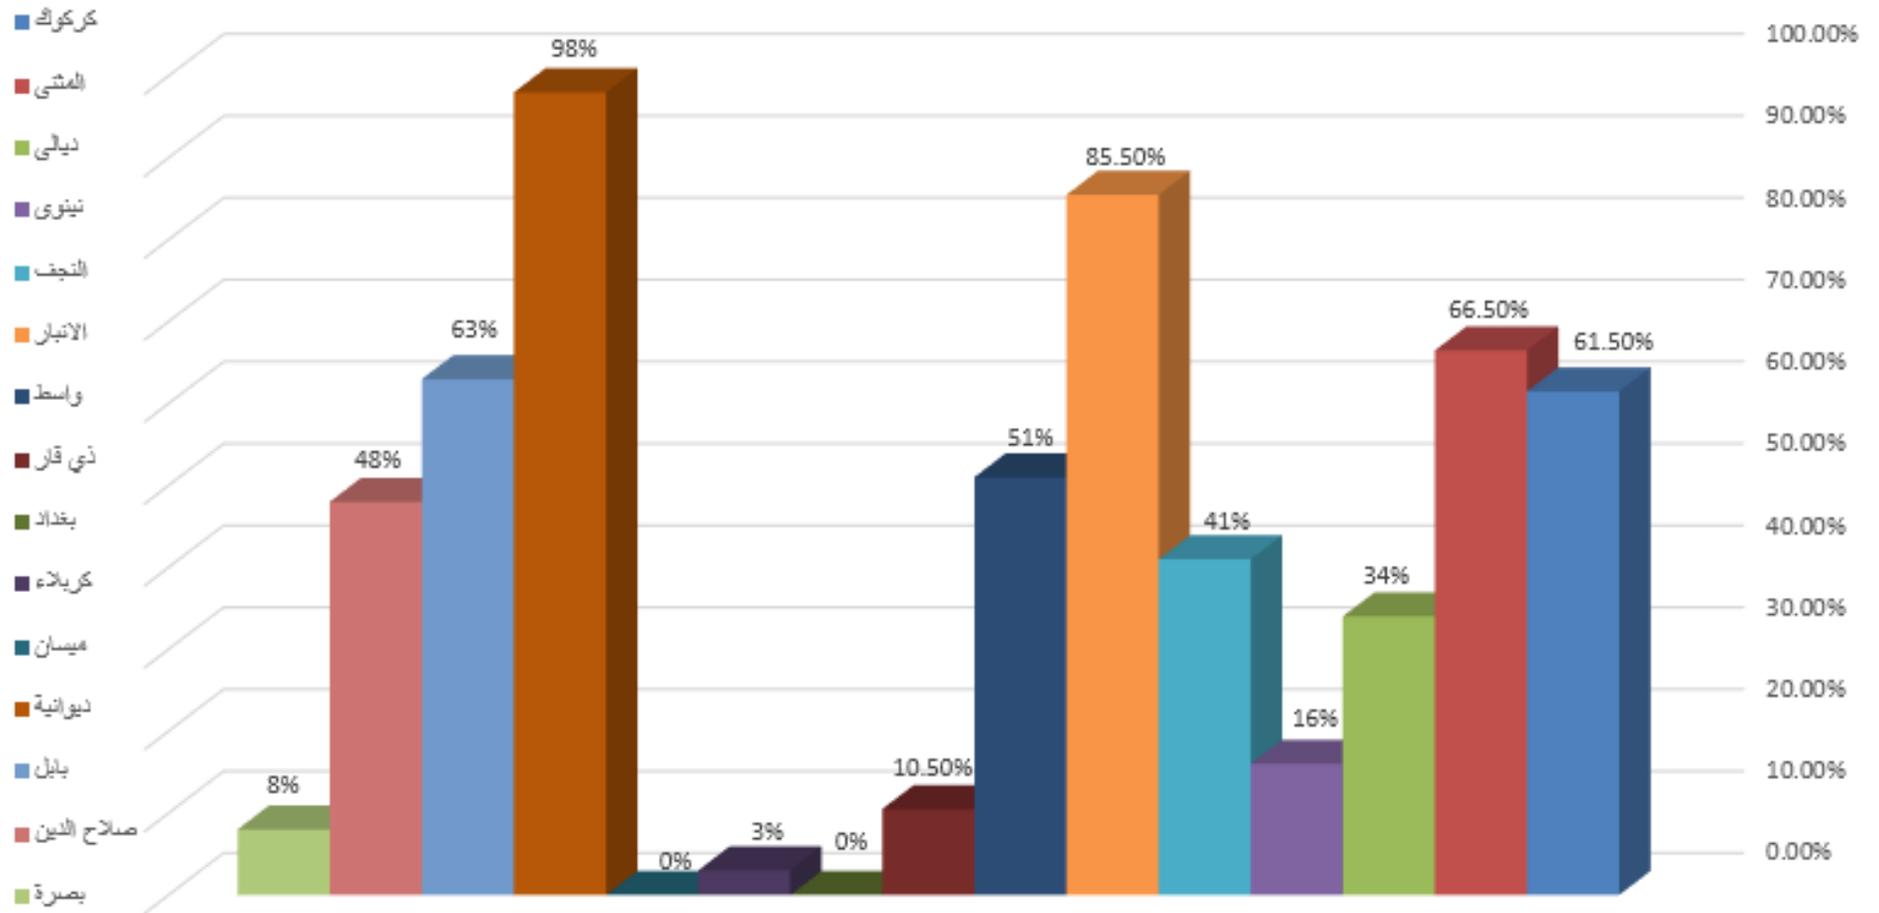

مخطط تقييم نسب انجاز الوزارات

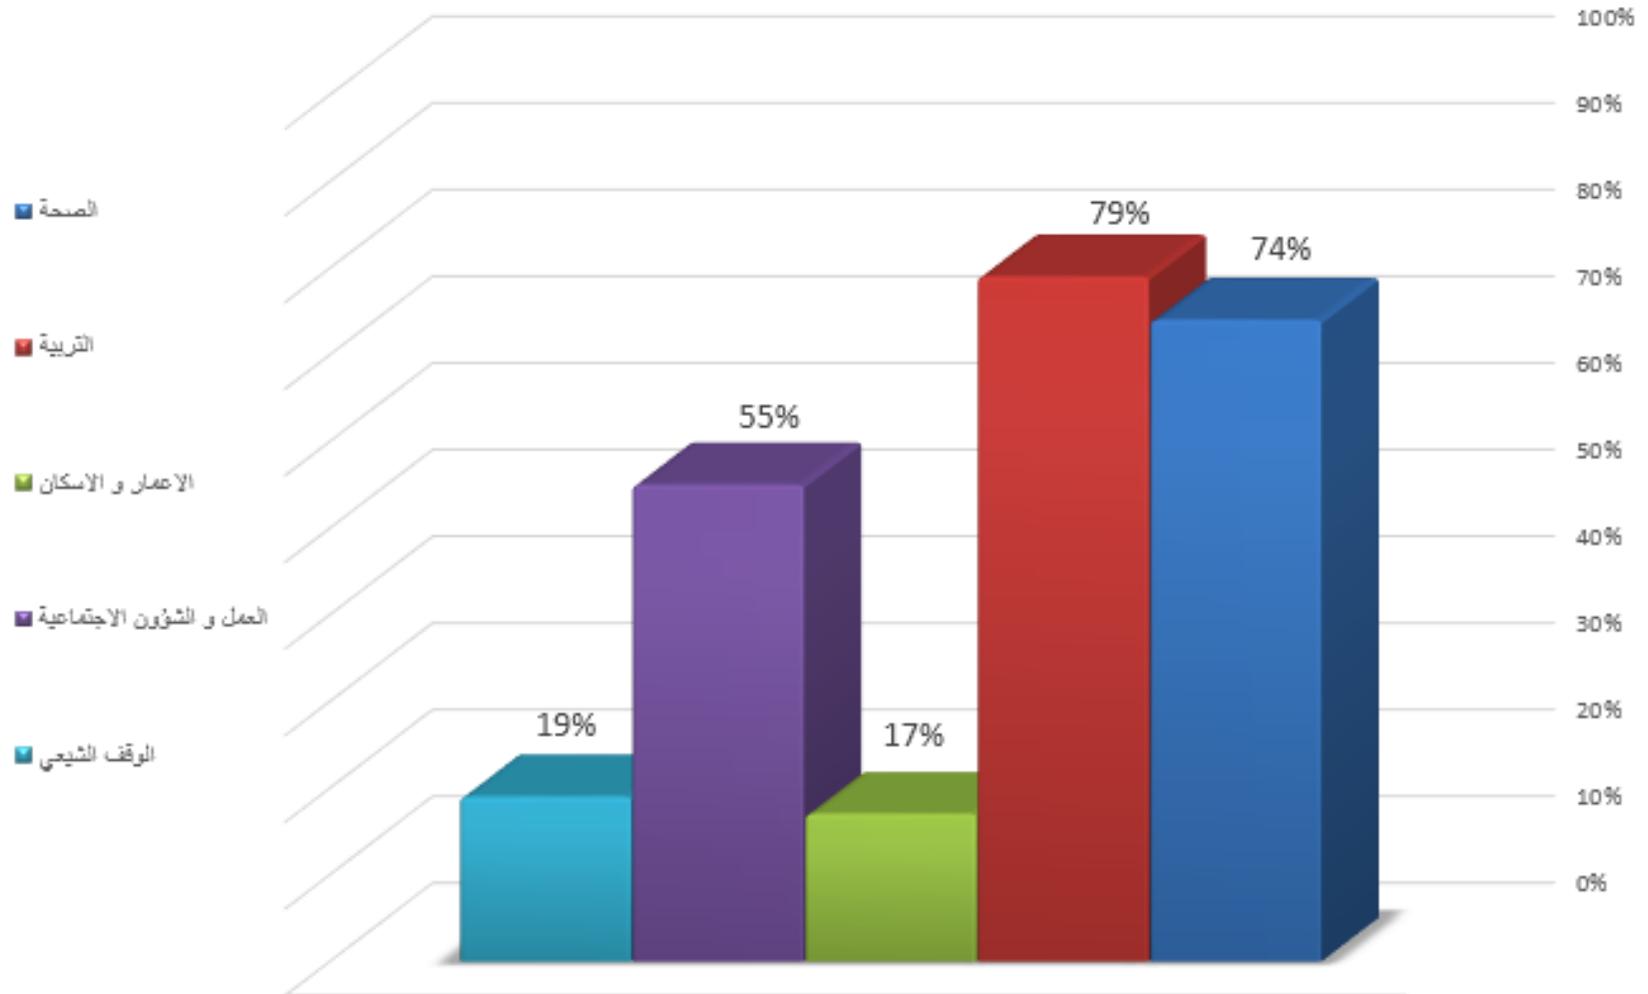

التوصيات

وفي اطار تفعيل وتحسين المتابعة لأنشطة وبرامج إستراتيجية التخفيف من الفقر فأنا نوصي :-

- ١- دعم الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر بالكوادر الفنية الهندسية لغرض تفعيل المتابعة الميدانية الخاصة بمشاريع إستراتيجية التخفيف من الفقر ضمن اطار المتابعة المركزية للوزارة وذلك لما لهذه المشاريع من خصوصية كونها تقدم خدمات لفئة الفقراء والفئات الهشة بالمجتمع.
- ٢- اجراء الزيارات المكتبية من قبل كوادر الإدارة التنفيذية الى المحافظات وذلك لتحديث وتدقيق البيانات بشكل دوري كون ان هناك بعض المحافظات لا تتعاون او تتأخر في الإجابات الامر الذي يؤخر انجاز التقارير الدورية وإمكانية معالجة المشاكل ان وجدت.
- ٣- ولغرض تجنب التوقف او التلكؤ في انجاز مشاريع الفقر بسبب تأخر بعض المحافظات في مصادقة خططها والمباشرة بالمشاريع الامر الذي لايمكنها من صرف تخصيصاتها السنوية ضمن إستراتيجية التخفيف من الفقر فأنا نقترح ان تكون لمشاريع إستراتيجية التخفيف من الفقر خصوصية من خلال حجر المبلغ المخصص للإستراتيجية وتمويله كاملاً ويوضع كإمانات لتجنب تأخير المحافظات في إجراءات التنفيذ لاسيما ان المبالغ المخصصة للإستراتيجية ليست كبيرة فعلا سبيل المثال خلال عام ٢٠٢١ المبلغ المخصص لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية بلغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار (خمسون مليار دينار) بالإضافة الى مبلغ (١٣٧,٧١٦,٧٠٦) دينار تمثل المبالغ المناقلة (٥%) من موازنة تنمية الاقاليم الى إستراتيجية التخفيف من الفقر استنادا الى قانون الموازنة العامة للدولة.
