



اللجنة العليا لإستراتيجية
التخفيف من الفقر

تقرير
متابعة تنفيذ أنشطة ومشاريع إستراتيجية
التخفيف من الفقر لعام 2018

المحتويات

المقدمة

..... خلاصة تنفيذ أنشطة ومشاريع إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام ٢٠١٨
١

4 الأنشطة والمشاريع المنجزة من خطة تخفيف الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2018

6 الأنشطة والمشاريع المستمرة من خطة تخفيف الفقر من الموازنة الاستثمارية للأعوام السابقة.....

6 المحصلة الأولى (دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء).....

9 المحصلة الثانية (تحسين المستوى الصحي)

13 المحصلة الثالثة (تحسين تعليم الفقراء)

17 المحصلة الرابعة (سكن ملائم وبيئة مستجيبة للتحديات).....

- المشاريع المستمرة
- تحديات مشاريع السكن
- مشروع إعادة تأهيل وتسوية جمعات السكن العشوائي

43 المحصلة الخامسة (حماية اجتماعية فعالة للفقراء).....

53 تخصيصات تخفيف الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2019.....

54 الصندوق الاجتماعي للتنمية

ملحق استمارات متابعة أنشطة الوزارات والمحافظات الممولة من تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام
2018

تقديم

في ضوء توجيهات اللجنة العليا لإستراتيجية التخفيف من الفقر التي يرأسها دولة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي، يسرّ اللجنة الفنية أن تقدم تقريرها السابع لمتابعة وتقويم الإنجازات المتحققة على طريق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر (2018 - 2022) التي وضعت الإستراتيجية أهدافاً عقلانية وموضوعية، وعياً بحقائق ما بعد المرحلة التي مر بها الاقتصاد العراقي، ونتائج الأزمة المزروجة، واختزال الأنشطة على تلك التي يمكن تنفيذها في ضوء المتاح من الإمكانيات، مع التركيز على تحسين أوضاع النازحين والمهجرين، وإعادة دمجهم مرة أخرى. لذا تضمنت 32 نشاطاً تدرج تحت ست محصلات ركزت على القضايا القطاعية الرئيسية: الدخل، التعليم، الصحة، السكن، والحماية الاجتماعية، فضلاً عن أفراد أنشطة خاصة بالاستجابة للحالات الطارئة التي أوجدها النزوح القسري من مناطق سيطرة داعش الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بإرادة العراقيين وعزمهم.

وعلى الرغم من محدودية التخصيصات التي أُقرت لعام 2018 والبالغت حوالي (40) مليار دينار، ومع ان نسب التنفيذ التي بلغت (61.5%) والتي تعكس إمكانية تحسين أداء الأنشطة والفعاليات المدرجة تحت بنود هذه الإستراتيجية بشكل أفضل.. إلا أن ما ينبغي الإشارة إليه هو مستوى التفاعل والتواصل الحكومي والمجتمعي لتحقيق إنجازات أفضل على طريق تخفيف الفقر في العراق.

لقد حرصنا في إعداد تقرير المتابعة السابع لتسليط الضوء على اهم المنجزات المتحققة في الاستراتيجيتين الأولى والثانية وعلى المشاكل والتحديات بالاستفادة من المعلومات التي تم جمعها ميدانياً من الوزارات والحكومات المحلية المشمولة بأنشطة الإستراتيجية، وفي ضوء استمارات المتابعة المعتمدة، التي يتولى نقاط الارتكاز (المنسقون) التعاون مع الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر على إنجازها.

نغتنم فرصة أعداد هذا التقرير لتقديم الشكر والامتنان لدولة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي / رئيس اللجنة العليا، ولعالي السادة الوزراء أعضاء اللجنة العليا لدعمهم وتواصلهم المستمر..

كما نقدم الشكر والتقدير لعالي وزير التخطيط الأستاذ الدكتور نوري صباح الدليمي لدعمه الكبير للجنة الفنية وللإدارة التنفيذية ومتابعته الدقيقة لأعمالها، وللكوادر القيادية الفنية في الوزارة الى جانب الكوادر القيادية لوزارة المالية لضمان وتأمين تخصيصات في الموازنة العامة للدولة لسنتي 2018 و2019.

أخيراً نوجه الشكر للسيدات والسادة أعضاء اللجنة الفنية الدائمة لإستراتيجية التخفيف من الفقر وللأدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر لاسيما الست نجلاء علي مراد المدير العام التنفيذي ولكل العاملين معها لأخلاصهم وحرصهم في إنجاز الأعمال ومنها بشكل خاص أعداد هذا التقرير.

والله ولي التوفيق..

رئيس اللجنة الفنية الدائمة
لإستراتيجية التخفيف من الفقر
حزيران/2019

مقدمة

شهد العراق أحداثا سياسية واقتصادية وامنية جسيمة خلال أعوام انطلاق استراتيجية التخفيف من الفقر الأولى 2010 - 2014 تركت اثارها السلبية على مسيرتها والنتائج المرجوة منها وفرضت تحديات جديدة أضيفت الى تلك التحديات التي تعاملت معها الاستراتيجية مع ذلك فان تنفيذها ومراجعتها ظلت هاجسا للجنة الفنية الدائمة والإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر وعلى رغم من نقص التمويل وتبدل الظروف الأمنية. استمر التنفيذ وتحققت بعض النتائج وان كانت اقل بكثير مما خطط له الا انها استطاعت ان تطل المجتمع الفقير بالتغيير والتمكين من خلال جملة من المشاريع التي تهدف الى مكافحة الفقر وتخفيف وطأته على تلك الشريحة الهشة في المجتمع... الامر الذي استدعى تبني رؤى استراتيجية جديدة لعلاج هذه المشكلة في العراق والذي تبلور في استراتيجية التخفيف من الفقر 2018 - 2022

بدأ العمل في خطة شاملة متدرجة بالاهداف منذ عام 2012 من خلال تخصيص مالي حوالي 445 مليار دينار شملت المحافظات السبعة الأكثر فقرا فضلا عن الوزارات الخدمية ذات الصلة بالفقر وابعاده المختلفة... في عام 2013 وبجهود استثنائية من الإدارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر ارتفع سقف التخصيص الى حوالي 605 مليار دينار وتوسع التنفيذ ليشمل محافظات العراق كافة عدا اقليم كردستان... وانتهاجا للمبدأ ذاته وعلى الرغم من تحديات اقرار الموازنة في عام 2014 فقد نجحت الادارة التنفيذية للاستراتيجية في توفير حوالي 252.401 مليار دينار للحفاظ على ديمومة واستمرار تنفيذ مشاريع تخفيف الفقر... وبعد تعرض العراق لأزميتين متلازمتين في النصف الثاني من عام 2014 احدهما جاءت نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط والأخرى احتلال داعش لمناطق عديدة . فمنذ حزيران عام 2014 تراجعت اسعار النفط الخام ولما كان العراق يعتمد بشكل كبير على النفط فيما يتعلق بالنتائج الاجمالي والصادرات وبعثباره المصدر الرئيسي للايرادات الحكومية. فان الانخفاض في اسعاره ترك اثاره القاسية على البلد . ومما ادى الى انخفاض تخصيص إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2015 لتصل الى 209.400 مليار دينار تم توزيعها وفق نسب الفقر على جهات التنفيذ مع مراعاة ديمومة تمويل المشاريع المستمرة. اما في عام 2016 فقد انخفضت التخصيصات لتصل 129.117 مليار دينار وكذلك عام 2017 تم تخصيص 55.250 مليار دينار والذي اثر بشكل واضح على مستوى التنفيذ وخاصة اذا ما قارنا هذه التخصيصات بالمبالغ الممولة فعلا والتي انعدمت في بعض المشاريع مما ادى الى توقف اغلبها ، خصصت إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2018 مبلغ 40 مليار دينار من الموازنة الاستثمارية وتم تخصيص مبلغ من الموازنة الجارية تم توزيعها وفق نسب الفقر على جهات التنفيذ مع مراعاة ديمومة تمويل المشاريع المستمرة .

حددت الاستراتيجية 2018 - 2022 في تنفيذها هدفا تصبو لتحقيقه وهو تخفيض نسبة الفقر بمعدل 25% وهي ماضية في تحقيق اهدافها من خلال مشاريع وانشطة شملت فئات هشة في المجتمع وابعاد مختلفة للفقر

يسرنا اليوم ان نطلق تقريرنا الدوري السابع لخطة تخفيف الفقر لعام 2018 وما تنفذ منها بمنتهى الشفافية...تتمت لجهود الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر الرامية الى توخي مبادئ الحوكمة في ادارة خطط تخفيف الفقر.


خلاصة تنفيذ أنشطة ومشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2018

يعد الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد والجوانب فهو لا يعبر عن عجز الفرد عن تلبية حاجاته الأولية فقط بل يتعدى ذلك ليشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتي تؤثر على تنمية الفرد والمجتمع ككل، ومن هذا المنطلق ركزت مشاريع وخطط الاستراتيجية على احتواء كل تلك الأبعاد ضمن خطة استراتيجية موجهة ضمت خطط جزئية تصاعديّة تهدف بمجموعها الى تخفيض الفقر بنسب تتواءم واجندة التنمية المستدامة وتسير بموازنتها.

احتلت استراتيجية التخفيف من الفقر مكانة بارزة في سلم أولويات الحكومة العراقية، والذي انعكس على منحى تخصيص مشاريع وأنشطة تخفيف الفقر، إذ بدأ التخصيص من الموازنة الاستثمارية لعام 2012 واستمر الى عام 2018، اذا بلغ التخصيص لموازنة الاستراتيجية في عام 2018 حوالي (40) مليار دينار لمشاريع وأنشطة تكافح الفقر في العراق من عدة جوانب وتحاصر كل أبعاده ضمن خطة استراتيجية أعدت مسبقا بجهود وطنية تحت مظلة وزارة التخطيط من خلال الإدارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر.

وزعت التخصيصات السنوية على الوزارات والمحافظات تم توزيع النسبة الأكبر من التخصيص المذكور انفاً الى الحكومات المحلية وقد تم مناقلة مبالغ الى ما بين جهات التنفيذ لغرض استكمال بعض المشاريع التي تزيد نسبة إنجازها عن 90% بالاستناد الى توجيهات مجلس الوزراء فقد حصلت المحافظات عدا محافظات إقليم كردستان على نسبة من التخصيص بلغت 88.2% من اجمالي التخصيصات لتنفيذ مشاريع تخدم الفقراء في المحافظات وبلغت نسبة تخصيص الوزارات الخدمية المعنية بتنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر 11.8% فقد حصلت وزارة الصحة على نسبة 3.9% من التخصيص ونسبة 4.3% من التخصيص الى وزارة الاعمار والإسكان والبلديات وكما حصلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على نسبة 3.2% اما نسبة تخصيص وزارة التربية فقد قارب 0.4%.

الشكل (1): يوضح توزيع نسب التخصيص على الوزارات والمحافظات لعام 2018

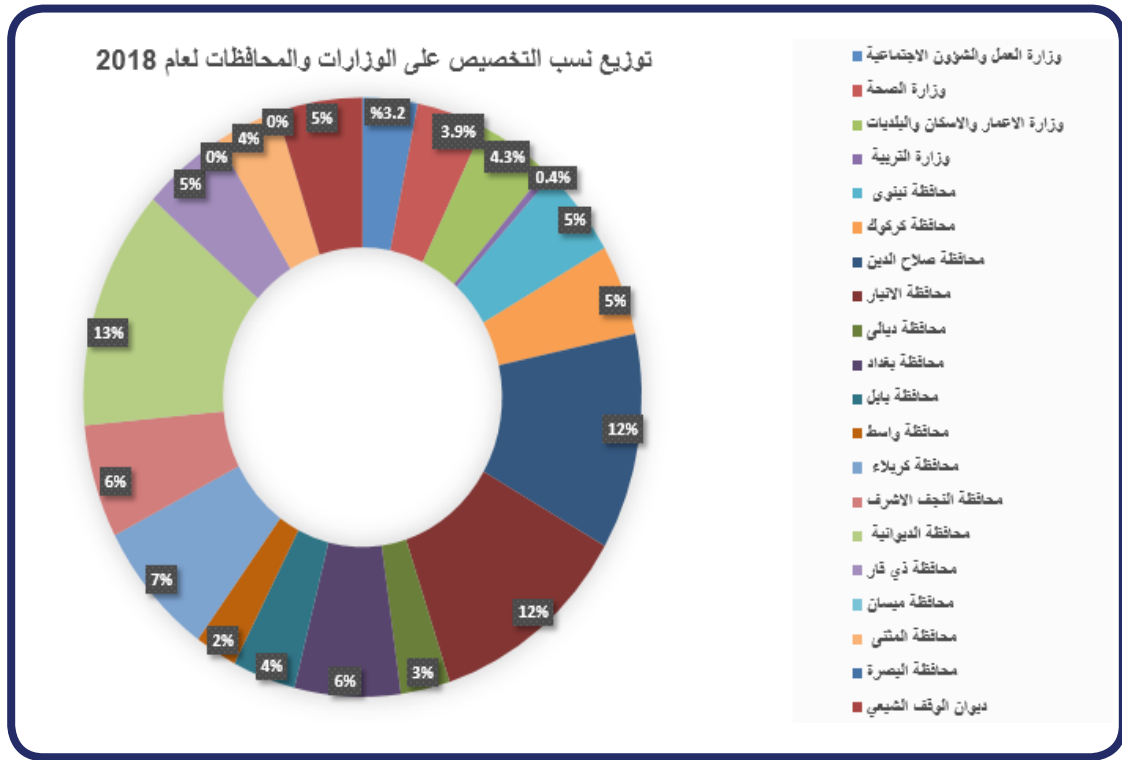

توزعت مشاريع وأنشطة الاستراتيجية على المحصلات (دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء، تحسن المستوى الصحي، تحسن تعليم الفقراء، سكن ملائم وبيئة مس حامية اجتماعية فعالة للفقراء، الأنشطة المستجيبة للطوارئ) في سياق خطة شملت أكثر من (132) مشروعاً ومكوناً خلال الأعوام 2012 و 2018 استكمل بعضها في أوقات مختلفة من عام 2018 في حين استمر تنفيذ البعض الآخر ودور إلى عام 2019.

حققت خطة إستراتيجية التخفيف من الفقر في عام 2018 في أنشطتها المبوية على المحصلات الأربعة الأولى نسبة إنجاز بلغت 61 % لغاية 31 /12/ 2018. وتعزى هذه النسبة الى حصول بعض جهات التنفيذ على مستحقاتها المالية مما أدى الى المباشرة في عدد من المشاريع وإنجاز بعضها في أواخر عام 2018. والجدول الآتي يبين نسب إنجاز محصلات الاستراتيجية.

المحصلة	التخصيص المالي للمحصلة / تخصيصات الاستراتيجية (مليار دينار)	نسبة الإنجاز % / إستراتيجية التخفيف من الفقر
دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء	1.436	48.8
تحسن المستوى الصحي	3.838	86.9
تحسن تعليم الفقراء	2.175	42.2
سكن ملائم وبيئة مستجيبة للتحديات	33.426	62.3
حماية اجتماعية فعالة للفقراء	-	-
الأنشطة المستجيبة للطوارئ	-	-
المجموع الكلي لمحصلات الاستراتيجية	40.875	61.5

هناك (١٢) مشروع لم يباشر بها خلال الاعوام السابقة ولم يتم احتساب نسب إنجازها ضمن الجدول أعلاه .

تصدرت المحصلة الثانية تحسن المستوى الصحي في المرتبة الأولى إذ حققت نسبة إنجاز 86.9 % من خلال تنفيذ (26) مشروعاً من تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2018 وقد تنوعت تلك المشاريع بين بناء مراكز صحية وتوفير مشاريع لإيصال الماء الصالح للشرب فضلاً عن تجهيز آليات حوضية لأعمال المجاري تساهم في توفير الخدمات الى الفقراء .

حلت محصلة سكن ملائم وبيئة مستجيبة للتحديات في المرتبة الثانية إذ بلغت 62.2% وشملت تنفيذ (73) مشروعاً من تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر شملت هذه المحصلة بناء دور اقتصادية للفقراء وتوفير بنى تحتية في المناطق الفقيرة .

وقد حلت محصلة دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء في المرتبة الثالثة إذ حققت نسبة إنجاز 48.8 % من خطتها والتي شملت مشروع القروض الصغيرة للفقراء فضلاً عن توفير طرق زراعية لنقل المنتجات الزراعية في المناطق الريفية في محافظة ديارى .

من حيث نسب التنفيذ جاءت أخيراً محصلة تحسن تعليم الفقراء في المرتبة الرابعة من حيث التنفيذ إذ بلغت 42.2 % تركز التنفيذ على نشاط بناء وتأهيل مدارس ابتدائية للفقراء من تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر والتي ضم النشاط فيها مجموعة من المشاريع هي بناء مدارس بدل المدارس الطينية بعدد (409) مدرسة ومشروع بناء (4) مدارس في محافظة النجف فضلاً عن مشروع بناء مع التأسيس مدرسة سعة 18 صف في محافظة كربلاء.

اما المحصلة الخامسة حماية اجتماعية فعالة للفقراء فقد نفذت فيها بعض الأنشطة تبنتها الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر والتي ضمت تقييم مشروع البيئة التجريبية لنظام اصلاح البطاقة التموينية من قبل منظمة الغذاء العالمي فضلاً عن تحديث بيانات الاسر المشمولة بنظام الحماية الاجتماعية اما الأنشطة الحماية الاجتماعية الأخرى التي وردت في الوثيقة فانها تنفذ من تخصيصات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن خطتها السنوية .

محصلة الأنشطة المستجيبة للطوارئ وهي من المحصلة السادسة من محصلات وثيقة إستراتيجية التخفيف من الفقر التي تنفذ للفترة 2018 - 2019 التي اوجدها النزوح القسري من المناطق المحررة من سيطرة داعش الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بإرادة العراقيين وعزمهم . وتمنح الأنشطة المستجيبة للطوارئ مرونة تمكنها من الاستجابة لتأثيرات النزاعات وما بعد النزاعات والتكيف لاستيعابها والتمكن من التعرف الى احتياجات المناطق المستهدفة والتي من المتوقع ان تتغير هي الأخرى مع الانتقال الى مرحلة الاستقرار وإعادة الأعمار . ركزت أنشطة المحصلة على العائدين الى النواحي الفقيرة وقد شملت نهاية عام 2018 تبنى الإدارة التنفيذية لنشاط إعادة تأهيل (4) مدارس في ناحية الضلوعية في محافظة صلاح الدين التي تعتبر اول محافظة تم تحريرها فضلا عن تأهيل شبكة الكهرباء بتجهيز (10) محولات كهربائية في الناحية .

ضمن نفس النشاط تبنى الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر مشروع تأهيل وصيانة مجمعات ماء عدد (6) في قرى محافظة الأنبار .

الأنشطة والمشاريع المنجزة من خطة تخفيف الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2018 :

أولاً: وزارة الإسكان والاعمار والبلديات العامة :

تجهيز آليات تخصصية في أعمال المجاري بكلفة وتخصيص (8) مليار دينار (معاد أدراجه في عام 2015):

ضم المشروع تجهيز اليات تخصصية في اعمال المجاري للاستفادة منها في تشغيل وصيانة شبكات المجاري في المحافظات الخمسة عشر وبعدها (28) آلية تتوزع على (15) محافظة، تتضمن اربع عشر سيارة سحب مياه ثقيلة واربعة عشر سيارة صاروخية سعة السيارة الواحدة 8000 لتر مكعب ، تخدم مناطق متفرقة في المحافظات وتعمل بأشراف دوائر المجاري في المحافظات المشار اليها اعلاه

اهداف المشروع :

توفير اليات تخصصية لصيانة شبكات الامطار والصرف الصحي وسحب المياه فضلا عن السيارات الصاروخية التي تستخدم لفتح الانسدادات التي تحدث داخل انابيب الشبكات ومداخل احواض التفتيش

الشرائح المستفيدة:

تخدم هذه الآليات حوالي (212443) فردا من سكان المناطق التي تصل اليها في المحافظات الخمسة عشر

انجاز المشروع :

❖ اعيد ادراج المشروع خلال عام 2015 بكلفة تبلغ (8) مليار دينار وبعدها (28) آلية بدل تجهيز اليات حوضية بعدد (42) الية وبكلفة (10450) مليون دينار

❖ احيل المشروع الى احدى شركات القطاع الخاص و تمت المباشرة بالمشروع بعد فتح الاعتماد المالي بتاريخ 9/11/2015

❖ انجز المشروع في شهر تشرين الثاني / 2018

ثانياً: محافظة بغداد:

مشروع (تبليط شوارع ناحية الحسينية) بكلفة قدرها (7846) مليون دينار (مدرج في عام 2015):

تبنت محافظة بغداد ضمن اولوياتها لتخفيف الفقر من تخصيصات الاستراتيجية من الموازنة الاستثمارية لعام 2015 مشروعاً لتبليط شوارع ناحية الزهور " الحسينية سابقاً " ... يضم المشروع جزئين من المقاولات (تبليط الشارع الممتد من مدخل جسر الناحية الى تقاطع الجريخي) بطول (590) متر مربع و(تبليط شارع الجريخي) بطول (4) متر مربع .

اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى توفير الطرق للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ذات الطابع الفقير مع اوصول الخدمات الاساسية لجميع المواطنين فضلاً عن تسهيل اوصول المحاصيل الزراعية من المزارع الى الاهالي والاسواق ويقع المشروع في ناحية الحسينية .

الشرائح المستفيدة :

يقدر عدد المستفيدين من المشروع بحوالي (450) الف نسمة

❖ انجز المشروع شهر تشرين الثاني / 2018



شارع الحسينية «الزهور»

ثالثاً: محافظة النجف:

انشاء وحدة مائتة مجمعة سعة 1000 متر مكعب / ساعة، بكلفة 3.933 مليار دينار (مدرج في عام 2013) :

هذا المشروع كان أولوية أولى في محافظة النجف تم تحديده من تخصيصات الاستراتيجية من الموازنة الاستثمارية لعام 2013 الذي يهدف الى تحسين واقع المحافظة الصحي وذلك من خلال انشاء وحدة مائتة مجمعة سعة 1000 متر مكعب / ساعة لتغذية مجموعة من القرى شمال مدينة الكوفة بالماء الصالح للشرب ، وقد تم توفير مستلزمات ادراجه وفق الضوابط المعتمدة للادراج .

اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى تزويد الماء الصالح للشرب لقرى شمال الكوفة وضمان تقليص انفاق المواطنين على شراء ماء الشرب.

الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد المستفيدين من المشروع ما يقارب (30000) من سكان القرى الفقيرة المشمولة بالمشروع

انجاز المشروع

❖ انجز المشروع في شهر ك / 1 / 2018

رابعاً: محافظة الأنبار:

بناء مجمعات اقتصادية (المرحلة الأولى) بكلفة قدرها (15) مليار دينار (مدرج عام 2013) :

ويشمل المشروع بناء (365) دار اقتصادية يوفر سكن ملائم لحوالي (2190) فرد في أضية الرمادي ، الفلوجة ، هيت ، حديث ، عنه ، راوه، القائم، الرطبة .

ما تم إنجازه :

- مجمع ناحية النخيب بنسبة انجاز فعلي 100 %
- مجمع قضاء الفلوجة بنسبة انجاز فعلي 100 %
- مجمع قضاء القائم بنسبة انجاز فعلي 100 %
- مجمع قضاء حديث بنسبة انجاز فعلي 90 %
- مجمع قضاء الرطبة بنسبة انجاز فعلي 90 %



مجمع قضاء الفلوجة / محافظة الأنبار

الأنشطة والمشاريع المستمرة من خطة تخفيف الفقر من الموازنة الاستثمارية للأعوام السابقة:

يجري تنفيذ مشاريع التخفيف من الفقر المستمرة منذ العام 2012 مروراً بالأعوام 2013-2018 من تخصيصات الاستراتيجية من الموازنة الاستثمارية لعام 2018 بنسب تنفيذ مختلفة، ومما لا يخفى على الجميع التحديات التي تلت أحداث حزيران /2014 وما صاحبها من أزمات مالية وأمنية والذي اثر سلباً على مستوى التنفيذ حيث توقفت اغلب المشاريع وألحقت أضراراً في البعض الآخر من قبل عصابات داعش في المناطق المحررة. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق وضمن هذا الإطار تم إصدار توجيهات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجان المشكلة باستثناء بعض مشاريع التخفيف من الفقر بإعادة إدراج بعض المشاريع المرفوعة وايضاً المضي قدماً في إجراءات (الإعلان، الإحالة، التعاقد). سيتم استعراض تلك المشاريع حسب محصلات تنفيذها وكالاتي:

(المحصلة الأولى) دخل أعلى ومستدام من العمل للفقراء

تسعى الإستراتيجية إلى تحسين أوضاع الفقراء، وانتشالهم من حالة الفقر، سواء من خلال تحسين دخولهم، أو من خلال تحسين فرص وصولهم إلى الخدمات ذات النوعية المناسبة، يُعد الدخل المستدام وسيلة رئيسة في تخليص الفقراء من فقرهم، لأن نقص الدخل ومن ثم الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية (هو من يضع الأفراد والأسر تحت خط الفقر في أوضاع مستقرة لا يتعرض فيها الفقراء إلى أزمات أو صدمات).

برنامج إقراض لتنفيذ أنشطة مدرة للدخل للفقراء

أولاً: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:

نشاط دعم مشروع صندوق القروض الصغيرة للفقراء وبكلفة كلية (168.750) مليار دينار) مدرج في (عام 2012):

يشمل النشاط منح قروض صغيرة وفق ضوابط واليات محددة تشمل فئات كل من (المعوقين، المهجرين العائدين، الارامل والمطلقات والمعيلات لاسرهن، المطلق سراحهم من السجون، المتضررين من العمليات الارهابية، معيلي الاسر غير المستقرة من سكنة مناطق الطمر الصحي، المتسولين) لتوفير فرص عمل من شأنها تحسين وضعهم المعيشي.

بدأ البرنامج في 9/1/2012 بشمول المحافظات السبعة الاكثر فقرا واستمر العمل فيه للاحوام 2012 - 2018 بعد ان تم التوسع به ليشمل محافظات العراق كافة (عدا اقليم كردستان) ضمن عدد معاملات مخططة بلغت 20877 معاملة وهو عدد المستفيدين من المشروع، تتراوح قيمة كل قرض بين (5 - 10) مليون دينار، وتمنح استنادا الى تقرير اللجان المختصة، وان هذه القروض تكون بدون فوائد وبمدة سماح تبلغ سنة واحدة من تاريخ تسلم القرض، فيما تسدد الاقساط على مدى ثماني سنوات، وتمنح هذه القروض دفعة واحدة لكل الفئات باستثناء المتسولين وسكان مناطق الطمر الصحي، والتي تكون بدفعتين، اذ تدفع الدفعة الثانية بعد المباشرة بالمشروع وبناء على تقرير من اللجنة الفرعية في المحافظة يصدر خلال (30) يوما من تاريخ تسلم الدفعة الاولى. كما يمنح المقرض مبلغ مليون دينار كقرض اضافي في حالة تشغيله لاي عامل اضافي بعد مرور فترة لا تقل عن ستة اشهر من تنفيذ المشروع وبما لا يتجاوز سقف الاقراض المقرر واستنادا الى توصيات اللجنة المركزية في المحافظة ومصادقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ويعفى ورثة المقرض المتوفي مما تبقى بدمته في حالة غلق المشروع وعدم قدرة الورثة على ادارته واستنادا لتقرير اللجنة المركزية في المحافظة والمصادقات الاصولية.

يجري توزيع القروض وفق خطط أعدتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن الملاحظ محدودية مراعاتها لتقليل التفاوت بين النساء والرجال والذي لم يدعم تمكين المرأة، اذ تم توزيع اغلب القروض في المحافظات للرجال وبنسبة 95.3% مقابل نسبة 4.7% للنساء. كما يتضح من تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان اغلب المقرضين كانوا من المتزوجين والذين شكلوا نسبة حوالي (86%) من مجموع المقرضين.

وقد بينت تقارير وزارة العمل ان النسبة الاكبر من القروض استثمرت لتنفيذ مشاريع تجارية مدرة للدخل وبنسبة (70.8%) ومشاريع خدمية بنسبة (16.2%) وصناعية بنسبة (8.7%) وزراعية بنسبة (4.3%)



صور مشروع اقراض الفقراء/ محافظة الديوانية

اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى توفير القروض الميسرة والتي تعد الأساس لبدء مشاريع صغيرة مدرة لدخل الفقراء تساعد في تمكينهم وتهيئة الأرضية التي يستند لها النمو الاقتصادي المستدام المرتبط بزيادة الانتاجية وخلق فرص عمل للفئات المهمشة والفقيرة.


الشرائح المستفيدة :

تم التخطيط لاقرض (20877) مستفيد من العاطلين الفقراء.

في طريق الانجاز

استمر العمل في اقرض الفقراء وبشكل محدود لقلّة التخصيصات السنوية لعام 2018 ليصبح مجموع ما تم إقرضه للأعوام السابقة (12234) منذ اطلاق البرنامج عام 2012. علماً واجه النشاط تحدياً إدارياً بسبب فك الدمج لدائرتي القروض الصغيرة والتدريب والتأهيل المهني الذي أثر سلباً في تأخير تنفيذ المشروع.

الشكل (2) : يوضح توزيع القروض على المستفيدين خلال السنوات 2012 - 2018

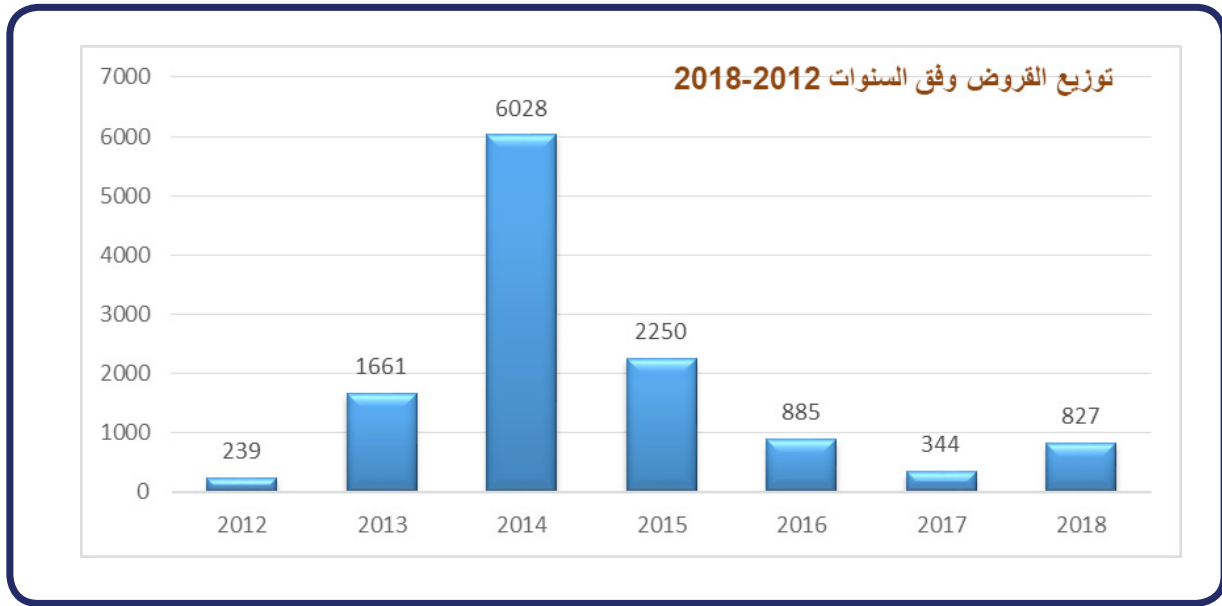

تأسيس جمعيات محلية لصغار الفلاحين أو تعاونية لتقديم الخدمات الزراعية كالتسويق، التمويل، استخدام المياه والصيانة والمكننة، الخزن والتبريد، النقل في المجتمعات الزراعية الصغيرة

اولاً: محافظة ديالى:

تبليط (10) طرق في قرى ريفية متعددة في المحافظة بطول 32.800 كم وبكلفة (4.770) مليار دينار (مدرج في عام 2013)

اخترت المحافظة ضمن اولوياتها لتخفيف الفقر في عام 2013 مشروع تبليط طرق لقرى متعددة، نظرا لحاجة تلك القرى والتي (تمتاز بكثافة سكانية عالية) الى انشاء شوارع تربط المناطق مع بعضها البعض وربطها بالمدن بهدف ايصال الخدمات الأساسية الى جميع مواطني المحافظة وتسهيل ايصال المحاصيل الزراعية من المزارع الى مراكز البيع في المدن. يبلغ طول هذه الطرق (32.800) كم.

أهداف المشروع :

يهدف المشروع الى :

- توفير الطرق للقرى السكنية
- ربط المناطق الريفية بمركز المحافظة
- ايصال الخدمات الأساسية الى جميع المواطنين
- تسهيل ايصال المحاصيل الزراعية من المزارع الى الاهالي والاسواق



شارع امام طالب / محافظة ديالى

الشرائح المستفيدة :

• سكان القرى التي تصل بينها تلك الطرق والبالغ عددهم (29750) فرداً.

في طريق الانجاز :

تم انجاز (7) طرق وهي...

- طريق المد الاخضر 100 %
- طريق قرية امام طالب وحي سارة 100 %
- طرق في الحديد 100 %
- طريق قرية جميلة - حاتم - صالح حبيب 100 %
- طريق قرية كاظم صالح ولفتة العنكود 100 %
- طريق ريفي لقرية حبيب العبد الله 100 %
- طريق قرية الحاج جاسم حسين 100 %



شارع قرية الحبيب عبد الله / محافظة ديالى

المشاريع قيد الإنجاز:

انشاء طريق الحساوية-العروبة- طريق المدارس بطول 1كم 25%

المشاريع المرفوعة من خطة عام 2016

- تبليط طريق بطول 7 كم في قضاء كفري / قرية الشيخ خليل مدرج عام 2013 بكلفة 989.250 مليون دينار
- تبليط طريق بطول 6 كم في قضاء المقدادية / قرية الكفاح مدرج عام 2013 بكلفة 104.817 مليون دينار

(المحصلة الثانية) تحسن المستوى الصحي

يبقى القطاع الصحي من القطاعات الحيوية في الدولة العراقية ويحظى بأولوية في السياسة الوطنية للبلد خاصة انه يعني حياة المواطن وأمنه الصحي.

تهدف محصلة الصحة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية المتكاملة والشاملة لكافة المواطنين ولجميع المناطق وخصوصاً المناطق النائية والفقيرة مع تحقيق سهولة الوصول إليها لخلق مجتمع عراقي معافى جسدياً ونفسياً واجتماعياً تسعى الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر الى تحقيقها مع التأكيد على الخدمات الصحية الوقائية الى جانب الصحية العلاجية وتشمل هذه السياسات خدمات الرعاية الصحية الأولية المحسنة والتي تضم عدد من الأنشطة والمشاريع .

إنشاء وتأهيل وتجهيز مراكز أو بيوت صحية أو عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة

أولاً : وزارة الصحة:

بناء وتأهيل وحدات التدرن مع توفير متطلباتها بكلفة (50) مليار دينار (مدرج في عام 2012) :

يضم المشروع بناء وحدة تدرن لكل محافظة من محافظات العراق (عدا اقليم كردستان)، ويهدف الى تحسن المستوى الصحي من خلال توفير خدمات رعاية صحية اولية محسنة للفقراء يسهل عليهم الوصول اليها عن طريق بناء (27) وحدة تدرن موزعة على المحافظات (ميسان 2، ذي قار 1، المثنى 2، الديوانية 1، بغداد 3، صلاح الدين 2، كركوك 2، كربلاء 2، واسط 2، بابل 2، الأنبار 3، النجف 1، ديالى 1، نينوى 2، البصرة 2) حددت مواقع وحدات التدرن في المحافظات تبعاً الى انتشار المرض في الرقعة الجغرافية ضمن المحافظة ونسبة الفقر فيها، اذ يعد هذا المرض من الامراض الصديقة للفقراء .

مساحة الوحدة الواحدة (600) متر مربع، تتكون من ثلاث طوابق، يضم الطابق الأرضي عيادة استشارية تتكون من غرفة طبيب ومختبر وصيدلية وغرفة أشعة ومكتب إحصائي وقاطع تذاكر، اما الطابق الثاني والثالث فيضم شقق سكنية للكادر العامل في الوحدات، وسيتم أشغال هذه الوحدات بواسطة 2 طبيب و 2 مساعد مختبر و 2 مساعد صيدلي و 2 مصور اشعة و 2 إحصائي وقاطع تذاكر، وتكون كل وحدة مسؤولة عن تشخيص ومتابعة حالات التدرن وتزويد المرضى بالعلاج اللازم للقضاء على هذا المرض.

اهداف المشروع :

تعد هذه الوحدات مراكز استشارية لفحص مرضى التدرن في المناطق الفقيرة التي تغطيها تلك المراكز فضلا عن توفير الأدوية اللازمة لعلاج المرضى .

الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد المستفيدين من المشروع بـ(150) الف فرد للمركز الواحد ومجموع المراكز ممكن ان سقدم الخدمة لـ 4 مليون مستفيد .

في طريق الانجاز

• يتم تنفيذ المشروع من بمرحلتين هي البناء والمرحلة الثانية التجهيز ضمن نفس المقاتلة :


- المرحلة الأولى: استكمل بناء هياكل 24 مركز تدرن في المحافظات (كركوك ، صلاح الدين ، الأنبار ، بغداد ، ديالى ، بابل ، واسط ، النجف ، كربلاء، ميسان ، القادسية ، البصرة ، المثنى) . تأخر استكمال باقي الهياكل بسبب الوضع الأمني في محافظة نينوى وسيتم إعطائها أولوية أولى في التنفيذ حال توفر تمويل كافي .

- المرحلة الثانية: التي تضم تجهيزها بالمواد والأجهزة و المستلزمات الطبية الخاصة بمراكز التدرن والذي توقف العمل بها بسبب عدم توفر تمويل كافي .

• بلغت نسبة الانجاز الكلي %75.

• تم افتتاح وإدخال (7) مراكز للتدرن في الخدمة على الرغم من وجود بعض المنقوصات والتي لا تحول دون افتتاح المركز مثل تجهيز بعض غرف مبيت الكادر الطبي وبعض قطع أجهزة التبريد ... الخ).



• بالرغم من توقف التنفيذ في اغلب المشاريع منذ نهاية عام 2014 بسبب الأزمة المالية واحتلال داعش لبعض المحافظات إلا انه تم توفير تمويل لاستكمال بعض المراكز وأيضا دفع مستحقات للمقاولين عن الأعمال المنفذة سابقاً .

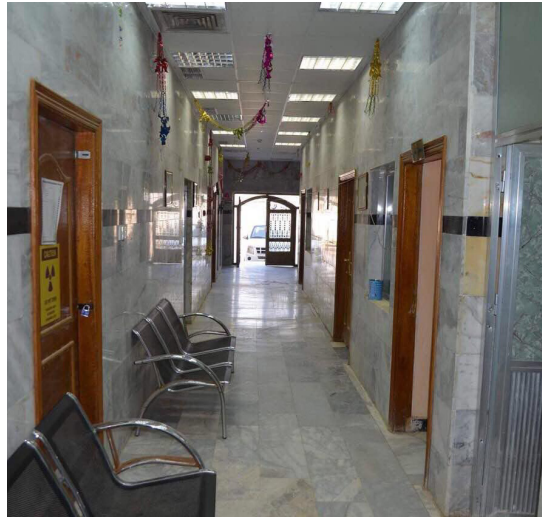

منسقية التدرن / محافظة بابل

جدول (1) : نسب إنجاز وحدات التدرن حسب المحافظات

ت	المحافظة	نسبة الانجاز%
1	نينوى / النهروان	14 %
	نينوى / الكرامتة	10 %
2	كركوك / داقوق	40 %
	كركوك / الحويجة	40 %
3	ديالى	91 %
4	الانبار / القائم	90 %
	الانبار / الفلوجة	90 %
	الانبار / حديثة	90 %
5	بغداد / الكرخ	100 %
	بغداد / الكاظمية	100 %
6	بابل / الاساتذة	100 %
	بابل / المحاويل	100 %
7	كربلاء / الحي العسكري	90 %
	كربلاء / حي النصر	62 %
8	واسط / الحي	77 %
	واسط / الكوت	77 %
9	صلاح الدين / بيحي	27 %
	صلاح الدين / تكريت	27 %
10	النجف / الحرية	100 %
11	الديوانية	75 %
12	المثنى / الخضر	100 %
12	المثنى / السماوة	100 %
13	ذي قار / الزهراء	72 %
14	ميسان / العزيز	85 %
	ميسان / علي الغربي	85 %
15	البصرة / القبلة	72 %
	البصرة / الزبير	80 %

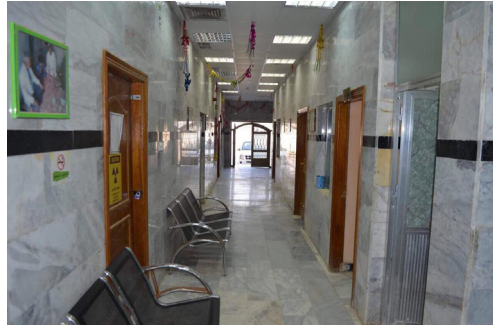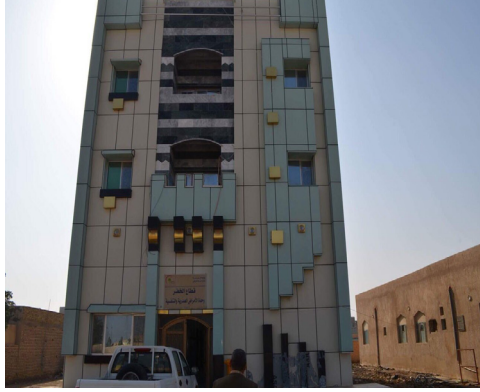

منسقية التدرن / ناحية الخضر / محافظة المثنى

تم رفع مشروع بناء وحدات منسق التدرن في محافظة بغداد/ قطاع الرصافة استنادا الى كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية المرقمة 651 في 9 / 12 / 2015.

ثانيا : محافظة ديالى :

بناء مراكز رعاية صحية عدد (2) مركز وبكلفتة (1.250) مليار دينار مدرج في عام (2012) :

يضم المشروع بناء مركزين صحيين في قريتي (كهريزه، النظام) في قضاء خانقين، ويرمي الى تحسين المستوى الصحي من خلال توفير خدمات رعاية صحية للفقراء يسهل عليهم الوصول اليها، يتكون مركز قرية كهريزه من بناية من طابق واحد على مساحة (800) متر مربع، اما مركز قرية النظام فيتكون من طابق واحد على مساحة (300) متر مربع، وسيتم تجهيز المركزين بكادر طبي وادوية بالتنسيق مع وزارة الصحة .

أهداف المشروع :

الهدف من انجاز هذه المراكز الصحية هو توفير خدمات صحية للفقراء تشمل تقديم العلاجات و فحص المرضى في المناطق الفقيرة التي تبنى فيها تلك المراكز .

الشرائح المستفيدة:

يخدم كل مركز صحي حوالي (15000) فرد من الفقراء ضمن الرقعة الجغرافية التي يغطيها.

في طريق الانجاز

- تم احالة المشروع نهاية كانون الاول 2013 وتم توقيع العقد بمدة (210) يوماً .
- نسبة انجاز احد المراكز 100 % ونسبة إنجاز المركز الثاني 98 %
- تمت المباشرة في تنفيذ مركز واحد بعد توفر التمويل بمبلغ (200) مليون دينار .
- العمل متوقف في التنفيذ المركز الثاني بسبب تأخر التمويل .
- سيتم تجهيز المركزين من قبل وزارة الصحة .



مركز صحي في قرية النظام / محافظة ديالى

ثالثاً: محافظة الانبار:

مشروع تجهيز عيادات متنقلة عدد (9) عيادات بضمنها عيادة طب اسنان عدد (1) واشعة نسائية عدد(1) ضمن برنامج إغاثة النازحين بكلفة و بتخصيص (1498) مليار دينار مدرج (عام 2015)

اهداف المشروع :

الهدف من المشروع تقديم الخدمات الصحية والعلاج اللازم للعوائل النازحة والعائدة لمحافظة الانبار

الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد المستفيدين من المشروع بحوالي (25000) فرد من العوائل النازحة ضمن الرقعة الجغرافية التي يغطيها .

في طريق الإنجاز

- تم أستثناء المشروع من توصيات لجنة الامر الديواني رقم (30) لعام 2015 حسب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد:س.ل./738 بتاريخ 29 /12/ 2016 من اجراءات الاحالة وتوقيع العقد
- لم يتعاقد على المشروع خلال العامي 2017 و2018 لعدم توفريسيولة مالية.
- تم تخصيص مبلغ (100) الف دينار لعام 2019 وسيتم المباشرة بالمشروع حين يتم توفير الغطاء المالي

رابعاً: محافظة ديالى :

مشروع تنفيذ مجمعات ماء صالح للشرب بكلفة (2.650) مليار دينار (مدرج في عام 2012) :
يتضمن المشروع مد شبكات ماء لقرى (ابو صيدا ، الاصلاح ، الأحيمر)

اهداف المشروع :

تجهيز المناطق في المحافظة والتي يصعب الحصول فيها على الماء الصالح للشرب ضمن القرى المشار اليها اعلاه فضلا عن توفير فرص عمل للعاطلين في تلك المناطق.

الشرائح المستفيدة:

يخدم هذا المشروع سكان القرى والذي يبلغ عددهم (1450) فردا.

في طريق الانجاز

- تم احالة مشروع قرية الاصلاح وبلغت نسبة الانجاز %75 توقف المشروع بسبب الازمة المالية.
- تم احالة مشروع قضاء المقدادية/ المخيسة ولم تنفذ الشركة اي انجاز وذلك بسبب قلة التخصيصات المالية .
- تم رفع مشروع (قرية ابو صيدا. قرية الاحيمر) استنادا الى كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية المرقمة 651 في 9/12/2015.

خامساً : محافظة نينوى :

مشروع تجهيز سيارات حوضية عدد 7 وتأهيل الطرق في ناحية الشمال بكلفة (10) مليار دينار(مدرج في عام 2013)

يتضمن المشروع (تطوير مجمعات ماء حطين - اليرموك - خنصور القديمة ، فرش الحصى الخابط للطرق الرابطة بين القرى وتبليط الشوارع المؤدية الى المجمعات المائية التابعة لناحية الشمال وتجهيز سيارات حوضية عدد 7 لمديرية ماء نينوى) والتي تتولى مهام توزيع المياه الصالحة للشرب الى القرى النائية، وينفذ المشروع في ناحية الشمال في محافظة نينوى والتي تعاني من نقص في الماء الصالح للشرب وذلك لبعدهم الناحية عن مصادر المياه والاعتماد على مياه الابار لهذا الغرض .

اهداف المشروع :

تجهيز مناطق في المحافظة تعاني من قلة توفر الماء الصالح للشرب، فضلا عن توفير فرص عمل للعاطلين في تلك المناطق، كما ان هذا المشروع يخدم مناطق تضم قرى تعاني من تدني نسبة الطرق والشوارع الداخلية المبلطة مما يؤدي الى صعوبة الوصول الى المراكز الخدمية وخاصة في ظل صعوبة التنقل كون تلك المناطق جبلية

الشرائح المستفيدة:

يخدم هذا المشروع سكان تلك القرى والبالغ عددهم (214) الف نسمة .

في طريق الإنجاز:

- تم احالة مشروع تبليط الطرق الرابطة بين القرى وبلغت نسبة الانجاز 50%. توجد مستحقات مالية وتم اجراء تسوية حسب قرار 347 لسنة 2019
- تم احالة مشروع فرش الحصى الخابط للطرق المؤدية الى المجمعات السكنية في ناحية الشمال 90% توجد مستحقات مالية. تم اجراء تسوية حسب قرار 347 لسنة 2016
- تم احالة مشروع تجهيز سيارات حوضية عدد 7 ولم يوقع العقد وبعد التحرير لم تراجع الشركة لغاية الان مما دفع المحافظة بطلب رفع المشروع .
- لم يحال مشروع تطوير مجمعات ماء حطين - اليرموك - خنصور القديمة بسبب الوضع الامني .
- توقفت جميع المشاريع بسبب الوضع الامني التي تلت احداث حزيران عام 2014
- تمت المصادقة على خطة المحافظة لعام 2018 وبسبب معوقات في الإجراءات الإدارية تم وضع مبلغ التخصيص في صندوق حسابات المحافظة كأمانات .

(المحصلة الثالثة) تحسن تعليم الفقراء

يسهم التعليم في تحريك عملية التنمية والتخفيف من الفقر وتحسن في مستوى صحة الأفراد والمساواة بين الجنسين وضمان الاستقرار في المجتمع وإشاعة السلم المجتمع. ويحقق عوائد ودخول أعلى ومستدام .

تبنت الاستراتيجية مجموعة من الأنشطة للوصول الى تحسن تعليم الفقراء في ضوء مبادئ الاستراتيجية الرامية الى تمكين الاطفال الفقراء ذكورا واناثا من اكمال دراستهم ضمن خطة تزامنت وتوازت مع اهداف أجندة 2030 الهدف الرابع الذي نص على "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع". ياعتبار بعد التعليم من الأبعاد الأساسية للفقر، كل ذلك دفع الجهات القائمة على الاستراتيجية الى توجيه اهتماما بالغا لتوفير البيئة الدراسية المناسبة من خلال تبني مشروع هدم واعادة بناء المدارس الطينية في العراق وهو من اهم ما نفذته الاستراتيجية فضلا عن مشاريع كانت تستهدف تحسين الواقع التعليمي للفقراء في العراق .

بناء وتأهيل وصيانة المدارس في المناطق الفقيرة

أولا : وزارة التربية :

مشروع ازالة المدارس الطينية في العراق بكلفة (283910) ملياردينار (مدرج في عام 2012) :

تم تخصيص مبلغ (140) مليار دينار في عام 2012 لمشروع ازالة المدارس الطينية ، والذي يشمل هدم (409) مدرسة طينية، وبناء مدارس بديلة وفق نمط البناء التقليدي او الجاهز وحسب ما تقتضيه عملية فحص التربة في تلك المنطقة....شمل المشروع محافظات العراق عدا اقليم كردستان كما لم يشمل التخصيص المحافظات الانبار، كربلاء، النجف لعدم وجود مدارس طينية فيها.

لتنفيذ المشروع خضعت (227) مدرسة في الوسط والجنوب الى نمط البناء التقليدي ، في حين واجهت مدارس محافظات ديالى، صلاح الدين، كركوك، نينوى تحديات البناء الجاهز(الكونكريتية) بسبب طبيعة تلك المناطق. عانى النشاط من تأخير في التنفيذ بسبب تلك الشركات المنفذة وخاصة للمدارس التي بنيت وفق نمط البناء الجاهز وقد تم تشخيص الخلل في الاعوام السابقة والذي يعود الى محدودية شركات البناء الجاهز وحدائث تجربة البناء وفق هذا الاسلوب في العراق مما حدا الى مخاطبة الجهات المعنية بهدف حل تلك التحديات وتمت الاستجابة من خلال تغيير جهة التنفيذ الى الإدارات المحلية وتغيير أسلوب البناء في بعض المواقع من أسلوب البناء الجاهز الى أسلوب البناء التقليدي.

علماً أن المشروع أحيل الى ثلاث شركات حكومية هي:

- الشركة العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية رقم المقاولتة (33) وزارة الصناعة والتي تنفذ (127 مدرسة في المحافظات البصرة ، ميسان ، المثنى، ذي قار) .
- شركة المنصور العامة رقم المقاولتة (34) وزارة الأعمار والإسكان والتي تنفذ (100) مدرسة في المحافظات القادسية، واسط، بابل، الكرخ 1، الكرخ 2، الكرخ 3.

- شركة الصمود العامة رقم المقاولتة (36) وزارة الصناعة والتي تنفذ (62) مدرسة بأسلوب البناء الجاهز و(55) مدرسة بأسلوب البناء التقليدي في المحافظات ديالى ، صلاح الدين، كركوك، نينوى ، تنفذ هذه المدارس وفق نمط البناء الجاهز ، وبسبب الظروف الأمنية والعمليات العسكرية فيها تم الغاء المقاولتة خلال عام 2018 بالاستناد الى قرار (417) لسنة 2014.

- تم تحويل جهة التنفيذ لـ (65) مدرسة في محافظات (صلاح الدين ، نينوى ، ديالى ، كركوك) من وزارة التربية (شركة الصمود) الى الإدارات المحلية في المحافظات المذكورة أعلاه. والتي تم الغاءها ضمن المقاولتة رقم (36) وزارة الصناعة والمعادن .

اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى القضاء على المدارس الطينية كافة واستبدالها بمدارس ذات مواصفات تؤدي الى تحسين كفاءة التعليم في المدارس التي يرتادها الفقراء بشكل خاص وتشكل عاملا حاسما في اجتذاب المزيد منهم الى مقاعد الدراسة وضمان عدم تسربهم من المدارس.

الشرائح المستفيدة:

تخدم المدارس حوالي 129 الف طالب في المناطق الفقيرة التي انشأت ضمنها .

في طريق الانجاز

- تم انجاز (144) مدرسة في حين ماتزال (108) مدرسة قيد التنفيذ والمشروع متوقف بسبب قلّة التخصيص الماليّة .
- تم الغاء (157) مدرسة
- بلغت نسبة الإنجاز الكلي للمشروع (79 %)



مدرسة الوردة البيضاء / محافظة واسط

جدول(2): نسب انجاز مشروع ازالة المدارس الطينية في العراق

ت	الموقع	عدد المدارس الكلي	الملاحظات
1-	نينوى	(38) مدرسة	- تم انجاز 5 مدارس من المجموع الكلي قبل احداث حزيان 2014 التي تسببت بتوقف المشروع - تم الغاء (33) مدرسة
2-	كركوك	(29) مدرسة	- تم انجاز 3 مدارس من المجموع الكلي - تم الغاء (26) مدرسة
3-	ديالى	(17) مدرسة	- تم انجاز 4 مدارس من المجموع الكلي - تم الغاء (13) مدرسة
4-	بغداد	(19) مدرسة	- انجز المشروع / عدد المدارس المنجزة 19 مدرسة
5-	بابل	(10) مدرسة	- انجز المشروع / عدد المدارس المنجزة 10 مدرسة
6-	واسط	(26) مدارس	- انجز المشروع / عدد المدارس المنجزة 26 مدرسة
7-	صلاح الدين	(98) مدرسة	- انجاز (14) مدرسة - الغاء (84) مدرسة
8-	القادسية	(45) مدرسة	- المشروع منجز/ عدد المدارس المنجزة (45) مدرسة
9-	المنشي	(15) مدرسة	- المشروع متلكئ/ عدد المدارس المنجزة (6) مدرسة وبقية المدارس (9) مدارس تتراوح نسب الإنجاز من -32% 93%
10-	ذي قار	(106) مدرسة	- المشروع متلكئ/ عدد المدارس المنجزة (11) مدرسة وبقية المدارس (95) مدرسة تتراوح نسب الإنجاز من -26% 90%
11-	ميسان	(5) مدارس	- المشروع متوقف في (5) مدارس - تم الغاء (1) مدرسة
12-	البصرة	(1) مدرسة	- انجز المشروع / عدد المدارس المنجزة (1) مدرسة
	المجموع	409 مدرسة	

❖ تم الغاء 157 مدرسة ضمن مقاولت (26) حسب قرار (417) لسنة 2014.

ثانياً: محافظة النجف : أنشاء (4) مدارس ذات 18 صف بكلفة (7.643) مليار دينار مدرج في عام 2013):

تبنّت المحافظة ضمن أولوياتها لتخفيف الفقر انشاء (4) مدارس تتألف المدرسة من طابقين وتضم 18 صف يتسع كل صف الى 35 طالب . موزعة على المناطق الآتية:

- حي ميسان / قضاء الكوفة .
- حي السلام / قضاء الكوفة
- ناحية الحيدرية / قضاء النجف
- حي الزهراء / قضاء المناذرة



اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى :

- فك الاختناقات الحاصلة في المدارس ذات الدوام المزدوج
- توفير فرص عمل في المحافظة خلال مدة انجاز المشروع

الشرائح المستفيدة :

يقدر عدد الطلاب المستفيدين من المشروع بحوالي 2520 طالب

في طريق الإنجاز:

- تم احالة المشروع الى شركات القطاع الخاص خلال عام 2013
- انجز مشروع انشاء مدرسة في قضاء الكوفة/حي ميسان وتم افتتاح المدرسة من قبل الحكومة المحلية والإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر .
- بسبب قلّة التخصيصات في الأعوام السابقة، حصل مقاول مدرسة حي السلام / قضاء الكوفة على إجازة استثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار بدون اخذ الموافقات الأصولية للاستثمار مستنداً الى قرار (374) لسنة 2015 .
- العمل متوقف في المدارس الاثنىن المتبقيتين وبنسب انجاز متباينة (ناحية الحيدرية %35 ، حي الزهراء 70%) بسبب مناقلة مبلغ التخصيص الإنجاز مشروع مجمع ماء سعة (1000) م³/سا.

ثانياً: محافظة كربلاء :

بناء مدرسة ابتدائية سعة 18 صف مع التآثيث في منطقة اللايح ناحية الحسينية بكلفة (1.900) مليار دينار(ادرج عام 2013) :

يشمل المشروع أنشاء مدرسة ابتدائية في منطقة اللايح في ناحية الحسينية والتي تخلو من مدارس ابتدائية ، تتكون المدرسة من (18) صف وجناح إدارة مع مجموعة صحية ومجموعة صحية للطلاب وبمدة انجاز 420 يوم .

أهداف المشروع :

يهدف المشروع الى :

- تعليم الفقراء في المناطق الريفية الفقيرة .
- تقليل المسافة الفاصلة بين القرى الفقيرة والمدارس الابتدائية .

الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد الطلاب المستفيدين من المشروع بحوالي 450 طالب.

في طريق الانجاز

- اعلن عن المشروع بتاريخ 23 / 10 / 2013
- تم التعاقد مع الشركة بتاريخ 18 / 3 / 2015
- تم رفعها من خطة عام 2016 بموجب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد س.ل/ 651 في 9 / 12 / 2015 لعدم المباشرة من قبل الشركة بسبب قلة التخصيصات المالية.
- بعد توفر الغطاء المالي تم إعادة ادراج المشروع في عام 2014
- باشرت الشركة بالتنفيذ ونسبة الإنجاز الفعلية تبلغ 4%

المحصلة الرابعة (سكن ملائم وبيئة مستجيبة للتحديات)

يُعد السكن أحد المستلزمات الأساسية كالتعليم والصحة، وتحمل الحكومات سواء في البلدان المتقدمة أم النامية، مسؤولية ضمان سكن لائق وملائم لشرائح المجتمع كافة. وللسكن آثار وارتباط بنواحي أخرى من مناحي الحياة، بالنظر للنقص الكبير في الوحدات السكنية الملائمة مما حدا بالدولة إلى إطلاق مبادرة السكن الوطنية للتخفيف من تلك الأزمة والتخفيف من حدة الآثار التي يتركها السكن العشوائي وعلى أساس أنها إحدى السياسات التي تؤسس الأمان الاجتماعي للسكان كافة.

لقد أدى العجز السكني في المناطق الفقيرة وارتفاع معدلات نمو السكان والفقراء غير القادرين على امتلاك وحدات سكنية إلى تفاقم الحاجة السكنية للفقراء إلى حوالي 250 ألف وحدة سكنية ويتطلب بناء 75 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الخمسة القادمة والتي تمثل 30 % من الحاجة الفعلية. وقد أسهم تدمير الوحدات السكنية في المحافظات التي تعرضت لإرهاب داعش في تفاقم هذه المشكلة وإضافة أبعاد بيئية خطيرة لها. لذا صبت الإستراتيجية جل اهتمامها لتوفير بيئة سكن مناسبة للفقراء والذي تبلور في عدد مشاريع السكن والبنى التحتية.

تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية.

اولا : وزارة الاعمار والاسكان :

بناء مجمعات سكنية اقتصادية بكلفة (500) مليار دينار مدرج عام (2012) :

اولت استراتيجية التخفيف من الفقر اهتماما خاصا لمشاريع بناء مجمعات سكنية اقتصادية في خمس محافظات فقيرة هي (بابل، ذي قار، صلاح الدين، الديوانية، المثنى) ... بواقع 1389 وحدة سكنية.

اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى توفير بيئة سكن مناسبة للفقراء من خلال توفير سكن اقتصادي ملائم يحل مشاكل تدني نوعية السكن والاكتظاظ

في طريق الانجاز

فيما يلي جدول يبين الموقف من مشروع بناء وحدات سكنية في 5 محافظات الذي تنفذه وزارة الاعمار والاسكان بحسب المحافظات وعدد الوحدات السكنية وعدد المستفيدين :

جدول (3): يوضح المجمعات السكنية ونسب انجازها التي تنفذها وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة

المحافظة	موقع المشروع	عدد المستفيدين	نسبة الانجاز %	الملاحظات
الديوانية	الشامية الجبسة/144 وحدة	864	39 %	انتهاء عقد
	الشفافية /331 وحدة	1986	صفر	انتهاء عقد
	السنية / 65 وحدة	390	7.6 %	انتهاء عقد
المتنى	طحربة /112 وحدة	672	11.1 %	انتهاء عقد
ذي قار	عكيكة/260 وحدة	1560	6%	انتهاء عقد
بابل	الشوملي/240 وحدة	1446	صفر	تمت احالة المشروع بمبلغ (30.935.975) مليار دينار بتاريخ 4 /6 /2014 تأجيل التوقيع العقد بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد
صلاح الدين	(يثرب+1 يثرب2)/237 وحدة	1422	صفر	لم يحال المشروع بسبب الوضع الأمني منذ عام 2014
المجموع		8340		



مجمع الشامية / محافظة الديوانية

ثانياً : محافظة نينوى :

أنشاء مجمع سكني واطئة الكلفة عدد (1) في محافظة نينوى سعة 500 دار بكلفة (24500) مليار دينار (مدرج عام 2013) :

بناء مجمع سكني اقتصادي على مساحة ارض تقدر بـ (215271) متر مربع ، يشمل المشروع بناء (500) وحدة سكنية بمساحة (150) متر مربع للوحدة السكنية الواحدة وبمساحة بناء (100) متر مربع، يتكون الدار من طابق واحد ... يضم غرفتي نوم ومطبخ وصالة ومجمع خدمات ، وسيتم تبليط الشوارع الرئيسية والفرعية وصب الأرصفة وتوفير خدمات الكهرباء والمجاري وإيصال الماء للدور ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم، فضلا عن أنشاء مباني خدمية تتضمن الآتي :

- مدرسة ابتدائية ذات (12) صف، مساحتها 1000 متر مربع
- مدرسة ثانوية ذات (12) صف، مساحتها 1000 متر مربع
- جامع مساحته 400 متر مربع
- مستوصف مساحته 700 متر مربع
- مجموعة مواقف سيارات ومواقع تجارية ومناطق خضراء

اهداف المشروع :

- يهدف المشروع الى :
- توفير سكن ملائم للعوائل الفقيرة
- المساهمة بالحد من ازمة السكن الحاد في المحافظة
- تشجيع الهجرة العكسية (الهجرة من المدينة الى الريف) حيث ان موقع المشروع يقع خارج مدينة الموصل .
- خلق فرص عمل اضافية تساهم بالحد من ظاهرة البطالة
- تقليل الاضرار الاجتماعية التي يمكن ان تنشأ لمثل هذه الشرائح عند عدم توفر سكن ملائم لهم.
- يعد هذا المشروع نواة لمشاريع مشابهة تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام ويمكن ان تساهم بها الحكومات المحلية مستقبلا لرفع المستوى المعاشي لمواطنيها

الشرائح المستفيدة :

يخدم المشروع حوالي 500 اسرة فقيرة اي ما يعادل 3000 فرد .

في طريق الإنجاز

- بعد أدراج المشروع تأخرت المحافظة إجراءات الإعلان للمشروع بسبب قطعة الارض المخصصة من قبلها لأنها لم تكن كافية وتم استبدالها بقطعة ارض أخرى .
- تم اعداد الدراسات والتصاميم الجديدة بعد استبدال قطعة الأرض بأخرى تابعة لنفس القضاء، وتم تسليم المخططات الجديدة الى دائرة تخطيط القطاعات وحصلت المصادقة عليها .
- توقفت بعدها كافة الإجراءات بسبب الأوضاع الأمنية
- بعد تحرير المحافظة من عصابات داعش الإرهابية صادقت المحافظة على خطتها لعام 2018 لكن لعدم معرفة مصير المشروع تم وضع مبلغ التخصيصات في صندوق حسابات أمانات المحافظة .

ثالثاً : محافظة كركوك :

تنفيذ مجمعين سكنيين ، بكلفة (15) مليار دينار (مدرج عام 2013) :

يتكون المشروع من بناء مجمعين سكنيين على عرصتة مساحتها (35) دونم تقريبا، يضم كل مجمع (150) وحدة سكنية على شكل دور منفصلة بطابق واحد، تبلغ مساحة البناء للدار الواحدة (100)متر مربع من مساحة المسكن (150) متر مربع ، وتحتوي على غرفتي نوم ومطبخ وغرفة معيشة مع مرافق وحمام ومخزن ومناور داخلية عدد 2 وحديقة امامية مع ممشي وكراج ، مدة تنفيذ المشروع تقدر بـ 360 يوم عمل لكل من المجمعين.



مجمع سكني غرب محافظة كركوك

اهداف المشروع

يهدف المشروع الى توفير سكن ملائم لشريحة من المواطنين المتعاضين وذوي الدخل المحدودة وتوفير فرص عمل في المدينة طيلة فترة انجاز المشروع .

الشرائح المستفيدة:

توفير السكن الاقتصادي لـ (300) اسرة فقيرة اي ما يعادل (1800) فرد .

في طريق الإنجاز

- نسبة الإنجاز (100 %) وتم استلام المشروع استلام اولي .
- تم تشكيل لجنة في المحافظة لتوزيع الوحدات السكنية بعد الإنجاز النهائي للمشروع .



مجمع سكني شرق محافظة كركوك

رابعاً : محافظة ديالى :

تنفيذ مجمع سكني اقتصادي لإسكان الفقراء ، بكلفة (7) مليار دينار (مدرج عام 2012) :

يضم المشروع تنفيذ ثلاث مجمعات سكنية في قرى (الكبة، بهرز، الاحيمر) في قضاء بعقوبة في محافظة ديالى ، ويتكون من (105) وحدة سكنية موزعة على القرى المذكورة .

الموقف الخاص بالمشروع:

- ادرج المشروع أعلاه عام 2012 لتنفيذ مجمع سكني اقتصادي لإسكان العوائل الفقيرة
- اهيل المشروع الى احدى شركات القطاع الخاص وتم الإحالة والتعاقد خلال شهر اب / 2013
- تم رفعه من خطة عام 2016 بموجب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد س.ج/ 651 في 9 / 12 / 2015. بسبب تخصيص الارض المراد الأتشاء عليها لكونها اراضي زراعية .
- بعد توفر الغطاء المالي ، طالبت المحافظة وزارة التخطيط بإعادة ادراج المشروع بكتابها المرقم 19596 بتاريخ 18 / 10 / 2018
- قيد اسحصال الموافقات الأصولية بإعادة ادراج المشروع مشروطة :

- 1 - تحديد موقع المشروع في النواحي الفقيرة المستهدفة حسب دليل أولويات الأنشطة والمناطق الخاصة بوثيقة استراتيجية التخفيف من الفقر 2018 - 2022.
- 2 - تقليل مساحة البناء وكلفة الوحدة السكنية بما تتلائم مع السكن الاقتصادي للفقراء .

خامساً : محافظة الانبار:

أ . بناء مجمعات اقتصادية (المرحلة الأولى) بكلفة قدرها (15) مليار دينار (مدرج عام 2013) :

ويشمل المشروع بناء (365) دار اقتصادية في اقصية الرمادي ، الفلوجة ، هيت ، حديثة ، عنه ، راوه ، القائم ، الرطبة، تشيد الدار الواحدة على قطعة ارض بمساحة 200 متر مربع وتضم غرفة نوم كبيرة واخرى صغيرة وصالة ومطبخ وحمام ومرافق صحية مع حديقة وكراج، مدة انجاز المشروع هي 6 اشهر من تاريخ تسلم الارض.

اهداف المشروع:

يهدف المشروع الى تقليل معاناة الفقراء من مشكلات تدني نوعية السكن والاكتظاظ والتلوث وعدم ملائمة البنى التحتية والتي تعكس الحرمان الذي يعاني منه الفقراء كما يهدف المشروع الى توفير السكن الملائم لفقراء المحافظة.



الشرائح المستفيدة:

يخدم المشروع (365) اسرة فقيرة اي ما يعادل (2190) فردا .

في طريق الانجاز

- بلغت نسبة الانجاز الفعلي 78 % .
- باشرت الشركات بالعمل في بعض الاقصية بعد توفر التمويل الازم وهي :
- مجمع قضاء القائم (100 %)
- مجمع قضاء الفلوجة (100 %)
- مجمع قضاء حديثة (90 %)
- مجمع قضاء الرطبة (90 %)
- مجمع قضاء راوه (70 %)
- مجمع قضاء هيت (70 %)
- مجمع قضاء عنة (59 %)

• تم فسخ العقد لمجمع قضاء الرمادي بموجب صلاحيات محافظ الانبار .

• تمت إضافة مكون لبناء (5) دور في ناحية النخيب من المبالغ الفائضة للمشروع (الوفره) و بنسبة انجاز فعلي 100 %.

ب . بناء مجمعات اقتصادية (المرحلة الثانية) بكلفة قدرها (16) مليار دينار (مدرج عام 2014) :

ويشمل المشروع بناء دار(325) دار اقتصادية في اقصية الرمادي ، الفلوجة ، هيت ، حديثة ، عنه ، راوه ، القائم ، الرطبة، الخالدية تشيد الدار الواحدة على قطعة ارض بمساحة 200 متر مربع وتضم غرفة نوم كبيرة واخرى صغيرة وصالة ومطبخ وحمام ومرافق صحية مع حديقة وكراج.

اهداف المشروع:

يهدف المشروع الى توفير السكن الملائم لفقراء المحافظة.

الشرائح المستفيدة :

يخدم المشروع 325 اسرة فقيرة اي ما يعادل (1950) فردا .

في طريق الانجاز

بلغت نسبة الانجاز الفعلي 51 % .

باشرت الشركات بالعمل في الاقضية بعد توفر التمويل اللازم وهي :

- مجمع قضاء القائم (20%)
- مجمع قضاء حديثة (25%)
- مجمع الرمادي (46%)
- مجمع قضاء الرطبة (80%)
- مجمع عامرية الفلوجة (60%)
- مجمع قضاء راه (15%)
- مجمع قضاء هيت (80%)
- مجمع قضاء عنه (43%)

ج . تجهيز ونصب كرفانات عدد 212 في محافظة الانبار بكلفة 2.5مليار دينار.

بعد احداث حزيران 2014 وفي ظل النزوح القسري لبعض المحافظات جراء ارهاب داعش والعمليات العسكرية فيها تبنت الإدارة التنفيذية أنشطة خاصة تهدف الى توفير خدمات للعوائل النازحة وكان من ضمنها مشروع تجهيز كرفانات لتوفير سكن ملائم للنازحين .

اهداف المشروع:

يهدف المشروع لاسكان العوائل النازحة بسبب العمليات العسكرية والاعمال الارهابية.

الشرائح المستفيدة:

يخدم هذا المشروع (1272) فرد في ناحية عامرية الفلوجة.

في طريق الانجاز

- تم انجاز البنى التحتية للمشروع ونصب بعض الكرفانات .
- نسبة الانجاز الفعلي 25 %.
- طالبت المحافظة بتغيير طبيعة اعمال التنفيذ وموقع المشروع الى مشروع (بناء وحدات سكنية اقتصادية بناء تقليدي)
- وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بتغيير طبيعة وموقع المشروع
- تم ارسال كتاب الى وزارة المالية لغرض (تغيير طبيعة وموقع المشروع واطلاق الصرف)

سادساً: محافظة بابل :

تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقراء في محافظة بابل مع اوصول الخدمات الاساسية روضة ، حضانتة، مسجد ، طرق داخلية، شبكة مجاري ، ساحات خضراء) وبكلفة (18 مليار دينار) مدرج في عام (2012) .

حددت المحافظة اولوياتها من تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2012 بناء مجمعات سكنية اقتصادية للفقراء وقد خصصت لتحقيق هذا الهدف قطعة ارض مساحتها (12) دونم في ناحية ابي غرق وبواقع (15) عمارة، كل عمارة تحتوي على (12) شقة ، مساحة الشقة الواحدة (100) متر مربع

اهداف المشروع :

- يهدف المشروع الى تحسين بيئة السكن للفقراء من خلال توفير مجمع سكني متكامل مع الخدمات الاساسية.

الشرائح المستفيدة:

يستهدف المشروع توفير بيئة سكن مناسبة لـ 180 اسرة فقيرة في المحافظة اي ما يعادل (1080) فرد.

في طريق الإنجاز



مجمع ابي غرق/ محافظة بابل

- احيل المشروع الى شركة الفاو الهندسية للمقاولات
- احدى شركات وزارة الإعمار والإسكان بأمر الاحالة المرقمة 13953 في 15 /12/ 2012 .
- تمت المباشرة بتاريخ 30 /12/ 2012 .
- توقف العمل منذ عام 2015 بعد صب جميع
- هياكل البناءات وبناء الجدران لـ(12) عمارة
- مع صب ارضية بنايتي الحارس ومبنى الإدارة .
- نسبة الإنجاز الكلي 35 % .
- لم تباشر الشركة خلال عام 2018 بسبب وجود مستحقات

سابعاً: محافظة واسط:

تنفيذ مشاريع بناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقراء في محافظة واسط في اقصية الكوت الحي والصويرة والعزيزية بكلفة (35) مليار دينار مدرج في عام (2012):

يتكون المشروع من مكونين بأربع مواقع في كل من الاقصية (الكوت ،الصويرة ،الحي ،العزيزية) بكلفة كلية قدرها (35) مليار دينار ، تم تخصيص مبلغ (11900) مليون دينار عام 2012 لبناء مجمع سكني بواقع 284 وحدة سكنية على قطعة ارض بمساحة (500) دونم في قضاء الكوت حيث تم اختيار موقع المشروع حسب الكثافة السكانية والمساحة المتوفرة في الاقصية والنواحي لتوفير سكن مناسب لشريحة الفقراء وقد تم انجازه خلال عام 2013 .

اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى حل مشكلة سكن الفقراء في محافظة واسط من خلال مشروع ينجز باكثر من مرحلة يستهدف شريحة مهمة من المجتمع ذات الدخل المحدود (دخل دون خط الفقر) فضلاً عن تدني نوعية السكن والتلوث وعدم ملائمة البنى التحتية .

الشرائح المستفيدة:

استهدف المشروع في مرحلته الاولى حل مشكلة سكن (5500) فرد من الفقراء .

في طريق الإنجاز

- المكون الاول: تنفيذ بناء مجمع سكني في محافظة الكوت بعدد 284 وحدة سكنية بكلفة كلية بلغت 11.900 مليون دينار:-
- 1 - تم احواله مشروع الخدمات الاساسية للمجمع بكلفة (11865) مليون دينار ضمن خطة عام 2013 ومن تخصيصات موازنة تنمية الاقاليم ، بمدة تنفيذ 500 يوم . بنسب انجاز فعلية تبلغ :
 - نسبة انجاز اعمال المجاري 80 %
 - نسبة انجاز اعمال تطوير واكساء وصب الشوارع 75%
 - نسبة انجاز اعمال الماء (100 % شبكة داخلية ، 100 % اعمال الخط الناقل ، 80 % مجمع الماء)
 - نسبة انجاز اعمال الكهرباء 90 % (المتبقي ربط الكيوسكات فقط)
 - نسبة انجاز اعمال البلدية 100 %

- 2 - شكلت لجنة لغرض توزيع الدور السكنية من خلال توزيع وجمع استثمارات المفاضلة التي اعدتها الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر وصادق عليها مجلس الوزراء بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ((ذي العدد ش.ل /ت/م/025869 في 13 /8/ 2014)) يترأس اللجنة مستشار المحافظ لشؤون المجتمع وعضوية كل من مدير التخطيط والمتابعة ، مدير شؤون المواطنين، مدير قسم العقود فضلاً عن ممثل عن الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر .
- تم توزيع استثمارات المفاضلة على العوائل الفقيرة وتم التركيز على المناطق العشوائية وبؤر الفقر في قضاء الكوت.
- تم ملئ (1024) استمارة من قبل الاسر المستهدفة الراغبين بالحصول على سكن وجرى تدقيق الاستثمارات وادخالها الكترونياً والمفاضلة بين المتقدمين.
- تم استخراج (284) اسرة فقيرة مستحقة ، تم تسليم قوائم الأسماء الى المحافظة وتم الإعلان عنها .
- سيتم توزيع الوحدات السكنية بعد اكتمال انجاز الخدمات الأساسية للمجمع التي هي في مراحلها النهائية .



مجمع قضاء الكوت / محافظة واسط

- المكون الثاني : تنفيذ بناء وحدات سكنية بعدد 591 وحدة سكنية في اقصية الحي والصويرة والعزيزية (إعادة ادراج في عام 2018) :
- بسبب عدم المباشرة بالمشروع تم رفع المكون من قبل دائرة تخطيط القطاعات أستنادا الى كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية المرقمة 651 في 9 /12/ 2015 .
- بسبب الوفرة في التخصيص للمشروع البالغ (23100) مليون دينار ، طالبت المحافظة بإعادة ادراج المشروع ضمن تخصيصات المكون الثاني .
- تم الطلب من المحافظة بضرورة إعادة النظر بتصميم ومواصفات البناء للوحدات السكنية والتحول الى نظام البناء التقليدي .
- أعيد ادراج المشروع ضمن صلاحيات وزير التخطيط بالاستناد الى الفقرة (-9) من صلاحياته وصلاحيات السيد المحافظ استنادا الى الفقرة (-17) من الصلاحيات الواردة في التعليمات الموازنة الاتحادية لعام 2017 .
- تم تخفيض عدد الدور لتكون (406) دار وبكلفة (44) مليون دينار للدار الواحدة بضمنها الخدمات الأساسية حسب توصيات الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر (شبكة ماء ، شبكة مجاري ، خزانات تعفين للمجاري، تبليط شوارع) كما تضمن المشروع أنشاء مدارس مع التآثيث عدد (2) سعة
- تم المصادقة على خطة المحافظة في شهر اب / 2018 بعد مناقلة مبلغ (1) مليار دينار .
- تم التمويل والمباشرة في موقع ناحية واسط وبنسبة انجاز فعلي 42 %.

ثامناً : محافظة صلاح الدين :

بناء مساكن اقتصادية للفقراء ، بكلفة كلية (25) مليار دينار(مدرج في عام 2013) :

تألف المشروع من (438) دار، ولا تقل مساحة بناء الدار الواحدة عن (100) متر مربع، ومن المؤمل ان يخدم عدد من سكان المحافظة ، كما انه سيؤدي الى تحسين بيئة الانسان ليكون له دور فاعل في التنمية الوطنية ورفع المستوى الخدمي السكني الذي يؤدي الى خفض الأنفاق ورفع المستوى المعاشي للمواطنين وتخفيض معدلات الفقر . كما أن المشروع سيقدم خدمات اجتماعية لسكان المحافظة من خلال توفير السكن والبنية التحتية المتطورة وسيتم تقديم الخدمات من قبل المحافظة ضمن خطة تنمية الأقاليم .

في عام 2018 تم استحصال الموافقات الأصولية لزيادة الكلفة الكلية للمشروع ليتم ادراج (40) مدرسة كرفانية و(40) بيت صحي وزعت في اقصية المحافظة لتكون المحافظة تعرضت للدمار جراء العمليات العسكرية وتعتبر اول محافظة تم تحريرها من عصابات داعش الإرهابية التي دمرت الكثير من الممتلكات الخاصة والعامة ولغرض البدء بدمج العوائل العائدة في المجتمع وتوفير الخدمات اللازمة

اهداف المشروع:

- يهدف المشروع الى توفير سكن اقتصادي ملائم للفقراء فضلاً عن توفير فرص عمل للعاطلين خلال فترة إنجاز المشروع .
- تقديم التعليم اللائق للعوائل الفقيرة والعائدة بعد موجة النزوح .
- توفير الخدمات الصحية في المناطق الفقيرة .

الشرائح المستفيدة:

- ستوزع الدور على (438) اسرة وبما يعادل (2628) فردا من الشرائح الإجتماعية المتضررة بالاعتماد على استمارة المفاضلة التي اعدتها الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر منها:
- عوائل الشهداء التي استشهد معيها جراء الانفجارات ولا تملك وحدة سكنية .
- العوائل المتعضة التي ليس لها معيل او شخص يعمل في القطاع الحكومي ويفضل العوائل التي تعيلها امرأة

في طريق الانجاز

- طالبت المحافظة بعد تحريرها من عصابات داعش اعادة ادراج المشروع بسبب الحاجة الملحة للسكن خاصة للفئات الفقيرة والتي تهدمت بيوتها جراء الأعمال الإرهابية والعمليات العسكرية التي صاحبت تحرير المحافظة. تم أستثناء المشروع حسب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد:س.ل/ 738 بتاريخ 29 /12/ 2016 من اجراءات الاحالة وتوقيع العقد.
- تم استئناف العمل خلال عام 2018 بعد توفر سيوله نقدية وبلغت نسبة الإنجاز الفعلية 30%.

تاسعاً: محافظة الديوانية:

- أ . تنفيذ مشاريع لبناء مجمعين سكنيين اقتصاديين للفقراء في محافظة الديوانية وبكلفة (4) مليار دينار لكل مجمع من المجمعين افقي وعمودي(مدرج في عام 2012):

تم تخصيص قطعة الأرض المرقمة (8/21) مقاطعة (5) ام العباسيات بمساحة (270) دونم، لبناء مجمعات سكنية افقية بعدد (91) وحدة سكنية وعمودية بعدد (94) وحدة سكنية اقتصادية ، تكون مساحة الوحدة السكنية في المجمعات السكنية الأفقية (90) متر مربع بناء (عدا مساحة الحديقة والكراج)، وتتكون الوحدة السكنية من غرفتي نوم وصالة ومطبخ وحمام، اما بالنسبة للبناء العمودي فتكون مساحة الوحدة السكنية (80) متر مربع وتتكون من غرفة نوم وصالة ومطبخ وحمام .



مجمع الديوانية السكني

اهداف المشروع:

- يهدف المشروع الى حل مشكلة السكن للعوائل الفقيرة في المحافظة من خلال نوعين من البناء العمودي والافقي في المحافظة والتي تعد من المحافظات الفقيرة في العراق

الشرائح المستفيدة

يقدر عدد المستفيدين من المشروع ب 185 أسرة، وبما يعادل 1110 فرداً.

في طريق الإنجاز

- بعد اعلان المشروعين وفتح العطاءات تمت الاحالة الى الشركة المنفذة ،حيث باشرت الشركة عملها في شهر شباط/2014
- بلغت نسبة الانجاز الفعلي للمجمع السكني العمودي هي 45 % .
- بلغت نسبة الانجاز الفعلي للمجمع السكني الافقي 91 % .

ب . محافظة الديوانية :

انشاء وحدات سكنية اقتصادية مع مجمع ماء ، بكلفة (15) مليار دينار(مدرج في عام 2013) :

المشروع هو احد أولويات المحافظة من تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013 ، ويتكون من :

- أنشاء وحدات سكنية عمودية مع مجمع ماء في ناحية الشافعية - مقاطعة 5 أم العباسيات جنوب غرب المحافظة، وبمدة تنفيذ (240) يوماً...يضم المشروع 162 مبنى سكني عمودي ، يتكون كل مبنى سكني من شقتين تستوعب كل منها (6) اشخاص وتتكون كل شقة من غرفتي نوم ومطبخ وغرفة معيشة ومجموعة صحية ، علماً ان الخدمات اللازمة للمشروع (شبكة الماء، الكهرباء، الطرق) وغيرها ستنفذ كمرحلة ثانية بعد انجاز مشروع البناء.
- مشروع تجهيز ونصب مجمع ماء سعة (200) متر مكعب /ساعة مع مد شبكة انابيب بلاستيكية باقطار (250، 160، 110، 315) ملم وبنائية خدمة وحوض تغطيس ومولدة كهربائية (KV500) وتعد مديرية ماء محافظة الديوانية هي المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

أهداف المشروع :

يهدف المشروع الى التخفيف من ظاهرة انتشار دور المتجاوزين للعوائل الفقيرة في احياء المحافظة من خلال توزيع الوحدات السكنية لهم بعد اكتمال هذا المشروع كما يسهم المشروع بتشغيل الايدي العاملة والتي معظمها من ذوي الدخل المحدود، اما مجمع الماء فسيؤمن الماء الصالح للشرب للعوائل الفقيرة التي تسكن المجمع .

الشرائح المستفيدة:

يخدم المشروع حوالي (324) اسرة اي (1944) فردا من الفقراء في المحافظة ، وسيكون توزيع المساكن بحسب العوائل الاشد فقرا وحرماناً وفق استمارة المعايير المعدة لهذا الغرض .

في طريق الإنجاز :

- اعلن عن المشروع واحيل الى الشركة المنفذة وباشرت في شباط/ 2014 .
- بلغت نسبة الإنجاز الفعلي 55 % وتمثل مرحلة بناء الجدران وتسقيف بعض الوحدات السكنية .
- خصص مبلغ(2098.2) للمشروع لعام 2018 لاستئناف العمل .
- العمل على تشكيل لجنة لغرض توزيع المساكن .



مجمع سكني اقتصادي مع مجمع ماء/ محافظة الديوانية

عاشراً: محافظة المثنى:

تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقراء في محافظة المثنى بكلفة(45) مليار دينار(مدرج في عام 2012):

تبنت المحافظة انشاء مجمعات سكنية مخصصة للفقراء مع كافة الخدمات والبنى التحتية اللازمة لها وبواقع (100) وحدة سكنية، توزع حسب النسبة السكانية للوحدات الادارية في المحافظة مع اجراء بعض التعديل للوحدات التي تعاني من نسب فقر اكبر. تتكون

كل وحدة سكنية من طابق واحد وتحتوي على غرفتين وصالة ومطبخ وصحيات فضلا عن حديقة امامية وكراج، وتختلف مساحة الاراضي المخصصة في اقصية المحافظة اذ تم تخصيص (200) متر مربع لكل وحدة سكنية في قضاء السماوة، و (250) متر مربع لكل وحدة سكنية في اقصية (الخضر، الرميثة، السلطان و (300) متر مربع لكل وحدة سكنية في كل من النواحي (الوركاء، الكرامت، النجمي، السوير، الدراجي، بصية، الهلال، المجد) الا ان مساحة البناء لكل وحدة سكنية ولكل الاقصية هي (106) متر مربع.

اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى توفير سكن اقتصادي ملائم لفقراء المحافظة فضلا عن توفير البنى التحتية الملائمة والتي تؤدي بمجملها الى تحسين بيئة السكن الخاصة بالفقراء.

الشرائح المستفيدة:

يستهدف المشروع تحسين الواقع السكني لـ (1000) اسرة وبما يعادل (6000) فردا في المحافظة.

في طريق الانجاز

- ادرج المشروع عام 2012 ولم توفق المحافظة في احالة المشروع خلال عامي 2012 - 2013 .
- نظرا لمحدودية عدد المساكن الاقتصادية في (قضاء السلطان ، ناحية البصية) قامت المحافظة بأعداد الكشوفات والدراسات والتصاميم للمشروع
- تم إحالة مجمعين في (قضاء السلطان ، ناحية البصية) الى الشركة المنفذة بواقع 70 وحدة سكنية وبشرت الشركة بالتنفيذ في ك2 / 2014 .. وبلغت نسبة الانجاز الكلي للمجمعين 98% وتمثل الاعمال النهائية للمشروع .
- اما بخصوص باقي الوحدات الإدارية قد تم إحالة مشروع اعداد (الدراسات والتصاميم) الى احدى شركات القطاع الخاص التي انجزت عملها خلال عام 2014 .
- تم تشكيل لجنة في المحافظة لغرض توزيع وجمع استمارات المفاضلة لتحديد الممولين بالوحدات السكنية



مجمع سكني في ناحية البصية / محافظة المثنى

إحدى عشر محافظة ذي قار :

بناء مجمع سكني اقتصادي وبكلفة (40) مليار دينار(مدرج في عام 2013):

لتنفيذ المشروع تم تخصيص مبلغ (3655.6) مليار دينار في عام 2016 يتضمن انشاء مجمع سكني افقي اقتصادي ضمن مساحة ارض تبلغ (58) دونم، يضم دور سكنية افقية بمساحة (200) متر مربع للدار الواحدة تتلائم مع بيئة الحضر التي تعيشها العوائل، وبعدها دور اجمالي يصل الى 356 دار سكنية وابنية خدمية متكاملة مع شبكات البنى التحتية لهذا المجمع

اهداف المشروع:

• توفير الوحدات السكنية لمواطني المحافظة التي تعاني من الفقر، وسد جزء من الحاجة السكنية في المحافظة

- تطوير المنطقة الحضرية من خلال انشاء مجتمعات سكنية مخدمه بابنية عامة كمحطة سكنية متكاملة لخدمة اهالي القضاء ،
- بالإضافة الى توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل من خلال اعمال البناء في المجمع السكن .
- تحسين دخل الاسر الفقيرة بتوفير المبالغ التي كانت تدفع بدلاً للإيجار .

الشرائح المستفيدة :

يخدم المشروع حوالي (356) أسرة اي بما يعادل (2136) نسمة من الفقراء في البيئته الحضرية.

في طريق الانجاز:

- اهيل المشروع باسلوب الدعوات المباشرة الى احدى الشركات المختصة للتنفيذ .
- توقف المشروع عن العمل منذ 4 سنوات بسبب الازمة المالية .
- تهيئة الكشوفات من قبل المحافظة لإعادة الإعلان عن المشروع .

إثنى عشر: محافظة كربلاء :

تضمنت مشاريع التخفيف من الفقر في المحافظة :

1- مشروع توفير البنى التحتية لمنطقة الزكاريط في قضاء عين التمر ومجمع دور واطئة الكلفة عدد (1000) دار في مركز المحافظة : المكون الاول : انشاء البنى التحتية لمجمع دور اقتصادية (1000) دار، بكلفة (12) مليار دينار (مدرج عام 2012) : نفذ المشروع مطلع عام 2013 ويمثل مشروع توفير البنى التحتية لمجمع دور اقتصادية تم بناءه سابقاً بعدد (1000) دار والذي يتكون من (تنفيذ شبكة مجاري ثقيلة وشبكة امطار، اىصال خط الماء المغذي ،اعمال تبليط للشوارع)

اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى تحسين بيئته السكن من خلال توفير البنى التحتية لمجمع دور (1000) دار تم بناءها سابقاً ضمن موازنة تنمية الاقاليم

عدد المستفيدين :

- يقدر عدد المستفيدين من المشروع بحوال (6000) فرد.
- تم انجاز المشروع في شهر اذار 2014.
- تم توزيع الدور على العوائل الفقيرة من قبل المحافظة حيث تم اعداد استمارة بالتنسيق ما بين المحافظة ومجلس محافظة كربلاء ، شملت الاستمارة الفئات (الارامل وعوائل الشهداء، الفقراء ضمن المناطق المتجاوز عليها في المحافظة ،عوائل شهداء الحشد الشعبي من الفقراء).

المكون الثاني : توفير البنى التحتية لمنطقة الزكاريط في قضاء عين التمر ، بكلفة (12) مليار دينار (مدرج عام 2012) : يتألف المشروع من 6 مكونات تشمل تنفيذ شبكة مجاري مع محطة المعالجة وتنفيذ بنائات لمقر الصيانة وتنفيذ شبكة ماء ، تنفيذ شبكة كهرباء مع مركز لصيانة الشبكة وشبكة اتصالات وتبليط الطرق

اهداف المشروع :

ويهدف المشروع الى توفير خدمة ملائمة لشريحة من المواطنين المتعطفين وذوي الدخول المحدودة وتوفير فرص عمل في المنطقة طيلة فترة انجازه.

عدد المستفيدين :

- يقدر عدد المستفيدين من المشروع بحوال (3000) فرد

في طريق الانجاز

- تم التعاقد والمباشرة بتنفيذ شبكة المجاري مع محطة معالجة وبنسبة انجاز %81 وتوقف المشروع منذ عام 2015 بسبب قلة التخصيصات .

- سيتم المباشرة في باقي المجمعات خلال عام 2019 بعد توفير التخصيصات المالية

2 - دراسة وتصميم مشروع توفير البنى التحتية لمشاريع السكن في منطقة الشريقات بكلفة قدرها (450) مليون دينار (مدرج في عام 2013):

يتضمن المشروع اعداد دراسة لإنشاء مجمع سكني متكامل في منطقة الشريقات / محافظة كربلاء والتي ستنفذه المحافظة ضمن مبالغ تخصصها الادارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر بعد اكمال الدراسة والتصاميم والمخططات بواقع (1000) وحدة سكنية ويشمل المشروع توفير دراسة وتصاميم ل:

- تنفيذ شبكة كهرباء
- انشاء بناية مركز صيانة الكهرباء
- استحداث مغذي من محطة الوند

اهداف المشروع :

تقديم الخدمات الاساسية للعوائل الفقيرة والتي يصعب الحصول عليها في تلك المناطق.

في طريق الانجاز :

- اهيل مشروع (دراسات وتصاميم منطقة الشريقات) الى مكتب استشاري .
- انجز العمل من قبل المكتب الاستشاري
- في عام 2018 تم تسديد مبلغ قدره (30) مليون دينار من مبلغ التعاقد

ثلاثة عشر : محافظة ديالى:

تاهيل وتنفيذ شبكات كهرباء في المناطق الريفية بكلفة (5.230) مليار دينار (مدرج في عام 2013) :

يتألف من (12) مشروع ويشمل تنفيذ وتاهيل شبكات كهرباء في قرى متعددة داخل المحافظة.

اهداف المشروع :

- توفير شبكة الكهرباء بصورة مستمرة للمناطق والقرى الفقيرة
- تاهيل الطاقة الكهربائية للقرى والمناطق البعيدة

الشرائح المستفيدة :

سكان القرى المشار اليها أعلاه والبالغ عددهم (14847) فردا.

:بسبب تأخر اطلاق صرف التخصيصات لعام 2018 لم يستأنف العمل في المكونات

- السلام - قرية الكبة بنسبة انجاز كلي 100 %
- العبارة - قرية الاعور بنسبة انجاز كلي 100 %
- بني سعد - قرية محمد الكاظم بنسبة انجاز كلي 100 %
- الخالص - قرية سفيط بنسبة انجاز كلي 100 %
- مركز قضاء بلد روز - قرية جواد الحجى بنسبة انجاز كلي 100 %
- مندلي - قرية عبد الله كيطان بنسبة انجاز كلي 100 %
- العظيم - قرية ابو طريمش بنسبة انجاز فعلي 87 % العمل متوقف
- مركز قضاء المقدادية بنسبة انجاز فعلي 60 % العمل متوقف
- مركز قضاء خانقين - قرية جسر حلوان بنسبة انجاز 54 % العمل متوقف
- المنصورية - قرية حبيب العبد الله العمل متوقف

المكونات المرفوعة من خطة عام 2016 بموجب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد س.ل/ 651 في 9 /12 /2015.

. جلولا - منطقة السكك في حي الطليعة

. الخالص - قرية السنديّة

المشاريع المستثناة من اجراءات الادراج والاعلان واحالة والتعاقد حسب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد:س.ل/ 738 بتاريخ 29 /12/ 2016

- ديوان الوقف الشيعي: تنفيذ مجمع سكني اقتصادي لإسكان الفقراء بعدد (316) وحدة سكنية، بكلفة (20) مليار دينار (مدرج في عام 2015) موقف المشروع

- أجريت مناقلة للمشروع بمبلغ (2) مليار دينار وتم إحالة المشروع الى شركة من القطاع الخاص مطلع عام 2019 وبنسبة إنجاز (3 %)

تحديات مشاريع السكن

- 1- توفر الارض التي يؤسس عليها المشروع والتي تعد اكبر محدد للمشاريع التي كانت تواجه جهات التنفيذ ضمن خطط تخفيف الفقر... اذ ان الجهات لم تخصص بصورة مسبقة قطع اراضي لمشاريع الامر الذي ادى الى تاخر البدء بعدد غير محدود من تلك المشاريع .
- 2- عدم وجود نماذج قياسية للدور الاقتصادية للفقراء معتمدة من الجهات المعنية ادى الى خضوع مواصفات تلك الدور الى ميول ورغبات الجهات المنفذة والمستفيدة وانعكس على تقديم مستلزمات ادراج تلك المشاريع في الوقت المحدد والذي اثر على موعد التنفيذ والانجاز وكذلك كلف بناء هذه الدور.
- 3- عدم وجود ضوابط لمسائلة الوزارة او المحافظة عن أسباب عدم المباشرة او تأخر تنفيذ مشاريع وأنشطة تخفيف الفقر ومنها مشاريع السكن أدى الى تأخر تنفيذ عدد غير قليل منها وتلك في تحقيق أهداف الاستراتيجية ضمن الوقت المحدد.
- 4- يتطلب ادراج أي مشروع سكني الى وجود دراسة جدوى فنية وهي لم تكن متكاملة في الوقت المحدد لدى عدد من جهات التنفيذ مما حد من سرعة تبني تلك المشاريع من قبل الجهات المعنية.
- 5- تفاوتت كلف التنفيذ المقدمة من قبل جهات التنفيذ لوحدة السكن الاقتصادي والتي تزيد في بعض الأحيان عن الحد المسموح به مما يؤدي الى رفضها من قبل الإدارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر والجهات المعنية في وزارة التخطيط وينعكس على الاستفادة من تخصيصات الاستراتيجية وسرعة تنفيذ خطط الفقر.



نستعرض في نهاية هذه المحصلة ملخصاً بعدد الدور السكنية الاقتصادية ونسب إنجازها حسب المحافظات وفق الجدول (5) الآتي :

جدول (6) : توزيع عدد الدور السكنية الاقتصادية التي تبنتها خطة إستراتيجية التخفيف من الفقر حسب المحافظات ونسب الانجاز

ت	الجهة	عدد الدور	نسبة الانجاز الفعلي	الملاحظات
1	وزارة الاسكان والاعمار محافظه بابل / الشوملي	240	-	لم يتم المباشرة بالعمل بسبب الوضع المالي
2	محافظه نينوى	500	0	لم يحال المشروع بسبب الوضع الامني
3	محافظه كركوك	300	95 %	المشروع في مراحل النهائيه
4	محافظه الانبار	370	78 %	تمت المباشرة بتنفيذ المشروع
		360	11 %	تمت المباشرة بتنفيذ المشروع
		212	25 %	تم تغيير موقع وطبيعة المشروع من كرفانات الى دور سكنيه
		105	0	لم يباشر بالتنفيذ بسبب زيادة كلفه الوحده السكنيه ، العمل جاري على إعادة النظر بالكشوفات
5	محافظه ديالى	105	0	لم يباشر بالتنفيذ بسبب زيادة كلفه الوحده السكنيه ، العمل جاري على إعادة النظر بالكشوفات
6	محافظه بابل	180	39 %	العمل متوقف بسبب قلته التخصيصات
7	محافظه صلاح الدين	438	48 %	تمت المباشرة بتنفيذ المشروع
8	محافظه الديوانيه	324	55 %	لم يباشر بالعمل
		94	65 %	المباشرة بالعمل في عام 2018
		91	97 %	المباشرة بالعمل في عام 2018
9	محافظه المثنى	1000	98 %	-احالت المحافظه مجمعين في قضاء السلیمان وناحیه البصیه بواقع 70 وحده سكنيه -لم يتم احاله باقي المجمعات
10	محافظه ذي قار	356	13 %	العمل متوقف بسبب الكلفه العاليه للوحده السكنيه الواحده
11	ديوان الوقف الشيعي	316	-	لم يباشر بالتنفيذ
مجموع الوحدات		4886		

• في عام 2018 تم انهاء (5) عقود في وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامه لبناء (894) وحده سكنيه في المحافظات (الديوانيه ، ذي قار ، المثنى).


❖ في إطار العمل الفني والإداري :


مرحلة تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي

- شكلت لجان فرعية عليا في المحافظات برئاسة نائب المحافظ وممثلين عن الدوائر القطاعية المعنية ولجان فنية سائدة لانجاز المهام الموكلة بموجب خارطة الطريق .
- تم تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في العراق عدا اقليم كردستان ومحافظة نينوى خلال عامي 2016 و2017 بموجب صور فضائية عالية الدقة تم توفيرها من قبل الهيئات .
- اعداد برنامج تفصيلي لدعم تنفيذ المشروع حيث تم استخدام برنامج Access والمعد على اساس نموذج مبني على بيانات إجتماعية وإقتصادية سابقة ضمن المواصفات العالمية ، ويتم ادخال المعلومات الخاصة بالمسح الجديد بعد حصر العشوائيات وربط بياناتها بالصور الفضائية التي تنظم في جداول هذا البرنامج وتدخل ضمن معادلات صممت من وفق منهجية دولية في مجال العشوائيات وعلى اساس هذه المدخلات يحدد نوع التدخل (ارتقاء ، اعادة توطين) لكل عشوائية .
- نفذنا مسح ميداني لتثبيت المواقع بالتنسيق مع لجان المحافظات والدوائر ذات العلاقة فيها .
- تم تقدير عدد المساكن وسكان التجمعات .


-اطلقت نتائج المسح سنة 2017 وادناه اهم النتائج :-

بلغ عدد تجمعات السكن العشوائي في 14 محافظة شملها المسح حوالي (4060) تجمعاً عشوائياً ، احتلت العاصمة بغداد المركز الاول في عدد التجمعات العشوائية وفيها (1022) تجمعاً عشوائياً .. تلتها محافظة البصرة بـ(677) تجمعاً عشوائياً ، فيما كانت محافظتا كربلاء والنجف هما الاقل في عدد التجمعات العشوائية بواقع (88) عشوائية في كربلاء و(89) عشوائية في النجف .

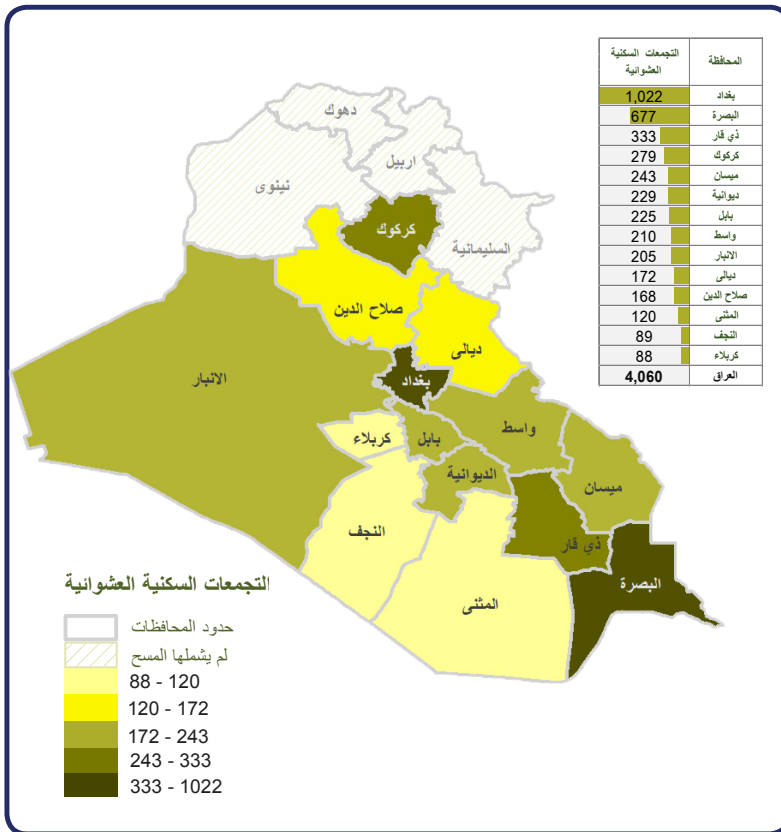

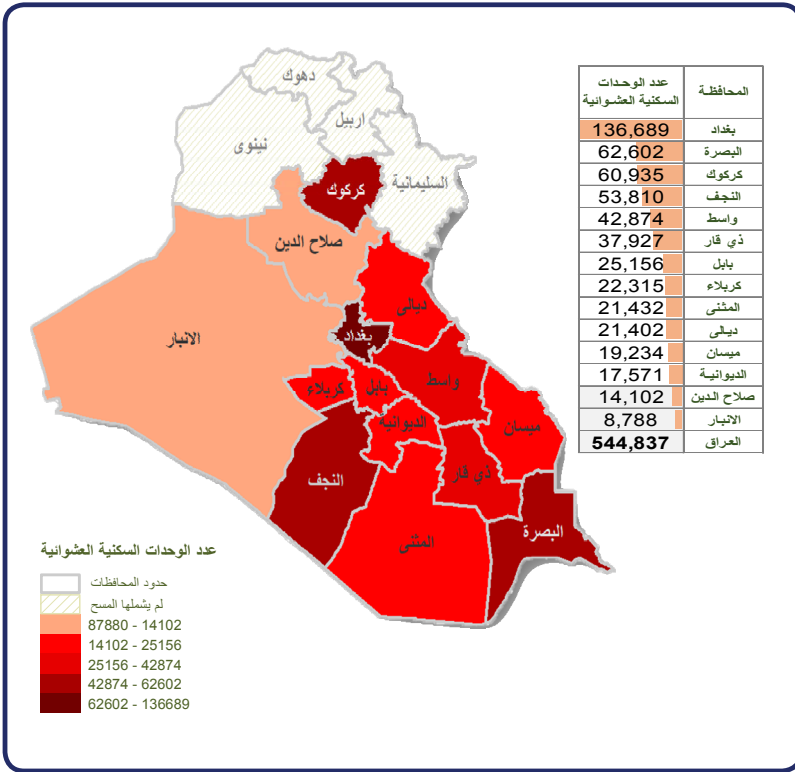

بلغ عدد الوحدات السكنية العشوائية (544837) وحدة سكنية، تشكل مانسبته (15.3%) من مجموع الوحدات السكنية في العراق، شكلت العاصمة بغداد ايضا المركز الاول بنسبة (25.1%) من مجموع المساكن العشوائية، تلتها البصرة بنسبة (11.5%)، فيما شكلت محافظتا الانبار وصلاح الدين اقل نسبة في عدد المساكن العشوائية بنسبة (1.6%) و(2.6%) في كل منهما على التوالي.

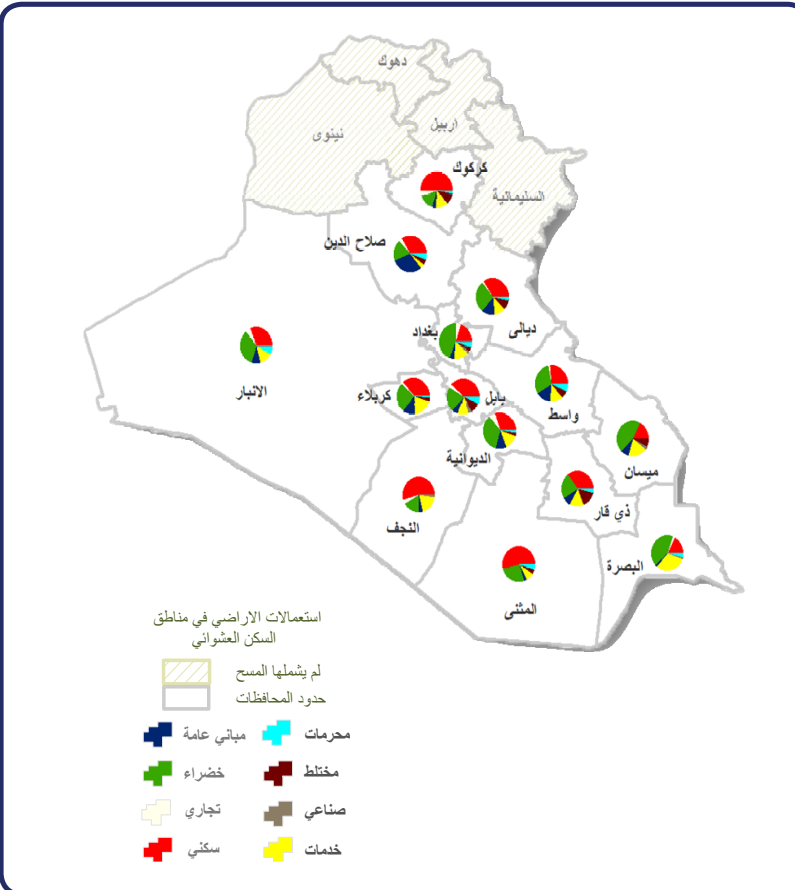

. بلغت نسبة استعمالات الارض (السكني) لتجمعات السكن العشوائي (27%) ونسبة استعمالات الارض (غير السكنية) (73%)، وان اعلى نسبة للاستعمال لجنس غير السكني كانت في مناطق خضراء بلغت (35%)

مرحلة مسح تجمعات السكن العشوائي على مستوى الوحدة السكنية العشوائية

ضمن الاطار الفني والاداري للمرحلة الاولى (مرحلة التهيئة والاعداد للمباشرة بالمعالجة) سيتم تنفيذ مسح ميداني لمناطق السكن العشوائي في المناطق الحضرية، فبعد الانتهاء من تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي ومعرفة حدودها وحجمها سينفذ هذا المسح من قبل الجهاز المركزي للاحصاء وفروعه في كافة المحافظات عدا اقليم كردستان وبإشراف الادارة التنفيذية لستراتيجية التخفيف من الفقر وبدعم من منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهيئات).

يهدف المسح الى توفير مؤشرات ذات موثوقية عالية على مستوى اصغر التشكيلات الادارية وللمناطق الحضرية في العراق عدا اقليم كردستان ، كما سيؤمن بناء قاعدة بيانات خاصة بالتجمعات العشوائية ، والتي من خلالها سوف تتوفر مؤشرات تفصيلية عن :-

- 1- الخصائص الديموغرافية
 - 2- الخصائص الاجتماعية والاقتصادية
 - 3- خصائص السكن وتوفر الخدمات
- أن توفر هذه المؤشرات والبيانات سيدعم تحديد نوع التدخل (ارتقاء ، اعادة توطين) وكذلك تحديد آليات معالجة هذه الظاهرة



- البيئة التجريبية في بغداد

تم تنفيذ بيئة تجريبية لتجمعين عشوائيين في بلدية الكاظمية / محلة 405 خلال الفترة (4 - 14) من شهر كانون الاول 2018 ، كمشروع رائد للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ المسح فضلاً عن تحديد المعالجات المطلوبة للتجمعات العشوائية وتوفير البيانات على مستوى التجمع والاسر من خلال استمارتين الاولى لحصر التجمع العشوائي والثانية خاصة بالاسرة بالاضافة الى اطر وتعليمات سائدة لتنفيذ العمل والتي سوف توفر مؤشرات تفصيلية عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسكن والخدمات وقد تضمنت مراحل العمل :-

1- تنفيذ دورة تدريبية خاصة لمشروع المسح الاجتماعي والاقتصادي الشامل في التجمعات العشوائية خلال الفترة 2 - 3 / 12 / 2018 عقدت في وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للإحصاء لشرح الاستمارات وآلية الحصر والترقيم وكيفية استخدام الاجهزة اللوحية .

2- حصر شامل للتجمعات والوحدات السكنية القائمة فيها بعد تحديد حدودها وترقيم المساكن فيها.

3- ملئ استمارتي التجمع والاسرة والاطر الخاصة بالاسر والمباني من خلال آلية حصر وترقيم المباني ميدانياً باستخدام الصور الفضائية وتثبيت حدود التجمع وأرقام المباني عليها.



4- قيام فرق العمل الميداني باستخدام اجهزة لوحية لأول مرة ودعمها باستمارات وخرائط ورقية للحصول على نتائج دقيقة.



تشير النتائج بشكل اولي الى استمرار التوسع في حدود التجمع وعدد المساكن العشوائية وعدد سكان العشوائية مقارنة بنتائج تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي 2016 وان الارض العشوائية المختارة ذات استعمال زراعي بموجب التصميم الاساس والنسيج العمراني لها غير منتظم وعائدية الارض تتوزع بين املاك زراعية خاصة وملكيات عامة (البلدية،المالية،السكك).

- سيتم الاسترشاد بنتائج المشروع الرائد اعلاه في تنفيذ مسح ميداني شامل في محافظات العراق لتجمعات السكن العشوائي في المناطق الحضرية بعد اجراء التعديلات المطلوبة في ضوء الملاحظات التي بينها المسح التجريبي .

- تنفيذ ورشة تدريبية للمسح الاجتماعي والاقتصادي الشامل للأسر في التجمعات العشوائية والتي عقدت في محافظة النجف للفترة من 16 - 18 / 12 / 2018 واجراء تدريب ميداني لمنطقة عشوائية مختارة في بلدية الكوفة / محلة 246 .

❖ في إطار العمل القانوني/التشريعي

- اعداد مسودة قانون معالجة التجاوزات السكنية بديل للقرارين 154،156 لسنة 2001 الذي يتناول ازالة التجاوزات الجديدة ومعالجة العشوائيات القائمة.

- صادق مجلس الوزراء على مسودة قانون معالجة التجاوزات السكنية بالقرار رقم (288) بتاريخ 4 / 7 / 2017 وتم ارسالها الى مجلس النواب لتشريعه.

- اعداد مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهيئات) حول تقديم الدعم الفني للمشروع ومن المؤمل توقيعها.



❖ في الأطار المالي:

- اعداد مسودة قانون صندوق تطوير العشوائيات لتسهيل توفير التمويل لمشاريع الترقية والتطوير لتجمعات السكن العشوائي في المدن العراقية وترميم وتأهيل الدور السكنية فيها .

- دمج مقترح مشروع قانون صندوق تطوير العشوائيات بأضافة مادة الى قانون معالجة التجاوزات السكنية والذي يناقش حالياً في مجلس النواب .

البوابة الالكترونية لأنشطة وبرامج استراتيجية التخفيف من الفقر

استحداث بوابة خاصة بمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر ضمن المنصة الوطنية الرقمية لرصد ومراقبة ومتابعة مشاريع إعادة الاعمار والاستقرار والتنمية بدعم فني من منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية لغرض تقييم مواقع المشاريع وتقديم البيانات بشكل مترابط واجراء عمليات التحليل والتي تسمح بتحديد العلاقات في البيانات وعرض النتائج بصفتها خرائط وجداول ومخططات ...

تضمن البوابة الالكترونية أنشطة وبرامج استراتيجية التخفيف من الفقر النواخذ التالية :

- الموقع الجغرافي لمشاريع التخفيف من الفقر

- مشروع إعادة وتأهيل تجمعات السكن العشوائي في العراق

- مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية

- مشروع إصلاح نظام البطاقة التموينية

ونبين ادناه الانجازات التالية:-

❖ التهيئة والتحضير لانشاء بوابة الكترونية لأنشطة وبرامج استراتيجية التخفيف من الفقر.

❖ اعداد واجهة البوابة الالكترونية .

❖ ادخال التقارير الصادرة عن استراتيجية التخفيف من الفقر بالاضافة الى البيانات المتعلقة بالاستراتيجية في البوابة الالكترونية .

❖ تنفيذ زيارات ميدانية في محافظات (كركوك، بابل، واسط، كربلاء، الديوانية، ذي قار، المثنى، البصرة، ميسان، النجف، ديالى، نينوى، بغداد) لغرض جمع البيانات الجغرافية لمشاريع التخفيف من الفقر.

❖ ادخال البيانات المكانية والوصفية لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر في البوابة الالكترونية

❖ التهيئة والتحضير لنشر البيانات المكانية والوصفية بنظام Arc GIS Online للمحافظات.



المحصلة الخامسة (حماية اجتماعية فعالة للفقر)

تسهم الحماية الاجتماعية في إرساء دعائم المساواة والعدالة الاجتماعية والحد من الفقر والتهميش في المجتمع. وتتضمن منظومة الحماية الاجتماعية نظام التوزيع العام (البطاقة التموينية)، ونظام شبكة الحماية الاجتماعية، ونظام التقاعد الوطني، ونظام التأمين الاجتماعي الذي لم ينجز لحد الآن. وهذه الأنظمة بحاجة إلى تصحيح للتشوهات التي أصابها منذ بدء تطبيقها، وأهم تلك التشوهات عدم مراعاة الأهمية حصول مبدأ الأهداف للفتات أو المناطق الجغرافية بحسب خريطة الفقر. وتتابع الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر تنفيذ هذه الأنظمة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بآليات المتابعة الخاصة بها .

أولاً: إصلاح نظام لبطاقة التموينية وربطها بقاعدة بيانات المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.

استكمالاً لجهود الإدارة التنفيذية في المساهمة في تفعيل نظام البطاقة التموينية وربطه بنظام الحماية الاجتماعية الذي هو أحد أنشطة إستراتيجية تخفيف الفقر لجعله أكثر فاعلية.. تواصل العمل على تطوير نظام البطاقة التموينية الذكية لتحقيق الاستهداف الدقيق للفقراء والفئات المهمشة من خلال توفيق قواعد البيانات الإلكترونية للمستفيدين فضلاً عن تحسين جودة مفرداتها وتيسير الحصول عليها من عدة منافذ بقيام القطاع الخاص بتوفير المواد التموينية .

ويضمن هذا المشروع عدم تسرب مزايا البطاقة التموينية لغير المحتاجين ويكفل منع هدر موارد الدولة تحت مظلة برنامج اصلاح حديث ومتكامل، وفي هذا الشأن تم تشكيل لجنة عليا وضعت الاطار العام للبرنامج وآليات العمل به وسلسلت فعالياته وفق أولويات وأسبقيات الاستهداف.

حيث تقوم فكرة مشروع البطاقة التموينية الذكية على اعتماد التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الحصول على المفردات التموينية المخصصة للأسرة شهرياً باستخدام البطاقة الذكية فضلاً عن توفر قاعدة بيانات إلكترونية لكل الأسر العراقية المشمولة بالبطاقة وإعطاء القطاع الخاص دور للمساهمة في نمو النشاط الاقتصادي ، وتخفيف العبء عن أجهزة الدولة كي تشغل بمهام الأشراف والتخطيط في هذا المجال .

تم وضع الاطار العام لنظام البطاقة التموينية :

- ❖ يعتمد النظام إمكانية تجهيز الأسر من الأسواق المحلية (القطاع الخاص) في بيئة المشروع الريادي بطريقة تكاملية مرنة تمكن من تبديل المواد ببدل نقدي حسب رغبة المستفيد.
- ❖ يقوم المواطن بالتعامل من خلال البطاقة مع الوكيل او التاجر وكذلك يقوم الوكيل بمراجعة اقرب منفذ مالي مخصص لتثبيت المعلومات المطلوبة لصرف الأموال مع إمكانية استخدام الأجهزة المتطورة لاستلام الأموال.
- ❖ إنشاء بوابة إلكترونية مخصصة للتعريف والأعلام وأملء النماذج.
- ❖ طبع البطاقات التموينية الذكية لكل مركز تمويني وتوزيعها على الوكلاء والتجار والمواطنين.
- ❖ توفير بطاقات ذكية توزع على العوائل المشتركة في التجربة (واحد لكل عائلة) لها مواصفات مناسبة من ناحية الأمان والسعة التخزينية والكفاءة والمعايير الأمنية العادية والمصرفية) .
- ❖ اعتماد مصرف تتوفر لديه البنى التحتية التقنية الضرورية لتنفيذ المشروع من خلال اتباع الطرق والمعايير الأمنية في حماية جميع اطراف العملية مع توفير الية ضمنية في النظم المستخدمة لأغراض التعريف والتحقق والتأكيد عند اجراء أي عملية تناقل بالأرصدة بين جميع الأطراف المشتركة في العملية
- ❖ اعتماد معايير الامن المعلوماتي وتجربة البنك المركزي في اختيار التقنيات والبرامجيات يكفل منع هدر موارد الدولة تحت مظلة برنامج اصلاح حديث ومتكامل .

اهداف البرنامج

- ❖ ضمان وصول الدعم للمشمولين من الفقراء خلال نظام آلي وقاعدة بيانات محدثة وقواعد استهداف دقيقة
- ❖ توفير اليات محكمة في الرقابة والسيطرة على معدلات الفقد والتسرب والفساد الاداري والمالي في مختلف مفاصل البرنامج.
- ❖ توفير امكانية تحديد انماط الاستهلاك للأسرة العراقية جغرافيا ونوعياً وكمياً.
- ❖ تحقيق الشفافية وتوفير الية لتفاعل المواطن مع الحكومة في عملية ترشيد وادارة الدعم .
- ❖ رفع المؤشر التكنولوجي العالمي للعراق من خلال الاستخدام الامثل لتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا البطاقات الذكية لتقديم الخدمات المختلفة للمستحقين.
- ❖ توفير قاعدة بيانات موسعة تدعم اتخاذ القرار لدى القطاعات الاخرى مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بالاضافة الى توفير فرص حقيقية لصناع القرار في اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة ومبنية على قراءات ومعطيات ميدانية وواقعية.
- ❖ توفر قاعدة البيانات امكانية الربط مع شبكة الحماية الاجتماعية لإستهداف الفقراء .



نموذج (1) : يوضح البطاقة التموينية الذكية

البيئة التجريبية لإصلاح نظام البطاقة التموينية

نفذت بيئة تجريبية لغرض تحديد تحديات التنفيذ واستخلاص الدروس لتطبيق نظام الإصلاح بشكل واسع ، وقد تم تنفيذ البيئة في ناحية الحرية / محافظة النجف التي يبلغ عدد سكانها حوالي (34844) الف فرد اي حوالي (6588) الف اسرة تزود كل اسرة ببطاقة ذكية ورقم تعريفي حسب عدد أفرادها حسب ما تم التخطيط له نفذت البيئة خلال مدة 3 اشهر اعتبارا من شهر نيسان 2017 ، يحق لكل اسرة التزود بالمواد التموينية خلال فترة اقصاها (30) يوماً من تاريخ التوزيع ويسقط حقها في المطالبة بالمواد في حال عدم المراجعة خلال فترة التنفيذ .

جدول (6) : التالي يوضح عدد المشمولين وعدد الوكلاء وبيانات اخرى في ناحية الحرية :

الجهة	اسم المركز	رقم المركز	عدد العوائل المستفيدة	عدد الافراد	عدد وكلاء الغذائية	عدد وكلاء الطحين	عدد المشمولين بالبطاقة التموينية الذكية / فرد
محافظة النجف	الحرية	655	6588	34844	22	10	34257

ساهمت عدة وزارات في تنفيذ البيئة التجريبية لإصلاح نظام البطاقة التموينية وهي كل من :

- وزارة التخطيط / الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر

- وزارة التجارة / دائرة التخطيط والتمويل

- وزارة الاتصالات / شركة السلام العامة

- الحكومة المحلية في محافظة النجف

بعد تحديد المهام لكل جهة تم وضع خطة لتنفيذ البيئة التجريبية للبطاقة التموينية لإنشطة التهيئة والتحضير.



تم انجاز الخطوات التالية بخصوص تنفيذ البيئة التجريبية للمشروع وهي :

- تحديث قاعدة البيانات الأسر المشمولة في ناحية الحرية وتم تسليمها الى وزارة الاتصالات.

اعداد نظام شبكي الكتروني من قبل وزارة الاتصالات والربط مع قاعدة بيانات الاسر والافراد المشمولة بالتجربة في ناحية الحرية بالتنسيق مع وزارة التجارة .

- اصدار بطاقات الكترونية ذكية ومنشور تعريفي للناحية المشمولة بالتجربة .

- توفير اجهزة القطع التي يبلغ عددها (28) جهاز توزيع على محلات البيع .

- تحديد اسعار المواد التموينية وفقاً للأسعار المحلية والعالمية .

- اقامة دورة تنشيطية للوكلاء حول استخدام اجهزة القطع واجراءات التوزيع .

- عقد اجتماع مع وكلاء المواد الغذائية المشمولين بالتجربة بالتنسيق مع وزارتي التجارة والاتصالات لمناقشة آليات اجراءات التنفيذ .

- تم اتفاق الوكلاء على تسمية مجهز واحد يلتزم بإيصال المواد الغذائية كاملة وبدون استيفاء اية مبالغ مالية عن اجور النقل او اية مصاريف اخرى بموجب القائمة المجهزة للمواد فضلا عن التزام المجهز بتجهيز المواد الغذائية بالمفردات قبل الموعد المحدد بالتجهيز بثلاثة ايام على اقل تقدير .

- تسمية لجنة فرعية مخولة لتحريك المبالغ الخاصة بالعوائل المشمولة بالتجربة .

- فتح حساب في المصرف العراقي للتجارة بأسم (البيئة التجريبية للبطاقة التموينية) لتحويل الاموال المخصصة لمواد التموين وتسهيل اجراءات حصول الوكلاء على المبالغ بعد تزويد الاسر بالمواد بالنوعية والكمية المحددة.

- تكليف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وبالتنسيق مع وزارة التجارة باجراء الفحص على مواد التموين قبل توزيعها للأسر المشمولة بالبيئة التجريبية في الناحية من حيث النوعية والجودة وحسب المواصفات المحددة من قبل وزارة التجارة .

مشروع البطاقة التموينية الذكية

موجز عن المشروع

يعد مشروع اصلاح نظام البطاقة التموينية احد المشاريع الاستراتيجية التي لتبنتها اللجنة الفنية الدائمة الاستراتيجية التخفيف من الفقر / وزارة التخطيط واوصت وثيقة الاستراتيجية التي ارها مجلس الوزراء بموجب القرار (4٠٩) لسنة 2٠٠٩ بتبنيها ضمن مشاريع خاصة لتلوك فيها كل الوزارات والجهات ذات العلاقة.

تقوم فكرة المشروع على اعتماد التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الحصول على المفردات التموينية المخصصة للأسر المستهدفة باستخدام البطاقة الذكية. فهدفاً من اعطاء القطاع الخاص دوراً والتخطيط في هذا المجال.

تتولد لكرة بطاقة فلكية برقم تعريفى بحسب عدد افرادها ، للحصول على تلك المواد خلال فترة الفها (٣٠) يوماً من تاريخ التوزيع بعدها يسقط حق الأسرة من التامين لذلك الشهر.

الرؤية

حصول المواطن على الدعم الغذائي الحكومي بأية انكرونية متطورة تمكن من الرصد والتقييم .

اهداف المشروع

- ضمان وصول الدعم للمستحقين من خلال نظام آلي وقاعدة بيانات محفلة وقواعد استهداف دقيقة .
- توفير اليات محكمة في الرقابة والسيطرة على معاملات القصد والشرب والصادق الاداري والمالي في مختلف مفاصل البرنامج .
- توفير مناع حضاري لصرى الخدمات المختلفة للمواطن المستحق لهذه الخدمة .
- توفير إمكانية تحديد اعطاء الاستهلاك لأشدة العرفية جغرافياً ووعياً وكماً .
- تسهيل الرقابة العرفية على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وضمان الحصول على الخدمات بسهولة .
- تحقيق الشفافية وتوفر اليه لتفاعل المواطن مع الحكومة في عملية رشيد واتخاذ الدعم .
- رفع المؤشر التكنولوجي العالمي للعراق من خلال الاستخدام الامثل لتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات الذكية لتقديم الخدمات المختلفة للمستحقين .
- توفير قاعدة بيانات موسعة تدعم اتخاذ القرار لدى القطاعات الاخرى مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بالإضافة الى توفير فرص حقيقية لصناع القرار في اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة ومبنية على فرائد وبعظيات ميدانية وواقعية .

كيف يتم استخدام البطاقة

1. يقوم حامل البطاقة بتعبير البطاقة لولا على الجهاز في المكان المحدد لها وفق المورد (رقم ١) .
2. بعد عملية التعبير يظهر رصيد البطاقة من المواد على شاشة الجهاز كما مين في الصورة (رقم ٢) حيث يمكن استخدام هذه الجزيات بالتفرع عليها (يمكن اختيار مادة واحدة او جميع المواد وحسب الرصيد المتوفر من المواد في البطاقة) .
3. بعد اتمام العملية يقوم الجهاز بطباعة وصل (عدد ٢) كما مين في الصورة (رقم ٣) اخذها للوكيل الاخر الحامل للبطاقة .
4. يسلم بعد ذلك للنادد أو لمراد المخزنة .

مكان البطاقة

نقد

يتم هذا المشروع بالتنسيق ما بين كل من :

- وزارة الاتصالات
- وزارة التجارة
- وزارة التخطيط
- اللجنة الفنية الاستراتيجية
- المصرف من الفقر
- الشركة العامة للخدمات
- شبكة البنية للخدمات

الشكل (4): التالي يوضح المنشور التعريفي لزيادة توعية العوائل المشمولة بالتجربة :

تقييم البيئة التجريبية لإصلاح نظام البطاقة التموينية :

طلبت حكومة العراق الدعم من برنامج الأغذية العالمي في استعراض تقييم تجربة النجف وإلقاء الضوء على الدروس المستفادة من أجل تسهيل إتخاذ المزيد من القرارات بشأن مستقبل نظام التوزيع العام التقليدي ، ووفقاً لذلك قام برنامج الأغذية العالمي بزيارات مهمة إستطلاعية تحضيراً للأستعراض الذي يتوقع أن يسهم في المناقشات الجارية بشأن الحماية الاجتماعية الوطنية وكخطوة أساسية نحو إستئناف مشاركة برنامج الغذاء العالمي الطويل الأجل مع حكومة العراق بشأن تقديم المشورة السياسية والمساعدة الفنية على نظام التوزيع العام وإصلاح شبكة الأمان الإجتماعية في البلد.

تم جمع المعلومات المطلوبة لتخطيط عمليات سلسلة التوريد لنظام التوزيع العام العادي بالإضافة تجربة النجف من خلال مقابلات منفصلة مع وزارة التجارة وبأعني الجملة المشاركين في التجربة وتلت هذه المقابلات أيضاً بعدد من طلبات البحث والبيانات اللاحقة كما تم إجراء المقابلات مع مسؤول من وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات حيث تم جمع معلومات إضافية فيما يتعلق بالبرنامج وقاعدة البيانات التجربة المستخدمة .

تم تسجيل تصورات جميع أصحاب الشأن عن تجربة النجف من خلال مقابلات شبه منظمة وتشمل الجهات المعنية عن وزارة التجارة ووزارة الاتصالات ووزارة التخطيط ووكلاء المواد الغذائية والمستفيدين في ناحية الحرية وبأعني الجملة المشاركين في التجربة وتم اختيار خمسة وكلاء بشكل عشوائي من وكلاء المواد الغذائية المشاركين لإجراء مقابلات فردية.

النتائج الرئيسية

من خلال النفقات والكفاءة في التوزيع : تقدر تكلفة تنفيذ البيئة التجريبية في محافظة النجف بمبلغ 748.6 مليون دينار بدون ضريبة الدخل الإضافية حسب المعلومات المقدمة من وزارة التجارة .

الجدول (7) يوضح متوسط عدد الحصص التموينية الموزعة لكل مخطط ونسبة التنفيذ خلال التجربة

الارز	زيت بناتي	سكر	الحصص التموينية المقدمة فعليا (المتوسط لكل دورة التوزيع المقررة)
34.412	34.380	34.074	
% 99.1	% 99.0	% 98.1	نسبة التنفيذ

ووفقاً لذلك تم تنفيذ خطة التوزيع للتجربة بكفاءة مثالية تقريباً .

تجربة أصحاب المصلحة والتصورات :

- ❖ المستفيدون : تعتبر فعالية سلسلة التجهيز في البيئة التجريبية وانتظام توفرها وعدم انقطاع خطوط التجهيز احد العوامل الرئيسية التي تفسر تفضيلات المستفيدين الذين تمت مقابلتهم من قبل برنامج الغذاء العالمي والذين جميعهم اهم اتسلموا جميع المواد الثلاثة المدرجة في الوقت المحدد طوال فترة التجربة وفضلوا البيئة التجريبية في النجف مقارنة بتجارهم بنظام التوزيع الاعتيادي.
- ❖ وكلاء المواد الغذائية : اعرب جميع الوكلاء المواد الغذائية الذين تمت مقابلتهم عن تفضيلهم لتجربتهم خلال البرنامج التجريبي على تجربتهم العادية في نظام البطاقة التموينية . من حيث التوقيت الزمني ونقل المواد ونوعيتها والايادات . كما ان الوكلاء اقرروا في نظام التوزيع العام بدفع مبلغ 100 دينار عراقي الى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية عن الأرز والسكر والزيت بينما يدفع وكلاء الطحين 50 ديناراً إضافياً الى هيئة الحبوب . اما هذه التكاليف فتلغى في البيئة التجريبية وضمنها تكاليف النقل بالكامل .
- ❖ تاجر الجملة : تمت مقابلة برنامج الغذاء العالمي مع تاجر الجملة المشارك اثناء العمل الميداني في ناحية الحرية الذي اعرب عن رضاه عن التجربة وقد ورد ان مبلغ (7500) دينار الذي قدمته وزارة التجارة كان كافياً لتغطية التكاليف حيث قدر تاجر الجملة ربحاً يتراوح قدره ما بين 300 الى 400 دينار لكل مستفيد.

التوصيات النهائية

- 1- تعميم التجربة لتنفيذها على مستوى العراق من خلال اطلاق المشروع الوطني للبطاقة التموينية الذكية مع الالتزام بتوصيات دراسة الاستهداف التي صادق عليها مجلس الوزراء بموجب القرار (369) لسنة 2009.
- 2- تقوم اللجنة العليا لإصلاح نظام البطاقة التموينية بالأشراف على تنفيذ المشروع الوطني للبطاقة التموينية الذكية.
- 3- ان يتم تخصيص مبلغ في الموازنة السنوية لتغطي تكلفة النظام والمواد التموينية المدعومة وهو نفس المبلغ المخصص لوزارة التجارة على ان ينفق لتنفيذ هذا المشروع بدلا من الآلية السابقة.
- 4- تكليف وزارة التجارة / دائرة التخطيط والمتابعة لتوفير بيانات البطاقة التموينية على مستوى العراق (الاسر والوكلاء والسلة الغذائية).
- 5- تكليف وزارة الاتصالات/ الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات لتنفيذ وتشغيل منظومة البطاقة التموينية الذكية (انظمة واجهزة ربط شبكي وبرامجيات واطلاق وادارة موقع الكتروني واصدار البطاقات الألكترونية واقامة ورش العمل والتدريب على كيفية التعامل مع المنظومة واستخدام الاجهزة وتثقيف المواطنين على استخدامها وتوفير مراكز خدمة العملاء) ويكون تمويل المشروع من تخصيصات البطاقة التموينية الحالية والأستفادة من المبالغ الموفرة من خدمة وطباعة ونقل البطاقة الورقية وتحويل مبالغها لحساب وزارة الاتصالات/ الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات دون تحميل الحكومة او المواطن اي نفقات اضافية ، ويمكن تحديد مبلغ مقطوع شهريا لكل مواطن مخدوم.
- 6- تحديد موعد لأنطلاق المشروع وسقف زمني ملزم لأتمام تنفيذ المشروع وتشغيله .
- 7- الأخذ بالأعتبار عند تنفيذ المشروع توفير المعلومات المحدثة لدعم متخذ القرار و خدمة استراتيجيات تخفيف الفقر مع ضمان تكريس الشفافية وعدالة التوزيع .
- 8- الأستعانة بالبنك المركزي لتحديد المصارف المحلية المؤهلة ماليا وفنيا لتقديم خدماتها التي تتناسب وطبيعة المشروع ليتم اختيار عدد منها ليكون ضمن المشروع.



صور افتتاح البيئة التجريبية من قبل أعضاء اللجنة العليا لإصلاح نظام البطاقة التموينية/ محافظة النجف

ثانياً: وضع آلية لشمول المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية بالقروض الصغيرة وربطها بإخراجهم من نظام الحماية

تم استخدام اسلوب الاستهداف متعدد المراحل لتحديد الاسر الفقيرة وذلك بالاستفادة من خرائط الفقر المعدة من قبل وزارة التخطيط على ضوء نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة لسنة 2012 ومسح خارطة الفقر ووفيات الامهات لسنة 2013 والتي حددت بؤر الفقر على مستوى اصغر وحدة ادارية (ناحية).

اذ يتم تحديد المبلغ المخصص لإعانة شبكة الحماية الاجتماعية في كل محافظة حسب نسبة السكان، اما توزيع المبلغ ضمن المحافظة وعلى الوحدات الإدارية فيها فيكون على أساس الاهمية النسبية لعدد الفقراء في كل وحدة ادارية.

ثالثاً: بناء قاعدة معلومات مشتركة بين هيئة الحماية الاجتماعية والوزارات والجهات ذات العلاقة لتقويم المتقدمين بالشمول بنظام الحماية الاجتماعية

أهتمت الحكومة في العراق خلال السنوات الماضية بتخصيص موارد سنوية رغم محدوديتها لدعم تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية الذي هو أحد برامج تخفيف الفقر للوفاء باحتياجات الفقراء. وعلى الرغم من تحقيق هذا النظام لفوائد ومزايا للأسر الفقيرة وللضمانات غير القادرة، إلا ان هناك حاجة الى أهمية تقويمه سنوياً بناءً على نتائج المسوح الاسرية لتجنب استفادة الطبقات غير المحتاجة وبالتالي توجيه قدر اكبر من الموارد للطبقات المهمشة والفقيرة من خلال اختبار (PMT) اختبار الأسر المعيشية بديل الدخل ويتم سنوياً تخصيص مبلغ من الاستراتيجية لتنفيذ هذا البرنامج.

رابعاً: الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في توعية المواطنين، وفي استهداف الفقراء، وفي مراجعة وتقويم نظام الحماية الاجتماعية.

تتشارك منظمات المجتمع المدني (المحلية) بفتح مراكز تدريب للفقراء من خلال ورش عمل تعمل على زيادة الوعي لدى الفقراء وأيضاً رفع مستوى الإداء العاملين ضمن المكاتب والدوائر التابعة لوزارة العمل في معرفة استهداف الفقراء وفي مراجعة وتقويم نظام الحماية الاجتماعية.

كما يختص هذا النشاط بزيادة الوعي من خلال برامج إعلامية وموجهة للمواطنين لتوعيتهم بحقوقهم وشروط الشمول والعقوبات الرادعة في حال التجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية وقد تم التعريف بالبرنامج والإعلان عنه بوسائل الأعلام المقروءة في المحافظات كافة من خلال (300) خبر على مواقع التواصل الاجتماعي فضلاً عن المواقع الإلكترونية.

كما تم وضع برنامج للتدريب في برنامج ابتكار الاعمال لمقتضي حاضنات الاعمال لرفع مستوى الوعي المهني لهم... بلغ عدد الدورات (16) دورة بعدد كلي للمشاركين (584) مشترك ... كما تم مشاركة موظفي شبكة الحماية الاجتماعية بدورات خارجية من خلال المركز الوطني للتدريب والتطوير الاداري التابع الى وزارة التخطيط.

تخصيصات تخفيف الفقر من الموازنة الجارية لعام 2018

في ضوء التخصيصات المرصودة ضمن الموازنة الجارية لإستراتيجية التخفيف من الفقر لعامي 2018-2019 لتنفيذ الأنشطة المستجيبة للطوارئ.

تشكلت لجنة عليا في وزارة التخطيط لإدارة عملية التنفيذ والاشراف كما شكلت لجان (حصر الاحتياجات وتحديد الأولويات ، لجنة تنفيذ امانة ، لجنة مشتريات ، لجان لإعداد الكشوفات وتدقيقها). من خلال التنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء عبر مديرياته في المحافظات تم اختيار قرى متضررة جراء العمليات الإرهابية في المحافظات (صالح الدين ، الانبار ، نينوى) للبدء بعملية تنفيذ مشاريع ضمن الأنشطة المستجيبة للطوارئ بأجراء حصر للاحتياجات وتحديد الأولويات للمجتمعات المحلية وأعداد الكشوفات وتدقيقها.

أولاً : تنفيذ المشاريع في محافظة صلاح الدين ضمن الموازنة الجارية

صادقة وزير التخطيط بتاريخ 31 /7/ 2018 على المضي في تنفيذ اعمال ترميم 4 مدارس في محافظة صلاح الدين في قرية (ام شعيفة ، سنجار، جويزرات) المتضررة وبكلفة تخمينية قدرها (150) مليون دينار من خلال تأهيل 38 صف و12 غرفة إدارة بواقع 4 مدارس . باشر فريق متخصص من قبل الوزارة بتنفيذ الاعمال مع شرط ان تكون الايدي العاملة من سكان القرى حصراً. وتجهيز المواد من الأسواق المحلية مما يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتوفير فرص عمل مؤقتة للعاطلين وكما يلي:-

اسم المشروع	الكلفة الكلية/ مليون دينار	نسبة الانجاز
تأهيل (4) مدارس	150	100 %
تأهيل (10) شبكات كهرباء	150	100 %

الأهداف المتحققة من المشروع

- المساهمة في إعادة الثقة بين المواطن والحكومة.
- إعادة النازحين بنسبة تقارب (80%).
- تحريك العجلة الاقتصادية في تلك المناطق.
- تشغيل (150) عاطل عن العمل في سكان تلك المناطق.
- تخفيض كلفة التنفيذ بنسبة تزيد عن (40%) من الكلفة المقدرة .

ثانياً : تنفيذ المشاريع في محافظة الانبار ضمن الموازنة الجارية

بغية استكمال تنفيذ المشاريع ضمن الموازنة الجارية لإستراتيجية التخفيف من الفقر في المحافظات المتضررة ؛ صادق وزير التخطيط بتاريخ 25 /3/ 2019 على تنفيذ مشروع صيانة مجمعات الماء عدد (6) في قرى محافظة الانبار والتي تشكل على اثرها لجنة من وزارة التخطيط لتنفيذ الاعمال بموجب امر إداري .

باشرت اللجنة مهام عملها في نهاية شهر أيار بعد استلام سلفة مالية وزيارة موقع العمل والتنسيق مع مديرية ماء الانبار وتسمية أعضاء من المديرية في لجنة الاستلا والاتفاق على خطة العمل الموضوعية لغرض الانتهاء من العمل في اسرع وقت لايبصال الماء الصالح للشرب الى المواطنين.

استهدفت المشاريع المواقع

❖ 2 مجمع ماء في عامرية الفلوجة .

❖ 2 مجمع ماء في كرمة الفلوجة .

❖ 1 مجمع ماء في الرمادي

❖ 1 مجمع ماء في هيت

❖ 1 مجمع ماء تل احمد

بكلفة مقدارها (249) مليون دينار وبلغ عدد العاملين في تنفيذ المشاريع 230 عامل ماهر وغير ماهر .

الأهداف المتحققة من المشروع

1. إيصال الماء الصالح للشرب الى اكثر من 5000 عائلة أي بما يعادل 24500 مواطن في القرى المستهدفة بعد تأهيل محطات التنقية العاملة في قراهم .
2. تقوية عملية دفع الماء لايصال المياه الى المنازل البعيدة عن محطات التنقية وتقويتها لجميع المنازل .
3. تشغيل أهالي المناطق المستهدفة بتأهيل محطات التنقية لرفع مستواهم المعاشي لهم وتوفير فرص عمل مؤقتة بواقع 230 عامل طيلة فترة التنفيذ.
4. شراء اغلب المواد الداخلة في العمل من الأسواق المحلية مما ساهم بانعاش الواقع الاقتصادي لتلك الأسواق .
5. تحسن العلاقة وزياد ثقة المواطن في الدوائر الخدمية من خلال سرعة الإجراءات المتبعة في التحضير والتنفيذ.


المشاكل والتحديات التي واجهت تنفيذ المشروع

1. الوضع الأمني في بعض المناطق وصعوبة الدخول الى مناطق العمل .
2. تباعد المسافة بين مواقع المجمعات (الرمادي ، الفلوجة ، هيت) وصعوبة التنقل بينهم ونقل الكادر والمواد.
3. صعوبة توفير بعض المواد والأجهزة التخصصية في محافظة الانبار .
4. صعوبة العمل في ظروف الأجواء الحارة المرتفعة وخلال شهر رمضان المبارك
5. عدم تواجد فريق العمل في مواقع العمل بشكل مستمر والاكتفاء بزيارات دورية لتنفيذ الاعمال المطلوبة .
6. انشغال جميع أعضاء لجنة التنفيذ باعمال أخرى داخل دوائهم وعدم إمكانية تفرغهم بشكل تام لمتابعة العمل
7. صعوبة الاعتماد على العمالة المحلية في العمل بسبب قلّة الاختصاصات الفنية الماهرة (الحدادة ، الكهرباء ، الصبغ ...الخ).

تخصيصات تخفيف الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2019

على الرغم من أهمية أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لكن لم يخصص سوى مبلغ (187) مليار دينار فقط من الموازنة الاستثمارية عام 2019 منها مبلغ (87) مليار دينار فضلا عن 5% من موازنة تنمية الأقاليم ومبلغ (17) مليار دينار خصص لتنفيذ برامج الوزارات .. تم توزيع هذه التخصيصات للمشاريع المستمرة بنسبة 70 % والجديدة بنسبة 30 % على المحافظات والوزارات المعنية بالاستراتيجية على أن تنفذ المشاريع الجديدة في المناطق الفقيرة المستهدفة ضمن أولويات إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2019 .

الشكل () : أدناه مخططاً بيانياً للتخصيصات حسب الجهات المعنية بالتنفيذ .

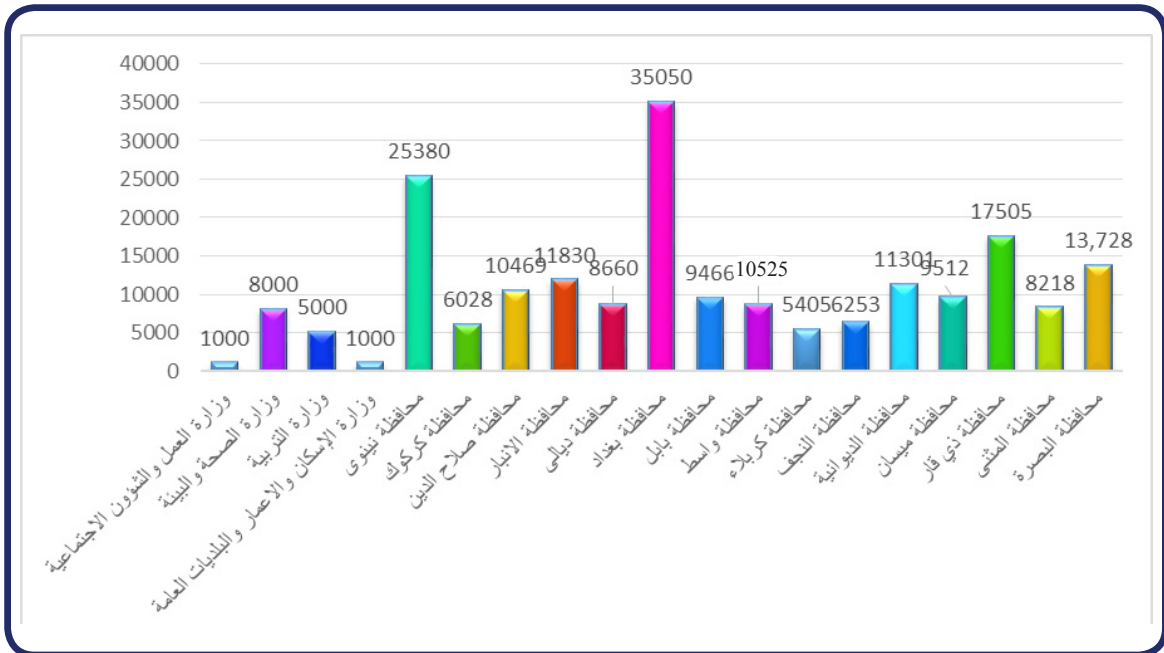

الصندوق الاجتماعي للتنمية

تلجأ معظم الدول النامية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لتخفيف الآثار السلبية التي تتركها عملية الإصلاح الاقتصادي على فئات المجتمع الهشة والفقيرة الى انشاء صندوق إجتماعي للتنمية الذي يعد مؤسسة تنموية متكاملة تهدف الى التمكين الإقتصادي وتحسين مستويات المعيشة والحد من البطالة وتوفير الموارد البشرية التي تتمتع بكفاءة عالية من اجل ضمان مشاركتهم وادماجهم في عملية التنمية الاقتصادية من خلال دعم ومساندة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر و مشاريع البنية المجتمعية بتقديم الخدمات المالية وغير المالية بالتنسيق مع كل الاطراف والجهات المعنية سواء كانت حكومية و غير حكومية او جهات دولية. استكمالا لهذا العمل طلبت الحكومة العراقية بقرار مجلس الوزراء المرقم 270 سنة 2016 الحصول على دعم البنك الدولي في تصميم وتمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم المبادرات بقيادة المجتمعات المحلية بهدف تحسين الظروف المعيشية والفرص امام الفقراء والفئات الأكثر هشاشة والأولى بالرعاية في العراق ومنذ بداية عام 2017 عمل البنك الدولي بصورة وثيقة مع المختصين في الحكومة وقدم الدعم بشأن الاطار بناء على الممارسات الدولية الناجحة. بعد المشاورات وافق مجلس الوزراء بالقرار رقم 379 لسنة 2017 على مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية واحالته الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه.

قدم البنك الدولي دعماً للحكومة العراقية للعمل بالصندوق بمبلغ قرض قدره 300 مليون دولار امريكي على مدى خمس سنوات. قامت الحكومة العراقية بتشكيل فريق وطني لتوجيه وتنسيق عملية اعداد وتأسيس الصندوق الاجتماعي للتنمية واطراف الصبغة المؤسسية عليه حيث تم تشكيل خمس فرق فنية للعمل على مختلف الجوانب الخاصة بتأسيس الصندوق وهي:

1- الحوكمة والنواحي المؤسسية والتشريعية

2- التمويل والتعاون الدولي

3- منظمات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية

4- العمليات والتنفيذ

5- الرصد والتقييم

مخرجات عمل هذه اللجان تم اعتمادها في اعداد الدليل التشغيلي للصندوق بالتنسيق والتعاون مع البنك الدولي فضلا عن مسودة القانون الخاصة به. ستقوم وزارة التخطيط / الإدارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر في الاشراف على تنفيذ الأنشطة خلال الفترة التأسيسية على المستوى المركزي والمحلي من خلال تشكيل فرق لتنفيذ نشاطات الصندوق، حيث سيدأ العمل في ثلاث محافظات في السنة الأولى وسيتم التوسع واطراف اربع محافظات أخرى في السنة الثانية وسيتم تغطية كافة محافظات العراق في السنة الثالثة.

تم اعداد دليل تشغيلي بدعم من البنك الدولي يوضح آلية عمل الصندوق والعلاقة بين فرق الصندوق على المستوى المركزي والمحلي. يتضمن الإرشادات والإجراءات ويصف الترتيبات التنفيذية للمشروع، ويوفر تعليمات مفصلة حول آليات الاستهداف والتوريدات والإدارة المالية واليات المتابعة والتقييم والتواصل ومعالجة التظلمات ومتطلبات رفع التقارير والمسؤوليات الخاصة بالأشخاص المعنيين بالتنفيذ من خلال تشكيل فرق لتنفيذ هذه الاليات اعلاه ويعمل هذا الدليل على تكملة وثيقة تقييم مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية ويمثل وثيقة تفاعلية سيجري تعديلها من قبل مكتب إدارة المشروع حسب الضرورة بالتنسيق مع البنك الدولي طوال فترة التنفيذ بغرض تحسين كفاءة وفعالية المشروع.

الأهداف التنموية الرئيسية للصندوق:

- 1- تنفيذ اعمال الخدمات والبنى التحتية للمناطق المستهدفة.
- 2- خلق فرص عمل للعاطلين عن العمل والفئات المهمشة لتحسين المستوى المعيشي.
- 3- تقليل الفجوة في النوع الاجتماعي
- 4- وضع المواطن في صلب عملية التخطيط والتنفيذ والرصد.
- 5- تعزيز الترابط الاجتماعي بين افراد المجتمع


تشكيل فرق الصندوق الاجتماعي للتنمية

تم إنشاء مكتب إدارة المشروع ضمن الإدارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر / وزارة التخطيط لإدارة أنشطة الصندوق خلال مرحلة التأسيس لحين إقرار القانون، ويضم المكتب الفرق التالية...

(الإدارة العامة للصندوق، فريق الاستهداف، فريق المتابعة والتقييم، فريق التوريدات، الفريق المالي، فريق الإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية، فريق معالجة التظلم، فريق التواصل، الفريق الإداري والدعم اللوجستي).

ايضا على مستوى المحافظات هناك فرع لإدارة الصندوق مدير فرع الصندوق، وممثل عن كل فريق، أخصائي تنمية مجتمعية، أخصائي توريدات، أخصائي إدارة مالية، مهندسين مختصين سيتم نشرهم بحسب المشاريع الفرعية في المجتمعات المحلية. ويتم نقل العاملين ضمن تنفيذ عمليات الصندوق وأثناء المرحلة التأسيسية في نهاية المطاف للعمل في الصندوق حينما يتم تأسيسه بشكل كامل. ويوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للصندوق:-

الهيكل التنظيمي للصندوق الاجتماعي للتنمية في العراق

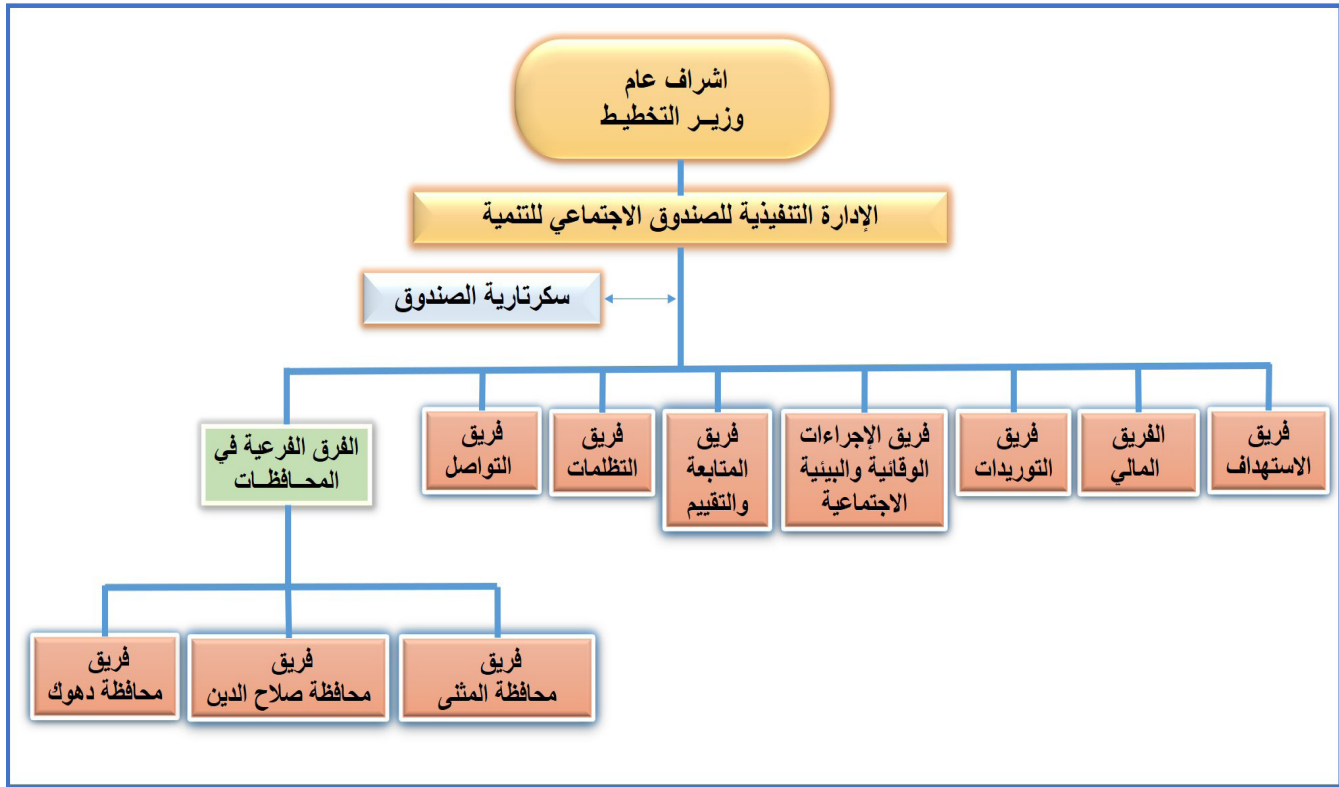

اطلاق مشروع الصندوق

أعلنت وزارة التخطيط يوم الأربعاء الموافق 2019/1/30 البدء بتنفيذ أنشطة الصندوق الاجتماعي للتنمية لمدة خمس سنوات وقد جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد برئاسة السيد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي و أعلن فيه بدء العمل في المرحلة التاسيسية في ثلاث محافظات في المرحلة الاولى وهي المثنى باعتبارها الأشد فقراً، وصلاح الدين التي تعرضت للارهاب والنزوح القسري ودهوك باعتبارها المحافظة الأفقر في اقليم كردستان والتي استقبلت اعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين السوريين.



1. الإجراءات المالية


استناداً لاطلاق اعمال مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية وقبل البدء بالتنفيذ ووفقاً لمتطلبات العمل على تنفيذ اتفاقية القرض الموقعة من قبل وزارة المالية والبنك الدولي بخصوص تنفيذ مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية في العراق، حيث تلخص نشاط الفريق المالي بالنقاط التالية:

- ❖ ادراج المشروع ضمن الموازنة الاستثمارية.
- ❖ تشكيل الفريق المالي من رئيس الفريق والأعضاء من مختصين والمحاسبين والمدققين.
- ❖ فتح حساب جاري لدى المصرف العراقي للتجارة في بغداد.
- ❖ فتح حسابات فرعية في المحافظات بعد موافقة وزارة المالية ويتم تزويد هذه الحسابات بسلف
- ❖ ويتم تعويض هذه الحسابات الفرعية من قبل مكتب ادارة المشروع بشرط تقديم كافة المستندات المؤيدة من قبل فريق ادارة المشروع.
- ❖ يتم الصرف عن طريق تقديم فريق إدارة المشروع طلباً لتغذية الحساب الفرعي مصحوباً بالمستندات المطلوبة.

2. آليات الاستهداف

تم اعتماد آليات لإستهداف لغرض الوصول الى المجتمعات الأكثر حرماناً وفقاً لمعايير مؤشرات إحصائية لضمان عدم تسرب المزايا لغير مستحقيها، حيث اعتمدت الية الاستهداف على المعايير التالية:

- 1- اختيار النواحي الأكثر فقراً في كل محافظة بالاعتماد على مؤشرات قياس الفقر في العراق.
 - 2- اختيار القرى في كل محافظة وفق معايير (عدد السكان، توفر الخدمات والبنى التحتية) بناءً على مسح القرى الريفية.
- اما في المحافظات التي تأخر مسح القرى الريفية فيها مثلاً محافظة صلاح الدين....
- ❖ تم تحديد النواحي الأكثر فقراً حسب مؤشرات قياس الفقر في العراق.
 - ❖ اما القرى الأكثر احتياجاً فقد اختيرت بالتنسيق مع مديريات الإحصاء ومديريات التخطيط والحكومة المحلية فيها.
 - ❖ وفي محافظة دهوك تم تحديد النواحي الأكثر فقراً فيها أيضاً بالاعتماد على مؤشرات قياس الفقر في العراق.
 - ❖ القرى ايضا تم تحديدها بالتعاون ما بين هيئة الإحصاء في الإقليم والحكومة المحلية في محافظة دهوك لعدم تنفيذ مسح القرى الريفية فيها.

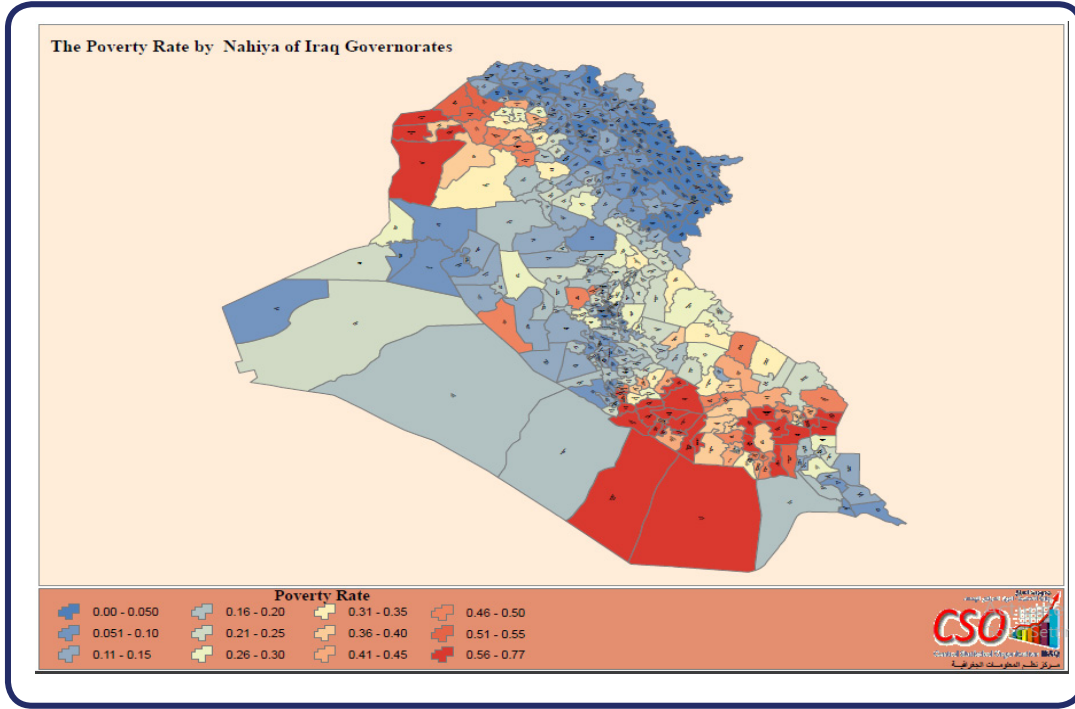

3. إجراءات التنفيذ

التوريدات

باشر الفريق مهام عمله بعد استحصال الموافقات الأصولية على توجيه الدعوات بشأن ابداء الرغبة بالعمل في الصندوق الى منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة صلاح الدين ومحافظة المثنى لغرض الحشد المجتمعي والتعريف بالصندوق وأهدافه عدا محافظة دهوك اذ يقوم فرع الصندوق في محافظة دهوك باعمال الحشد المجتمعي ودعم المجتمع المحلي في اختيار اللجان المجتمعية لغرض اختيار المشاريع المطلوب تنفيذها بسبب توفر الخبرات لتنفيذ هذا النشاط فيها. تم توجيه الدعوات الى 14 منظمة (7 لكل محافظة) التي تم ترشيحها من قبل دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع السيرة الذاتية لكل منها وبعد استحصال مصادقة السيد الوزير لغرض العمل ، تم اختيار منظمة مجتمع مدني في كل محافظة وفقاً للمعايير المحددة عدا محافظة دهوك. بعد استكمال الفريق لكافة الإجراءات الأصولية للتعاقد مع منظمة واحدة لكل محافظة وفقاً لضوابط الدليل التشغيلي باشرت المنظمات مهام أعمالهم في كل من محافظتي المثنى وصلاح الدين.

دور منظمات المجتمع المدني

بدأ العمل من قبل منظمات المجتمع المدني يوم الأربعاء المصادف 6 شباط 2019 وقامت بالمهام والأعمال التالية:-
1. التهيئة للعمل والاتصالات بوجهاء وشيوخ القرى وتعريف المجتمع بمهام واهداف الصندوق وتحديد اولي لاحتياجات المجتمع وحصر الشخصيات والمهارات المتوفرة لديهم.



2. تشكيل لجان مجتمعية مكونة من 11 شخص لكل قرية مستهدفة مع مراعاة ان تضم عضوين من كل فريق النساء والشباب فيها على ان تنتخب من قبل أهالي القرية.



اختيار اللجان المجتمعية ومشاركة النساء في الاختيار/ محافظة صلاح الدين

3. المعاينة الميدانية للقرية واللقاءات مع المواطنين بكافة فئات المجتمع (نساء، شباب ، كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة ... الخ) والإدارات المحلية ووجهاء المنطقة.
4. تدريب أعضاء اللجنة المجتمعية حول التنمية المحلية وكيفية تطوير الفرد وتنمية قدراته وكيفية تصنيف المشكلات وإيجاد الحلول والتعريف بها.
5. التقييم الاقتصادي والاجتماعي القائم على المشاركة يمثل تحليلاً للوضع على مستوى المنطقة.
6. استكمال البيانات وتحديد وصف المشاريع المجتمعية والتحديد النهائي للاولويات بالتنسيق مع الدوائر القطاعية المعنية في المحافظة.
7. خلال الفترة المحددة لعمل المنظمة تم تسليم التقارير النهائية متضمنة دراسة عن واقع القرية والمشاريع المختارة من قبل أهالي المناطق المستهدفة.



جانب من المشاريع المختارة الطريق المؤدي للقرية ومدرسة القرية



حشد الأهالي للتعريف بالصندوق / صلاح الدين



حشد الأهالي للتعريف بالصندوق / المثني

دراسة وإقرار الأولويات من المشاريع :

1. بعد الاطلاع على المشاريع الأولية المقترحة تم تصنيفها حسب القطاعات (صحة . تربية . كهرباء . طرق . ماء . مشاريع اروائية . مشاريع البلديات) .
2. شكلت لجان فنية حسب الاختصاص لغرض اعداد الكشوفات شاملة المواصفات والكلف التخمينية للمشاريع وحسب الأولوية وإمكانية التنفيذ والمبلغ المخصص لكل قرية .
3. قامت لجان الكشف بزيارة ميدانية الى القرى المستهدفة وبالتنسيق مع الجهات القطاعية المسؤولة عن المشاريع المخطط تنفيذها لضمان عدم تقاطع تنفيذها مع الخطط الموضوعية من قبل المحافظة ولضمان إمكانية الجهة المسؤولة في استلام وتشغيل وإدارة المشروع بعد إنجازه .
4. أنجزت الفرق اعداد الكشوفات الفنية والكلف التخمينية للمشاريع والعمل حالياً في طور المصادقة لغرض المباشرة بإجراءات التعاقد .
5. فيما يخص محافظة دهوك تم خلال الفترة الماضية تشكيل اللجان المجتمعية وتحديد الأولويات واختيار المشاريع واعداد الكشوفات والعمل جاري حالياً لغرض دراسة الكشوفات للمصادقة عليها من قبل إدارة الصندوق .

فريق المتابعة والتقييم

- يتولى فريق المتابعة مهمة الاشراف على اعمال الصندوق ابتداءً من الاستهداف الى عمل منظمات المجتمع المدني ووصولاً الى المشاريع المختارة من قبل الأهالي .
- يتولى الفريق القيام بأعمال المتابعة والتقييم لغرض تتبع وإعداد التقارير حول سير العمل ورصد مخرجات المشروع بناءً على مجموعة من المؤشرات المتفق عليها بالتنسيق مع المجتمع وإعداد نظام متابعة وتقييم كافة المشاريع الفرعية .
- حيث تكون اليات المتابعة والتقييم حسب النقاط التالية:
- خطة العمل السنوية والموازنات، من خلال يتم الربط بين مؤشرات الأداء والأهداف .
 - تقارير سير العمل بشكل نصف سنوي، مقارنة بالمخرجات المستهدفة من قبل مكتب إدارة المشروع .
 - لتقارير المالية السنوية مقارنة بحجم الانفاق المتوقع للممولين .

فريق الإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية

- يتلخص مهام فريق الإجراءات الوقائية والبيئية بالاتي:
- دراسة المشاريع الفرعية المقترحة من الجانب البيئي والاجتماعي و بالإمكان استضافة الجهات ذات العلاقة في حال توجب الأمر ذلك .
 - اختيار معايير مجتمعية لقياس اداء المشروعات الفرعية بصورة دقيقة .
 - وضع ضوابط لجهات التنفيذ للالتزام بالشروط البيئية والوقائية .

معالجة التظلمات

- تحقيقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة حيث تم تشكيل فريق يتولى معالجة التظلمات والنظر في الشكاوي المقدمة من قبل المواطنين وخاصة في المراحل الأولى واثناء سير عمل أنشطة الصندوق الاجتماعي للتنمية .
- تهدف آلية معالجة التظلمات لحل المشاكل المتعلقة بتنفيذ المشروع بشكل دقيق وسريع حيث تقوم بإجراء عملية تحقيق وتببع صحيحة تسمح باتخاذ قرار يعتمد على الأدلة والحلول الواقعية .

. أهداف الية معالجة التظلمات:

1. الحد من الغش والتزوير .
2. خلق ثقة بين المواطن والدولة .
3. زيادة الشفافية في الاجراءات .
4. وضع المشتكي في حلقة الحل .
5. المساعدة على حل المشاكل قبل ان تصبح امراً مسلماً به او تتوسع .

- اجراءات معالجة التظلمات:

وضع لافتة في كل موقع عمل تحتوي على المعلومات التالية التي توضح وسائل إيصال الشكوى:

1. الأرقام الساخنة الخاصة بالشكوى
2. البريد الالكتروني
3. مواقع اللجان الفرعية في المحافظات
4. اللقاءات مع شيوخ ووجهاء العشائر في المناطق

التواصل والاعلام

- يعد الاعلام والاتصال ركنا أساسيا من اركان التنمية، ولا يمكن نتصور أي مشروع ناجح من دون ان يرافقه اعلام فاعل للتعريف والترويج والتنوير، وصولاً الى تحقيق الأهداف التي حددها المشروع.
- اهداف الفريق الإعلامي:
- خلق التواصل مع الجمهور المستهدف ونشر الوعي والتعريف باهداف وبرامج الصندوق الاجتماعي للتنمية وضرورة المشاركة المجتمعية في تنفيذ هذه البرامج.
 - الوصول الى بناء قاعدة مشاركة واسعة بين جمهور القرى المستهدفه والصندوق.
 - التأكيد على ان الصندوق يهدف الى تعزيز المشاركة المجتمعية لإتاحة الفرص امام المجتمعات المحلية لان تكون شريكة في تحديد المشاريع التي يمولها الصندوق.
 - توعية الجمهور المستهدف باحتياجاته ودور الصندوق في تلبيتها.
- تحدد الخطة مجموعة الوسائل والوسائط التي يمكن من خلالها الوصول إلى الجمهور مثل :
- (التلفزيون، وسائل التواصل الاجتماعي، الاذاعة المسموعة، الصحف، البوسترات، الموقع الإلكتروني)

ملحق

استمارة متابعة أنشطة الوزارات والمحافظات الممولة من تخصيصات إستراتيجية
التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2018

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة اذراج النشاط	الكلفة الكلية/ مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي	نسبة المستفيدين
						الانتهاء	البدء			
7 - 1	شمول أوسع للفقره ببرنامج الإقراض لإنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل.	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	2012	168.750	1300	ايلول 2012	مستمر	20877	54	20877

مكونات النشاط

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الاتجاهات والوقائ
1	دعم مشروع القروض الصغيرة للقراء	15	كافة المحافظات (عدا اقليم كردستان)	20877	ايلول 2012	ايلول 2018	54	تم صرف (162) صك خلال عام 2018 - نسبة الانجاز الكلي المشروع 54%

وزارة الصحة

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنظمة	سنة اذراج النشاط	الكلفة الكلية/ مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي الفعلي	عدد المستفيدين
						الانتهاء	البدء			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(8)	(9)	(10)
2-1	إنشاء وتأهيل وتجهيز مراكز أو بيوت صحية أو عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	وزارة الصحة	2012	50000	1.607	2013	فيسان	3000	75	5.600 مليون

مكونات النشاط

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	النسبة السابقة تبلغ 90 %	النسب الحالية بعد تقدير الاضرار تبلغ 70 %	الاحاطات والوعوات
1	بناء وتأهيل وحدات التنز	3	محافظة الاثيار	600 الف	حزيران 2013	-	70			
2	بناء وتأهيل وحدات التنز	2	محافظة البصرة	400 الف	فيسان 2013	ايلول 2014	72			- تاخر اقرار الموازنة حال دون تنفيذ المشروع ضمن الفترة المحددة له

مكونات الأنشطة

الملاحظات والملاحظات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
- تاخر اقرار الموازنة حال دون تنفيذ المشروع ضمن الفترة المحددة له	75	ايلول 2014	ت 2013	200 الف	محافظة القادسية	1	بناء وتأهيل وحدات التدرن	3
- تم الاجاز واستلم من قبل الدائرة	100	شباط 2014	ايار 2013	400 الف	محافظة البغلي	2	بناء وتأهيل وحدات التدرن	4
- تم الاجاز واستلم من قبل الدائرة	100	حزيران 2014	ت 2013	200 الف	محافظة النجف	1	بناء وتأهيل وحدات التدرن	5
انجز المشروع	100	شباط 2015	ت 2013	400 الف	محافظة بابل	2	بناء وتأهيل وحدات التدرن	6
تم سحب العمل من موقع دائرة صحة الرصافة بسبب الازمة المالية	100	ت 2014	ت 2013	600 الف	محافظة بغداد	3	بناء وتأهيل وحدات التدرن	7
- تاخر اقرار الموازنة حال دون تنفيذ المشروع ضمن الفترة المحددة له	91	ادار 2014	تموز 2013	200 الف	محافظة ديالى	1	بناء وتأهيل وحدات التدرن	8

مكونات الأنشطة

الملاحظات والملاحظات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
- تأخر اقرار الموازنة حال دون تنفيذ المشروع ضمن الفترة المحددة له وعدم توفر السيولة المالية	72	ايار 2014	اب 2013	200 الف	محافظة ذي قار	1	بناء وتأهيل وحدات التترو	9
لم يحدث الموقف لسوء الوضع الأمني في المنطقة	27	ت 2014	اب 2013	400 الف	محافظة صلاح الدين	2	بناء وتأهيل وحدات التترو	10
- تأخر اقرار الموازنة حال دون تنفيذ المشروع ضمن الفترة المحددة له	76	ت 2014	ايلول 2013	400 الف	محافظة كربلاء	2	بناء وتأهيل وحدات التترو	11
- تأخر اقرار الموازنة حال وحاليا يعتبر من المناطق الساخنة	30	ايلول 2014	ايلول 2013	400 الف	محافظة كركوك	2	بناء وتأهيل وحدات التترو	12
- سبب الازمة المالية وعدم توفر السيولة المالية	85	حزيران 2014	اب 2013	400 الف	محافظة ميسان	2	بناء وتأهيل وحدات التترو	13

مكونات النشاط

الالتحطات والعواقب	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
- سبب الأزمة المالية وعدم توفر السيولة المالية	12	اب 2015	ك 2013	400 الف	محافظة تينوي	2	بناء وتأهيل وحدات التدون	14
- سبب الأزمة المالية وعدم توفر السيولة المالية	77	تموز 2014	يناير 2013	400 الف	محافظة واسط	2	بناء وتأهيل وحدات التدون	15

وزارة الإعمار والإسكان والبلديات

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي	المصرف التراكمي	مدة التنفيذ		التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة الكلية/ مليون دينار	سنة اذراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط	
			الانتهاء	البدء							
(10)	(9)	(8)	(7)		(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
212443	100	7650	2014	تموز 2014	شباط 2014	100	8000	2013	وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة	تأمين مياه صالحة للشرب في المناطق الفقيرة	3-2

مكونات النشاط

الإحقات والمعوقات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع المكون	عدد الوحدات	اسم المكون	ت
- اعيد ادراج المشروع خلال عام 2015 بكلفة تبلغ (8) مليار دينار ويعدد (28) آئيتا - اجيل المشروع الى احدى شركات القطاع الخاص - ايجز المشروع بعد تمويل المشروع عام 2018	100	تموز 2014	شباط 2014	212443	كافة المحافظات	28	تجهيز البنايات سحب البنايات صاروخية تتوزع على (15) محافظة	1

وزارة الإعمار والإسكان والبلديات

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة اذراج النشاط	الكلفة الكلية/ مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		المصروف التراكمي	نسبة الانجاز الفعلي	عدد المستفيدين
						البدء	الانتهاء			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(8)	(9)	(10)
4-5	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية	وزارة الإعمار والإسكان	2012	500000	1.645	تموز 2013	-	8943	-	8334

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	انتهاء عقد	الإلاحتات والموقات
1	بناء وحدات سكنية اقتصادية/ الشامية/ جيبستا	144	محافظة الديوانية	864	تموز 2013	اب/ 2016	39	انتهاء عقد	الإلاحتات والموقات
2	بناء وحدات سكنية اقتصادية/ الشوملي	240	محافظة بابل	1446	-	-	0	-	توقف بسبب توصيات لجنة الامر الديواني رقم 30 لسنة 2015 بموجب كتاب الأمانة العامة المرقم ش.ل/1/15943 /12/5 بتاريخ 15/30/2015 .. بالتربيت بإجراءات الإحالة والتعاقد. - لم يتم المباشرة بالعمل بسبب الوضع المالي

مكونات النشاط

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والعوقات
3	بناء وحدات سكنية اقتصادية/ حكومية	260	محافظة ذي قار	1560	اب / 2014	شباط / 2016	6	انتهاء عقد
4	بناء وحدات سكنية اقتصادية/ طحيرية	112	محافظة النجف	672	ك / 2014	حزيران / 2016	12	انتهاء عقد
5	بناء وحدات سكنية اقتصادية / قضاء / الشناقية	313	محافظة الديوانية	1986	ك / 2015	-	0	انتهاء عقد
6	بناء وحدات سكنية اقتصادية / السنية	65	محافظة الديوانية	390	ت / 2014	ايار / 2016	7.6	انتهاء عقد
7	بناء وحدات سكنية اقتصادية / يثرب	237	محافظة صلاح الدين	1422	-	-	0	- لم يحال بسبب الوضع الأمني منذ عام 2014

وزارة التربية

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي	المصرف التراكمي	مدة التنفيذ (7)		التخصيص السنوي مليون دينار (6)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	سنة اذراع النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
			الانتهاء	البداية						
(10)	(9)	(8)								
128835	97	70906	2013	كانون الثاني	175	283910	2012	وزارة التربية	بناء وتأهيل وصيانت المدارس في المناطق الفقيرة	3-1

مكونات النشاط

الملاحظات والوقوات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الاكتمال	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
-انجز المشروع / عدد المدارس المنجزة (1) ومدرسة المنجزة	100	2/2012	2012 /2	315	البصرة	1	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	1
انجز المشروع / عدد المدارس المنجزة (26) ومدرسة المنجزة (10)	100	2/2013	2012 /2	8190	واسط	26	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	2
انجز المشروع / عدد المدارس المنجزة (19) ومدرسة المنجزة (45)	99	2/2013	2012 /2	3150	بابل	10	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	3
انجز المشروع / عدد المدارس المنجزة (45) ومدرسة	99	2/2013	2012 /2	5985	بغداد	19	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	4
انجز المشروع / عدد المدارس المنجزة (45) ومدرسة	97	2/2013	2012 /2	14175	القادسية	45	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	5

مكونات النشاط

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والوقت
6	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	17	ديالى	5355	2/2012	2013/2	100	- تم انجاز عدد (4) مدرسة فقط - تم الغاء (13) مدارس
7	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	15	الثنى	4725	2/2012	2013/2	68	- المشروع متوقف / عدد المدارس المنجزة (6) مدرسة
8	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	106	ذي قار	33903	2/2012	2013/2	55	- المشروع متوقف / عدد المدارس المنجزة (11) مدرسة
9	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	98	صلاح الدين	30870	2/2012	2013/2	100	- تم انجاز (14) مدرسة - تم الغاء (84) مدرسة
10	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	29	كركوك	9135	2/2012	2013/2	100	- تم انجاز (3) مدرسة - تم الغاء (26) مدارس
11	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	5	ميسان	1575	2/2012	2013/2	37	ال مشروع متوقف عدد المدارس (5) مدارس تم الغاء (1) مدارس
12	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	38	نينوى	11970	2/2012	2013/2	100	- عدد المدارس المنجزة (5) مدرسة - تم الغاء (33) مدارس

محافظة نينوى

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفني الفعلي	المصرف الاتراكمي	مدة التنفيذ (7)		التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة الكليتر / مليون دينار	سنة ادراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط		
			الانتهاء	البداية								
(10)	(9)	(8)			(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		
4000	53	0	2014	1ك	2013	1ك	1000	2800	2012	محافظة نينوى	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية	4 - 5

مكونات النشاط

الالاحقات والعوقات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
- احيل الشروع نهائيا عام 2013 وتوقف بسبب الوضع الامني - تم المصادقة على خطة المحافظة لعام 2018 - وضع مبلغ التخصيصات في صندوق حسابات امانات المحافظة	65	2014	2013	2000	اوصل / ناحية الشمال	1	مشروع فرش الحصن الحابط للطرق الرابط بين القرى	1
- احيل الشروع نهائيا عام 2013 وتوقف بسبب الوضع الامني - تم المصادقة على خطة المحافظة لعام 2018 - وضع مبلغ التخصيصات في صندوق حسابات امانات المحافظة	50	2014	2013	2000	اوصل / ناحية الشمال	1	تطبيق الشوارع المؤدية للمجمعات السكنية التابعة لناحية الشمال	2

محافظة نينوى

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة اوج النشاط	الكلفة الكلية / مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		نسبة الانجاز الفعلي	عدد المستفيدين
						الانتهاء	البدء		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(9)	(10)
4 - 5	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية	محافظة نينوى	2013	24500	500	-	-	0	3000

مكونات النشاط

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الالاحظات والعوقات
1	بناء وحدات سكنية	500	مركز قضاء الموصل	3000	-	-	0	<ul style="list-style-type: none"> - اعلان عن المشروع بداية عام 2014 ولم يحال المشروع بسبب الوضع الامني - تم المصادقة على خطة المحافظة لعام 2018 - وضع مبلغ التخصيصات في صندوق حسابات امانات المحافظة

محافظة نينوى

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة اذراج النشاط	الكلفة الكليمة / مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والمواقف
						البدء	الانتهاء			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	-	-	500	-	تم التعاقد مع الجهة المنفذة بداية عام 2014 ولم تجهز السيارات بسبب الوضع الامني في المحافظة - تم لمصادقة على خطة المحافظة لعام 2018 ووضع مبلغ التخصيصات في صندوق حسابات امانات المحافظة
2-3	تأمين مياه صالحه للشرب في المناطق الفقيرة والناحية	محافظة نينوى	2013	1438	500	-	-	10000	0	

مكونات النشاط

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والمواقف
1	مشروع تجهيز سيارات حوضية عدد (7) لتوزيع الماء الصالح للشرب للقرى النائية في ناحية الشمال	1	موصل	10000	-	-	0	

محافظة كركوك

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة اذراج النشاط	التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة الكلية/ مليون دينار	مدة التنفيذ		المصروف التراكمي	نسبة الانجاز الفعلي	عدد المستفيدين
						البدء	الانتهاء			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4 - 5	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية	محافظة كركوك	2013	15000	4000	1	شباط 2015	10000	100	1800

مكونات النشاط

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والعوقات
1	بناء وحدات سكنية اقتصادية	150	شوروا	900	كانون الاول 2013	شباط 2015	100 %	-انجز المشروع وتم استلامه استلام اولي
2	بناء وحدات سكنية اقتصادية	150	موقع خلف حي دوميز	900	كانون الاول 2013	شباط 2015	100 %	-انجز المشروع وتم استلامه استلام اولي

محافظة صلاح الدين

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنظمة	سنة اذراج النشاط	الكلفة الكلية/ مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		عدد المستفيدين	نسبة الانجاز % الفعلي	الملاحظات والموقات	عدد المستفيدين
						الابتداء	الانتهاء				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	الابتداء	الانتهاء	(8)	(9)	(10)	2628
4 - 5	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية بعدد (438) دار	محافظة صلاح الدين	2013	25000	4773.8	ت2	2013	5255	2014	-	

مكونات النشاط

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز % الفعلي	الملاحظات والموقات
1	بناء وحدات سكنية اقتصادية	34	قضاء الدجيل - قرية الحير	204	ت2013/2	ت2014/2	25	المشروع مستمر
2	بناء وحدات سكنية اقتصادية	50	قضاء طوز خورمتو	300	ت2013/2	ت2014/2	15	المشروع مستمر
3	بناء وحدات سكنية اقتصادية	74	قضاء الشرافاط - بعاجت	444	ت2013/2	ت2014/2	30	المشروع مستمر
4	بناء وحدات سكنية اقتصادية	26	قضاء بلد - الضلعوية	156	ت2013/2	ت2014/2	25	المشروع مستمر
5	بناء وحدات سكنية اقتصادية	24	قضاء بلد - الاسحافي	144	ت2013/2	ت2014/2	15	المشروع مستمر
6	بناء وحدات سكنية اقتصادية	76	قضاء بييجي - قرية 24 حليوات	456	ت2013/2	ت2014/2	5	المشروع مستمر

مكونات الأنشطة

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والمعوقات
7	بناء وحدات سكنية اقتصادية	78	قضاء تكريت	468	ت/2013	ت/2014	25	المشروع مستمر
8	بناء وحدات سكنية اقتصادية	25	قضاء سامراء	150	ت/2013	ت/2014	15	المشروع مستمر
9	بناء وحدات سكنية اقتصادية	25	قضاء سامراء- قرية عروموشة	150	ت/2013	ت/2014	20	المشروع مستمر
10	بناء وحدات سكنية اقتصادية	26	قضاء طوز خورمتمو - امرلي	156	ت/2013	ت/2014	8	المشروع مستمر
11	الانشاء (40) مدرستا و(30) بيت صحي	70	عموم المحافظة	العائدين والفقراء	ت/2018	حزيران/ 2019	80	تم المباشرة بالتنفيذ نهاية عام 2018

محافظة الانبار

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي	المصروف التراكمي / مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة الكلية / مليون دينار	سنة اذراج النشاط	الجهة الممولة	اسم النشاط	رمز النشاط
			الاتجاه	البدء						
(10)	(9)	(8)			(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1272	25	-	2016	2015	1272	2500	2015	محافظة الانبار	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية	4 - 5

مكونات النشاط

اللاحتقات والمعوقات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
- العمل متوقف وقد طالبت المحافظات بتغيير طبيعة اعمال التنفيذ وموقع المشروع الى مشروع (بناء وحدات سكنية اقتصادية بناء تقليدي) - تمت الموافقة من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية بتغيير طبيعة وموقع المشروع - تم ارسال كتاب الى وزارة المالية لغرض اطلاق المصرف	25 %	2016	2015	1272	عامرية الفلوجة	212	تجهيز ونصب كرفانات عدد 212	1

محافظة الانبار

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة النشاط	الكلفة الكلية/ مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	مدة التنفيذ		المصرف التراكمي / مليون دينار	نسبة الانجاز الفعلي	عدد المستفيدين
						(7) الانتهاء	البدء			
1 - 2	إنشاء وتأهيل وتجهيز مراكز أو بيوت صحية أو عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	محافظة الانبار	2015	1490	0	-	-	-	-	18000

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والمعوقات
1	تجهيز عيادات متنقلة/ بضمنها عيادة طب اسنان والفتحة تساليمة	9	الانبار	18000	-	-	0	لم يحال المشروع بسبب الازمة المالية التي يمر بها البلد . - تم استثناء المشروع بموجب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد سن.ل/ 738 بتاريخ 29/ 2016/12 لاجراء الاعلان لحالة التعاقد - لم يتفد بسبب عدم التمويل

محافظة الأنبار

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي	الصراف التراكمي / مليون دينار	مدة التنفيذ		التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة / مليون دينار	سنة اذراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط
			(7)	(8)						
2190	85	9859	-	-	2593	15000	2013	محافظة الأنبار	تنفيذ مشاريع ابناء الجمعات السكنية الاقتصادية (الرحلة الاولى)	4-5
(10)	(9)	(8)	الانتهاء	البدء	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)

محافظة الزرقاء

الاحاطات والموقات		نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
- انجز المشروع		100 %	2014 2	2014 2	30	قضاء الخجيب	5	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	1
انجز المشروع وتم الاستلام الاولي		100 %	2014 2	2014 2	240	قضاء القانم	40	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	2

مكونات الأنشطة

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والوقوات
3	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	100	قضاء العلوچه	600	ت2013	ت2014	100 %	انجز المشروع وتم افتتاحه
4	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	30	قضاء حديتة	180	ت2013	ت2014	90 %	في المراحل الأخيرة للاحتجاز
5	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	25	قضاء الرطبة	150	ت2013	ت2014	85 %	العمل مستمر بعد تمويل المشروع
6	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	100	قضاء الرمادي	600	ت2013	ت2014	---	تم قسح العقد بسبب تعرض المشروع الى اضرار كبيرة نتيجة العمليات العسكرية
7	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	15	قضاء زاوه	90	ت2013	ت2014	70 %	تعذر استئناف العمل في المشروع بسبب توجيهات من القوات الأمنية
8	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	15	قضاء عنه	90	ت2013	ت2014	63 %	متوقف العمل نتيجة لتواجد القوات العسكرية في الموقع
9	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	40	قضاء هيت	240	ت2013	ت2014	75 %	- تعرض المشروع الى اضرار نتيجة العمليات العسكرية - قاتحت المحافظة وزارة التخطيط تعرض زيادة الكلفة على المشروع بسبب الاضرار

محافظة الأبار

عدد المستفيدين	نسبة الإنجاز الفعلي	المصرف التراكمي / مليون دينار	مدة التنفيذ		الكلفة / الكلفة / مليون دينار	التخصيص السنوي / مليون دينار	سنة اذراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط
			(7)	البدء						
(10)	(9)	(8)	الإنهاء	البدء	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
2000	% 51	569	-	-	907	16000	2014	محافظة الأبار	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية (الرحلة الثانية)	4 - 5
			2018	2	2018	2				

مكونات النشاط

نسبة الإنجاز الفعلي %	سنة الإنهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
% 80	-	2	150	قضاء الرطبة	25	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	1
% 46	-	2	480	قضاء الرمادي	80	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	2

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الاتجار القطعي %	التاحضات والمعوقات
3	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقرء	80	عامرية الطلوجت	600	ت2 2018	-	60 %	- العمل مستمر بعد تمويل المشروع - تم الانتهاء من الاعمال الترابية والاسس وبناء الجدران
4	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقرء	40	قضاء القنالم	240	ت2 2018	-	20 %	- العمل مستمر بعد تمويل المشروع
5	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقرء	30	قضاء حديت	180	ت2 2018	-	25 %	- العمل مستمر بعد تمويل المشروع
6	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقرء	15	قضاء راوه	90	ت2 2018	-	15 %	- العمل مستمر بعد تمويل المشروع
7	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقرء	15	قضاء عنه	90	ت2 2018	-	43 %	- العمل مستمر بعد تمويل المشروع
8	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقرء	40	قضاء هيت	240	ت2 2018	-	80 %	- العمل مستمر بعد تمويل المشروع - في مرحلة بناء الجدران
9	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقرء	35	قضاء الخالديت	210	ت2 2018	-	88 %	العمل مكتمل عدا الارضيات والأبواب وجزء من البياض

محافظة ديالى

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنظمة	سنة اذراج النشاط	الكلفة الكلية/ مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	مدة التنفيذ		نسبة الانجاز الفعلي %	الاحاطات والمعوقات
						الانتهاء	البدء		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 - 2	إنشاء وتأهيل وتجهيز مراكز أو بيوت صحيّة أو عيادات متنقلة في المناطق الفقيرة	محافظة ديالى	2012	1250	256	1 تموز 2003	1 تموز 2014	98	اشروع متوقف حسب الامر الاداري 2016 /6/ 9

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الاحاطات والمعوقات
1	بناء مركز صحي	1	قضاء خانقين/ قرية كهرزيرة	15000	1 تموز 2013	تموز 2014	96	اشروع متوقف حسب الامر الاداري 2016 /6/ 9
2	بناء مركز صحي	1	قضاء خانقين / قرية النظام	15000	1 تموز 2013	تموز 2014	96	اشروع متوقف حسب الامر الاداري 2016 /6/ 9

محافظة ديالى

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة اذراج النشاط (4)	الكلفة / مليون دينار (5)	التخصيص السنوي مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		التصروف التراكمي / مليون دينار (8)	نسبة الانجاز الفعلي (9)	عدد المستفيدين (10)
						البدء	الانتهاء			
4-5	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية	محافظة ديالى	2012	7000	0	يول 2013	يول 2014	-	0	630

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والمعوقات
1	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقره	105	قضاء بعقوبة/ ببرز/ الكبيه الاجير	630	يول 2013	يول 2014	0	- طالبت المحافظه وزارة التخطيط بإعادة اذراج المشروع - قيد اسحصال الموافقات الاصولية بإعادة اذراج مشروطة بتقليل كلفة الوحدة السكنية بما تتلائم مع السكن الاقتصادي للفقره

محافظة ديالى

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي	المصرف التراكمي / مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة الكلية / مليون دينار	سنة ادراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط		
			الانتهاء	البدء								
(10)	(9)	(8)			(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		
29750	90	2926	2014	حزيران	2013	2	136.1	4770	2013	محافظة ديالى	تأسيس جمعيات محلية لصغار الفلاحين أو تعاونية لتقديم الخدمات الزراعية كالتمويل، استخدام المياه والصبغات والمكننة، الخزن والتبريد، النقل في المجتمعات الريفية الصغيرة	2 - 1

مكونات النشاط

الالاحظ والمواقف	نسبة الانجاز % الفعلي	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع المكون	عدد الوحدات	اسم المكون	ت
انجز المشروع بتاريخ 2014 / 4 / 9	100	حزيران 2014	1 ك 2013	3500	قضاء الفداية / قرية امام طالب	1	تطبيق طريق بطول 2 كم	1
انجز المشروع بتاريخ 2014 / 5 / 27	100	ايار 2014	2 ك 2014	4000	قضاء يعقوتة / ناحية العبارة قرية ابد الاخضر / شارع عصفور وشارع الجامع	1	تطبيق طريق بطول 3 كم	2

مكونات النشاط

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الالاحظات والعوقات
3	تبليط طريق بطول 3.2 كم	1	كنعان / قرية الحاج جاسم	2000	2013	حزيران 2014	100	انجز المشروع بتاريخ 2014 /5/ 28
4	تبليط طريق بطول 3.5 كم	1	المنصورية / قرية حبيب العبدالله	3500	1013	حزيران 2014	100	انجز المشروع 2014 /7/ 20
5	تبليط طريق بطول 3.5 كم	1	جلولاء قرية جميلة	2500	1013	اذار 2014	100	انجز المشروع بتاريخ 2014 /6/ 17
6	تبليط طريق بطول 4 كم	1	بلدروز / قرية كاظم صالح	2250	1013	حزيران 2014	100	انجز المشروع بتاريخ 2015 /3/ 2
7	تبليط طريق بطول 5 كم	1	قضاء الخالص / ههيب / قرية الحديد	2500	2013	حزيران 2014	100	انجز المشروع بتاريخ 2014 /6/ 3
8	تبليط طريق بطول 1 كم	1	الحساوي-العريبة- طريق المدارس	4000	2013	2015	25	العمل متوقف لتأخر صرف التمويل

محافظة ديالى

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفني الفعلي	المصرف التراكمي / مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة الكلية / مليون دينار	سنة اذراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط		
			الانتهاء	البدء								
(10)	(9)	(8)		البدء	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		
14842	89	2342	2015	كانون الثاني	2013	كانون الثاني	402	5230	2013	محافظة ديالى	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية	4 - 5

مكونات النشاط

الااحاطات والمعوقات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
انجز المشروع بتاريخ 4/3/2015	100%	ايار 2015	1 كانون 2013	160	العزارة / قرية الاحور	1	تنفيذ شبكات كهرباء لالقرى	1
انجز المشروع بتاريخ 5/5/2015	100%	فيسان 2014	1 كانون 2013	350	الخالص / قرية سفيط	1	تنفيذ شبكات كهرباء لالقرى	2
انجز المشروع بتاريخ 13/5/2015 تم استلام المشروع استلام اولي.	100%	ايار 2014	2 كانون 2014	1640	السلام / قرية الكيتا	1	تنفيذ شبكات كهرباء لالقرى	3
انجز المشروع	100%	2 كانون 2014	2 كانون 2013	1640	منذلي / قرية محمد الموسى وقرية عبد الله كيطان.	1	تنفيذ شبكات كهرباء لالقرى	4
تم استلام المشروع استلام جزئي وابتدأ تسديد باقي المستحقات للمشروع المنفذة.	100%	1 كانون 2014	2 ايلول 2014	300	بني سعد / قرية محمد الكاظم	1	تنفيذ شبكات كهرباء لالقرى	5
انجز المشروع تم استلام المشروع استلام اولي وابتدأ تسديد باقي المستحقات للمشروع المنفذة.	100%	2 كانون 2015	2 ايلول 2014	552	مركز قضاء بلد روز / قرية جواد الحججي.	1	تنفيذ شبكات كهرباء لالقرى	6

مكونات الأنشطة

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والموقات
7	تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	1	المعظم / قرية الابو طربيش	648	1 ك 2013	حزيران 2014	98 %	الانجاز الفعلي بتاريخ 15 /3 /2015 ثلاث قرى (البوط يمش، حسن الضالع ، احمد الفرحان) وتم الاستلام الاولي بتاريخ 2015 /6 /17
8	تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	1	مركز قضاء خالقين / قرية جسر حلوان وقرية الابو جودة	448	ايول 2014	2 ك 2015	54 %	- تم انجاز شبكة كهرباء قرية جسر حلوان حاليا المشروع متوقف في قرية ابو جودة.
9	تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	1	مركز قضاء القنادية / قرية الشبيحة	400	2 ك 2014	نيسان 2014	60 %	المشروع متوقف بسبب تاخر صرف التمويل
10	تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	1	المنصورية / قرية حبيب العبد الله / القصبة	4909	1 ك 2013	-	0	محال وتوقف بسبب تاخر صرف التمويل
11	تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	1	الحااص / قرية السندية	240	-	-	0	رفع المشروع
12	تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	1	جلولاء / منطقة السمك في حي الطليمة	3560	-	-	0	رفع من الخطا

محافظة ديالى

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفني الفعلي	المصرف التراكمي / مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة الكلية / مليون دينار	سنة ادراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط
			الانتهاء	البدء						
(10)	(9)	(8)			(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1450	75	344	2014	2013	375	2650	2012	محافظة ديالى	تأمين مياه صالحه للشرب في المناطق الفقيرة والناحية	2 - 3

مكونات النشاط

الملاحظات والعوقات	نسبة الانجاز % الفعلي	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
متوقف بسبب تاخر صرف التمويل	75	2014	2013	550	جولاه / قرية الاصلاح	1	تنفيذ شبكات ماء للقرى	1
متوقف بسبب تاخر صرف التمويل	0	-	-	500	القنادرية / الخبيسة	1	تنفيذ شبكات ماء للقرى	2
رفع من الخطه	0	-	-	400	العبارة / الاحيمر	1	تنفيذ شبكات ماء للقرى	3

محافظة بغداد

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي	المصرف التراكمي / مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		التخصيص السنوي / مليون دينار	الكلفة الكلية / مليون دينار	سنة اذراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط
			الانتهاء	البدء						
10	9	8	2016	2015	6	5	4	3	2	1
30000	100	7846	2016	2015	2500	7846	2015	محافظة بغداد	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية	4 - 5

مكونات النشاط

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الجزء المشروع في شهر تشرين الأول 2018
1	تبليط الطرق بطول م 4590	-	ناحية الحسينية - بغداد	30000	اذار / 2015	اذار / 2016	100%	الجزء المشروع في شهر تشرين الأول 2018

محافظة بابل

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي (9)	المصرف التراكمي / مليون دينار (8)	مدة التنفيذ (7)		التخصيص السنتوي مليون دينار (6)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	سنتي اذراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
			الانتهاء	البدء						
1080	39	5696	2015	اب	1500	18000	2012	محافظة بابل	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية	4-5

مكونات النشاط

الاحداثيات والوقوات	نسبة الانجاز % الفعلي	سنتي الانتهاء	سنتي البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
- يتكون المشروع من مجمع سكني فيه 15 عمارة ذات ثلاث طوابق (180 شقة) مع الخدمات الاساسية. -توقف المشروع بسبب عدم صرف مستحقات الشركة	39	2015/ اب	1 ت 2012/	1080	محافظة بابل قضاء الحلة ناحية ابي غرق	180	بناء وحدات سكنية اقتصادية	1

محافظة واسط

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة اذراج النشاط	الكلفة الكلية/ مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلية %	ملاحظات والمقرات
						البدء	الانتهاء			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	2012	اب	1000	-	5500
4 - 5	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية	محافظة واسط	2012	35000	1000	2012	اب	1000	-	5500

مكونات النشاط

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلية %	ملاحظات والمقرات
1	بناء وحدات سكنية اقتصادية	284	قضاء الكوت - نصف الدجيلت	1704	اب 2012	ت 2013	100	<ul style="list-style-type: none"> - انجز المشروع بكلفة (11,900) مليون دينار - العمل مستمر في مشروع توفير الخدمات الاساسية للمجمع (ماء، كهرباء، شبكة مجاري، طرق) ضمن موازنة تمنية الاقليم وبنسبة انجاز فعلي 67%. - تشكيل لجنة في المحافظة لتوزيع الوحدات السكنية وفق استمارة الفاضلة على المتقدمين بعد اكمال مشروع الخدمات . - حددت أسماء الممولين الفقراء بالوحدات السكنية بعد اجراء الفاضلة.

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنتا البدء	سنتا الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والمعوقات
2	بناء وحدات سكنية اقتصادية	406	اخصيتا (الكوت ، الصورية ، العزيريتا، الحي)	3796	اب 2012	-	28	- أعاد ادراج المشروع عام 2017 - تم مناقشة مبلغ (1) مليار دينار لتنفيذ المشروع ضمن خطتها عام 2018 - تمت المباشرة بجمع ناحية واسط بنسبة انجاز % 15

محافظة كربلاء

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة اذراج النشاط (4)	التخصيص السنتي مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		المصرف التراكمي /مليون دينار (8)	نسبة الانجاز النفي الفعلي (9)	عدد المستفيدين (10)
					البدء	الانتهاء			
3-1	بناء وتأهيل وصيانة المدارس في المناطق الفقرية	محافظة كربلاء	2013	1000	أذار	حزيران 2015	2016	4%	450

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والوقوات
1	انشاء مدرستين ابتدائيتين ذات (18) صف	1	مركز قضاء كربلاء - ناحية الحسينية - قرية خير الدين اللافتحة	450	أذار / 2015	حزيران/ 2016	4	- أعيد أذراج المشروع في عام 2018 بعد توفر الغطاء المالي - العمل مستمر في المشروع بالرغم من عدم صرف السلفات الأولية للشركة بسبب تأخر اطلاق المصرف في عام 2018.

محافظة كربلاء

عدد المستفيدين	نسبة الأجاز الفعلي (9)	المصرف الأرامي / مليون دينار (8)	مدة التنفيذ (7)		التخصيص السنوي مليون دينار (6)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	سنة ادر اج النشاط (4)	الجهة المفضدة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
			الانتهاء	البدء						
9000	57.5	12344	-	2012	1550	24000	2012	محافظة كربلاء	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية	4 - 5

مكونات النشاط

الملاحظات والموقات	نسبة الأجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الموقع	عدد الوحدات	اسم الموقع	ت
يتكون المشروع من (6) مكونات مشروع تنفيذ شبكة مجاري مع المحطة للمعالجة/ ونسبة أجازة 81% لم تحال بقية المشاريع بسبب قلّة التخصيصات	15	2ت 2014/	2ت 2012/2ت	3000	قضاء عين نمر - الزكاريط	6	توفير البنى التحتية لمنطقة الزكاريط	1
-أجاز المشروع خلال شهر اذار 2014 -يتكون المشروع من (انشاء شبكة مجاري تقليدية وشبكة امطار ، اقبال خط الماء العفدي للمجمع، مشروع تبليط لشوارع المجمع). - تم توزيع السور السكنية للعوائل الفقيرة والتي شملت الفئات (عوائل الشهداء ، الارامل والمطلقات ، المتجاوزين على السكن الحكومي)	100	اذار 2014/	حزيران 2013/	6000	مركز قضاء كربلاء	1	توفير البنى التحتية لمجمع دور اقتصادية دار (1000)	2

محافظة كربلاء

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة اذراج النشاط	الكلفة الكلية/ مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي	المصرف التراكمي / مليون دينار	نسبة الانجاز الفعلي	عدد المستفيدين
						البدء	الانتهاء					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	البدء	الانتهاء	(10)	(9)	(8)	(10)	(10)
4-5	تنفيذ مشاريع بناء المجمعات السكنية الاقتصادية	محافظة كربلاء	2013	450	450	تموز	ايلول	3000	100	30	100	3000

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والعواقب
1	دراسة وتصميم مشروع توفير البنى التحتية قريّة الشريقات	3	مركز قضاء المحافظة ناحية الحسينية قريّة الشريقات	3000	تموز/2014	ايلول/2014	100	<p>- تم التعاقد مع مكتب الاستشاري / كلية الهندسة/ جامعة كربلاء</p> <p>- انجز العمل في اعداد التصاميم لشبكات المجاري الثقيلة والامطار ووحدة المعالجة والرفع للمجمع السكني في قرية الشريقات</p> <p>- توجد مستحقات مالية.</p>

محافظة النجف الأشرف

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة اذراج النشاط	التخصيص السنوي مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		عدد المستفيدين	موقع الكون	الكلفة الكلية/ مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	نسبة التنفيذ		نسبة الانجاز الفعلي	نسبة الانجاز الفعلي	عدد المستفيدين
					الانتهاء	البدء					نسبة الانجاز الفعلي %	نسبة الانجاز الفعلي			
1	اسم النشاط	الجهة المنفذة (3)	سنة اذراج النشاط (4)	التخصيص السنوي مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)	نسبة التنفيذ	عدد المستفيدين	موقع الكون	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	التخصيص السنوي مليون دينار (6)	نسبة الانجاز الفعلي %	نسبة الانجاز الفعلي	نسبة الانجاز الفعلي	عدد المستفيدين	
3 - 1	بناء وتأهيل وصيانة المدارس في المناطق الفقيرة	محافظة النجف	2013	1000	ت 1	ت 2	630	حي ميسان	7643	1000	2014	2014	74	2520	

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	ملاحظات
1	انشاء مدرسة (18) صف	1	حي ميسان	630	ت 1	ت 2	100	- انجز المشروع ودخلت الخدمة
2	انشاء مدرسة (18) صف	1	حي الكوفة - حي السلام	630	ت 1	ت 2	90	- توقف العمل بسبب الازمة المالية، حصل المناول على اجازة استثمارية من الهيئة الوطنية للاستثمار بدون اخذ الموافقات الاصولية للاستثمار
3	انشاء مدرسة (18) صف	1	حي الزهراء	630	ت 1	اطول 2014	70	- توقف العمل منذ عام 2015 ولم تباشر الشركة بالتنفيذ بسبب الازمة المالية - لم يتم تمويل المشروع عام 2018
4	انشاء مدرسة (18) صف	1	حي السلام	630	ت 1	اب 2014	35	- توقف العمل منذ عام 2015 ولم تباشر الشركة بالتنفيذ بسبب الازمة المالية - لم يتم تمويل المشروع عام 2018

محافظة النجف الأشرف

عدد المستفيدين (10)	نسبة الانجاز الفعلي (9)	المصروف التراكمي / مليون دينار (8)	مدة التنفيذ (7)		التخصيص السنوي مليون دينار (6)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	سنة ادراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
			الاتجاه	اليه						
37856	87	4555	2015	حزيران 2014	1500	7321	2013	محافظة النجف	تأمين مياه صالحه للشرب في المناطق الفقيرة والناحية	2 - 3

مكونات النشاط

الملاحظات والعوقات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
- انجز العمل	100	2014/ اب	2014/ آذار	3000	قضاء النجف - ناحية الحيدرية قرية بني زيد الجنوبية	1	بناء مجمع ماء سعته 25 م ³ /سا	1
- انجز العمل	100	2014/ اب	2014/ آذار	3000	قضاء النجف ناحية الشبكرة - قرية الاساويد	1	بناء مجمع ماء سعته 25 م ³ /سا	2
- انجز العمل	100	2014/ اب	2014/ آذار	3000	قضاء النجف ناحية الحيدرية - قرية حاتم الطائي	1	بناء مجمع ماء سعته 25 م ³ /سا	3
- المشروع غير مستلم بسبب تذبذب وارتفاع نسبة الاملاح مياه الابار - تعمل المحافظة على ايجاد حل بتعديل التصميم لوحدة التحلية المائية ضمن موزانتها السنوية	100	2014/ اب	2014/ آذار	3000	قضاء النجف - ناحية الشبكرة - قرية بحر النجف	1	بناء مجمع ماء سعته 25 م ³ /سا	4
- انجز المشروع - طالبت المحافظة بإدراج مشروع خط ناقل الى قرية شمال الكوفة، يتقد خلال عام 2019	100	حزيران 2015/	ايلول 2014/	25856	قضاء الكوفة - بالقرب من ناحية العباسية - شمال الكوفة	1	بناء مجمع ماء سعته 1000 م ³ /سا	5

محافظة الديوانية

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنظمة (3)	سنة اذراج النشاط (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	التخصيص السنوي مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		المصرف الائكمي / مليون دينار (8)	نسبة الانجاز الفعلي (9)	عدد المستفيدين (10)
						البدء	الانتهاء			
4 - 5	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية	محافظة الديوانية	2013	15000	2098.8	شباط 2014	1 تم 2018	3278.2	55%	1944

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والمواقف
1	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء مع مجمع ماء	324	قضاء الديوانية ناحية الشافعية	1944	شباط 2014	1 تم 2018	55%	- خصص مبلغ (2098.8) للمشروع لعام 2018 لاستئناف العمل - العمل على تشكيل لجنة لغرض توزيع المساكن

محافظة الديوانية

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنبذة (3)	سنة اذراج النشاط (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	التخصيص السنوي مليون دينار (6)	مدة التنفيذية (7)		الصراف التراكمي / مليون دينار (8)	نسبة الانجاز الفعلي (9)	عدد المستفيدين (10)
						البدء	الانتهاء			
4 - 5	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية	محافظة الديوانية	2012	8000	3210	شباط	1 ك	2014	81%	1110

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الاتاحات والعوقات
1	بناء وحدات سكنية عمومية اقتصادية للمفقره	94	قضاء الديوانية	564	شباط 2014	1 ك 2018	65%	- استائف العمل بالمشروع بعد تخصيص مبلغ لعام 2018 - العمل على تشكيل لجنة لغرض توزيع المساكن
2	بناء وحدات سكنية اقيمية اقتصادية للمفقره	91	قضاء الديوانية	546	شباط 2014	1 ك 2018	97%	- استائف العمل بالمشروع بعد تخصيص مبلغ لعام 2018 - العمل على تشكيل لجنة لغرض توزيع المساكن

محافظة ذي قار

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة اذراع النشاط (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	التخصيص السنتوي مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		المصروف التراكمي /مليون دينار (8)	نسبة الانجاز النقي الفعلي (9)	عدد المستفيدين (10)		
						الابتداء	الانتهاء					
4 - 5	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية	محافظة ذي قار	2013	40000	2000	اب	2014	1ك	2018	-	15	2136

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز % الفعلي	تقييم الكشوفات من قبل المحافظة لاعادة الاعلان عن المشروع بعد توقف لمدة 4 سنوات بسبب الازمة المالية
1	بناء وحدات سكنية اقتصادية	356	قضاء الناصرية	2136	اب 2014	1ك 2018	15	

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة اذراج النشاط (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	التخصص السنوي مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		عدد المستفيدين
						البدء	الانتهاء	
4 - 5	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية	محافظة المنى	2012	45000	1500	2014	2018	6000
						1ك	2018	98
						2ك		3279.4

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز % الفعلي	الملاحظات والوقت
1	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقره	35	قضاء السلطان	210	2014ك	2018ك	98	- المشروع في الاعمال النهائية - تم تشكيل لجنة في المحافظة لغرض توزيع وجمع استثمارات المفاضلة لتحديد المشمولين بالوحدات السكنية
2	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقره	35	قضاء البصية	210	2014ك	2018ك	98	- المشروع في الاعمال النهائية - تم تشكيل لجنة في المحافظة لغرض توزيع وجمع استثمارات المفاضلة لتحديد المشمولين بالوحدات السكنية

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	اللاحظات والعوقات
3	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقره	930	عشرة وحدات ادارية	5580	-	-	صفر	- احالت المحافظه مشروع اعداد الدراسات والتصميم لثروع انشاء 930 وانجزت المحافظه اعداد الدراسات والتصاميم من قبل مكتب استشاري - لم يحال المشروع السكني حسب قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2015 بإيقاف احالت المشاريع التي لم توقع عقودها

ديوان الوقف الشيعي

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة اذراع النشاط	التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة الكلية/ مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي	نسبة الانجاز الفعلي
						البدء	الانتهاء			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	سنة البدء	سنة الانتهاء	عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي %	نسبة الانجاز الفعلي %
4 - 5	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية	ديوان الوقف الشيعي	2015	2025	20000	أيار	2015	1	3%	3%

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	ملاحظات والمعوقات
1	بناء وحدات سكنية اقتصادية	316	محافظة كربلاء - مركز القضاة	1896	2019	2022	3%	<p>- يتكون المشروع من مجمع سكني (316) دار مع الخدمات (روضة) مدرسة ابتدائية، جامع محلات عدد (10).</p> <p>- ادرج المشروع في شهر حزيران / 2015</p> <p>- تم استثناء المشروع من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية رقم س.ل/ 738/ 12/ 29 في 2016 باجراء الاعلان واحالة والتعاقد</p> <p>- اجريت مناقشة للمشروع بمبلغ (2) مليار دينار وبسبب تاخر اطلاق المصرف لم يحال المشروع عام 2018</p> <p>- تم احالة المشروع الى شركة من القطاع الخاص مطلع عام 2019</p>

ملحق

استمارة متابعة أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الجارية لعام
2018



محافظة صلاح الدين

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي الفعلي (9)	المصرف التراكمي / مليون دينار (8)	مدة التنفيذ (7)		التخصيص السنوي / مليون دينار (6)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	سنة اذراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
			الاتجاه	البدء						
1940	% 100	150	2018	تموز 2018	300	300	2018	وزارة التخطيط	بناء وتأهيل وصيانات المدارس عدد 4 مدارس في المناطق الفقيرة	1-3

مكونات النشاط

الملاحظات والموقات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
منجز	% 100	2018 1 ت	تموز 2018	540	قرية الجوزيرات - قضاء بلد	2	تأهيل مدرسة ابتدائية	1
منجز	% 100	2018 1 ت	ايار 2018	270	قرية امش عيفر - قضاء بلد	1	تأهيل مدرسة ابتدائية	2
منجز	% 100	2018 1 ت	ايار 2018	270	قرية سنجر - قضاء بلد	1	تأهيل مدرسة ابتدائية	3
منجز	% 100	2018 1 ت	ايار 2018	800	قضاء بلد	10	تجهيز محولات كهربائية	4

محافظة الأنبار

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة اذراج النشاط	الكلفة الكلية/ مليون دينار	التخصيص السنوي و مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		المصرف التراكمي / مليون دينار (8)	نسبة الانجاز الفعلي (9)	عدد المستفيدين (10)
						الانتهاء	البدء			
(1)	تأمين مياه صالحه للشرب في المناطق الفقيرة والناحية	وزارة التخطيط	2018	250	250	ادار	تموز 2018	250	100%	24500
(2)	تأهيل محطة تصفية مياه الشرب	1	قرية الشهابي 1 - كرمه الفلوجة	3000	3000	ادار	تموز 2018	3000	100%	منجز
(3)	تأهيل محطة تصفية مياه الشرب	1	قرية الشهابي 2 - كرمه الفلوجة	5000	5000	ادار	تموز 2018	5000	100%	منجز
(4)	تأهيل محطة تصفية مياه الشرب	1	قرية تل اسود - هيت	3000	3000	ادار	تموز 2018	3000	100%	منجز

مكونات النشاط

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والموقات
1	تأهيل محطة تصفية مياه الشرب	1	قرية العجاريبة - عامرية الفلوجة	6000	ادار 2018	تموز 2018	100%	منجز
2	تأهيل محطة تصفية مياه الشرب	1	قرية البوحاد - عامرية الفلوجة	3500	ادار 2018	تموز 2018	100%	منجز
3	تأهيل محطة تصفية مياه الشرب	1	قرية الشهابي 1 - كرمه الفلوجة	4000	ادار 2018	تموز 2018	100%	منجز
4	تأهيل محطة تصفية مياه الشرب	1	قرية الشهابي 2 - كرمه الفلوجة	3000	ادار 2018	تموز 2018	100%	منجز
5	تأهيل محطة تصفية مياه الشرب	1	قرية البوحاد - الرماذي	5000	ادار 2018	تموز 2018	100%	منجز
6	تأهيل محطة تصفية مياه الشرب	1	قرية تل اسود - هيت	3000	ادار 2018	تموز 2018	100%	منجز

ملحق

استمارة متابعة أنشطة الوزارات والمحافظات الممولة من تخصيصات إستراتيجية
التخفيف من الفقر من موازنة تنمية الأقاليم لعام 2018

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (5) البدء	الكلفة الكلية مليون دينار (6) الانتهاء	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز الفعلي (8)	الملاحظات والمعلومات (10)
					الانتهاء	الانتهاء		
1	تنفيذ زيارات تفتيش ومراقبة حسن تطبيق قانون العمل والضممان الاجتماعي لمرافقة بيئته العمل الاطلاق	- قسم تفتيش العمل - اتحاد نقابات العمال - اتحاد الصناعات	موازنة جارية	—	1 ك1 2018	2 ك2 2018	100%	-المخطط تنفيذه خلال العام 2018 (24273) زيارة من قبل فرق التفتيش الى اصحاب العمل والشاريع المشمولين باحكام قانون العمل والضممان لمرافقة بيئته العمل والالاتق، حيث تم تنفيذ (24273) زيارة في بغداد والمحافظات.
2	تضمين قانون العمل فقرات مرتبة حول تحديد الحد الأدنى للأجر ليتناسب مع حط الفقر.	لجنة لدراسة الحد الأدنى للأجور في وزارة العمل وبرقاسة دائرة العمل وعضوية ممثلي اتحاد نقابات العمال واتحاد الصناعات العراقي.	الموازنة الجارية	—	1 ك1 2018	2 ك2 2018	مستمر (مقعد) اجتماعات دورية)	تم تعديل اجور العامل غير الماهر الى (350) الف دينار بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم (413) لسنة 2017 بناء على ماجاه في توصيات لجنة الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز النشاط (1)	نوع النشاط	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التحويل (5) البنية التحتية	الكلفة الكلية مليون دينار (6) الانتهاء	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز الفعلي (8)	ملاحظات والمعلومات (10)
						الانتهاء	الانتهاء		
1	3	تعريف العاملين الذين يستلمون الحد الأدنى من الاجر بحقوقهم في رفع الاجور للتوافق مع خط الفقر.	فرق تفتيش العمل في دائرة العمل قسم الاعلام.	الوازنة الجارية	—	1ك 2018	2ك 2018	100 %	يتم التوعية والتوجيه لأصحاب العمل والعمال خلال الزيارات التفتيشية اليومية لفرق التفتيش والتي تضم عضويتها ممثلي اصحاب العمل والعمال
1	4	تشخيص وحدة في مكاتب التشغيل في جميع المحافظات يستطيع العاملون باجر مراجعتها عند عدم التزام ارباب العمل بالقانون.	فرق التفتيش المشكلت في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	الوازنة الجارية	—	1ك 2018	2ك 2018	100 %	الوحدة موجودة في قسم التفتيش المركزي في مقر دائرة العمل وشعب التفتيش في المحافظات وهي (15) شعبت ، و عملها مستمر في زيارة ومقابلات اصحاب العمل والعمال
1	4	قيام مكاتب التشغيل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل.	دائرة التشغيل والقروض	موازنة جارية	—	1ك 2018	2ك 2018	100 %	تم تحقيق (1285) زيارة في بغداد والمحافظات لتطاعات العمل للحصول على فرص عمل لتشغيل العاطلين المسجلين .

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التحويل (5) اليه	الكلفة الكلية مليون دينار (6) الانتهاء	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز الفعلي (8)	ملاحظات والمواقف (10)
					الانتهاء	الانتهاء		
1	تنظيم حملات توعيه للفقراء لالتحاق بالراكز وبرامج التدريب	- دائرة التدريب المهني - اعلام الوزارة.	موازنة جارية	—	2 ت 2018	مستمر	100 %	<ul style="list-style-type: none"> - زيارة مجموعة من الكليات والمعاهد ومقابلة المسؤولين فيها لغرض القيام بحملات التوعية والاعلان عن كافة نشاطات المراكز التدريبية - الترويج لدورات التدريبية لاعادة تاهيل وتشغيل المهجرين العائدين - قيام وحدات الاعلام بزيارة المجالس البلدية وقاء السادة المسؤولين بخصوص الاعلان عن الدورات وتوعية المواطنين وذلك ضمن الرقعة الجغرافية للمراكز وحتم على التسجيل والمشاركة في هذه الدورات وكذلك من طريق الملتصقات الجارية داخل المراكز وخارجها ونصب فلكسات اعلانية وطبع دليل استرشادي لعمل الدائرة وتوزيعها على كافة المراكز التدريبية في بغداد المحافظات - دعم برامج التدريب اعلاميا لغرض كسب القراء الباحثين عن العمل واشراكهم في الدورات - متابعة صفحة التواصل الاجتماعي (face book)

وزارة العمل والشؤون الإجتماعية

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التحويل (5) البدء	الكلفة الكلية مليون دينار (6) الانتهاء	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز الفعلي (8)	ملاحظات والمعلومات (10)
					الانتهاء	الانتهاء		
1	قيام مكاتب التشغيل ¹ بالتنسيق مع جهات التدريب وتأهيل وتميز مهارات العمل لدى الفقراء	دائرة التدريب المهني / مراكز التدريب المهني	موازنة جارية	—	1ك 2018	2ك 2018	72%	تعقد دورات تدريب العاطلين المسجلين في بغداد والمحافظات على السورث المهنية والتعليمية (اللغة الانكليزية ، الحاسبات ، اللغة العربية) والتدريب المهني (التجارة ، الحداثة ، تكيف ، تربية ، كهرباء ، صيانة ، موبايل) - بلغ عدد المتخرجين من الدورات اعلاه ونفاية شهر 1ك عام 2018 (3243) متدربا من الدورات المهنية والتعليمية في جميع مراكز التدريب المهنية والمهنية . - بسبب قلّة التخصيصات المالية وعدم صرف مكافئة التدريب البالغة (5000) دينار مما ادى الى قلّة الاقبال على الدورات التدريبية من قبل العاطلين عن العمل
2	تبنى نظام متابعة مستمر لتتقويم برامج تدريب النساء وتأهيلهن.	دائرة العمل والتدريب المهني	موازنة جارية	—	1ك 2018	2ك 2018	100%	بلغ عدد التخرجات من النساء للتدريبات (5083) متدربة من خلال الدورات التدريبية للعاطلات المسجلات في بغداد والمحافظات (عدا المحافظات الساحلية امثيا)

وزارة العمل والشؤون الإجتماعية

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التحويل (5) البنية التحتية	الكلفة الكلية مليون دينار (6) الانتهاء	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز الفعلي (8)	ملاحظات والملاحظات (10)
					الانتهاء	الانتهاء		
2	صياغة اطر تعاون مع القطاع الخاص لجهة على دعم برامج تأهيل مهنية في الريف العراقي	- دائرة العمل والتدريب المهني - قسم التدريب المهني	التحويل البنية التحتية	—	1 2018	2 2018	—	- تم اعلان القانون الى مجلس الوزراء - تم اكمال المسودة النهائية للبراكزة مع سوق (PPP)
3	برامج توعوية موجه للنساء لاسيما في الريف العراقي للالتزام بنظام الضمان الاجتماعي	دائرة التشغيل والقروض	التحويل البنية التحتية	—	1 2018	2 2018	100%	عدد منشآت القطاع الخاص التي تمت زيارتها لرؤية تنفيذ القانون (1532) تم التوعية من خلال الزيارات التثقيفية وتوزيع دليل التفتيش على النساء ومن خلال هذه الزيارات تم شمول (3202) امرأة فقيرة بالضمان الاجتماعي

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز النشاط (1)	نسب الانجاز الفعلي (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية مليون دينار (6)	التحويل (5) البنية	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رقم النشاط (1)		
		الانتهاء	الانتهاء							
10	100%	مستمرة	2018	—	موازنة الجارية	دائرة الحماية الاجتماعية	اتخاذ الإجراءات لاعتماد الاسر كزيتية في ادارة شؤون شبكة الحماية الاجتماعية	1	1	5
11	95%	مستمر	حزيران 2006	8 مليون دولار	منحة البنك الدولي	دائرة الحماية الاجتماعية	تطوير قاعدة البيانات للأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية وتحديثها بشكل مستمر	2	1	5

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التحويل (5) البنية	الكلفة الكلية مليون دينار (6) الانتهاء	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز الفعلي (8)	الملاحظات والمعلومات (10)
					الانتهاء	الانتهاء		
5	وضع برنامج لرفع القدرات لتأهيل وتدريب العاملين على حسن تطبيق نظام الحماية الاجتماعية	دائرة الحماية الاجتماعية / قسم التخطيط	موازنة جارية	3.880 مليون دينار	1 ^ك 2018	2 ^ك 2018	100 %	تم وضع برنامج للتدريب في المجال القانوني والبحث الاجتماعي والحسابات والبرمجة ولادخال البيانات والشؤون المالية لكن لم تتحقق جميعها يتطلب زيادة في الأقسام في المحافظات والتي تتعلق بالإيجاد بإضافة الى ذلك يقوم قسم التخطيط بسلوره بإدخال الكادر بدورات خارجية من خلال المركز الوطني للتطوير الإداري التابع الى وزارة التخطيط وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة حقوق الإنسان. حيث بلغ عدد الدورات (78) وعدد الترموز (16) وعدد المشاركين (651) مشاركت وعدد المشاركون (651) مشاركت
4	وضع تقارير أنظمة رقابية صارمة على آليات العمل وتنفيذ القانون من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	دائرة الحماية الاجتماعية - قسم القانونيات - قسم التدقيق	موازنة جارية	—	1 ^ك 2018	2 ^ك 2018	100 %	- تدقيق ومتابعة كافة النشاطات المالية والإدارية والفنية لدوائر الحماية الاجتماعية والتي تتمثل بالخطط التشغيلية (الاتفاق على احتياجات سير العمل ، تطوير الأنظمة التقنية لتسهيل العمل بالصيغة المناسبة) - المتابعة مستمرة مع هيئة الرقابة المالية العاملة في الهيئة

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ملاحظات والمعلومات (10)	نسب الإنجاز الفعلي (8)	مدة التنفيذ (7)		التكلفة الكلية مليون دينار (6) الالتقاء	التحويل (5) اليه	الجهة المنفذة (3)	أسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)		
		الالتقاء	الالتقاء							
يعمل القسم على مد جسور التواصل مع القنصليات المسموعة والرئية والقروية من خلال تحرير الأخبار التي تخص الهيئة	100 %	1ك 2018	2ك 2018	2.425 مليون دينار	موازنة جارية	قسم الإعلام في دائرة الحمائية الاجتماعية	تصميم برنامج اعلامي موجه للمواطنين لتوعيتهم بحقوقهم وشروط التمول والعقوبات الرادعة في حالة التجاوز على الشبكة	6	1	5
الاجاز الخطة الخاصة بالبرنامج التجريبي للاعانات التقديرية الشروط وتم طبع فولدر تعريفى وارشادي - التاج فلم وثائقي (معا في محنة النزوح) - تصميم بوسترات حول الخدمة الاجتماعية والبحث الاجتماعي والدم النفسي المقدمة للمستشفيات وشركات حول العنف ضد المرأة	90 %	مستمر	تموز 2011	-	موازنة استثمارية	دائرة الحماية الاجتماعية قسم تكنولوجيا المعلومات اقسام الشبكة المحافظات	تكوين قاعدة بيانات على مستوى المحافظة والقضاء والساحية للأطفال في سن التعليم عن الأسرة الفقيرة المشمولات بشبكة الحماية	1	3	3
توجد قاعدة بيانات للمشمولين بالاعانة في بغداد وكافة المحافظات وبالأماكن اعداد اي احصائية بخصوص الاطفال الموجودين ضمن الأسرة وحسب عنوان السكن	90 %	—	اليول 2011	—	موازنة جارية	دائرة الحماية الاجتماعية	إعادة النظر بقانون وتعليمات شبكة الحماية الاجتماعية بما يضمن تسجيل ومواظبة أطفال الأسر المشمولات	2	3	3
تم اقرار قانون الحماية الجديد ذي العدد (11) لسنة 2014 من قبل مجلس النواب والنشر في جريدة الوقائع العراقية الرسومية ذي العدد (4316) الصادر في 24/3/2014 حالياً قيد التنفيذ.	90 %	—	اليول 2011	—	موازنة جارية	دائرة الحماية الاجتماعية	إعادة النظر بقانون وتعليمات شبكة الحماية الاجتماعية بما يضمن تسجيل ومواظبة أطفال الأسر المشمولات	2	3	3

من خلال تنفيذ دورات تدريبية في مختلف الاختصاصات للقراء ووفق احتياجات سوق العمل.

(Footnotes)

1

