



جمهورية العراق  
وزارة التخطيط



الإدارة التنفيذية لاستراتيجية  
التخفيف من الفقر



# متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر 2014





## المحتويات

3	.....تقديم
5	.....المقدمة
7	.....خلاصة تنفيذ أنشطة ومشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013
40	..... خطة تخفيف الفقر من تخصيصات الاستراتيجية من الموازنة الاستثمارية لعام 2014
	ملحق (1) : استثمارات متابعة أنشطة الوزارات والمحافظات الممولة من تخصيصات
41	..... استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2013
	ملحق (2) : استثمارات متابعة أنشطة الوزارات والمحافظات من خطط تنمية الوزارات
91	..... والمحافظات لعام 2013



## تقديم

في ضوء توجيهات اللجنة العليا لإستراتيجية التخفيف من الفقر التي يرأسها دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس، يسرّ اللجنة الفنية أن تقدم تقريرها الثالث لمتابعة وتقويم الانجازات المتحققة على طريق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر (2010\_2014) وتشخيص التحديات والصعوبات التي تواجهها.

للمضي قدماً في خطتنا الوطنية لتخفيف الفقر تم رفع سقف التخصيص الى 605 مليار دينار من الموازنة الاستثمارية لعام 2013 لتنفيذ أنشطة الاستراتيجية... وبتكاتف الجهود ومن خلال أنشطة ومشاريع تخفيف الفقر من خطة الاستراتيجية فضلاً عن ما نفذته الوزارات والإدارات المحلية في المحافظات ضمن السياق ذاته ... كل ذلك أثمر عن نسبة إنجاز بلغت 48 % وهي أكثر من ضعف نسبة إنجاز العام المنصرم .... رفع منحى الإنجاز إنما يدل على حجم التفاني والمتابعة من الجهات القائمة على الاستراتيجية فضلاً عن مستوى التفاعل والتواصل الحكومي والمجتمعي لتحقيق إنجازات أفضل على طريق تخفيف الفقر في العراق.

لقد حرصنا في إعداد تقرير المتابعة الثالث تسليط الضوء على أهم المنجزات المتحققة حتى 2013/12/31 وعلى المشاكل والتحديات بالاستفادة من المعلومات التي تم جمعها ميدانياً من الوزارات والحكومات المحلية المشمولة بأنشطة الإستراتيجية، وفي ضوء استمارات المتابعة المعتمدة التي يتولى نقاط الارتكاز (المنسقون) بالتعاون مع الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر إنجازها.

نغتنم فرصة إعداد هذا التقرير لتقديم الشكر والامتنان لدولة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس / رئيس اللجنة العليا، ولعالي السادة الوزراء أعضاء اللجنة العليا لدعمهم وتواصلهم المستمر..

كما نقدم الشكر والتقدير لمعالي وزير التخطيط الأستاذ الدكتور علي يوسف الشكري لدعمه الكبير للجنة الفنية ولإدارة التنفيذية ومتابعته الدقيقة لأعمالها، وللكوادر القيادية الفنية والمسؤولة عن إدارة الموازنة الإستثمارية في الوزارة الى جانب الكوادر القيادية لوزارة المالية لضمان وتأمين تخصيصات في الموازنة العامة للدولة للسنوات 2012 و2013 و2014.

أخيراً نوجه الشكر للسيدات والسادة أعضاء اللجنة الفنية الدائمة لإستراتيجية التخفيف من الفقر وللأدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر لاسيما الست نجلاء علي مراد المدير العام التنفيذي ولكل العاملين معها وهم كل من ( السيدة سحر فيض الله ، السيد حيدر صلاح ، السيد نور محمد رحمة ، السيد احمد رعد، السيد شوان خالد، السيدة قيس غسان، السيدة بيداء محمود) لأخلاصهم وحرصهم في إنجاز الأعمال ومنها بشكل خاص إعداد هذا التقرير.

والله ولي التوفيق..

د. مهدي محسن العلاق

الوكيل الاقدم لوزارة التخطيط

رئيس اللجنة الفنية الدائمة

لاستراتيجية التخفيف من الفقر

نيسان / 2014



## مقدمة

يعد الفقر من أكبر الآفات التي تواجه المجتمع العراقي، والتصدي له يأتي ضمن اولويات اجندة الحكومة بغية الوصول الى مجتمع متعالٍ، ولعلاج آفة الفقر لابد من تحليلها. اذ يستند الفقر الى عدة ابعاد منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تلك الابعاد تقيض جهود العراق الرامية للتنمية والتقدم. لذا استشر القائلون على استراتيجية التخفيف من الفقر اهمية التخطيط والاستثمار والامن الاقتصادي ووضعوا كل ذلك ضمن سياسات جاءت من صميم استراتيجية التخفيف من الفقر. وقد تم مراعاة شمول ابعاد الفقر كافة ضمن سياسات التخفيف من الفقر، وبالتركيز على ما يمس حياة الفقراء اليومية، اذ طالت تلك السياسات توفير مصادر الدخل وتوفير الخدمات الصحية باشكالها والتعليم المناسب فضلا عن توفير السكن الاقتصادي والبنى التحتية وغيرها من العوامل ذات التماس المباشر مع الفقراء.

بدأت خطة تخفيف الفقر فعليا في عام 2012 من خلال تخصيص مبلغ 445 مليار دينار من الموازنة الاستثمارية لعام 2012 لتنفيذ 24 نشاط، وبعد دراسة وتقييم خطة تخفيف الفقر المنفذة في عام 2012، تم رفع سقف التخصيص من الموازنة الاستثمارية لعام 2013 الى 605 مليار دينار لتنفيذ خطة اوسع شملت أنشطة عام 2013 فضلا عن الأنشطة المدورة من عام 2012، اذ تم ادراج ما يربو على الخمسين نشاط للعامين، وفي سياق مبادئ الادارة الرشيدة التي اعتمدها الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر احدى تشكيلات استراتيجية التخفيف من الفقر، فقد تم متابعة أنشطة تخفيف الفقر كافة على مدى عامي 2012 و2013 ضمن خطة متابعة راعت الشمولية والشفافية في نقل واقع التنفيذ الى الجهات المعنية من خلال تقارير دورية وسنوية، وتشخيص مكامن الخلل والتكؤ وعرضها على الجهات المعنية وايجاد الحلول المناسبة لدعم التنفيذ.

وفي سياق تحقيق الاستهداف الدقيق للفقراء نفذت الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر مسحا للفقير كان النواة لاعداد خارطة توزع عليها بؤر الفقر في العراق وعلى مستوى ادنى وحدة ادارية في ضوء عمل ريادي لايجاد القاعدة المعلوماتية اللازمة لوضع الخطط المناسبة للفقراء.

وضمن الاطار ذاته ولتحقيق نفس الهدف وهو استهداف الفقراء بصورة دقيقة تقوم الجهات القائمة على الاستراتيجية برصد وتقييم نظام البطاقة التموينية وتبني نظام البطاقة التموينية الذكية لتحديد الفئات المستفيدة من الفقراء والمعوزين في المجتمع العراقي.

كان لتنفيذ أنشطة ومشاريع تخفيف الفقر سواء من تخصيصات الاستراتيجية او من خطط التنمية اثرا في خفض نسبة الفقر من 23% الى 19% خلال اعوام تنفيذ الاستراتيجية، والجهات القائمة على الاستراتيجية ماضية في حشد الجهود والموارد لتحقيق هدفها «تخفيف الفقر» في محافظات العراق كافة.

ونحن اذ نطلق تقريرنا الدوري الثالث لمتابعة أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013 في النصف الاول من عام 2014، نؤكد على الشفافية والمصداقية في نقل واقع التنفيذ ونناشد دعم الجهات العليا لمواجهة وتذليل تحديات العمل، سائلين المولى عز وجل العون لانجاز عملنا على اتم وجه.

جاء تقرير متابعة أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر الثالث مكملا لجهود الادارة التنفيذية للاستراتيجية والتي دأبت على تقديم التقارير السنوية التي تعكس اداء جهات التنفيذ المختلفة مؤطرة بمبادئ المسؤولية والشفافية.



### خلاصة تنفيذ أنشطة ومشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

بعد الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد والجوانب فهو لا يعبر عن عجز الفرد عن تلبية حاجاته الأولية فقط بل يتعدى ذلك ليشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتي تؤثر على تنمية الفرد والمجتمع ككل، ومن هذا المنطلق ركزت مشاريع وخطط الاستراتيجية على احتواء كل تلك الأبعاد ضمن خطة استراتيجية موجهة ضمت خطط جزئية تصاعديّة تهدف بمجموعها الى تخفيض الفقر بنسب تتواءم والاهداف الانمائية للالضية وتسير بموازتها.

احتلت استراتيجية التخفيف من الفقر مكانة بارزة في سلم اولويات الحكومة العراقية، والذي انعكس على منحى التخصيص لمشاريع وانشطة تخفيف الفقر، اذ بدأ التخصيص من الموازنة الاستثمارية لعام 2012 بحوالي 445 مليار دينار وتساعد المنحنى باضطراد ليبلغ في عام 2013 حوالي 605 مليار دينار ويستمر بهذا الاتجاه ليصل في عام 2014 الى حوالي 735 مليار دينار لمشاريع وانشطة تكافح الفقر في العراق من عدة جوانب وتحاصر كل ابعاده ضمن خطة استراتيجية اعدت مسبقا بجهود وطنية تحت مظلة وزارة التخطيط من خلال الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر.

وفي اطار استعراض مشاريع وانشطة تخفيف الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2013 ضمن تخصيص 605 مليار دينار، والذي تم توزيعه ليشمل محافظات العراق كافة (عدا اقليم كردستان) بمبلغ 319 مليار دينار (اي بنسبة حوالي 53%) في حين تم تخصيص 286 مليار دينار (اي بنسبة 47%) لوزارات (العمل والشؤون الاجتماعية، الصحة، الاعمار والاسكان، البلديات والاشغال العامة) كونها وزارات ذات تماس مباشر مع ابعاد الفقر وتداخلاته. فضلا عن الأنشطة والمبالغ المدورة من عام 2012 لتشكل خطة واسعة تتكامل ضمنها آليات محاربة الفقر.

توزعت مشاريع وانشطة الاستراتيجية على المحصلات (تحقيق دخل اعلى من العمل للفقراء، تحسن المستوى الصحي للفقراء، نشر وتحسن تعليم الفقراء، تحقيق بيئة سكن افضل للفقراء، حماية اجتماعية فعالة للفقراء وتفاوت اقل بين النساء والرجال الفقراء) في سياق خطة شملت اكثر من مئة مشروع ونشاط خلال عامي 2012 و2013 استكمل بعضها في اوقات مختلفة من عام 2013 في حين استمر تنفيذ البعض الاخر ودور الى عام 2014.

حققت خطة تخفيف الفقر من الموازنة الاستثمارية المخصصة لها ومن موازنات كل من تنمية الوزارات والاقاليم في عام 2013 ارتفاعا ملحوظا عن خطة عام 2012 اذ حققت أنشطة ومشاريع تخفيف الفقر نسبة انجاز بلغت 48% بعد ان سجلت نسبة 20% في العام السابق، ويعزى هذا الارتفاع الى جهود القائمين على الاستراتيجية ومتابعة الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر ودعم الجهات العليا للاستراتيجية. والجدول الاتي يبين نسب انجاز محصلات الاستراتيجية.

جدول 1: نسب الإنجاز الفعلي لمحصلات الإستراتيجية

المحصلة	التخصيص المالي للمحصلة / تخصيصات الاستراتيجية (مليار دينار)	نسبة الانجاز/ الاستراتيجية	التخصيص المالي للمحصلة / تخصيصات خطة التنمية (مليار دينار)	نسبة الانجاز/ خطة التنمية	نسبة الانجاز الكلية
دخل اعلى من العمل للفقراء	183	29%	-	-	29%
تحسن المستوى الصحي	189	34%	296	56%	47%
نشر وتحسن تعليم الفقراء	148	58%	260	63%	61%
بيئة سكن افضل للفقراء	180	27%	182	59%	44%
المجموع الكلي لمحصلات الاستراتيجية	699	36%	739	59%	48%

انطلاقاً من التزام لجان الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في تحقيق هدفها العام "تخفيف الفقر واستكمالاً لخطط الاستراتيجية الرامية لتحقيق ذلك الهدف تم تخصيص 605 مليار دينار من الموازنة الاستثمارية لتنفيذ مشاريع وأنشطة تخفيف الفقر في محافظات العراق كافة (عدا إقليم كردستان) وعدداً من الوزارات ذات العلاقة وهي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الأعمار والسكان، ووزارة الصحة، ووزارة البلديات والأشغال العامة.

ضمت خطة تخفيف الفقر لعام 2013 مجموعة من الأنشطة والبرامج كانت ترمي إلى تحقيق بيئة سكن أفضل للفقراء ونشر وتحسين تعليمهم وتحسين المستوى الصحي وتحقيق دخل أعلى من العمل وغيرها من الأهداف التي تصبو لتحقيقها الاستراتيجية وصولاً إلى تخفيف الفقر في العراق.

كما شهد عام 2013 تنفيذ مشاريع وأنشطة الاستراتيجية المدورة من عام 2012 والبالغ عددها 23 نشاطاً بمبلغ 336.351 مليار دينار ليكون مجموع المبلغ الإجمالي في عام 2013 حوالي 941 مليار دينار، انجز 6 أنشطة منها في أوقات مختلفة من عام 2013 ويستمر تنفيذ باقي الأنشطة وينسب إنجاز متفاوتة، وفيما يلي استعراضاً لمشاريع وأنشطة تخفيف الفقر مبوبة وفق المنجز منها والمدور إلى عام 2013 فضلاً عن المشاريع المحاللة ضمن خطة تخفيف الفقر لعام 2013 وصولاً إلى مشاريع وأنشطة تخفيف الفقر التي تنفذ من موازنة تنمية الأقاليم.

لاهمية بعد التعليم وتزامناً مع تحقيق الأهداف الانمائية للالافية، فقد تصدرت محصلة نشر وتحسين تعليم الفقراء باقي محصلات الاستراتيجية إذ حققت نسبة إنجاز 61% من خلال تنفيذ 5 أنشطة من تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعامي 2012 و2013 و22 نشاطاً من خطط تنمية الوزارات والمحافظات، تنوعت الأنشطة بين بناء مدارس واعتماد برامج تهدف إلى نشر وتحسين تعليم الفقراء.

حلت محصلة تحسين المستوى الصحي في المرتبة الثانية من حيث التنفيذ إذ بلغت نسبة إنجاز هذه المحصلة 47%، وشملت تنفيذ 11 نشاطاً من تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر و22 نشاطاً من خطط تنمية الوزارات والمحافظات، تنوعت تلك الأنشطة بين بناء مراكز صحية وتوفير عيادات متنقلة واجهزة طبية متعددة الأغراض ومختبرية وتطوير قدرات في المجال الصحي وتوفير مشاريع الماء الصالح للشرب ومشاريع الصرف الصحي وغيرها من المشاريع التي تعكس مخرجاتها تحسين الواقع الصحي للفقراء.

وانطلاقاً من توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء واستناداً إلى أهمية توفير السكن اللائق للفقراء وتخفيف عبء بدل الإيجار الذي يثقل كاهل شريحة الفقراء، فقد حظيت محصلة توفير بيئة سكن أفضل للفقراء باهتمام بالغ من الإدارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر والذي انعكس على تنفيذ تلك المحصلة إذ حققت نسبة إنجاز 44% علماً أن مشاريع السكن تمتاز بطول مدة التنفيذ، إلا أن استمرار المتابعة وتذليل العقبات أتى ثماره برفع منحنى التنفيذ عن العام السابق إذ بلغت نسبة تنفيذ هذه المحصلة في عام 2012 حوالي (13%)، شملت خطة عام 2013 تنفيذ 26 نشاطاً ضمن تخصيصات تخفيف الفقر من الموازنة الاستثمارية لعامي 2012 و2013 وتنفيذ 20 نشاطاً من خطط تنمية الوزارات والمحافظات، دارت تلك الأنشطة في فلك توفير مساكن اقتصادية للفقراء وبنى تحتية وإنشاء أسواق شعبية وغيرها من المشاريع التي تضمن بيئة ملائمة لسكن الفقراء.

حققت محصلة دخل أعلى من العمل للفقراء نسبة تنفيذ بلغت 29%، علماً أن هذه المحصلة تم احتسابها من مشاريع وأنشطة نُفذت من تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعامي 2012 و2013 فقط، وعلى الرغم من وجود عدد غير قليل من أنشطة ومشاريع تصب في هدف هذه المحصلة من خطط تنمية الوزارات والمحافظات إلا أنه لم تشمل في الحساب لصعوبة حصر تخصيصاتها ونسب إنجازها إذ تنفذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (7) أنشطة لتمكين الفقراء وتحسين وضعهم المعاشي.

## الانشطة والمشاريع المنجزة من خطة تخفيف الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2012

تم انجاز مشروع واحد من خطة تخفيف الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2012 في شهر ايلول. ومن الجدير بالذكر ان هذا المشروع هو احد مشاريع خطة تخفيف الفقر لمحافظة صلاح الدين لعام 2012 وشمل توزيع 800 بقرة حليب هولندية على الارامل وفق استمارة مفاضلة اعدت لهذا الغرض.

في حين تم انجاز ستة مشاريع من خطة تخفيف الفقر لعام 2012 في عام 2013 والمشاريع هي:

**اولا: توفير وادامة البنى التحتية الداعمة للانتاج والتسويق**  
( انشاء طرق زراعية بطول 30 كم) في محافظة صلاح الدين ويتخصيص (3.3) مليار دينار:

نفذت محافظة صلاح الدين مشروعا لتبليط طرق تصل بين القرى الفقيرة والاقضية الرئيسية في المحافظة، يهدف المشروع الى تحقيق دخل اعلى من العمل للفقراء عن طريق توفير العوامل التي تسهل تسويق الانتاج الزراعي باانشاء وتبليط طرق في المناطق الريفية والزراعية الفقيرة، وبما ساعد في ربط المناطق الزراعية بالمدن لتسهيل نقل الانتاج الزراعي لعلوات البيع المباشر، يبلغ طول الطرق (30) كم. يضم النشاط 7 طرق انجز 6 طرق منها دون مشاكل تذكر وتوقف العمل في الطريق السابع ( طريق مطيبجة - حمرين 12 كم ) بسبب الظروف الامنية بعد تحقيق نسبة انجاز بلغت 28% مما دعا المحافظة الى استبداله وفق الضوابط بطرق اخرى ضمن القضاء ذاته وهو قضاء بلد .

تم المباشرة بهذا المشروع في حزيران 2012 وانتهى في شهر حزيران عام 2013، وقد انجز وفق التفاصيل الاتية:

جدول 2 : تفاصيل الطرق المنفذة في محافظة صلاح الدين

ت	الطريق	طول الطريق (كم)	عدد المستفيدين
1	طرق متفرقة في ناحية الضلوعية / قضاء بلد	12	1349
2	قرية الشهيد عبد الله جبارة	3	1445
3	طريق قرية سلمان مكحول	3	1030
4	طريق الشهيد ضامن (قرية ابو حمد)	3	195
5	طريق يمر بالقرى (بسطلمي، جردغلي، بروجلي، طريق ابو حسن )/قضاء الطوز	5	8140
6	طريق قرية النبع /سليمان بيك	2	195
7	طريق قرية قره ناز امرلي	2	683



ثالثاً: بناء مراكز رعاية صحية أولية مجهزة ( إنشاء بيوت صحية عدد 20 بيت صحي) تنفيذها محافظة صلاح الدين وبتخصيص 2 مليار دينار:

ضمن سلسلة انجازات محافظة صلاح الدين من خطة تخفيف الفقر لعام 2012 تم تنفيذ 20 بيت صحي موزعة على ريف 6 اقصية هي (الطوز، الدجيل، تكريت، الشرقاط، سامراء، بيجي) في المناطق الفقيرة التي تخلو من المستشفيات والمراكز الصحية، يتكون كل بيت صحي من كرفان ضمن قطعة ارض محاطة بسياج ومولد كهرباء، مساحة كل كرفان (225) متر مربع ويضم 3 غرف للإستعلامات والمعاينة والادوية، يعمل في كل بيت صحي معاون طبي ومعاون صيدلي وموظف إستعلامات.



أحد الطرق المنفذة في محافظة صلاح الدين

يقدر مجموع عدد المستفيدين من هذه الطرق باكثر من 13000 نسمة ضمن القرى التي تربط بينها تلك الطرق، وبما يؤمن تنقل قاطني القرى فضلا عن توفير وادامة البنى التحتية اللازمة لزيادة مردود العمل الزراعي.

ثانياً: تنظيم الاسواق في الاحياء الفقيرة (إنشاء أسواق شعبية (سوق الجمعة)) في محافظة صلاح الدين وبتخصيص (2.4) مليار دينار:

انجزت محافظة صلاح الدين مشروع انشاء (8) اسواق شعبية في اقصية المحافظة، تم تنظيمها في الاحياء الفقيرة وفق نمط البناء التقليدي، وقد تم اختيار مواقع الاسواق الشعبية حسب الكثافة السكانية والمساحة المتوفرة في الاقصية والنواحي.

بدأ العمل في الاسواق خلال شهر حزيران 2012 وانجز خلال شهر حزيران 2013، وانطلاقاً من الرغبة في توزيعها وفق آليات ومبادئ الادارة الرشيدة تم تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة معاون المحافظ للشؤون الإدارية في محافظة صلاح الدين وعضوية مدير دائرة الرعاية الاجتماعية ورئيس الوحدة الادارية التي تقع ضمنها الاسواق وممثل عن الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر، تولت اللجنة اعلاه دراسة الطلبات المقدمة لحيازة تلك الاسواق واعتمدت استمارة مفاضلة اعدتها الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر لاختيار المستحقين من العاطلين الفقراء واعطاء اولوية لعوائل الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والارامل، فضلا عن استحصال موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشمول من وقع عليهم الاختيار بالقروض الصغيرة الخاصة بالفقراء بهدف التكامل بين مشاريع وانشطة الاستراتيجية لتعميم الفائدة على الفقراء في المحافظة. وقد تم توزيع تلك الاسواق بالكامل بتاريخ (2013/11/11).



بيت صحي في صلاح الدين



الاسواق في محافظة صلاح الدين

تم تزويد البيوت الصحية بالأجهزة والمعدات الطبية من قبل دائرة صحة المحافظة، وقد صمم هذا البيت ليستقبل 25 مريض يوميا من سكان المناطق الريفية المحيطة بالبيوت الصحية وبمجموع 4500 مريض للبيوت الصحية شهريا.



دورة تدريبية في احد المراكز الصحية في محافظة بغداد

خامساً: تنفيذ مشاريع لبناء مجمعات سكنية اقتصادية للفقراء في محافظة واسط في اقصية الكوت والحي والصويرة والعزيبية بكلفة بلغت ( 35 ) مليار دينار وبتخصيص لعام 2012 بلغ (11.9) مليار دينار.

انجزت محافظة واسط بناء مجمعات سكنية اقتصادية للفقراء (مجمع الكرامة السكني) في قضاء الكوت. يهدف المشروع الى توفير سكن امن وصحي للمستهدفين من الفقراء، يتكون المشروع من 284 وحدة سكنية، مساحة بناء الوحدة السكنية الواحدة 84.5 متر مربع تتكون كل وحدة سكنية من ( 3 ) غرف نوم مساحة غرف النوم 32 متر مربع وغرفة استقبال بمساحة 15 متر مربع ومطبخ 9 متر مربع وممر وهول داخلي 9 متر مربع وحمام ومخزن ومدخل. بدأ العمل في المشروع في اب 2012 وانجز في تشرين الاول 2013. نفذ المشروع في منطقة ريفية في قضاء الكوت / نصف الدجيلية الغربي، وقد شكلت لجنة متخصصة لغرض اختيار الشرائح المستحقة وفق استمارة مفاضلة اعدتها الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر. وسيتم توفير الخدمات اللازمة للمجمعات السكنية من موازنة تنمية الاقاليم والتي تمر في طور الاعلان. يخدم المشروع 284 اسرة من الشرائح الفقيرة والهشة، اي حوالي (1704) فرد.



المجمع السكني في محافظة واسط

رابعاً: تدريب ملاكات مراكز الرعاية الصحية الأولية (بناء القدرات وزيادة الوعي الصحي وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق الفقيرة) وبتخصيص (3) مليار دينار:

يتكون النشاط من شقين، يتضمن الشق الاول بناء القدرات من خلال تنظيم دورات تدريبية لمتطوعات صحيات تم تسميتهن ضمن برنامج الاستراتيجية في المراكز والقرى الفقيرة في محافظات العراق كافة (عدا اقليم كردستان) وبواقع (10) دورات نُفذت في الحضر و(10) نُفذت في الريف شهريا في كل دائرة صحة عدا دائرة صحة النجف التي تضمنت 3 مناطق (2 ريف و1 حضر) شهريا، وقد تم تحديد(30) متطوعة لكل دورة، بدأت الدورات في (2012/9/15) ولمدة (3) أشهر هي مدة تنفيذ البرنامج، غير ان البرنامج لم ينفذ وفق السقف الزمني المعد له بسبب المدة اللازمة لتحويل المبالغ اللازمة لتنفيذ النشاط الى المحافظات.

تضمن برنامج الدورات الشهري الآتي :

- (2) دورة مبادئ الرعاية الصحية الأولية.
- (1) دورة الرعاية المتكاملة لصحة الاطفال.
- (2) دورة الرقابة الصحية (سلامة الغذاء للمتطوعات، دورة لعمال المطاعم).

كما تضمن البرنامج (3) دورات تخص الولادة الامنة وخفض وفيات الامهات و(3) دورات حول الرش الوبائي والتضبيب (السيطرة على الامراض الانتقالية) والتي تنفذ مرة واحدة خلال مدة تنفيذ البرنامج.

في نهاية البرنامج تتخرج المتطوعة كمرشدة صحية تكون نقطة ارتكاز بين المركز الصحي والأسر تتولى الإرشاد في كل ما يتعلق بالأمور الصحية مثل التدنن، الإنجاب... الخ.

أما الشق الثاني من البرنامج فيتضمن رفع الوعي الصحي من خلال شراء أجهزة ومعدات مثل شاشات عرض (LCD) تعرض إرشادات صحية وبرامج توعوية في المراكز الصحية الفرعية وداتا شو لاغراض التدريب.

انجز النشاط بالكامل في مطلع عام 2013 من خلال تنفيذ (698) دورة في محافظات العراق كافة (عدا اقليم كردستان) وبما تعدى سقف خطة الوزارة بهذا الشأن.

أشار قانون شبكة الحماية بوضوح الى آليات استهداف الفقراء جغرافياً الذي سيعتمد بشكل اساسي على خارطة الفقر (ستنجز المسودة الاولى لها في شهر تموز 2014) كمرحلة اولى في الوصول الى الفقراء، وفي المرحلة الثانية يتم تحقيق زيارات ميدانية من قبل باحثين اجتماعيين للمحددین بالإعتماد على الخارطة للتحقق بشكل امثل على وضعهم المعيشي بعد مل استمارة معايير الشمول لإختيار الأقر منهنم .. وسيكون ذلك على مستوى المحافظات استناداً الى اللجان المشكلة فيها برئاسة قاضي وعضوية عدد من الجهات منها مدير احصاء المحافظة، كما تم تعديل سقف الاعانة الذي ارتبط الحد الأدنى فيه بخط الفقر البالغ 105 الف دينار ليصل الى 420 الف دينار كحد اعلى ... نُشر القانون في جريدة الوقائع العراقية، وسيُطبق بما يضمن شمول الشرائح المشار اليها اعلاه فضلا عن تطبيق نظام التحويلات النقدية المشروط.

#### • قانون محو الامية الإلزامي

سن قانون محو الامية رقم 23 لسنة 2011 والتعليمات لتسهيل تنفيذه سنة 2012 ويعد انجازا وطنيا هاما لعلاج مشكلة استفحلت خلال عقود من الحصار الاقتصادي والحروب والدمار حيث افرزت نسبة حوالي (20 %) من السكان الاميين ... اذ خطت وزارة التربية خطوات فاعلة في علاج هذه المشكلة تجسدت في تهيئة القاعدة الاحصائية اللازمة لتحديد حجم المشكلة وتهيئة قاعدة معلوماتية حول الحاجة من البنى التحتية وتهيئة المعلمين اللازمين بالاضافة الى الكتب المنهجية والقرطاسية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني... يستند تنفيذ هذا القانون الى التحفيز والترغيب ، وتضمن عدد من المواد والفقرات ووجهت سير التنفيذ وحددت مهام الهيئة العليا لمحو الامية في وضع الاهداف والخطط العامة وغيرها من المهام الحيوية ، كما تم تحديد مهام الجهاز التنفيذي والتشكيلات التابعة له وآليات التنفيذ في المحافظات ، فضلا عن تحديد عمر الشخص الامي ومدة الدراسة وعدد الدارسين وغيرها من الامور التي قننت برنامج محو الامية بحلته الجديدة في العراق .... يجري تنفيذ البرنامج بالاستناد الى هذا القانون وبما يدعم تقليص نسب الامية في العراق.

#### • وضع ضوابط تضمن شمول اوسع للفقراء ببرامج الاقراض لانشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل

تم وضع ضوابط تضمن شمول اوسع للفقراء ببرامج الاقراض لانشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل والذي حدد مسار ونهج صندوق القروض الصغيرة للفقراء المنفذ من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر... حددت هذه الضوابط فئات المشمولين في البرنامج من ( المعوقين ، المهجرين

سادساً: توفير وادامة البنى التحتية الداعمة للانتاج والتسويق (انشاء طرق ريفية بطول 4 كم ) في محافظة ديالى وبكلفة وتخصيص (1 مليار دينار ) (مدرج في عام 2012) :

نفذت محافظة ديالى مشروعاً لتبليط طرق بطول (4) كم تربط قرى فقيرة في ناحية (حديدة /قرية التتن) مع الشوارع الرئيسية ، يهدف المشروع الى تحقيق دخل اعلى من العمل للفقراء عن طريق توفير العوامل التي تسهل تسويق الانتاج الزراعي بانشاء وتبليط طرق في المناطق الريفية والزراعية الفقيرة، تسهل نقل الانتاج الزراعي لعلوات البيع المباشر، انجز المشروع في عام 2013 .

#### انشطة اخرى تحقق هدف الاستراتيجية

تتطلب برامج الاصلاح الشامل والسياسات الهادفة للتنمية وتخفيف الفقر اصدار تشريعات وقوانين تضمنتها وثيقة الاستراتيجية ... تضع خارطة الطريق لتنفيذ ناجح وسليم وتهيئ السبيل لوضع نظام قابل للمسائلة في ظل محددات وضوابط تلك القوانين، الامر الذي تنبهد له الجهات القائمة على الاستراتيجية واولته عناية فائقة، وسخرت الجهود الحثيثة لمتابعة تلك القوانين وقرارها... وبالتأكيد على اهميتها في دعم منهج الاستراتيجية... فقد تم تنفيذ وانجاز 8 قوانين او ضوابط واجراءات من اصل 11 تم تبنيها في وثيقة استراتيجية التخفيف من الفقر، وفيما يلي استعراضا لموقف تنفيذ تلك القوانين:

#### • مشروع قانون الحماية الاجتماعية رقم ( 11 ) لسنة 2014

تم اقرار مشروع قانون الحماية الاجتماعية والذي يضمن حقوق الافراد الذين هم دون خط الفقر من فئات كل من المعاقين والارامل والمطلقات وزوجات المفقودين والمهجورات والفتيات البالغات غير المتزوجات والعاجزين والايتام واسر النزلاء او المودعين اذا زادت مدة محكوميتهم عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية والمشردات في دور الدولة الايوائية والاحداث المحكومين ممن تزيد مدة محكوميتهم عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية والمستفيدين من دور الدولة من مجهولي الابوين والطالب المتزوج ولغاية الدراسة الاعدادية والاسر معدومة الدخل او التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر وغيرها من الفئات الهشة المحتاجة الى حماية الدولة... يعد هذا القانون من القوانين الرصينة لاعتماد المساهمين في صياغته وبدعم من المنظمات الدولية على تجارب فضلى دولية في الشمول وآليات التنفيذ ومصادر التمويل.

### • اتخاذ الإجراءات لاعتماد اللامركزية في إدارة شؤون شبكة الحماية الاجتماعية

أقرت الصيغة الحالية لقانون الحماية الاجتماعية ان يكون الشمول والاعانة بصورة لا مركزية من خلال تشكيل لجنة عليا لشبكة الحماية الاجتماعية يكون رئيسها النائب الأول للمحافظ وتمنح لهذه اللجنة صلاحيات الشمول والاعانة اما فيما يخص التخصيصات المالية فهي مركزية وذلك لضمان عدالة التوزيع بين محافظات العراق .

علما ان هذا الاجراء هو الافضل والاضمن من وجهة نظر دائرة الرعاية لذا سيتم استمراره بالعمل وفق هذا المنهج لتقليل الاجراءات البيروقراطية اذ ان الصلاحيات الممنوحة لرؤساء اللجان عالية.

### • تضمين قانون العمل فقرات مرنة حول تحديد الحد الأدنى للأجر ليتناسب مع خط الفقر

تم تعديل اجر العامل غير الماهر الى 250 الف دينار بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 178 لسنة 2013 بناء على ما جاء في توصيات لجنة الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر ليتناسب مع الواقع المعيشي ونفذ من 2013/7/1

### • تعديل المادة (34/اولا) من الدستور لمد الزامية التعليم الى المرحلة المتوسطة (الثالث متوسط).

بينت وزارة التربية عدم الحاجة الى تعديل المادة 34 اولاً كون الوزارة لها صلاحيات ضمن قانون الوزارة بمد الزامية التعليم وهي ماضية في تحقيق هذا الهدف وان التعديل يتطلب اجراءات كثيرة

### • انشاء صندوق ضمان اجتماعي للعاملين في القطاع غير المنظم

تم قراءته للمرة الثانية من قبل مجلس النواب وتم ايضاه من قبل مجلس الوزراء. وما يزال كل من نشاط وضع نظام متابعة ومراقبة فعالة لتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي بما يؤمن حقوق المرأة العاملة (جهة تنفيذه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) والذي يصب في هدف تمكين المرأة الفقيرة وتقليل التفاوت بينها وبين الرجل، ونشاط اتخاذ اجراءات تشجع مشاركة القطاع الخاص لبناء وحدات سكنية في المناطق الفقيرة (جهة تنفيذه مجلس الوزراء) والذي يحقق بيئة سكن افضل للفقراء، ما يزالان غير منفذان ، علما ان الادارة التنفيذية للاستراتيجية ماضية في متابعة تنفيذهما.

العائدين، الارامل والمطلقات والمعيلات لاسرهن، المطلق سراحهم من السجون، المتضررين من العمليات الارهابية، معيلي الاسر غير المستقرة من سكنة مناطق الطمر الصحي، المتسولين... وغيرهم ) كما حددت مبلغ القرض الذي يتراوح (5-10) مليون دينار، يمنح بدون فوائد وبمدة سماح تبلغ سنة واحدة من تاريخ تسلم القرض، فيما تسدد الاقساط على مدى ثماني سنوات، وغيرها من الضوابط المعتمدة في تطبيق البرنامج.

### • وضع وتنفيذ نظام واجراءات لتحديد المستفيدين (اسكان واطيء الكلفة)

تولت الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر على عاتقها مهمة وضع خط ومنهج لتحديد المستفيدين من برنامج الاسكان الاقتصادي للفقراء.... اذ صممت استمارة مفاضلة ضمت بين ثنائياها عدد من المعايير والاوزان التي تحدد الاستهداف الدقيق للفقراء وتمنح شمول غير المستحقين بتلك المساكن وبالتاكيد على اهمية توفير سكن مناسب في تخفيف الفقر ضمن وثيقة الاستراتيجية.... ولغرض اعتمادها في توزيع المساكن في المحافظات كافة... تم رفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وفق الضوابط المحددة في الاستراتيجية بعد عرضها على الهيئة الوطنية للاسكان والتي وافقت عليها بدورها، والادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر بانتظار الرد لتعميمها على المحافظات ، واعتمادها في توزيع المساكن والدكاكين ضمن الاسواق الشعبية التي يتم انشاؤها.

### • اعادة النظر بحزمة التشريعات والسياسات الزراعية لصالح المزارعين الفقراء

تم انجاز ثلاثة قوانين من اصل اربعة ضمن النشاط، وكالاتي:

1. مشروع قانون ايجار القرى العصرية رقم (59) لسنة 2012 ونشر بجريدة الوقائع العراقية بتاريخ 2012/10/15

2. قانون اعفاء المزارعين والفلاحين والمقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة من ذمتهم رقم (49) لسنة 2012 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 2013/6/11


3. قانون ايجار الاراضي الزراعية وتمليك حق التصرف والتملك فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة 2013 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 2013/8/26 وما يزال قانون تعويض الفلاحين والمزارعين عن الكوارث البيئية والمناخية قيد الدراسة. ومن الجدير بالذكر ان لهذه القوانين اثر كبير في دعم الفلاح العراقي الفقير وضمان حقوقه على المستوى المهني والشخصي.

تسدد الاقساط على مدى ثماني سنوات، وتمنح هذه القروض دفعة واحدة لكل الفئات باستثناء المتسولين وسكان مناطق الطمر الصحي، والتي تكون بدفعتين، اذ تدفع الدفعة الثانية بعد المباشرة بالمشروع وبناء على تقرير من اللجنة الفرعية في المحافظة يصدر خلال (30) يوما من تاريخ تسلم الدفعة الاولى. كما يمنح المقترض مبلغ مليون دينار كقرض اضافي في حالة تشغيله لاي عامل اضافي بعد مرور فترة لا تقل عن ستة اشهر من تنفيذ المشروع وبما لا يتجاوز سقف الاقراض المقرر واستنادا الى توصيات اللجنة المركزية في المحافظة ومصادقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ويعض ورثة المقترض المتوفي مما تبقى بدمته في حالة غلق المشروع وعدم قدرة الورثة على ادارته واستنادا لتقرير اللجنة المركزية في المحافظة والمصادقات الاصولية.

واجه هذا النشاط تلكؤ يعود سببه الى شطر دائرة العمل والتدريب المهني الى دائرتي (التشغيل والقروض، والتدريب المهني) والذي ادى الى تاخير تحويل التخصيصات المالية لعام 2013 الخاصة بالمشروع الى حساب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى شهر تشرين الثاني 2013.

يجري توزيع القروض وفق خطط اعدتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن الملاحظ محدودية مراعاتها لتقليل التفاوت بين النساء والرجال وبما يدعم تمكين المرأة، اذ تم توزيع اغلب القروض في المحافظات للرجال وبنسبة فاقت 95% مقابل نسبة اقل من 5% للنساء. كما يتضح من تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان اغلب الحاصلين على القروض هم من ذوي التحصيل العلمي المتدني (ابتدائية) وكما موضح من الشكل (1):

شكل 1: عدد الحاصلين على القروض حسب التحصيل العلمي

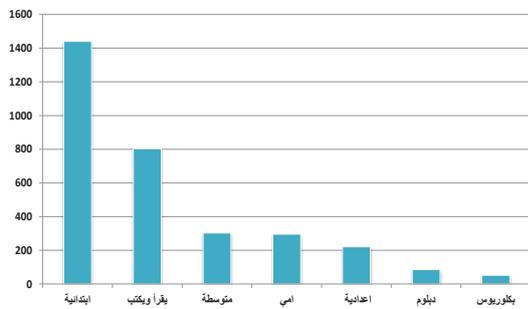

## المشاريع قيد التنفيذ في عام 2013 بضمنها الدور من عام 2012

يجري تنفيذ عددا من مشاريع تخفيف الفقر من تخصيصات الاستراتيجية من الموازنة الاستثمارية لعام 2012 خلال عام 2013 ومشاريع خطة تخفيف الفقر من تخصيصات الاستراتيجية من الموازنة الاستثمارية لعام 2013 وبنسب تنفيذ مختلفة، وسيتم استعراض تلك المشاريع حسب محصلات تنفيذها وكالاتي:

### المحصلة الاولى (دخل اعلى من العمل للفقراء)

يعد الدخل المنخفض احدهم الاسباب التي تؤدي الى الفقر، لذا فان استراتيجية التخفيف من الفقر تنتهج تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المرتبط بزيادة الانتاجية وتمكين الفقراء من خلال خلق فرص العمل والاقراض الميسر، الا ان ذلك لا يشكل بديلا عن السياسات الاجتماعية المرتبطة بتمكين الفقراء انفسهم وتحسين فرص وصولهم الى الموارد المهمة الاخرى، وانطلاقا من ذلك تبنت الاستراتيجية عددا من المشاريع التي تتكامل مع الهدف الانمائي الاول ( القضاء على الفقر المدقع والجوع) فضلا عن المشاريع التي تساهم في زيادة الانتاجية والتي نستعرضها بالاتي:

### برنامج اقراض لإنشطة مدرة للدخل للفقراء

اولا: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: نشاط دعم مشروع صندوق القروض الصغيرة للفقراء وبتخصيص (168.750) مليار دينار (مدرج في عام 2012):

يشمل النشاط منح قروض صغيرة وفق ضوابط واليات محددة تشمل فئات كل من ( المعوقين ، المهجرين العائدين، الازامل والمطلقات والمعيلات لاسرهن، المطلق سراحهم من السجون، المتضررين من العمليات الارهابية، معيلي الاسر غير المستقرة من سكنة مناطق الطمر الصحي، المتسولين ) لتوفير فرص عمل من شأنها تحسين وضعهم المعيشي.

بدأ البرنامج في (2012/9/1) بشمول المحافظات السبعة الاكثر فقرا واستمر العمل فيه عام 2013، وقد تم التخطيط لتوسيع المشروع ليشمل محافظات العراق كافة (عدا اقليم كردستان) ضمن عدد معاملات مخططة بلغت 20877 معاملة وهو عدد المستفيدين من المشروع، تتراوح قيمة كل قرض بين (5-10) ملايين دينار، وتمنح استنادا الى تقرير اللجان المختصة، وان هذه القروض تكون بدون فوائد وبمدة سماح تبلغ سنة واحدة من تاريخ تسلم القرض، فيما

### تنظيم برامج تدريب للفقراء الذين استلموا القروض لمساعدتهم في استخدامها

أولاً: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: برنامج تدريب المقترضين الفقراء بتخصيص (30) مليار دينار (مدرج في عام 2013):

تبنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن أولوياتها لتخفيف الفقر في عام 2013 برنامج تدريب المقترضين الفقراء وذلك بالنظر للتوسع الهائل في مجال التدريب المهني ولدخول مهن جديدة لسوق العمل، فضلاً عن توفير كوادرن فنية باختصاصات قادرة على قيادة واستخدام المعدات الثقيلة، وسيتم شراء الأجهزة والمكائن التدريبية المتطورة في مجالات العمل المختلفة لضمان جودة التدريب وتطوير ورفع كفاءة المتدربين بالأساليب المتقدمة والتي تكون باهضة الثمن أحياناً.



ورشة تدريب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة بغداد



تعتمد البرامج التدريبية بالدرجة الأساس على التدريب المهني وحسب احتياجات سوق العمل وقد تم تحديد خطة أولية لتهيئة القاعدة المعرفية للمقترضين ضمن برنامج القروض الصغيرة الممول من تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر تتراوح فترتها من شهرين إلى 6 أشهر. تتضمن خطة التدريب مجموعة ورش منها الرافعات الشوكية والخياطة وأجهزة التبريد والتكييف والمصاعد والصناعات الجلدية والصناعات الغذائية والمصوغات الذهبية وصيانة الموبايل والالكترونيك والطباعة بالسكرين والكوافير وصيانة السيارات واللحام، وغيرها مما يعد الأكثر طلباً في سوق العمل.

كما ظهر ان اغلب المقترضين كانوا من المتزوجين والذين شكلوا نسبة حوالي (88%) من مجموع المقترضين .

وقد بينت تقارير وزارة العمل ان النسبة الأكبر من القروض استثمرت لتنفيذ مشاريع تجارية مدره للدخل وبنسبة (64%) ومشاريع خدمية بنسبة (14%) وزراعية بنسبة (12%) وصناعية بنسبة (10%).

#### اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى توفير القروض الميسرة والتي تعد الاساس لبدء مشاريع صغيرة مدرة لدخل الفقراء تساعد في تمكينهم وتهيئة الارضية التي يستند لها النمو الاقتصادي المستدام المرتبط بزيادة الانتاجية وخلق فرص عمل للفئات المهمشة والفقيرة.

#### الشرائح المستفيدة :

تم التخطيط لاقتراض 20877 مستفيد من العاطلين الفقراء.

#### في طريق الانجاز

- تم المصادقة على 6722 معاملة مستفيد وصرف 2743 صك خلال الفترة السابقة من اصل 20877 معاملة مخططة في عامي 2012 و 2013 .
- يجري حالياً دراسة معاملات الاقراض المتبقية وتصديق ما يستوفي الشروط منها وتحرير الصكوك للمستفيدين.

شكل 2: توزيع القروض على القطاعات



- طريق قرية جميلة - جلولا بطول 3.5 كم بكلفة 491.190 مليون دينار
- طريق قرية كاظم صالح - بلدروز بطول 4 كم بكلفة 583.380 مليون دينار
- طريق ريفي لقرية حبيب العبد الله - المنصورية بطول 3.5 كم بكلفة 570 مليون دينار
- طريق قرية الحاج جاسم حسين - كنعان بطول 3.2 كم بكلفة 567.388 مليون دينار
- طريق قرية الشيخ خليل - كفري بطول 7 كم بكلفة 698.250 مليون دينار

#### اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى :

- توفير الطرق للقرى السكنية
- ربط المناطق الريفية بمركز المحافظة
- ايسال الخدمات الاساسية الى جميع المواطنين
- تسهيل ايسال المحاصيل الزراعية من المزارع الى الاهالي والاسواق

#### الشرائح المستفيدة :

- سكان القرى التي تصل بينها تلك الطرق.

#### في طريق الانجاز

- تم احالة اغلب مكونات المشروع وهي في طور التنفيذ عدا بعض المناطق .
- نسبة الانجاز الكلي (17%) .

ومن الجدير بالذكر ان هذه الدورات هي الخطوة الاولى ضمن برنامج تاهيل متكامل تنفذه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع الادارة التنفيذية لاسراتيجية التخفيف من الفقر والذي يشمل تدريب ومن ثم اقراض الفقراء فضلا عن برامج اضافية في بعض المحافظات .

#### اهداف المشروع :

فتح برامج تدريبية للمقترضين ضمن برنامج دعم مشروع القروض الصغيرة للفقراء والحد من البطالة والتخفيف من الفقر وخلق فرص عمل لشريحة العاطلين عن العمل من خلال اشراكهم بدورات تدريبية لاكسابهم مهارات فنية تمكنهم من إقامة مشاريع صغير توفر دخل مناسب لهم .

#### الموقف من التنفيذ

لم يبدأ تنفيذ المشروع خلال عام 2013 بسبب تأخر ورود التخصيصات الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والذي يعود الى شطر دائرة العمل والتدريب المهني الى دائرتي (التشغيل والقروض، والتدريب المهني)

#### توفير وادامة البنى التحتية الداعمة للانتاج والتسويق

اولاً: محافظة ديالى: تبليط (10) طرق في قرى ريفية متعددة في المحافظة بطول (32.800) كم وبكلفة وتخصيص (4.770) مليار دينار (مدرج في عام 2013)

اختارت المحافظة ضمن اولوياتها لتخفيف الفقر في عام 2013 مشروع تبليط طرق لقرى متعددة ، نظرا لحاجة تلك القرى (والتي تمتاز بكثافة سكانية عالية) الى انشاء شوارع لربط المناطق مع بعضها البعض وربطها بالمدن بهدف ايسال الخدمات الاساسية الى جميع مواطني المحافظة وتسهيل ايسال المحاصيل الزراعية من المزارع الى مراكز البيع في المدن. يبلغ طول هذه الطرق ( 32.800 ) كم وموزعة كالآتي :

- طريق المد الاخضر ( شارع عصفور - شارع الجامع ) بطول 3 كم وبكلفة 450 مليون دينار
- طريق قرية امام طالب - مركز قضاء المقدادية بطول 2 كم وبكلفة 345.975 مليون دينار
- طريق قرية الحديد - هب بطول 5 كم وبكلفة 800 مليون دينار
- طريق قرية العروبة - الوجيهية بطول 1 كم بكلفة 159 مليون دينار
- طريق قرية الكفاح - قضاء المقدادية بطول 600 م بكلفة 104.817 مليون دينار

تدرن موزعة على المحافظات (ميسان 2، ذي قار 2، المثنى 2، الديوانية 1، بغداد 3، صلاح الدين 2، كركوك 2، كربلاء 2، واسط 2، بابل 2، الأنبار 3، النجف 1، ديالى 1، نينوى 2، البصرة 2). تم تحديد عدد مواقع وحدات التدرن في المحافظات تبعاً الى انتشار المرض في الرقعة الجغرافية ضمن المحافظة ونسبة الفقر فيها، اذ يعد هذا المرض من الأمراض الصديقة للفقر.

مساحة الوحدة الواحدة (600) متر مربع، تتكون من ثلاث طوابق، يضم الطابق الارضي عيادة استشارية تتكون من غرفة طبيب ومختبر وصيدلية وغرفة اشعة ومكتب احصائي وقاطع تذاكر، اما الطابق الثاني والثالث فيضم شقق سكنية للكادر العامل في الوحدات، وسيتم اشغال هذه الوحدات بواسطة 2 طبيب و2 مساعد مختبر و2 مساعد صيدلي و2 مصور اشعة و2 احصائي وقاطع تذاكر، وتكون كل وحدة مسؤولة عن تشخيص ومتابعة حالات التدرن وتزويد المرضى بالعلاج اللازم للقضاء على هذا المرض.

#### اهداف المشروع :

تعد هذه الوحدات مراكز استشارية لفحص مرضى التدرن في المناطق الفقيرة التي تبني فيها تلك المراكز فضلاً عن توفير الادوية اللازمة لعلاج المرضى .

#### الشرائح المستفيدة:

تخدم كل وحدة تدرن 150-200 الف فرد ضمن الرقعة الجغرافية التي تغطيها

#### المحصلة الثانية ( تحسن المستوى الصحي للفقراء )

ان وضع سياسات صحية تهدف الى الحد من المشكلات الصحية، وتقليل اثرها السلبي على الفقراء، وتحسين المستوى الصحي والرعاية والخدمات المقدمة لهم، هي غاية اساسية تسعى استراتيجية التخفيف من الفقر الى تحقيقها مع التاكيد على الخدمات الصحية الوقائية الى جانب الخدمات الصحية العلاجية وتشمل هذه السياسات خدمات الرعاية الصحية الأولية المحسنة والتي تضم عدداً من الانشطة والمشاريع هي:

#### بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة


اولاً: وزارة الصحة: بناء وتأهيل وحدات التدرن مع توفير متطلباتها بكلفة وتخصيص (50 مليار دينار) (مدرج في عام 2012):

تم تخصيص (50) مليار دينار لتنفيذ هذا النشاط الذي ينجز على مدى سنتين، وبواقع (25) مليار دينار لكل سنة، يضم المشروع بناء وحدة تدرن لكل محافظة من محافظات العراق (عدا اقليم كردستان)، ويهدف النشاط الى تحسين المستوى الصحي من خلال توفير خدمات رعاية صحية اولية محسنة للفقراء يسهل عليهم الوصول اليها عن طريق بناء (29) وحدة

خارطة 1 : توزيع وحدات التدرن على المحافظات عدا إقليم كردستان حسب نسب الإنجاز المتحققة



بناء وحدة التدرن في محافظة صلاح الدين

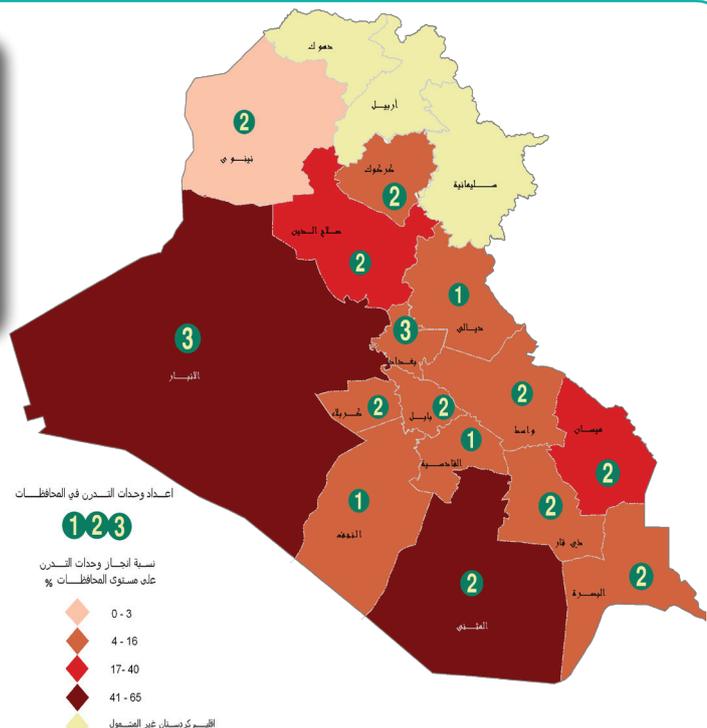

## في طريق الإنجاز

ثانياً: محافظة ديالى: بناء مراكز رعاية صحية عدد(2) مركز وبتمويل ( 1.250 مليار دينار) (مدرج في عام 2012):

يضم المشروع بناء مركزين صحيين في قريتي (كهريزه، النظام) في قضاء خانقين، ويهدف النشاط الى تحسين المستوى الصحي من خلال توفير خدمات رعاية صحية للفقراء يسهل عليهم الوصول اليها، يتكون مركز قرية كهريزا من بناية من طابق واحد على مساحة (800)متر مربع، اما مركز قرية النظام فيتكون من طابق واحد على مساحة (300) متر مربع، سيتم تجهيز المركزين بكادر طبي وادوية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

## اهداف المشروع:

تعمل المراكز الصحية على توفير خدمات صحية للفقراء تشمل تقديم العلاجات و فحص المرضى في المناطق الفقيرة التي تبني فيها تلك المراكز.

## الشرائح المستفيدة:

يخدم كل مركز صحي حوالي (1500) الف فرد ضمن الرقعة الجغرافية التي تغطيها.

## في طريق الانجاز

- ادراج المشروع ضمن الضوابط المحددة بعد ان تم اعداد الكشوفات المسعرة والتصاميم الاولية ودراسة الجدوى الخاصة به
- تم احالة المشروع نهائية كانون الاول 2013 وتم توقيع العقد بمدة (210) يوماً.
- يجري تنفيذ المشروع بنسبة انجاز 35%.

بعد تلكؤ المشروع في العام السابق لاسباب تعود الى مركزية تنفيذه تم منح صلاحيات تنفيذه الى المحافظات المعنية وبدأ التنفيذ في المحافظات كافة وبنسب انجاز متفاوتة وكالاتي:

جدول 3 : نسب إنجاز وحدات التدرن حسب المحافظات

ت	المحافظة	النسبة%
1	الديوانية	10 %
2	كركوك/ داقوق	10 %
	كركوك/ الحويجة	10 %
3	المتنى / الخضر	65 %
	المتنى / السماوة	65 %
4	صلاح الدين/ بيبي	40 %
	صلاح الدين/ تكريت	40 %
5	النجف/ الحرية	10 %
6	واسط/ الحي	10 %
	واسط/ الكوت	10 %
7	كربلاء/ الحي العسكري	10 %
	كربلاء/ حي النصر	10 %
8	نينوى/ النهروان	3 %
	نينوى/ الكرامة	3 %
9	بابل/ الاساتنة	18 %
	بابل/ المحاويل	13 %
	الانبار/ القائم	60 %
10	الانبار/ الفلوجة	60 %
	الانبار/ حديثة	60 %
11	ديالى	10 %
12	البصرة/ القبلة	13 %
	البصرة / الزبير	3 %
13	ميسان/ العزيز	44 %
	ميسان/ علي الغربي	22 %
14	ذي قار / الزهراء	17 %
	ذي قار / الرسول	0 %
15	بغداد / الكرخ	20 %
	بغداد/ الكاظمية	12 %
	بغداد/ الرصافة لم يبدأ التنفيذ فيها	

### استمرار توفير المواد والمستلزمات القياسية

أولاً: وزارة الصحة: توفير أجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية وبتخصيص (13) مليار دينار (مدرج في عام 2012):

يشمل النشاط شراء (21) نوع من الأجهزة المختبرية الخاصة باغراض فحص الاغذية والتلوث والدم وفحص الرئة واجهزة معالجة الشبكية ومعالجة وتنقية الماء الابيض واجهزة قياس ذروة تدفق الزفير واشعة ماموكرام ومحارير الكترونية وثلاجات لحفظ اللقاح ومراقب انجماد وحامل اللقاح وصندوق حفظ اللقاح وناظور لفحص عنق الرحم مع ملحقاته وسونار متنقل مع مجس لحديثي الولادة وغيرها، اذ سيتم تجهيز المراكز الصحية بالاجهزة الضرورية وحسب حاجة تلك المراكز للاجهزة خاصة تلك التي تقع على اطراف المدن والمؤشرة كمناطق فقيرة .

#### اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى تعزيز شمول المناطق الفقيرة بالعناية الطبية الضرورية من خلال تجهيز المراكز الصحية بالاجهزة المختبرية ومستلزماتها وتوفير الخدمة الصحية اللازمة للفقراء بسبب المبالغ المالية المطلوبة لإجراء هذه الفحوصات في المؤسسات الصحية الخاصة .

#### في طريق الانجاز

واجه المشروع محدودية في انجازه لاسباب تعود الى مركزية تنفيذه، لذا تم منح صلاحيات تنفيذه الى المحافظات الخمسة عشر والتي حددت احتياجاتها من الاجهزة والمواد المختبرية

جدول 4: توفير الاجهزة والمعدات المختبرية حسب المحافظات

المحافظة	نسبة الانجاز
صلاح الدين	100 %
ديالى	100 %
بابل	100 %
ذي قار	100 %
كربلاء	100 %
الانبار	100 %
نينوى	88 %
المتنى	60 %
البصرة	47 %
واسط	27 %
كركوك	9 %
الديوانية	0 %
ميسان	0 %
بغداد/ الكرخ - الرصافة	0 %
النجف	0 %

### زيادة اعداد العيادات المتنقلة للمناطق النائية

أولاً: وزارة الصحة: شراء عيادات متنقلة ذات مواصفات عالية تحتوي على سيارات مجهزة بجهاز اشعة مع مجهر ثنائي العدسة لاكتشاف حالات التدرن الجديدة وخاصة في مناطق الاخطار العالي والمجاميع الواهنة والتي هي ضمن خط الفقر وبتخصيص (2 مليار دينار) لعام 2012 (مدرج في عام 2012):

يتضمن المشروع شراء (8) عيادات متنقلة توزع على دوائر صحة المحافظات السبعة الاكثر فقرا بالإضافة الى محافظة بغداد. تتكون كل عيادة من سيارة كرفانية ذات طابق واحد يضم غرفة مقسمة الى اربعة اقسام ، يحتوي القسم الاول على جهاز اشعة داخل غرفة مغلقة بالرصاصة، اما الثاني فيحتوي على جهاز اشعة رقمي ويضم الثالث مختبر مجهز بمجهر ثنائي العدسة والقسم الاخير مجهز بسرير لاسعاف الحالات الطارئة، يلحق الكرفان بمولدة كهرباء عدد (2) لتشغيل اجهزة الاشعة والميكروسكوب

يعمل في كل عيادة طبيب مختص بالامراض الصدرية ومصور اشعة ومساعد مختبر، وتكون عائدة هذه العيادات الى مركز الامراض الصدرية والتنفسية التخصصي (بغداد) وضمن البرنامج الوطني لمكافحة التدرن.

#### اهداف المشروع:

تهدف هذه العيادات الى فحص مرضى المناطق الفقيرة والبعيدة والنائية وتوفير التدابير اللازمة في حالة اكتشاف مريض التدرن وعلاجه بالسرعة اللازمة.

#### الشرائح المستفيدة:

تكون هذه العربات مؤهلة لفحص 100 شخص في الساعة في المناطق الفقيرة التي تجوبها تلك العربات.

#### في طريق الانجاز

- واجه المشروع تلكؤ في العام السابق بسبب مركزية تنفيذه ، مما دفع الوزارة الى منح صلاحية تنفيذه الى المحافظات المعنية وهي المحافظات السبعة الاكثر فقرا ( المتنى، بابل، صلاح الدين، كربلاء ، واسط ،الديوانية ، ديالى ) فضلا عن بغداد، وقد تم الاحالة لشراء وتجهيز العربة في محافظة ديالى وعانت باقي المحافظات من عزوف في تقديم الشركات .



جهاز طبي في احد مراكز الصحية في محافظة كربلاء

### توسيع المشاريع لايصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة

اولاً: محافظة النجف. تجهيز ونصب اربع مجمعات خلية ماء ( سعة 25 متر مكعب/ ساعة ) بتخصيص (3.389) مليار دينار (مدرج في عام 2013):

يضم المشروع تجهيز ونصب اربع وحدات تحلية ماء في قرى متفرقة في المحافظة سعة كل منها 25 متر مكعب/ ساعة ويتوزع المشروع على المناطق والقرى الآتية:

- تجهيز ونصب وتشغيل وحدة تحلية ماء لقرى بحر النجف في قضاء النجف
- تجهيز ونصب وتشغيل وحدة تحلية ماء لقرية الاساويد في قضاء النجف
- تجهيز ونصب وتشغيل وحدة تحلية ماء لقرية بني زيد الجنوبية في ناحية الحيدرية
- تجهيز ونصب وتشغيل وحدة تحلية ماء لمدرسة حاتم الطائي والدور القريبة منها في ناحية الحيدرية

### اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى :

- توفير المياه الصالحة للشرب للقرى المخدومة
- توفير فرص عمل خلال مدة انشاء وتشغيل المشروع
- تشجيع المواطنين على عدم الهجرة من القرى بسبب عدم توفر الخدمات
- للمشروع تاثير ايجابي على بيئة المنطقة المحيطة من خلال توفير مياه الشرب الصحية وتقليل الامراض المعدية.

ثانياً: وزارة الصحة : توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض وبتخصيص (79.5) مليار دينار (مدرج في عام 2012):

يتضمن النشاط شراء اجهزة ومعدات طبية ذات استعمالات مختلفة توزع على المراكز الصحية ويتم تحديدها حسب حاجة واولوية المراكز الصحية ذاتها. ومن الجدير بالذكر ان توفير هذه الاجهزة يؤدي الى تحسين الخدمات التشخيصية التي تقوم بها تلك المراكز ، وتشمل (اجهزة اشعة وملحقاتها وحضانات اطفال واجهزة اسنان وC.SCAN واجهزة سونار واجهزة الصدمة الكهربائية واجهزة تخطيط القلب واجهزة الفحص الجزئي الحديث لعصيات التدرن وثلاجات حفظ الادوية والملقحات واجهزة طبية للعيون واجهزة تنقية الهواء وغيرها من الاجهزة الطبية متعددة الاغراض) .

### اهداف المشروع :

يرمي المشروع الى توفير الاجهزة ذات الاغراض المتعددة للمراكز الصحية وحسب الحاجة لضمان توفير الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين بالاستناد الى رؤية القائمين على تلك المراكز الصحية.

### في طريق الانجاز

- بسبب تأخر مركز الوزارة في انجاز اجراءات الشراء، تم منح صلاحيات تنفيذه الى المحافظات الخمسة عشر والتي حددت نوع احتياجاتها من الاجهزة ذات الاغراض المتعددة.

جدول 5 : توفير الاجهزة والمعدات متعددة الاغراض حسب المحافظات

المحافظة	نسبة الانجاز
صلاح الدين	23 %
ديالى	47 %
بابل	100 %
ذي قار	100 %
كربلاء	78 %
الانبار	99 %
نينوى	71 %
المنجى	85 %
البصرة	49 %
واسط	27 %
كركوك	6 %
الديوانية	0 %
ميسان	71 %
بغداد/ الكرخ	71 %
بغداد/ الرصافة	0 %
النجف	2 %

ثانياً: وزارة البلديات والأشغال العامة ، مشاريع لايصال الماء الصالح للشرب في ريف 15 محافظة، وبتخصيص (10.450) مليار دينار ( مدرج في عام 2013 ):

ضمن اولويات الوزارة لتخفيف الفقر من تخصيصات الاستراتيجية من الموازنة الاستثمارية لعام 2013 تم تسمية مشروع تجهيز ونصب 15 وحدة ماء مجمعة بسعات مختلفة (100) متر مكعب/ساعة و(200) متر مكعب/ساعة، يتم توزيعها على القرى والأرياف البعيدة عن مركز 6 محافظات هي (كركوك ، ديالى ، الديوانية ، ميسان ، صلاح الدين ، بابل)، الا ان وزارة البلديات لم توفر مستلزمات ادراج المشروع ضمن خطة تخفيف الفقر ، مما دفعها الى تغيير المشروع الى اخر وهو شراء 60 سيارة حوضية سعة 10000 متر مكعب يتم من خلالها توزيع الماء الصالح للشرب لسكان القرى والأرياف البعيدة عن مراكز المدن، وقد تم توفير مستلزمات ادراج المشروع وفق الضوابط المحددة وادرج ضمن خطة تخفيف الفقر لعام 2013

#### اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى توفير الماء الصالح للشرب من خلال السيارات الحوضية الى الاماكن الريفية البعيدة والنائية والتي لا تصل لها شبكات الماء الصالح للشرب.

#### الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد المستفيدين من المشروع بـ150 الف شخص يتوزعون في مناطق مختلفة من القرى البعيدة والأرياف .

#### في طريق الانجاز

- تم تقديم متطلبات ادراج المشروع الجديد بتاريخ 2013/9/15 وبسبب ارتفاع الاسعار المقدمة تم تعديل الكلف بتاريخ 2013/10/10 وادرج المشروع.
- المشروع يمر بمرحلة التهيئة والتحضير للاعلان.

#### الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد السكان المستفيدين من المشروع بـ 2000 نسمة.

#### في طريق الانجاز

- ادراج المشروع ضمن الضوابط المحددة بعد ان تم اعداد الكشوفات المسعرة والتصاميم الاولية ودراسة الجدوى الخاصة به

- اعلن عن المشروع ويمر الان في مرحلة الاحالة

اولاً-ب: محافظة النجف، تجهيز ونصب وحدة مائية مجمعة سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، بتخصيص (3.968) مليار دينار ( مدرج في عام 2013 ):

حددت محافظة النجف ضمن اولوياتها من تخصيصات الاستراتيجية من الموازنة الاستثمارية لعام 2013 مشروعاً لبناء مركز الانف والاذن والحنجرة (ENT) مع تزويده بمستلزمات طبية متعددة الا ان عدم توفير مستلزمات ادراجه ضمن الضوابط المحددة حال دون ادراجه ضمن خطة تخفيف الفقر لعام 2013 ، الامر الذي دفع المحافظة الى تسمية مشروع اخر هو مشروع تجهيز ونصب وحدة مائية مجمعة سعة 1000 متر مكعب/ ساعة لتغذية مجموعة من القرى شمال مدينة الكوفة ، وقد تم توفير مستلزمات وادرج ضمن خطة المحافظة لتخفيف الفقر لعام 2013

#### اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى تزويد الماء الصالح للشرب لقرى شمال الكوفة وضمان تقليص انفاق المواطنين على شراء ماء الشرب.

#### الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد المستفيدين من المشروع 25856 من سكان القرى المشمولة بالمشروع

#### في طريق الانجاز

- تم ادراج المشروع بتاريخ 2013/11/6 .
- اعلن عنه بتاريخ 2013/11/17 .
- تم اعادة الاعلان للمرة الثانية بسبب عدم استيفاء الشروط من المتقدمين على المشروع .

## توسيع مشاريع الصرف الصحي

أولاً: وزارة البلديات والأشغال العامة، تجهيز آليات تخصصية في أعمال المجاري بتخصيص (10.450) مليار دينار ( مدرج في عام 2013 ):

ضم المشروع الذي تبنته وزارة البلديات والأشغال العامة تجهيز اليات تخصصية في أعمال المجاري للاستفادة منها في تشغيل وصيانة شبكات المجاري في المحافظات الخمسة عشر وبعدها (42) آلية تتوزع على (15) محافظة، تتضمن واحد وعشرون سيارة سحب مياه ثقيلة وواحد وعشرون سيارة صاروخية سعة السيارة الواحدة 8000 لتر مكعب ، تخدم مناطق متفرقة في المحافظات وتعمل بإشراف دوائر المجاري في المحافظات المشار إليها أعلاه .

## اهداف المشروع :

توفير اليات تخصصية لصيانة شبكات الامطار والصرف الصحي وسحب المياه فضلا عن السيارات الصاروخية التي تستخدم لفتح الانسدادات التي تحدث داخل انابيب الشبكات ومداخل احواس التفتيش

## الشرائح المستفيدة:

تخدم هذه الاليات سكان المناطق التي تصل اليها في المحافظات الخمسة عشر

## في طريق الانجاز

- بعد ادراج المشروع تم التهيئة للاعلان الان اجراءات الاعلان تم ايقافها لورود كتاب من وزارة التجارة يحتم على الوزارات مفاتحة وزارة التجارة عن امكانية التجهيز قبل الاعلان عن المشروع
- فاتحت المديرية العامة للمجاري بكتابها ذي العدد 5011 في 29/10/2013 الامانة العامة لمجلس الوزراء باستثناء المشروع من القرار.
- حصلت موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وتم الاعلان بتاريخ 2013/12/1.

## المحصلة الثالثة (نشر وتحسن تعليم الفقراء)

تبنت الاستراتيجية مجموعة من المخرجات للوصول الى نشر وتحسين تعليم الفقراء في ضوء مبادئ الاستراتيجية الرامية الى تمكين الاطفال الفقراء ذكورا واناثا من اكمال دراستهم ضمن خطة تزامنت وتوازت مع خطة الاهداف الانمائية للالضية باعتبار بعد التعليم من الابعاد الاساسية للفقير، كل ذلك دفع الجهات القائمة على الاستراتيجية الى توجيه اهتمامها بالغا لتوفير البيئة الدراسية المناسبة من خلال تبني مشروع هدم وإعادة بناء المدارس الطينية في العراق وهو من اهم ما نفذته الاستراتيجية فضلا عن مشاريع كانت تستهدف تحسين الواقع التعليمي للفقراء في العراق وتلك المشاريع هي:

**تخصيص تمويل كاف ضمن الموازنة الاستثمارية التربوية حسب المراحل (اولوية للانفاق الحكومي الاستثماري التربوي) مع اولوية في تخصيص بناء وتأهيل المدارس المتوسطة والاعدادية في القرى والاحياء الفقيرة ووفق سقف زمنية ملائمة .**

**أولاً: وزارة التربية : مشروع ازالة المدارس الطينية في العراق بتخصيص (140) مليار دينار (مدرج في عام 2012):**

تم تخصيص مبلغ (140) مليار دينار لمشروع ازالة المدارس الطينية ، والذي يشمل هدم (409) مدرسة طينية، وبناء مدارس بديلة وفق نمط البناء التقليدي او الجاهز وحسب ما تقتضيه عملية فحص التربة في تلك المنطقة تتوزع على محافظات العراق عدا اقليم كردستان كما لم يشمل التخصيص المحافظات الأنبار، كربلاء، النجف لعدم وجود مدارس طينية فيها.

لتنفيذ المشروع خضعت (227) مدرسة في الوسط والجنوب الى نمط البناء التقليدي ، في حين واجهت مدارس محافظات ديالى، صلاح الدين، كركوك، نينوى تحديات البناء الجاهز (الكونكريتي) بسبب طبيعة تلك المناطق. عانى النشاط من تأخير في التنفيذ بسبب تلك الشركات المنفذة وخاصة للمدارس التي بنيت وفق نمط البناء الجاهز وقد تم تشخيص الخلل في العام السابق والذي يعود الى محدودية شركات البناء الجاهز وحدثة تجربة البناء وفق هذا الاسلوب في العراق مما حدا بنا الى مخاطبة الجهات المعنية بهدف حل تلك التحديات وتمت الاستجابة من خلال تغيير جهة التنفيذ الى الادارات المحلية وتغيير اسلوب البناء في بعض المواقع من اسلوب البناء الجاهز الى اسلوب البناء التقليدي. علما ان المشروع احيل





رابعاً: في محافظة بابل : بناء مدارس في قرى محافظة بابل،  
بتخصيص (12.6) مليار دينار (مدرج في عام 2013)

يتكون المشروع من بناء (16) مدرسة ابتدائية ، موزعة على  
قرى محافظة بابل وكالاتي :

- قرية اولاد الكاظم مقاطعة 7 الحصن البيكات /سدة  
الهندية في قضاء المسيب .
- قرية ام ذرة مقاطعة 4 / سدة الهندية في قضاء المسيب .
- قرية الطابه مقاطعة 42 الشاخة / النيل في قضاء المحاويل .
- قرية ال بوشايخ علي / ناحية القاسم .
- قرية الجنابيين / ناحية القاسم .
- قرية كاظم الصلي / ناحية الكفل .
- قرية هوى الشام / مركز قضاء الحلة .
- قرية خلف مقام الخضر / ناحية الاسكندرية .
- قرية الكصيرات / ناحية المدحتية .
- قرية الغزالي الاكرع / ناحية المدحتية
- قرية الفياده / ناحية الشوملي .
- منطقة العمار قرية البوهليل / النيل في قضاء المحاويل .
- قرية الطويل / ناحية الشوملي .
- قرية الزوية العويديين / الطليعة في قضاء الهاشمية .
- قرية البدعة / مركز قضاء المحاويل .
- قرية الحميري / المشروع في قضاء المحاويل .

#### اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى:

- توفير مدارس يسهل وصول الفقراء اليها وكذلك تخفيف  
الزخم في المدارس الابتدائية المجاورة فضلا عن استيعاب  
الزيادات المتوقعة للسكان مستقبلاً .
- تحسين الواقع التربوي وتأمين المتطلبات الاساسية للطلاب  
وتبني ثقافة جودة التعليم ورفع المستوى التعليمي .

#### اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى :

- فك الاختناقات الحاصلة في المدارس ذات الدوام المزدوج
- توفير فرص عمل في المحافظة على مدى سنة وهي مدة  
انجاز المشروع

#### الشرائح المستفيدة :

يقدر عدد الطلاب المستفيدين من المشروع بحوالي 2880  
طالب

#### في طريق الانجاز

تم توقيع العقد مع اربع شركات قطاع خاص والتي بدأت  
بالتنفيذ وينسب انجاز بلغت في كل من (حي ميسان 28 %،  
ناحية الحيدرية 9 %، حي السلام 9 %، حي الزهراء 9 %).

ثالثاً : محافظة كربلاء : انشاء مدرسة ابتدائية ذات 18 صف  
بتخصيص (1.9) مليار دينار (مدرج في عام 2013)

يشمل المشروع انشاء مدرسة ابتدائية في منطقة اللايح في  
ناحية الحسينية والتي تخلو من مدارس ابتدائية ، تتكون  
المدرسة من (18) صف وجناح ادارة مع مجموعة صحية  
ومجموعة صحية للطلاب وبمدة انجاز 420 يوم .

#### اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى :

- تعليم الفقراء في المناطق الريفية الفقيرة .
- تقليل المسافة الفاصلة بين القرى الفقيرة والمدارس  
الابتدائية .

#### الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد الطلاب المستفيدين من المشروع بحوالي 450 طالب .

#### في طريق الانجاز

- اعلن عن المشروع بتاريخ 2013 /10/23 .
- بعد ان تم الاعلان عن المشروع وعزوف المقاولين عن التقديم  
تم احالة المشروع باسلوب الدعوات المباشرة .
- تم توجيه دعوات للمرة الثانية بسبب قلة المتقدمين  
للمشروع .

## الشرائح المستفيدة:


يقدر عدد المستفيدين من المشروع بحوالي 5560 طالب

## في طريق الانجاز

- تم الاعلان في شهر تموز 2013 وبسبب عزوف المقاولين عن التقديم للمشروع لأسباب تتعلق بالمواصفات المطلوبة تم اعادة الاعلان للمرة الثانية بتاريخ 2013/10/1
- نظرا لمحدودية عدد العروض المتقدمة، تم توجيه الدعوات المباشرة للمرة الثانية، وهي في مرحلة التحليل والاحالة.

تبنت الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر خطة لإنشاء مدارس ابتدائية للتجمعات السكانية التي تبعد عنها المدارس الابتدائية 2 كم فأكثر، ولتنفيذ هذه الخطة فقد تم مخاطبة المحافظات كافة لتحديد المدارس المطلوبة، اذ تبين ان عدد المدارس المطلوبة بلغ 1344 مدرسة موزعة على 15 محافظة كالاتي:

شكل 3: المدارس الابتدائية التي تبعد عن التجمعات السكانية لـ 2 كم واكثر موزعة حسب المحافظات

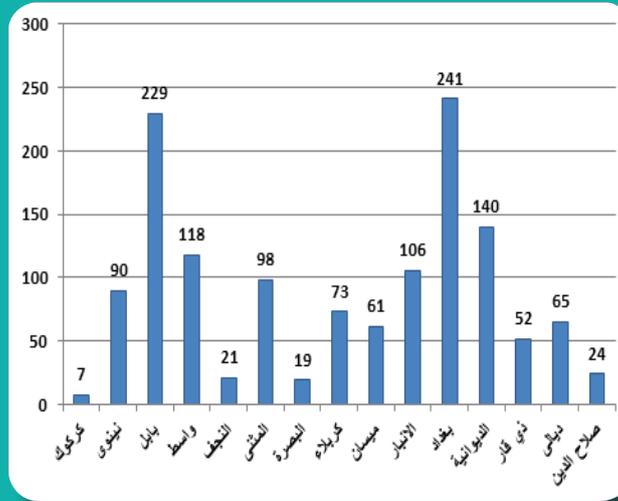

وفي سياق العمل لايجاد حلول لهذه المشكلة تم تخصيص مبالغ سنوية من تخصيصات الاستراتيجية من الموزانة الاستثمارية بصورة سنوية لإنشاء مدارس ابتدائية في تلك المناطق.

أولاً : وزارة الاعمار والاسكان : تنفذ وزارة الاعمار والاسكان مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقراء في محافظة الديوانية بتخصيص (10.9) مليار دينار (مدرج في عام 2012):

تبنت استراتيجية التخفيف من الفقر اعطاء اولوية لتنفيذ مشاريع لبناء مجمعات سكنية اقتصادية وقد خصصت قطعة ارض في محافظة الديوانية لبناء (175) دار سكني اقتصادي

تم تحديد قطعة الارض المخصصة في محافظة الديوانية قضاء الشامية التي تبلغ مساحتها (30) دونم والمشمولة بمبلغ الدعم لعام 2012 والبالغ (10.9) مليار دينار، حيث سيتم بناء (175) دارا فضلا عن توفير خدمات البنى التحتية اللازمة لها

#### اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى توفير بيئة سكن مناسبة للفقراء من خلال توفير سكن اقتصادي ملائم يحل مشاكل تدني نوعية السكن والاكتظاظ

#### الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد المستفيدين من المشروع 175 اسرة اي حوالي 1350 فردا

#### في طريق الانجاز

- تم احواله المشروع والعمل مستمر فيه وهو في مرحلة تسوية الارض، وبنسبة انجاز 5%

ثانياً: محافظة المثنى: تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقراء في محافظة المثنى بتخصيص (45) مليار دينار (مدرج في عام 2012):


تبنت المحافظة اثناء مجمعات سكنية مخصصة للفقراء مع كافة الخدمات والبنى التحتية اللازمة لها وبواقع الف وحدة سكنية، توزع حسب النسبة السكانية للوحدات الادارية في المحافظة مع اجراء بعض التعديل للوحدات التي تعاني من نسب فقر اكبر. تتكون كل وحدة سكنية من طابق واحد وتحتوي على غرفتين وصاله ومطبخ وصحيات فضلا عن حديقة امامية وكراج، وتختلف مساحة الاراضي المخصصة في اقصية المحافظة اذ تم تخصيص (200) متر مربع لكل وحدة سكنية في قضاء السماوة، و(250) متر مربع لكل وحدة سكنية في اقصية (الخضر، الرميثة، السلمان) و(300) متر مربع لكل وحدة سكنية في كل من النواحي (الوركاء، الكرامة، النجمي، السوير، الدراجي، بصية، الهلال، المجد) الا ان مساحة البناء لكل وحدة سكنية ولكل الاقصية هي (106) متر مربع.

#### المحصلة الرابعة (بيئة سكن افضل للفقراء)

يعاني الفقراء من مشكلات البيئة التي يعيشون فيها، من تدني نوعية السكن ، والاكتظاظ والتلوث، وعدم ملائمة البنى التحتية حيث يعكس سوء السكن الحرمان الذي يعانيه الفقراء ويساهم في تعميقه، لذا صبت الاستراتيجية جل اهتمامها لتوفير بيئة سكن مناسبة للفقراء والذي تبلور من خلال المشاريع والانشطة الاتية:

#### تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقراء .

خارطة 3: توزيع الوحدات السكنية الاقتصادية على المحافظات عدا إقليم كردستان

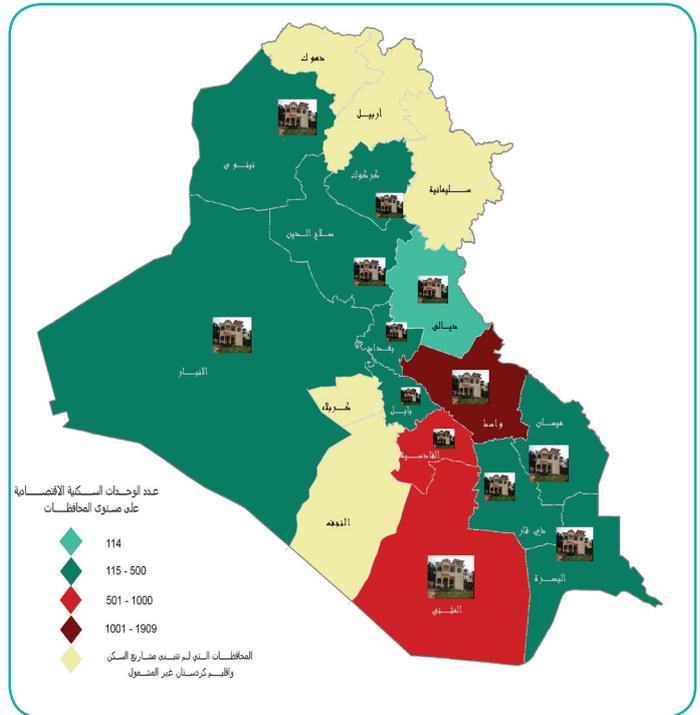

## اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى توفير سكن اقتصادي ملائم لفقرى المحافظة فضلاً عن توفير البنى التحتية الملائمة والتي تؤدي بمجملها الى تحسين بيئة السكن الخاصة بالفقرى.

## الشرائح المستفيدة:

يستهدف المشروع تحسين الواقع السكني لـ (1000) اسرة في المحافظة

## في طريق الانجاز

• وجهت المحافظة طلباً رسمياً الى وزارة التخطيط بتنفيذ المشروع وفق الية تسليم مفتاح والذي لم يتم الموافقة عليه وفق الضوابط المعتمدة.

• نظر الحدودية عدد المساكن الاقتصادية في قضائي السلطان والبصية تكفلت المحافظة باعداد الكشوفات والدراسات والتصاميم للمشروع في القضائين اعلاه.

• تم احالة المشروع في قضائي (السلطان، والبصية) الى الشركة المنفذة وبأشرت الشركة بالتنفيذ

• تم توقيع العقد مع شركة لاعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بباقي الوحدات الادارية، وقد سلمت الشركة المخططات والدراسات الى المحافظة لتقوم اللجنة بعدها بالاعلان عن المشروع.

ثالثاً: محافظة الديوانية : تنفيذ مشاريع لبناء مجمعين سكنيين إقتصاديين للفقرى في محافظة الديوانية وبتخصيص (8) مليار دينار لكلا المجمعين (افقي وعمودي) (مدرج في عام 2012):

تم تخصيص قطعة الارض المرقمة (21/8) مقاطعة (5) ام العباسيات بمساحة (270) دونم، لبناء مجمعات سكنية افقية وعمودية اقتصادية، تكون مساحة الوحدة السكنية في المجمعات السكنية الافقية (90) متر مربع بناء (عدا مساحة الحديقة والكراج)، وتتكون مساحة البناء من غرفتي نوم وصالة ومطبخ وحمام، اما بالنسبة للبناء العمودي فتكون مساحة الوحدة السكنية (80) متر مربع وتتكون من غرفة نوم وصالة ومطبخ وحمام .

## اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى حل مشكلة السكن للعوائل الفقيرة في المحافظة من خلال نوعين من البناء العمودي والافقي في المحافظة والتي تعد من المحافظات الفقيرة في العراق

## الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد المستفيدين من المشروع بـ 185 اسرة، وبما يعادل 1110 فرداً.

## في طريق الانجاز

- على الرغم من ادراج المشروعين في عام 2012 الا انه عانى من تلوؤ في الانجاز بسبب بطئ اجراءات تنفيذ المشروع
- اعلن عن المشروعين خلال شهر تشرين الاول 2013 وتم فتح العطاءات والاحالة للشركة المنفذة

رابعاً: محافظة واسط: تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقرى في محافظة واسط في اقصية الحي والصويرة والعزيرية والنعمانية بتخصيص (23.1) مليار دينار (مدرج في عام 2013):

بدأ التخطيط لتنفيذ المشروع من خلال تخصيص 23.1 مليار دينار من الموازنة الاستثمارية لعام 2013، حيث تم استحصال الموافقات على تخصيص اراضي في اقصية (النعمانية، الصويرة، والحي، والعزيرية) والمصادقة عليها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

## اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى حل مشكلة سكن الفقراء في محافظة واسط من خلال مشروع ينجز باكثر من مرحلة

## الشرائح المستفيدة:

استهدف المشروع في مرحلته الاولى حل مشكلة السكن لـ 284 اسرة فقيرة في المحافظة اي ما يعادل (1704) فرد.

## في طريق الانجاز

- تمت المصادقة من المكتب الاستشاري على التصاميم الجديدة للمشروع لبناء (1625) وحدة سكنية أفقية وتقسيمها على اقصية المحافظة (500) وحدة في قضاء النعمانية و(530) وحدة في قضاء الصويرة و(500) وحدة في قضاء العزيرية و(95) وحدة في قضاء الحي، بما فيها الفحوصات المختبرية.
- تم تكليف شركة المنصور العامة احدى شركات وزارة الاعمار والاسكان وتم توقيع العقد والمباشرة بتاريخ 11/12 / 2013 بمدة زمنية تعادل (600) يوماً، وبلغت نسبة الانجاز الفعلي 3% والمشروع في مراحلته الاولى من العمل .



بناء مجمع سكني في محافظة بابل

سادساً : محافظة ديالى، تنفيذ مجمع سكني اقتصادي لإسكان الفقراء ، بكلفة وتخصيص (7) مليار دينار (مدرج عام 2012)

يضم المشروع تنفيذ ثلاث مجمعات سكنية في قرى (الكبة، بهرز، الأحيمر) في قضاء بعقوبة من محافظة ديالى، ويتكون من (114) وحدة سكنية موزعة على القرى اعلاه .

#### اهداف المشروع :

- تقليل مشكلة السكن لشريحة الفقراء في المجتمع
- ايجاد فرص عمل جديدة ومحاولة الحد من مشاكل البطالة.

#### الشرائح المستفيدة :

يخدم المشروع (114) اسرة اي بما يعادل (786) فرد من الفقراء في المحافظة .

#### في طريق الانجاز

لم يباشر بتنفيذ المشروع لحد الان بسبب وجود تجاوزات على موقع العمل .

خامساً: محافظة بابل : تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقراء في محافظة بابل ( مع اوصول الخدمات الاساسية من روضة ، حضانتة، مسجد، طرق داخلية، شبكة مجاري ، ساحات خضراء) بتخصيص (12.6) مليار دينار (مدرج في عام 2012) وينفذ على مدى ثلاث سنوات:

حددت المحافظة اولوياتها من تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2012 بناء مجمعات سكنية اقتصادية للفقراء وقد خصصت لتحقيق هذا الهدف قطعة ارض مساحتها (12) دونم في ناحية ابي غرق وبواقع (15) عمارة، كل عمارة تحتوي على (12) شقة ، مساحة الشقة الواحدة (100) متر مربع، ويشمل المشروع انشاء المجمعات السكنية فضلا عن توفير الخدمات الاساسية (روضة، حضانتة، مسجد، طرق وساحات، شبكة مجاري مع محطة معالجة).

#### اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى تحسين بيئة السكن للفقراء من خلال توفير مجمع سكني متكامل مع الخدمات الاساسية.

#### الشرائح المستفيدة:

يستهدف المشروع توفير بيئة سكن مناسبة لـ 180 اسرة فقيرة في المحافظة اي ما يعادل (1080) فرد .

#### في طريق الانجاز

- ينفذ المشروع خارج حدود البلدية في المناطق الريفية.
- اعدت الكشوفات مع دائرة عقارات الدولة-التخطيط العمراني لكون المشروع خارج التصميم الأساس للمدينة.
- جرى الاعلان والتعاقد مع شركة الفاو الهندسية للمقاولات احدى شركات وزارة الاعمار والإسكان بأمر الاحالة المرقمة 13953 في 2012/12/15 .
- سلم الموقع بتاريخ 2012/12/31 .
- تم وضع حجر الاساس بتاريخ 2013 /4/15 من قبل السيد المحافظ.
- يمر المشروع في مرحلة تسليح وصب اعمدة البناءات بنسبة انجاز كلي بلغت (15%) .

### في طريق الإنجاز

- تم تسمية المشروع ضمن اولويات المحافظة الا ان قطعة الارض المحددة من قبل المحافظة لم تكن كافية وتم استبدالها بقطعة ارض اخرى
- تم اعداد الدراسات والتصاميم الجديدة بعد استبدال قطعة الارض باخرى تابعة لنفس القضاء، وتم تسليم المخططات الجديدة الى دائرة تخطيط القطاعات وتم المصادقة عليها ويجري الان التهيئة للاعلان.

ثامنا: محافظة صلاح الدين: بناء مساكن اقتصادية للفقر ، بكلفة وتخصيص قدره (20) مليار دينار (مدرج في عام 2013):

يتألف المشروع من (438) دار، ولا تقل مساحة بناء الدار الواحدة عن (100) متر مربع، ومن المؤمل ان يخدم عددا من سكان المحافظة فضلا عن (70000) عائلة مهجرة من بغداد والمحافظات الجنوبية الاخرى ومئات النازحين من المحافظات القريبة غير المستقرة امنيا، كما انه سيؤدي الى تحسين بيئة الانسان ليكون له دور فاعل في التنمية الوطنية ورفع المستوى الخدمي السكني الذي يؤدي الى خفض الانفاق ورفع المستوى المعاشي للمواطنين وتخفيض معدلات الفقر. كما ان المشروع سيقدم خدمة اجتماعية لسكان المحافظة من خلال توفير السكن والبنية التحتية المتطورة وسيتم تقديم الخدمات من قبل المحافظة ضمن خطة تنمية الاقاليم .

### اهداف المشروع:

يهدف المشروع الى توفير سكن اقتصادي ملائم للفقر فضلا عن توفير فرص عمل للعاطلين خلال فترة إنجاز المشروع .

### الشرائح المستفيدة:

ستوزع الدور على عدد من الشرائح الاجتماعية المتضررة منها:

- عوائل الشهداء التي استشهد معيها جراء الانفجارات وليس لها عقار اخر
- العوائل المتعوضة التي ليس لها معيل او شخص يعمل في القطاع الحكومي ويفضل العوائل التي تعيها امراة
- العوائل الفقيرة المهجرة في المحافظة

### في طريق الإنجاز

- تم تسليم الاراضي في بعض المناطق الى الشركة المنفذة.
- نسبة الانجاز الفعلي 12 %.

سابعاً: محافظة نينوى، بناء مساكن اقتصادية للفقر بتخصيص (20) مليار دينار (مدرج عام 2013):

بناء مجمع سكني اقتصادي على مساحة ارض تقدر بـ (215271) متر مربع ، يشمل المشروع بناء (500) وحدة سكنية بمساحة (150) متر مربع للوحدة السكنية الواحدة وبمساحة بناء (100) متر مربع ، ويتكون من طابق واحد يضم غرفتي نوم ومطبخ وصالة ومجمع خدمات ، وسيتم تبليط الشوارع الرئيسية والفرعية وصب الارصفة والخدمات (الكهرباء والمجاري وايصال الماء للدور) ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم، فضلا عن انشاء مباني خدمية تتضمن الآتي:

- مدرسة ابتدائية ذات ( 12 ) صف، مساحتها (1000) متر مربع
- مدرسة ثانوية ذات ( 12 ) صف، مساحتها ( 1000 ) متر مربع
- جامع مساحته (400) متر مربع
- مستوصف مساحته (700) متر مربع
- مجموعة مواقف سيارات ومواقع تجارية (اسواق) ومناطق خضراء (حدائق)

ينفذ المشروع خلال فترة (12-15) شهر

### اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى :

- توفير سكن ملائم لشريحة مهمة من المجتمع ذات الدخل المحدود (دخل يقع تحت خط الفقر)
- المساهمة بالحد من ازمة السكن الحاد في المحافظة
- تشجيع الهجرة العكسية ( الهجرة من المدينة الى الريف ) حيث ان موقع المشروع يقع خارج مدينة الموصل .
- خلق فرص عمل اضافية تساهم بالحد من ظاهرة البطالة
- تقليل الاضرار الاجتماعية التي يمكن ان تنشأ مثل هذه الشرائح عند عدم توفر سكن ملائم لهم.
- يعد هذا المشروع نواة لمشاريع مشابهة تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام ويمكن ان تساهم بها الحكومات المحلية مستقبلا لرفع المستوى المعاشي لمواطنيها

### الشرائح المستفيدة :

يخدم المشروع حوالي (500) اسرة فقيرة اي ما يعادل (3000) فرد.

عاشراً: محافظة كركوك ، تنفيذ مجمعين سكنيين ، بتخصيص قدره (7.5) مليار دينار لكل مجمع من المجمعين (مدرج في عام 2013).

يتكون المشروع من بناء مجمعين سكنيين على عرصية مساحتها (35) دونم تقريبا، يضم كل مجمع (150) وحدة سكنية على شكل دور منفصلة بطابق واحد، تبلغ مساحة البناء للدار الواحدة (100) متر مربع من مساحة السكن (150) متر مربع ، وتحتوي على غرفتي نوم ومطبخ وغرفة معيشة مع مرافق وحمّام ومخزن ومناور داخلية عدد 2 وحديقة امامية مع ممشي وكراج ، مدة تنفيذ المشروع تقدر بـ (360) يوم عمل لكل من المجمعين.

#### اهداف المشروع

يهدف المشروع الى توفير سكن ملائم لشريحة من المواطنين المتعاضين وذوي الدخل المحدودة وتوفير فرص عمل في المدينة طيلة فترة انجاز المشروع .

#### الشرائح المستفيدة:

توفير السكن الاقتصادي لـ (150) اسرة فقيرة لكل مجمع اي ما يعادل (900) فرد .

#### في طريق الانجاز

- بدأ التنفيذ في المشروع نهاية عام 2013 بعد اختيار شركة اجنبية (تركية) من اصل 6 شركات تم دعوتها مباشرة
- نسبة الانجاز 7 %

احد عشر : محافظة ذي قار ، بناء مجمع سكني اقتصادي وبتخصيص قدره (40) مليار دينار (مدرج في عام 2013)

يتضمن المشروع انشاء مجمع سكني افقي اقتصادي ضمن مساحة ارض تبلغ (58) دونم، يضم دور سكنية افقية بمساحة (200) متر مربع للدار الواحدة تتلائم مع بيئة الحضر التي تعيشها العوائل ، وبعده دور اجمالي يصل الى 356 دار سكنية وابنية خدمية متكاملة مع شبكات البنى التحتية لهذا المجمع

#### اهداف المشروع

- توفير الوحدات السكنية لمواطني المحافظة التي تعاني من الفقر، وسد جزء من الحاجة السكنية في المحافظة
- تطوير المنطقة الحضرية من خلال انشاء مجمعات سكنية مخدمية بابنية عامة كمحلة سكنية متكاملة تعمل لخدمة اهالي القضاء ، بالإضافة الى توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل من خلال اعمال البناء في المجمع السكني. تحسين دخل الاسر الفقيرة بتوفير المبالغ التي كانت تدفع بدلاً للإيجار.

تاسعاً: محافظة الانبار ، بناء دور سكنية اقتصادية ، بكلفة وتخصيص قدره (15) مليار دينار (مدرج في عام 2013)

ويشمل المشروع بناء (365) دار اقتصادية في اقصية الرمادي ، الفلوجة ، هيت ، حديثة ، عنه ، راوه ، القائم ، الرطبة ، تشيد الدار الواحدة على قطعة ارض بمساحة (200) متر مربع وتضم غرفة نوم كبيرة وغرفة نوم صغيرة وصالة ومطبخ وحمّام ومرافق صحية مع حديقة وكراج ، مدة انجاز المشروع هي 6 اشهر من تاريخ تسلم الارض.



بناء دور اقتصادية للفقراء في محافظة الأنبار

#### اهداف المشروع

يهدف المشروع الى تقليل معاناة الفقراء من مشكلات تدني نوعية السكن والاكتظاظ والتلوث وعدم ملائمة البنى التحتية والتي تعكس الحرمان الذي يعاني منه الفقراء لذا فان هذا المشروع يهدف الى توفير السكن الملائم لفقراء المحافظة

#### الشرائح المستفيدة :

يخدم المشروع تقريبا (365) اسرة فقيرة اي ما يعادل (2190) فردا .

#### في طريق الانجاز

ينفذ المشروع في الاقصية وبنسب انجاز متفاوتة وكالاتي:  
جدول 6 : توزيع الوحدات السكنية حسب اقصية المحافظة

القضاء	عدد الدور	نسب الانجاز
الرمادي	100	40 %
الفلوجة	100	40 %
هيت	40	70 %
القائم	40	15 %
حديثة	30	35 %
الرطبة	25	15 %
عنه	15	40 %
راوه	15	50 %
المجموع	365	38 %

## الشرائح المستفيدة :

يخدم المشروع حوالي (356) أسرة اي بما يعادل (2136) نسمة من الفقراء في البيئة الحضرية.

## في طريق الانجاز:

لم يبدأ تنفيذ المشروع في عام 2013، اذ تم تقديم دعوات مباشرة الى شركات متخصصة والتي قدمت بدورها عطاءات اعلى من الكلفة التخمينية للوحدات السكنية مما حدا بالمحافظة باعادة النظر بالكلف التخمينية ودراسات المشروع.

اثني عشر: محافظة ميسان، انشاء مساكن اقتصادية للفقراء بكلفة وتخصيص (25) مليار دينار (مدرج في عام 2013)

يضم المشروع مباني سكنية عدد (625) وحدة سكنية تبنى بالمواد الانشائية المتيسرة محليا مثل البلوك والطابوق وغيرها من المواد، تصل مساحة قطعة ارض الدار الواحدة داخل مركز المحافظة (200) متر مربع وفي الاقضية والنواحي (250) متر مربع ومساحة البناء للدار الواحدة (100) متر مربع او (120) متر مربع وسيتم تنفيذ الخدمات (الطرق، شبكة الماء، شبكة الكهرباء) من موازنة تنمية الاقاليم.

## اهداف المشروع :

- يساعد المشروع في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال توفير السكن الملائم
- سد جزء من الحاجة السكنية في المحافظة التي تعاني من نقص السكن الحاد.
- تطوير المنطقة الحضرية من خلال انشاء الدور السكنية المخدمة بابنية عامة مكونة محللة سكنية متكاملة
- توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل علما ان الايدي العاملة الماهرة وغير الماهرة متوفرة
- تحسين دخل الاسرة الفقيرة بتوفير المبالغ التي كانت تدفع كبدل للإيجار.

## الشرائح المستفيدة :

يخدم المشروع حوالي (625) أسرة وما يعادل (3750) فردا في المحافظة.

## في طريق الانجاز:

اعلن عن المشروع في شهر اب 2013، ولعزوف الشركات عن التقديم بسبب قلة الكلفة المقدرة للدار الواحدة في الدراسات

التي اعدت والتي كانت حوالي (33) مليون دينار، قامت المحافظة بأعادة دراسة المشروع من خلال تقليل عدد الدور وزيادة كلفة الدار الواحدة لتصل الى (55) مليون دينار لبناء (400) وحدة سكنية بدلا عن (625).

ثلاثة عشر : محافظة الديوانية ، انشاء وحدات سكنية اقتصادية مع مجمع ماء ، بكلفة وتخصيص (15) مليار دينار (مدرج في عام 2013)

المشروع هو احد اولويات المحافظة من تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013، ويتكون من :

• انشاء وحدات سكنية عمودية في ناحية الشافعية - مقاطعة 5 ام عباسيات جنوب غرب المحافظة، وبمدة تنفيذ (240) يوما.

• يضم المشروع 162 مبنى سكني عمودي ، يتكون كل مبنى سكني من شقتين تستوعب كل منها (6) اشخاص وتتكون كل شقة من غرفتي نوم ومطبخ وغرفة معيشة ومجموعة صحية، علماً أن الخدمات اللازمة للمشروع (الماء، الكهرباء، الطرق) وغيرها ستنفذ كمرحلة ثانية بعد انجاز مشروع البناء، علماً أن كلفة المبنى السكني العمودي حوالي 40 مليون دينار. ينفذ المشروع بطريقة البناء الجاهز وبصورة عمودية حيث تعتقد الحكومة المحلية في المحافظة ان مثل هذا النمط من البناء يعطي جمالية عند مقارنته بالابنية الافقية فضلا عن سهولة التنفيذ وقلة الكلفة.

• مشروع تجهيز ونصب مجمع ماء سعة (200) متر مكعب / ساعة مع مد شبكة انابيب بلاستيكية باقطار (315،250،160،110) ملم وبنائية خدمة وحوض تغطيس ومولدة كهربائية (500) KV وتعد مديرية ماء محافظة الديوانية هي المسؤولة عن توفير المواد الأولية لغرض تشغيل المجمع وايصال الماء الصالح للشرب لاهالي المجمع السكني للفقراء

## اهداف المشروع :يهدف المشروع الى

التخفيف من ظاهرة انتشار دور المتجاوزين للعوائل الفقيرة في احياء المحافظة من خلال توزيع الوحدات السكنية لهم بعد اكتمال هذا المشروع كما يسهم المشروع بتشغيل الايدي العاملة والتي معظمها من ذوي الدخل المحدود ، اما مجمع الماء فسيؤمن الماء الصالح للشرب للعوائل الفقيرة التي تسكن المجمع .

محافظة بغداد للحد من عمليات الانتشار العشوائي وبالتالي الحفاظ على شكل وتخطيط المدينة مما يبقي الشكل الحضاري والعمراني ومن ناحية أخرى إيجاد الحلول لمشكلة السكن بالنسبة للشرائح الفقيرة لأنها تعتبر من المشاكل الرئيسية لها.

#### اهداف المشروع :

- تقليل مشكلة السكن لشرائح الفقراء في المجتمع
- إيجاد فرص عمل جديدة ومحاولة الحد من مشاكل البطالة.

#### الشرائح المستفيدة :

يخدم المشروع حوالي (96) أسرة اي ما يعادل (576) فرد من الفقراء في المحافظة .

#### في طريق الانجاز

- تم يبدأ التنفيذ في عام 2013 بسبب اعتراض وزارة التخطيط على كلفة البناء للوحدة السكنية الواحدة حيث قدمت محافظة بغداد دراسات وتصاميم المشروع بكلفة (140) مليون دينار لبناء الوحدة السكنية الواحدة الذي يتعارض وكلف السكن الاقتصادي الذي يتراوح بين (35 - 60) مليون للوحدة الواحدة .
- تقوم محافظة بغداد بالتنسيق مع وزارة الإعمار والسكان بتعديل الكشوفات التخمينية والتصاميم بما يتناسب مع المواصفات المعمول بها في بناء المساكن الاقتصادية لشمول أكبر عدد من الفقراء.

ستة عشر: وزارة الإعمار والسكان ، بناء مجمعات سكنية اقتصادية بتخصيص ( 50 ) مليار دينار ( مدرج عام 2013 )

يضم المشروع بناء وحدات سكنية في 5 محافظات وكالت:

1. محافظة المثنى / طحربة
2. محافظة صلاح الدين / يثرب
3. محافظة بابل / الشوملي
4. محافظة الديوانية / الشنافية
5. محافظة ذي قار / عكيكة

#### اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى توفير بيئة سكن مناسبة للفقراء من خلال توفير سكن اقتصادي ملائم يحل مشاكل تدني نوعية السكن والاكتظاظ .

#### الشرائح المستفيدة:

يخدم المشروع حوالي (324) أسرة اي (1944) فردا من الفقراء في المحافظة ، وسيكون توزيع المساكن بحسب العوائل الأشد فقرا وحرماناً .

#### في طريق الانجاز :

- اعلن عن المشروع خلال شهر تشرين الاول 2013 وأحيل الى الشركة المنفذة.
- نسبة الانجاز 5% .

اربعة عشر: محافظة البصرة ، بناء وحدات سكنية اقتصادية بكلفة وتخصيص (35) مليار دينار (مدرج في عام 2013)

تبنت المحافظة بناء (500) وحدة سكنية اقتصادية والذي يقع في قضاء المدينة / ناحية الامام الصادق، مقاطعة طرة بني منصور مع توفير خدمات، تبنى بالمواد الانشائية المتوفرة محليا، حيث تصل مساحة البناء للدار الواحدة الى ( 100 ) متر مربع ومساحة الدار في النواحي ( 250 ) متر مربع وفق نمط البناء الافقي وتشارك الدور كافة بالاسيجة مما يقلل تكاليف البناء وامكانية تقديم الخدمات البلدية وانشاء المدارس والمراكز الصحية وانشاء المجاري وكافة الخدمات.

#### الشرائح المستفيدة:

يخدم المشروع 500 أسرة ، وبما يعادل 3000 فردا من الفقراء في المحافظة

#### في طريق الانجاز:

- بسبب عدم كفاية الارض المخصصة للمشروع تم اضافة قطعة ارض تكميلية واعداد دراسات جدوى جديدة للمشروع.
- تم توجيه دعوات مباشرة الى 5 شركات اجنبية خلال شهر كانون الاول 2013

خمس عشر : محافظة بغداد، تنفيذ مجمع سكني متعدد الطوابق لإسكان الفقراء ، بكلفة (19.594) مليار دينار وتخصيص لعام 2013 (15) مليار دينار (مدرج في عام 2013) ..

يضم المشروع تنفيذ مجمعين في منطقة بسماية / النهروان /بغداد، يتكون كل مجمع من اربع عمارات كل عمارة تضم ثلاث طوابق، يحتوي كل طابق على (4) شقق سكنية مساحة الشقة تتراوح بين (120-140) متر مربع ..ويكون المجمعين متكاملين من ناحية الخدمات الاساسية (الماء، الطرق، المجاري)، تم اختيار هذا المشروع ضمن اولوية

## في طريق الانجاز

ثانياً: محافظة نينوى : مشروع تاهيل وتطوير مشاريع الماء في ناحية الشمال بتخصيص (10) مليار دينار (مدرج في عام 2013):

يتضمن المشروع تاهيل وتطوير مشاريع الماء ( لمجمعات الماء في حطين - اليرموك - خانصور القديمة ) وفرش الحصى الخابط للطرق الرابطة بين القرى وتبليط الشوارع المؤدية الى المجمعات المائية التابعة لناحية الشمال وتجهيز سيارات حوضية عدد 7 لمديرية ماء نينوى والتي تتولى مهام توزيع المياه الصالحة للشرب الى القرى النائية، وينفذ المشروع في ناحية الشمال في محافظة نينوى والتي تعاني من نقص في الماء الصالح للشرب وذلك لبعدهم الناحية عن مصادر المياه والاعتماد على مياه الابار لهذا الغرض .

## اهداف المشروع :

تجهيز مناطق في المحافظة تعاني من قلة توفر الماء الصالح للشرب، فضلاً عن توفير فرص عمل للعاطلين في تلك المناطق، كما ان هذا المشروع يخدم مناطق تضم قرى تعاني من تدني نسبة الطرق والشوارع الداخلية المبلطة مما يؤدي الى صعوبة الوصول الى المراكز الخدمية وخاصة في ظل صعوبة التنقل كون تلك المناطق جبلية

## الشرائح المستفيدة:

يخدم هذا المشروع سكان تلك القرى والبالغ عددهم ( 250 ) الف نسمة .

## في طريق الانجاز:

لم يبدأ التنفيذ في المشروع مطلع عام 2013 وذلك لتأخر فتح الحساب الاستثماري للمحافظة لغاية شهر كانون الاول 2013 ، والذي يعزى للاجراءات الروتينية لعمليات فتح الحساب الاستثماري في المحافظات وتم احالة مشروع المجمعات المائية والسيارات الحوضية الى جهة التنفيذ خلال كانون الاول 2013 ويجري تنفيذ باقي مكونات المشروع وبنسبة انجاز 9% .

## ثالثاً: محافظة كربلاء:

1- انشاء البنى التحتية لمنطقة الزكاريط في مركز المحافظة وقضاء عين التمر وجمع دوراالاقتصادية وبتخصيص (11.9) مليار دينار (مدرج في عام 2012):

وهي من مشاريع عام 2012 ويهدف المشروع الى توفير خدمة ملائمة لشريحة من المواطنين المتعاضين وذوي الدخل المحدودة وتوفير فرص عمل في المنطقة طيلة فترة انجاز المشروع .

- احييت الوحدات السكنية في محافظة الديوانية/ الشنايفية وبمدة تنفيذ 720 يوم.
- احييت الوحدات السكنية في محافظة ذي قار/ عكيكة وبمدة تنفيذ 540 يوم.
- تمر الوحدات السكنية في محافظة المثنى في مرحلة اعادة الاعلان ، والوحدات السكنية في محافظات بابل وصلاح الدين في مرحلة الدعوات المباشرة .

## اتخاذ اجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لمشاريع بناء الوحدات السكنية الاقتصادية

اولاً: محافظة ديالى : مشروع تنفيذ مجمعات ماء صالح للشرب بتخصيص (2.650) مليار دينار (مدرج في عام 2012):

يتضمن المشروع مد شبكات ماء لقرى ( ابو صيدا ، الاصلاح، الأحمير )

## اهداف المشروع :

تجهيز مناطق في المحافظة يصعب الحصول فيها على الماء الصالح للشرب للقرى المشمولة فضلاً عن توفير فرص عمل للعاطلين في تلك المناطق.

## الشرائح المستفيدة:

يخدم هذا المشروع سكان القرى اعلاه .

## في طريق الانجاز:

تم الاعلان عن المشاريع خلال عام 2013 وبسبب التغييرات الادارية في المحافظة تم ايقاف جميع الاحالات في القرى اعلاه عدا مشروع قرية الاصلاح الذي بلغت نسبة انجازه الفعلي (75%) .



مد شبكات ماء في محافظة ديالى

## جدول 7 : مكونات النشاط مع نسب الانجاز الفعلي

اسم المكون	موقع المكون	نسبة الانجاز الفعلي	الملاحظات والمعوقات
تنفيذ شبكة مجاري مع محطة المعالجة	قضاء عين تمر / منطقة الزكاريط	86 %	- العمل مستمر بتنفيذ فتحات التصريف الجانبية . - العمل مستمر بتنفيذ محطة الرفع
تنفيذ بناية لمقر الصيانة وتنفيذ شبكة ماء	قضاء عين تمر / منطقة الزكاريط	-	- تعديل الكشوفات من قبل الدائر الفنية في المحافظة
تنفيذ شبكة كهرباء	قضاء عين تمر / منطقة الزكاريط	-	- حاليا في مرحلة التهيئة للاعلان
تنفيذ مركز صيانة للكهرباء	قضاء عين تمر / منطقة الزكاريط	-	- يجري حاليا العمل على تعديل الكشوفات
تنفيذ شبكة اتصالات	قضاء عين تمر / منطقة الزكاريط	-	- تدقيق الكشف ومدولة حول تغيير المشروع .
تنفيذ تخطيط الطرق	قضاء عين تمر / منطقة الزكاريط	-	- تعديل كشوفات - طلبت المحافظة تعديل كلفة المشروع بكتاب قسم العقود 659 في 24/11/2013 .

2- انشاء البنى التحتية لمجمع دور واقتصادية واطئة الكلفة (1000) دار في مركز المحافظة بتخصيص قدره (9.8) مليار دينار (مدرج في عام 2013):

تم البدء بالنشاط في مطلع عام 2013 ، يمثل مشروع توفير البنى التحتية لمجمع دور اقتصادية تم بناءه سابقا بعدد (1000) دار ويتكون المشروع من :

- ❖ مشروع انشاء شبكة مجاري ثقيلة وشبكة امطار
- ❖ مشروع ايصال خط الماء المغذي للمجمع
- ❖ مشروع اعمال تخطيط لشوارع المجمع

## اهداف المشروع :

تقديم الخدمة الاساسية للعوائل الفقيرة التي تسكن المجمع .

## في طريق الانجاز

بلغت نسبة الانجاز الفعلي 48% والتي تمثل مرحلة حدل الارض مع قشط السببببب وصب الاسس لبنانية مركز صيانة الكهرباء فضلا عن بدء اعمال مجاري امطار / مياه ثقيلة .

3- دراسة وتصميم مشروع توفير البنى التحتية لمشاريع السكن في منطقة الشريفات بتخصيص قدره (400) مليون دينار (مدرج في عام 2013)

ويشمل المشروع توفير دراسة وتصاميم لـ :

- ❖ تنفيذ شبكة كهرباء
- ❖ انشاء بناية مركز صيانة الكهرباء
- ❖ استحداث مغذي من محطة الوند

### تنظيم الاسواق في الاحياء الفقيرة

اولاً: محافظة الديوانية: اثناء 400 كشك توزع على مراكز الوحدات الادارية في محافظة الديوانية وبتخصيص (2) مليار دينار (مدرج في عام 2012):

تم التخطيط لإنشاء (400) كشك لتوفير فرص عمل للفقراء فضلاً عن ضمان بيئة ملائمة محيطة بالسكن. توزعت (200) كشك منها في مركز محافظة الديوانية و(200) كشك توزعت على الاقضية والنواحي في محافظة الديوانية، مساحة الكشك الواحد (2x3) متر او (2.5x2.5) متر.

#### اهداف المشروع

يهدف المشروع الى تحسين البيئة المحيطة بسكن الفقراء من خلال فتح اسواق شعبية في المناطق الفقيرة في المحافظة فضلاً عن توفير فرص عمل للعاطلين من سكنة تلك المناطق وبما يدعم تحقيق التكامل البيئي في تلك المنطقة وتحقيق اكثر من هدف في الاستراتيجية.

#### الشرائح المستفيدة :

المشروع يوفر فرص عمل لـ 400 اسرة من اسر العاطلين الفقراء.

#### في طريق الانجاز

تم التعاقد مع احدى الشركات الحكومية التي باشرت بالتنفيذ وبنسبة انجاز 36 % من المشروع .

رابعاً: محافظة ديالى، تاهيل وتنفيذ شبكات كهرباء في المناطق الريفية بكلفة وتخصيص (5.230) مليار دينار (مدرج في عام 2013)

يتألف من (12) مشروع ويشمل تنفيذ وتاهيل شبكات كهرباء في قرى متعددة داخل المحافظة وكالاتي:

- السلام - قرية الكبة
- الخالص - قرية السندية
- العبارة - قرية الاعور
- العظيم - قرية ابو طريمش
- المنصورية - قرية حبيب العبد الله
- بني سعد - قرية محمد الكاظم
- جلولاء - منطقة الكحلاء
- الخالص - قرية سفيط
- مركز قضاء المقدادية
- مركز قضاء خانقين - قرية جسر حلوان
- مركز قضاء بلد روز - قرية جواد الحجى
- مندلي - قرية عبد الله كيطان

#### اهداف المشروع :

- توفير شبكة الكهرباء بصورة مستمرة للمناطق والقرى الفقيرة
- تاهيل الطاقة الكهربائية للقرى والمناطق البعيدة

#### الشرائح المستفيدة :

سكان القرى المشار اليها اعلاه.

#### في طريق الانجاز

ينفذ المشروع حسب النسب الآتية، قرية الكبة / السلام (20%)، قرية ابو طريمش / العظيم (30%)، قرية سفيط / الخالص (20%) قرية عبد الله كيطان / مندلي (25%).

### ثالثاً: وضع برنامج لرفع القدرات لتأهيل وتدريب العاملين على حسن تطبيق نظام الشبكة

لتحسين العمل في نظام الشبكة تعتمد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وضع برنامج لرفع القدرات وتأهيل وتدريب العاملين على حسن تطبيق نظام الشبكة وذلك من خلال التوسع في إدخال وأشراك موظفي شبكة الحماية الاجتماعية في الدورات التدريبية والتي بلغ عددها 47 دورة في عام 2013، شارك فيها 131 موظف، كما بلغ عدد الندوات 52 ندوة شارك فيها 591 موظف، وبلغ عدد الورش 22 ورشة، شارك فيها 122 موظف، لرفع الكفاءة ومستوى الاداء وإكساب المشاركين المهارات والمعارف التي تصب في تطويرهم من جهة ورفع مستوى الدائرة من جهة أخرى وذلك بمشاركةهم في تلك الدورات التي تقام في نفس المحافظة والتنسيق مع الجامعات والمكاتب الاستشارية فيها بغية معالجة تكاليف السفر والإيفاد في حال عدم توفرها للاشتراك في تلك التي تقام في محافظة بغداد .

### رابعاً: وضع تقارير انظمة رقابية صارمة على اليات العمل وتنفيذ القانون من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

للتأكد من دقة تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية تم وضع تقارير انظمة رقابية صارمة على اليات العمل وتنفيذ القانون من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبلور برسم خطة سنوية لتنفيذ 60 زيارة تدقيقية تفشيشية في بغداد والمحافظات (عدا اقليم كردستان) حيث تكون الخطة زيارة المحافظة كل فصل لمتابعة الامور المالية والية عمل الشبكة وتدقيق المبالغ المسترجعة من المتجاوزين وتدقيق الاضابير والبيانات المدخلة على برنامج الشبكة وتقوم اللجنة بتحديد اعداد المتجاوزين على الشبكة واتخاذ الاجراءات اللازمة باسترداد الاموال واحالتهم الى القضاء ولم يتم تحقيق جميع الزيارات التفشيشية الى اقسام الرعاية في المحافظات في عام 2013 لقلّة الكادر المتخصص وعدم توفير تخصيص مالي على حساب الايفاد.

### خامساً: تصميم برنامج اعلامي موجه للمواطنين لتوعيتهم بحقوقهم وشروط الشمول والعقوبات الرادعة في حالة التجاوز على الشبكة

تم تصميم برنامج اعلامي موجه للمواطنين لتوعيتهم بحقوقهم وشروط الشمول والعقوبات الرادعة في حالة التجاوز على الشبكة تضمن توجيه حملات اعلامية تهدف الى نشر الوعي بين الفئات المستحقة لأعانة الشبكة واستقبال شكاوي المواطنين وبمعدل (50) شكوى يومية، يتم الاجابة عليها خلال 48 ساعة.

### المحصلة الخامسة: حماية اجتماعية فعالة للفقراء

على الرغم من تمتع المجتمع العراقي باساليب التكافل العشائري والديني ( الزكاة، والصدقات، الخ) الا ان مستوى تنفيذ تلك الممارسات لم يكن كافياً لتحقيق العدالة الاجتماعية كما انها لم تكن تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية، لذا اتجهت الحكومة العراقية الى نظام شبكة الحماية الاجتماعية في نهاية عام 2005 لمساعدة الفقراء بالشكل الاساس، وقد مر هذا النظام بتطورات عدة ليضي بمستلزمات حياة الفقراء واحتياجاتهم وتم تحديد الفئات المستهدفة منهم وتابعت الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر تنفيذ هذا النظام من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بآليات المتابعة الخاصة بها.

### اولاً: نظام رصد وتقييم واصلاح نظام البطاقة التموينية

نظراً للحاجة الى ممارسات اوسع من هذا النظام لتحقيق الحماية الاجتماعية الفعالة، ولتنفيذ غير الفعال لنظام البطاقة التموينية بوضعه الحالي، والذي استوجب ايجاد حلول ناجعة له، فقد اتجهت الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر للعمل مع جهات عدة لغرض تقليص فئات المستفيدين منه وجعله مقتصرًا على الفقراء. اذ يجري العمل على اعتماد نظام البطاقة التموينية الذكية لتحقيق الاستهداف الدقيق للفقراء والفئات الهشة فضلاً عن تحسين جودة مفرداتها وتيسير الحصول عليها من عدة منافذ ضمن نظام يساهم في تنفيذه عدة جهات ويضمن عدم تسرب مزايا البطاقة التموينية لغير المحتاجين وبما يكفل منع هدر موارد الدولة تحت مظلة نظام اصلاح حديث ومتكامل، اذ تم عقد عدة اجتماعات لتحديد الآليات والتقنيات المطلوبة، وقدمت الجهات المتخصصة عروضها وبدأت الجهات العليا ببلورة نظام شامل يضمن وصول البطاقة التموينية لمستحقيها بانسيابية عالية وبما يساهم في تفعيل دور القطاع الخاص في توفير المواد التموينية يصاحبها جودة وشفافية في العمل.

### ثانياً: تطوير قاعدة البيانات للاسر المشمولة وتحديثها بشكل مستمر

انشأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبدعم فني من جهات دولية ربط شبكي بين أقسام شبكة الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات كافة (عدا إقليم كردستان) والذي انجز العمل فيه في شهر نيسان 2013، لغرض تطوير قاعدة بيانات للاسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية وتحديثها بشكل مستمر .

### سادسا: وضع آلية لربط مبلغ الاعانة بمعدل التضخم مع امكانية توفير معدلات التضخم للسلع الاساسية

المحصلة السادسة: تفاوت اقل بين النساء والرجال الفقراء تستهدف الاستراتيجية تقليل التفاوت بين النساء والرجال وتمكين المرأة اقتصاديا عبر تحقيق التكافؤ في التعليم وفرص العمل، والحصول على دخل منصف يعد من المرتكزات الاساسية لتخفيف فقر النساء. تلقتي هذه المحصلة والهدف الرابع من الاهداف الانمائية للالافية "تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" وتعمل بموازاته لخلق مستقبل افضل للمرأة العراقية يجعلها قادرة على تنشئة جيل متعلم وواعي من خلال دعمها معرفيا واقتصاديا واجتماعيا.

لضمان منح مبلغ اعانة مناسب فقد تم وضع الية لربط مبلغ الاعانة بمعدل التضخم مع امكانية توفير معدلات التضخم للسلع الاساسية وفقا لقانون شبكة الحماية الاجتماعية لعام 2013 الذي يشير الى ربط مبلغ الاعانة بمعدل التضخم السنوي، اذ يقوم الجهاز المركزي للاحصاء سنويا باحتساب معدلات التضخم السنوية والذي تستعين به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحديد مبلغ الاعانة، كما ان قانون شبكة الحماية الاجتماعية لعام 2013 شمل المتسولين بنظام الشبكة وترك الباب مفتوحا لشمول فئات اخرى مثل المهجرين من خلال المادة -1 اثنيا في القانون التي نصت على ان يكون لمجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة شمول فئات اخرى من غير الفئات المذكورة في القانون. علما ان هناك نشاط في وثيقة الاستراتيجية يشير الى وضع الية لشمول المهجرين بنظام شبكة الحماية الاجتماعية الا ان وزارة العمل بينت انها اغلقت ملف المهجرين لانتفاء الحاجة لذلك ولكون هذه الظاهرة غير ثابتة وتم تبنيها من قبل وزارة الهجرة والمهجرين.

### سابعا: تحديث خط الفقر الوطني سنويا بالاستفادة من مسوحات الاسر والصادر الاحصائية الاخرى لتحديد الاسر المستهدفة بالاعانة

في السياق ذاته يقوم الجهاز المركزي للاحصاء بتحديث خط الفقر الوطني سنويا بناء على نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي المستمر الذي ينفذه سنويا لتحديد الاسر المستهدفة بمبلغ الاعانة تأكيدا على دقة الاستهداف ومنع تسرب المزايا لغير المستحقين.

ركزت أنشطة الاستراتيجية على المرأة الريفية بصورة خاصة فلا يخفى على احد ما تفرضه التقاليد الاجتماعية في الريف على وجه الخصوص من انماط اجتماعية تولد الفقر وتعيد انتاجه عبر الاجيال، لذا كان من اولويات الاستراتيجية دعم المرأة الريفية لخلق مستقبل مزدهر للمجتمع. وعلى الرغم من التشريعات التي تدعم المرأة في الدستور العراقي ومنها اقرار الدستور العراقي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وعضويتها في البرلمان ومجالس المحافظات على ان لا تقل نسبة مشاركة النساء في البرلمان عن 25 %، وحق المرأة في العمل وحقوق المرأة في قانون الاحوال الشخصية، الا ان العوامل والنظرة المجتمعية لا تزال تحدد انماط تعليم وعمل المرأة العراقية في الريف بصورة خاصة والذي ينعكس على دورها وفعاليتها في المجتمع العراقي، مما حدا بالاستراتيجية بتبني عدد من الأنشطة تنفذها عدد من الوزارات والمحافظات كان بعضها يحقق اكثر من هدف في الاستراتيجية ويستهدف الفقر باكثر من زاوية مثل مشروع توزيع ابقار حليب على الارامل الذي تبنته محافظة صلاح الدين من تخصيصات الاستراتيجية من الموازنة الاستثمارية لعام 2012 والذي يحقق دخل اعلى من العمل ويدعم تمكين المرأة اقتصاديا في ريف اضية المحافظة.

تبنت وزارة الصحة من تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2012 مشروع بناء قدرات وزيادة الوعي الصحي وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الاولية في المناطق الفقيرة لمتطوعات صحيات والذي يحقق هدفا مزدوجا من خلال بث الوعي الصحي ودعم المرأة معرفيا في المناطق الفقيرة والذي تم تحقيقه من خلال 698 دورة تدريبية صحية في محافظات العراق كافة (عدا اقليم كردستان).

التحديات التي واجهت استراتيجية التخفيف من الفقر

1. محدودية تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة السنوية حالت دون وضع خطة شاملة ومتكاملة لتخفيف الفقر سنويا واثرت على حجم مشاريع تخفيف الفقر المنفذة في المحافظات
2. تأخر اقرار الموازنة سنويا ادى على تأخر وصول التخصيصات الى الجهات المعنية بالتنفيذ والذي انعكس على تاريخ بدء المشاريع ونسب التنفيذ.
3. لم تستوعب خطة التنمية الوطنية أنشطة وثيقة استراتيجية التخفيف من الفقر والاستراتيجيات الوطنية الاخرى ولم تتبنى تنفيذها على نطاق واسع وبتكامل مع مشاريعها وتوجهاتها، فضلا عن تقاطع وتكرار عدد من الأنشطة الاستراتيجية مع الاستراتيجيات اخرى وبرامج تنفيذها الحكومة مثل استراتيجية سوق العمل واستراتيجية الشباب واستراتيجية التربية والتعليم واستراتيجية لذا قد يكون من الاجدى توحيد الجهود ضمن مضملة خطة التنمية الوطنية منعا للتقاطع والتكرار.
4. واجهت استراتيجية التخفيف من الفقر تحدي تخصيص قطع اراضي لمشاريعها وانشطتها حد من الاسراع في تقديم مستلزمات ادراج تلك المشاريع للجهات المعنية في الوقت المحدد وأخر البدء بتنفيذها.
5. ضعف ومحدودية التواصل والتنسيق ما بين نقاط الارتكاز والوزارة او المحافظة العائدين لها انعكس على تحديد اولويات تخفيف الفقر لتلك الجهات بالوقت المحدد وادى الى تأخير تزويدنا بتقارير المتابعة ضمن الخطة المقررة لذلك.
6. عدم وجود خارطة للفقر ادى الى خضوع اولويات تخفيف الفقر لميول ورغبات الجهات المسؤولة وانعكس على حيادية وموضوعية اختيار بعض تلك الاولويات.
7. عدم وجود ضوابط لمسائلة الوزارة او المحافظة عن نسب تنفيذ مشاريع وأنشطة تخفيف الفقر ادى الى تأخر تنفيذ عدد غير قليل منها وتلك في تحقيق اهداف الاستراتيجية ضمن الوقت المحدد.
8. عدم وجود نماذج قياسية للدور الاقتصادية للفقراء معتمدة من الجهات المعنية ادى الى خضوع مواصفات تلك الدور الى ميول ورغبات الجهات المنفذة والمستفيدة وانعكس على تقديم مستلزمات ادراج تلك المشاريع في الوقت المحدد والذي اثر على موعد التنفيذ والانجاز وكذلك كلف بناء هذه الدور.

كما تنفذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من موازنتها التنموية سنويا عدد من الأنشطة تدعم المرأة وتمكنها معرفيا واقتصاديا، مما تبلور في تنفيذ 53 زيارة متابعة الى معظم المراكز التدريبية المنتشرة في بغداد والمحافظات والتي تهىء برامج تدريبية لتأهيل النساء ضمن ورش ( خياطة، كوافير، حاسبات، لغة انكليزية، صناعات جلدية، الكترون ... وغيرها ) من خلال نظام متابعة مستمر لتقويم برامج تدريب النساء وتأهيلهن، اثمرت هذه الزيارات عن زيادة الاقبال على الدورات التدريبية، اذ بلغت 11802 متدربة في عام 2013، فضلا عن ما تم تنفيذه في عام 2012 والبالغ 32 زيارة متابعة في بغداد والمحافظات والذي تمخض عن 8045 متدربة ليبلغ العدد في العامين (19847) متدربة.

كما تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برامج توعوية موجهة للنساء لاسيما في الريف العراقي للالتزام بنظام الضمان الاجتماعي والذي بث الوعي لـ (12996) امرأة فقيرة من خلال زيارات التفتيش وتوزيع دليل التفتيش على النساء في الريف العراقي وقد اثمر عن شمول (14206) امرأة فقيرة بالضمان الاجتماعي. كما نفذت محافظة الانبار هدم واعادة بناء اربع مدارس ثانوية للاناك في قرى ومناطق فقيرة في المحافظة خلال عامي 2012 و2013 وانجزت العمل بالكامل خلال عام 2013 لتحقيق بيثة دراسية مناسبة للاناك وخاصة في المناطق الريفية.


وعلى الرغم من كل الجهود السابقة لتمكين المرأة تروم الإدارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر توسيع عملها باتجاه دعم المرأة الريفية، اذ وجهت المحافظات في عام 2014 بتبني انشاء مراكز مجتمعية للمرأة الريفية بغية تأهيلها ودعمها ضمن مهن سوق العمل المتوفرة وفق خطة مدروسة تنفذ بالتوازي مع الاهداف الانمائية والتكامل مع جهود وزارة المرأة بهذا الشأن وتكون ايضا كمراكز لمحو الامية وتعليم النساء الفقيرات.

### خطة تخفيف الفقر من تخصيصات الاستراتيجية من الموازنة الاستثمارية لعام 2014


دأبت الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر على متابعة خططها وتحديد التحديات التي تواجهها ووضع الحلول الناجعة لها وتحديد الدروس المستفادة من كل خطة لوضع خطط قائمة وفق مبدأ التحسين المستمر.

واستناداً الى هذا المبدأ فقد تم تخصيص 865 مليار دينار من الموازنة الاستثمارية لعام 2014 وقد تم توزيعها على المحافظات وفقاً لنتائج قياس الفقر الذي تم بالاعتماد على بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة الذي نفذته الجهاز المركزي للإحصاء في عام 2012، الا ان هذا التخصيص شمل بالتخفيض الذي طال الموازنة الاستثمارية والبالغ 15 % (علماً ان تخصيصات خطط تخفيف الفقر كان المفترض ان لا تشمل بالتخفيض) ليصل المبلغ المرصود لخطة تخفيف الفقر لعام 2014 الى حوالي 735 مليار دينار.... وقد تم توزيع التخصيصات كالآتي:

شكل 4: توزيع تخصيصات تخفيض الفقر من الموازنة الإستثمارية لعام 2014 على الجهات المعنية

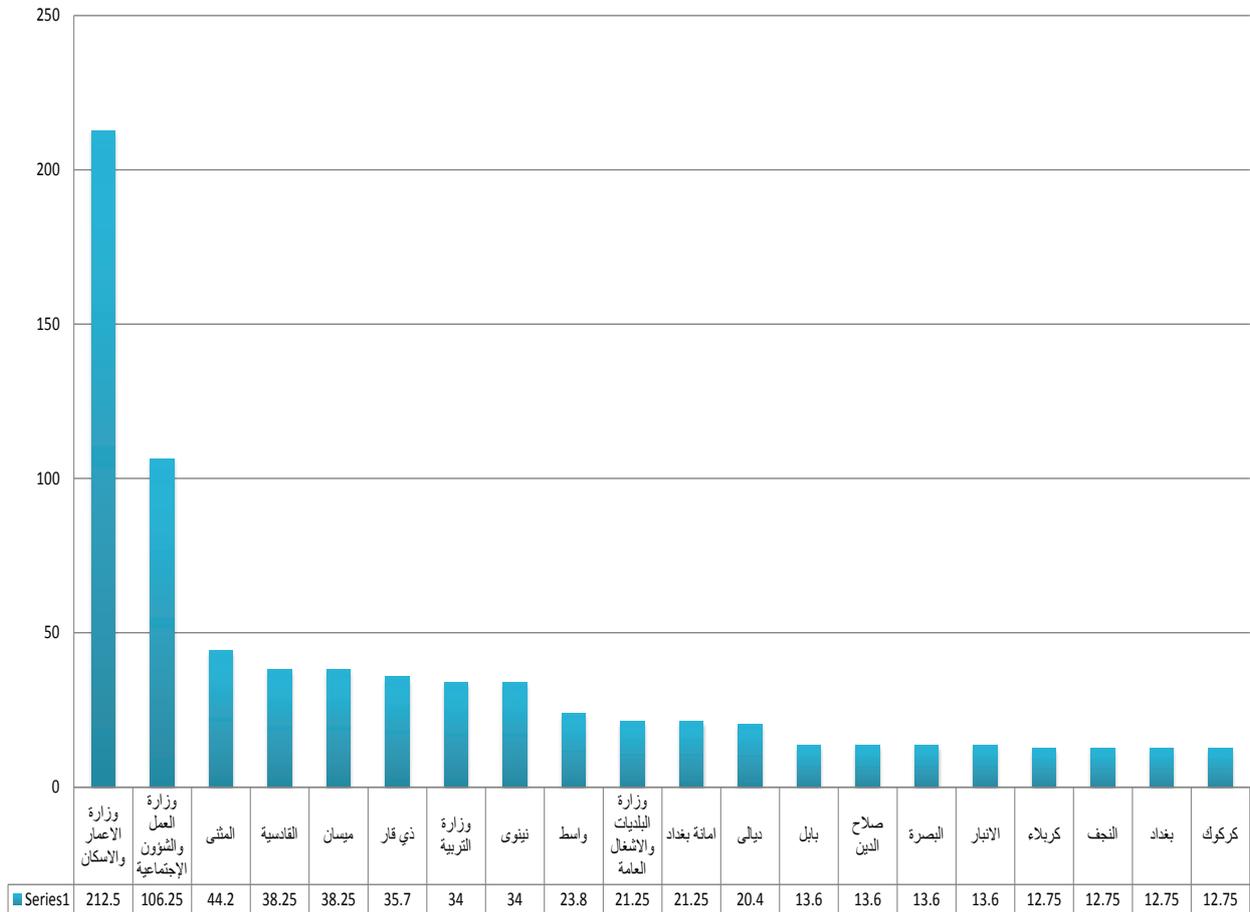

ملحق (1)  
إستثمارات متابعة أنشطة الوزارات والمحافظات الممولة من  
تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة  
الإستثمارية لعام 2013





## وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة الراج النشاط (4)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	الكلفة الكلية مليار دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز الفتي المتحقق (8)
						البدء	الانتهاء	
1.2.1	دعم مشروع صندوق القروض الصغيرة للفقراء	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	2012	168.750	168.750	اليول 2012	مستمر	32 %

## مكونات النشاط

اسم المكون	موقع المكون	نسبة الانجاز الفعلي	الملاحظات والملاحظات
دعم مشروع صندوق القروض الصغيرة للفقراء	عموم المحافظات (عدا إقليم كردستان)	32 %	تم المصادقة على 6722 معاملة مستفيد وصرف 2743 صك خلال الفترة السابقة من اصل 20877 معاملة مخططة في العامين 2012 - 2013

## وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الأجزاء الفنى المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السئوي مليار دينار (5)	سنة اذراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البدء						
-	-	2013	30	30	2013	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	تنظيم برامج تدريب الفقراء الذين استلموا التقروض لمساعدتهم في استخدامها	3.2.1

## مكونات النشاط

الملاحظات والمعرفات	نسبة الأجزاء الفئلي	موقع المكون	اسم المكون
تم اعادة ورش اللحام وتوقيع العقد وحاليا الشركة في طور التجهيز	—	المحافظات (عدا إقليم كردستان)	تجهيز ورش نموذجية للحام
تمت الاحالة وابتانتظار توقيع العقد	—	المحافظات (عدا إقليم كردستان)	تجهيز ورش مصاعد وسلام كهربائية
سيتم اعادة دراسة مضمون الكشوفات من قبل فريق العمل المختصة بعد تعذر احوالها	—	المحافظات (عدا إقليم كردستان)	تجهيز ورش طباعة بالشبكة الحريرية (طباعة السكرين)
سيتم اعادة دراسة مضمون الكشوفات من قبل فريق العمل المختصة بعد تعذر احوالها	—	المحافظات (عدا إقليم كردستان)	تجهيز ورش خياطة
سيتم اعادة دراسة مضمون الكشوفات من قبل فريق العمل المختصة بعد تعذر احوالها	—	المحافظات (عدا إقليم كردستان)	تجهيز ورش لصيانة السيارات
سيتم اعادة دراسة مضمون الكشوفات من قبل فريق العمل المختصة بعد تعذر احوالها	—	المحافظات (عدا إقليم كردستان)	تجهيز ورش تكييف وتبريد
سيتم اعادة دراسة مضمون الكشوفات من قبل فريق العمل المختصة بعد تعذر احوالها	—	المحافظات (عدا إقليم كردستان)	تجهيز ورش الموبايل
سيتم اعادة دراسة مضمون الكشوفات من قبل فريق العمل المختصة بعد تعذر احوالها	—	المحافظات (عدا إقليم كردستان)	تجهيز ورش الالكترون
سيتم اعادة دراسة مضمون الكشوفات من قبل فريق العمل المختصة بعد تعذر احوالها	—	المحافظات (عدا إقليم كردستان)	تجهيز ورش الكرافتر وتجميل السيدات
سيتم اعادة دراسة مضمون الكشوفات من قبل فريق العمل المختصة بعد تعذر احوالها	—	المحافظات (عدا إقليم كردستان)	تجهيز ورش للصناعات الجلدية
سيتم اعادة دراسة مضمون الكشوفات من قبل فريق العمل المختصة بعد تعذر احوالها	—	المحافظات (عدا إقليم كردستان)	تجهيز ورش للصناعات الغذائية
سيتم اعادة دراسة مضمون الكشوفات من قبل فريق العمل المختصة بعد تعذر احوالها	—	المحافظات (عدا إقليم كردستان)	انشاء ورشة متكاملة في المصوغات الذهبية
تمت الاحالة وابتانتظار توقيع العقد	—	المحافظات (عدا إقليم كردستان)	تجهيز رفاعات شوكية
تمت الاحالة وابتانتظار توقيع العقد	—	المحافظات (عدا إقليم كردستان)	تجهيز مولدات
سيتم اعادة دراسة مضمون الكشوفات من قبل فريق العمل المختصة بعد تعذر احوالها	—	المحافظات (عدا إقليم كردستان)	تجهيز اجهزة تبريد وتكييف
سيتم اعادة دراسة مضمون الكشوفات من قبل فريق العمل المختصة بعد تعذر احوالها	—	المحافظات (عدا إقليم كردستان)	تجهيز باصات نقل
سيتم اعادة دراسة مضمون الكشوفات من قبل فريق العمل المختصة بعد تعذر احوالها	—	المحافظات (عدا إقليم كردستان)	تجهيز حاسبات وماسح ضوئي وطابعات و اجهزة استنساخ
سيتم اعادة دراسة مضمون الكشوفات من قبل فريق العمل المختصة بعد تعذر احوالها	—	المحافظات (عدا إقليم كردستان)	تجهيز اجهزة عرض

## وزارة الصحة

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الإنجاز الفني المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		التكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	سنة الراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	أسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البداية						
100 %	شباط 2013	أيلول 2012	3	3	2012	وزارة الصحة	تدريب ملاكات مراكز الرعاية الصحية الأولية	1.1.2

## مكونات النشاط

الملاحظات والملاحظات	نسبة الإنجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
بدأ النشاط في شهر أيلول 2012 في جميع المحافظات بواقع (10) دورات نفذت في الحضر و (10) نفذت في الريف شهريا في كل دائرة صحة عدا دائرة صحة النجف فقد تخصصت (3) مناطق (2) ريف و 1 حضر) وشمل الدورة الواحدة (30) متطوعة واستمر النشاط حتى انجز في مطلع عام 2013 ، كما انجز النشاط شراء اجهزة ومعدات مثل شاشات عرض (LCD) تعرض ارشادات صحية وبرامج توعية في المراكز الصحية الفرعية واجهزة داتا شو لأعراض التدريب	100 %	جميع المحافظات/ عدا القليم كردستان	بناء القدرات وزيادة الوعي الصحي وتعزيز الصحة للمجتمعات الفقيرة

## وزارة الصحة

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الانجاز الفتي المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السوي مليار دينار (5)	سنة ادراج النشاط (4)	الجهة الممولة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البدء						
20 %	2014	2012	50	50	2012	وزارة الصحة	بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة	2.1.2

## مكونات النشاط

الملاحظات والمعوقات	نسبة الانجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
المشروع في الاعمال النهائية	60 %	محافظة الانبار/ عدد 3 مراكز	بناء وتأهيل وحدات التدرن
البدء ببناء الاسس	10 %	محافظة الديوانية/ عدد 1 مركز	بناء وتأهيل وحدات التدرن
تم اكمال الهياكل من ثلاث طوابق والان في عمليات اكمال التغليف بالسير لميك والسمنت	65 %	محافظة المثنى/ عدد 2 مركز	بناء وتأهيل وحدات التدرن
تم وضع الاسس للبنية	10 %	محافظة النجف/ عدد 1 مركز	بناء وتأهيل وحدات التدرن
تم اكمال الاسس	16 %	محافظة بابل/ عدد 2 مركز	بناء وتأهيل وحدات التدرن
تم وضع الاسس للبنية	10 %	محافظة ديالى/ عدد 1 مركز	بناء وتأهيل وحدات التدرن
وضع الاسس وبناء الهيكل للمركزين	40 %	محافظة صلاح الدين/ عدد 2 مركز	بناء وتأهيل وحدات التدرن
تم وضع الاسس للابنية	10 %	محافظة كربلاء/ عدد 2 مركز	بناء وتأهيل وحدات التدرن
تم وضع الاسس للابنية	10 %	محافظة كركوك/ عدد 2 مركز	بناء وتأهيل وحدات التدرن
تم التعاقد وصرف سلفة تشغيلية	3 %	محافظة نينوى/ عدد 2 مركز	بناء وتأهيل وحدات التدرن
تم وضع الاسس للبنية	10 %	محافظة واسط/ عدد 2 مركز	بناء وتأهيل وحدات التدرن
تم وضع الاسس لبنايتين	10 %	محافظة بغداد/ عدد 3 مركز	بناء وتأهيل وحدات التدرن
تم وضع الاسس للابنية	8 %	محافظة البصرة/ عدد 2 مركز	بناء وتأهيل وحدات التدرن
وضع الاسس وبناء الهيكل للطابق الاول	33 %	محافظة ميسان/ عدد 2 مركز	بناء وتأهيل وحدات التدرن
تم وضع الاسس للابنية	9 %	محافظة ذي قار/ عدد 2 مركز	بناء وتأهيل وحدات التدرن

وزارة الصحة

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الانجاز الفتي المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	سنة الراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	أسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البدء						
-	2014	2012	6	2	2012	وزارة الصحة	زيادة اعداد العيادات المتنقلة للمناطق النائية	3.1.2

مكونات النشاط

الملاحظات والموقعات	نسبة الانجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
تم اتخاذ بعض الاجراءات لتسهيل التعاقد وجنب الشركات بعد زيادة الكلفة التخمينية للعجالة ولم تتمكن الدائرة من التعاقد كون السنة المالية قد انتهت	-	محافظة صلاح الدين	عيادة متنقلة لامراض التدرن
قمت الدائرة طلبا الى معالي وزير الصحة لغرض تحويل المبلغ على احد البنود الاخرى	-	محافظة كربلاء	تجهيز عيادة متنقلة لامراض التدرن
تم الاحالة لشراء وتجهيز العريفة	-	محافظة ديالى	تجهيز عيادة متنقلة لامراض التدرن
عزوف الشركات والمكاتب المجهزة عن التقويم	-	محافظة المثنى	تجهيز عيادة متنقلة لامراض التدرن
عزوف الشركات والمكاتب المجهزة عن التقويم	-	محافظة النجف ابيية	تجهيز عيادة متنقلة لامراض التدرن
عزوف الشركات والمكاتب المجهزة عن التقويم	-	محافظة بابل	تجهيز عيادة متنقلة لامراض التدرن
عزوف الشركات والمكاتب المجهزة عن التقويم	-	محافظة واسط	تجهيز عيادة متنقلة لامراض التدرن
لم تقم عروض على شراء العيادة المتنقلة وذلك لعدم قبول الشركات التعاقد على هذا المشروع بضمن خمس سنوات حسب تعليمات العقد	-	محافظة بغداد	تجهيز عيادة متنقلة لامراض التدرن

## وزارة الصحة

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الاجاز الفني المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السئوي مليار دينار (5)	نسبة الاجاز الفعلي	موقع المكون	الجهة المفضلة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البدء							
52 %	مستمر	اذار 2013	29.5	13		2012	وزارة الصحة	استمرار توفير المواد والمستلزمات القياسية	3.6.2

## مكونات النشاط

الملاحظات والمعلومات		نسبة الاجاز الفعلي		موقع المكون		اسم المكون	
انجز المشروع	100 %	محافظة الانبار	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية	محافظة البصرة	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية
العمل مستمر بتنفيذ النشاط	47 %	محافظة البصرة	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية	محافظة النجف	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية
بانتظار اقرار الموازنة لاستكمال الاجراءات	-	محافظة النجف	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية	محافظة بابل	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية
العمل مستمر بتنفيذ النشاط	60 %	محافظة النجف	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية	محافظة بغداد / الرصافة	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية
بانتظار اقرار الموازنة لاستكمال الاجراءات	-	محافظة بغداد / الكرخ	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية	محافظة ديالى	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية
انجز المشروع	100 %	محافظة ديالى	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية	محافظة ذي قار	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية
انجز المشروع	100 %	محافظة ذي قار	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية	محافظة صلاح الدين	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية
انجز المشروع	100 %	محافظة صلاح الدين	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية	محافظة كربلاء	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية
انجز المشروع	100 %	محافظة كربلاء	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية	محافظة ميسان	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية
من وجهة نظر الإدارة التنفيذية للسفر نتيجة لا يوجد سبب للتذني حيث ان شروط التعاقد الخاصة، والعامه تستدعي استلام الاجهزة والتدريب عليها مقابل تسلم المبالغ بانتظار اقرار الموازنة لاستكمال الاجراءات	9 %	محافظة ميسان	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية	محافظة نينوى	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية
العمل مستمر في تنفيذ النشاط	88 %	محافظة نينوى	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية	محافظة واسط	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية
من وجهة نظر الإدارة التنفيذية للسفر نتيجة لا يوجد سبب للتذني حيث ان شروط التعاقد الخاصة والعامه تستدعي استلام الاجهزة والتدريب عليها مقابل تسلم المبالغ	27 %	محافظة واسط	محافظة الاولى	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية			

وزارة الصحة

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الانجاز الفتي المتوقع (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	سنة ادراج النشاط (4)	الجهة المفضلة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البدء						
52 %	مستمر	اذار 2013	500	79.5	2012	وزارة الصحة	استمرار توفير المواد والمستلزمات القياسية	3.6.2

مكونات النشاط

الملاحظات والمواقف		نسبة الانجاز الفعلي		موقع المكون		اسم المكون	
المعمل مستمر بالنشاط ولا توجد ملاحظات		99 %		محافظة الانبار		توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض	
المعمل مستمر بتجهيز المحافظة		49 %		محافظة البصرة		توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض	
سبب تذيي الصرف يعود الى تأخر تحويل التخصيص للمحافظة		-		محافظة الديوانية		توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض	
المعمل مستمر ولا يوجد اي تذيي		85 %		محافظة المثنى		توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض	
لا يوجد سبب للتذيي حيث ان شروط التعاقد الخاصة والعامه تستدعي استلام الاجهزة والتدريب عليها مقابل تسلم المبالغ		2 %		محافظة النجف		توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض	
انجز المشروع		100 %		محافظة بابل		توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض	
لم يتم الصرف لان العقد تم في شهر كانون الاول 2013 وهي نهاية سنة مالية تم تأجيله لحين اقرار موازنة 2014		-		محافظة بغداد / الرصافة		توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض	
المعمل مستمر		71 %		محافظة بغداد / الكرخ		توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض	
المعمل مستمر		47 %		محافظة ديالى		توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض	
انجز المشروع		100 %		محافظة ذي قار		توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض	
ان سبب تذيي نسبة الانجاز يعود الى طول الفترة الزمنية ابتداء من اقرار الموازنة واليات التعاقد		23 %		محافظة صلاح الدين		توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض	
المعمل مستمر		78 %		محافظة كربلاء		توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض	
بانتظار اقرار الموازنة لاستكمال النشاط		6 %		محافظة كركوك		توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض	
المعمل مستمر		71 %		محافظة ميسان		توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض	
المعمل مستمر		71 %		محافظة نينوى		توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض	
لا يوجد سبب للتذيي حيث ان شروط التعاقد الخاصة والعامه تستدعي استلام الاجهزة والتدريب عليها مقابل تسلم المبالغ		27 %		محافظة واسط		توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض	

## وزارة التربية

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الانجاز الفتي المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	سنة ادراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البدء						
58%	2013	2012	140	140	2012	وزارة التربية	تخصيص تمويل كاف ضمن الموازنة الاستثمارية التربوية حسب المراحل (اولوية للانفاق الحكومي الاستثماري التربوي) مع اولوية في تخصيص بناء وتأهيل المدارس المتوسطة والاعدادية في القرى والاحياء الفقيرة وفق سقف زمنية ملائمة	2.2.3

## مكونات النشاط

الملاحظات والموقعات	نسبة الانجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
المشروع مئلكي	77%	القادسية	بناء 45 مدرسة في المناطق والقرى الفقيرة
المشروع مئلكي	90%	بابل	بناء 10 مدارس في المناطق والقرى الفقيرة
المشروع مئلكي	95%	بغداد	بناء 19 مدرسة في المناطق والقرى الفقيرة
المشروع مئلكي	19%	ديالى	بناء 17 مدرسة في المناطق والقرى الفقيرة
المشروع مئلكي	47%	ذي قار	بناء 106 مدرسة في المناطق والقرى الفقيرة
المشروع مئلكي	43%	صلاح الدين	بناء 98 مدرسة في المناطق والقرى الفقيرة
المشروع مئلكي	68%	المتن	بناء 15 مدرسة في المناطق والقرى الفقيرة
المشروع مئلكي	33%	ميسان	بناء 5 مدارس في المناطق والقرى الفقيرة
المشروع مئلكي	38%	تبنوى	بناء 38 مدرسة في المناطق والقرى الفقيرة
المشروع مئلكي	98%	واسط	بناء 26 مدرسة في المناطق والقرى الفقيرة
المشروع مئلكي	100%	البصرة	بناء 1 مدرسة في المناطق والقرى الفقيرة
المشروع مئلكي	35%	كركوك	بناء 29 مدرسة في المناطق والقرى الفقيرة

## وزارة الاصحار والاسكان

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة الراج النشاط (4)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	الكلفة الكلية مليار دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الاجاز الفني المتحقق (8)
						البدء	الانتهاء	
1.1.4	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقره	وزارة الاصحار والاسكان	2012	10.9	10.9	حزيران 2013	-	5 %

## مكونات النشاط

اسم المكونات	موقع المكونات	نسبة الاجاز الفعلي	الملاحظات والمعوقات
بناء 175 وحدات سكنية اقتصادية	محافظة الديوانية / قضاء الشامية	5 %	المشروع مستمر بالتنفيذ

## وزارة الأعمار والأسكان

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الاجاز الفني المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		التكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	سنة ادراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البدء						
-	شباط 2015	شباط 2013	500	50	2013	وزارة الأعمار والأسكان	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقر	1.1.4

## مكونات النشاط

الملاحظات والمعوقات	نسبة الاجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
اعادة الاعلان	-	المنشي - طحربة	بناء وحدات سكنية اقتصادية
تم تقديم الدعوات المباشرة الي 6 شركات	-	بابل- الشمولي	بناء وحدات سكنية اقتصادية
تم تقديم الدعوات المباشرة الي 6 شركات	-	صلاح الدين - يثرب	بناء وحدات سكنية اقتصادية
احيل الي الشركة المنفذة لمدة (720) يوم	-	الديوانية - الشناقفة	بناء وحدات سكنية اقتصادية
احيل الي الشركة المنفذة لمدة (540) يوم	-	ذي قار - عككة	بناء وحدات سكنية اقتصادية

## وزارة البلديات والإشغال العامة

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة ادراج النشاط (4)	التخصيص السنوي مليون دينار (5)	الكلفة الكلية مليار دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الاجاز الفنى المتحقق (8)
						الابتداء	البدء	
1.3.2	توسيع المشاريع لايصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	وزارة البلديات والإشغال	2013	10.450	10.450	-	-	-

## مكونات النشاط

اسم المكون	موقع المكون	نسبة الانجاز الفعلي	الملاحظات والمعوقات
تجهيز البيات حوضية لنقل الماء الصالح للشرب للقرى والأرياف في (15) محافظة بعدد (60) البية	كافة المحافظات عدا اقليم كردستان	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>بسبب عدم توفر مستلزمات الادراج من قبل دائرة الماء في وزارة البلديات ادى الى تأخير ادراج مشروع ( انشاء وحدة ماء مجمعة سعة (1000 م<sup>3</sup> /ساعة) وشراء البيات حوضية للماء الصالح للشرب ) وفق الضوابط المعتمدة .</li> <li>فاتحت وزارة البلديات والإشغال العامة وزارة التخطيط بكتابهم ذي العدد 750 بتاريخ 2013 /4/8 بمترح المديرية العامة للماء بتغيير المشروع الى (شراء 60 سيارة حوضية سعة (10000 م<sup>3</sup>) لنقل الماء الصالح للشرب للقرى والأرياف في المناطق الفقيرة) .</li> <li>حصلت المصادقة من قبل دائرة تخطيط القطاعات وأدرج المشروع ويتم حالياً التهيئة للاعلان</li> </ul>

## وزارة البلديات والإشغال العامة

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة اراج النشاط (4)	التخصيص السنوي (5)	الكلفة الكلية مليار دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز الفنى المتحقق (8)
						البدء	الانتهاء	
2.3.2	توسيع مشاريع الصرف الصحي	المديرية العامة للمجاري	2013	10.450	10.450	-	-	-

## مكونات النشاط

اسم المكونات	موقع المكون	نسبة الانجاز الفعلي	الملاحظات والمعلومات
تجهيز البيات سحب واليات صاروخية عدد(42) تتوزع على(15) محافظة	كافة المحافظات عدا اقليم كردستان	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم إيقاف اجراءات الاعلان عن المشروع بسبب ورود كتاب من وزارة التجارة يحتج على الوزارات مفاتحة وزارة التجارة عن امكانية التجهيز قبل الاعلان عن المشروع</li> <li>فاتحت المديرية العامة للمجاري بكتابها ذي العدد 5011 في 2013/10/29 الامانة العامة لمجلس الوزراء باستثناء المشروع من القرار.</li> <li>حصلت موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء.</li> <li>اعلن عن المشروع بتاريخ 2013/12/1.</li> </ul>

## محافظة نينوى

نسب الانجاز الفتي المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	سنة ادرج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البدء						
9 %	1ك 2014	1ك 2013	10	10	2013	محافظة نينوى	اتخاذ اجراءات لتوفير النفي التحتية اللازمة لمشروع السكن الاقتصادي	2.2.4

## مكونات النشاط

الملاحظات والمعوقات	نسبة الانجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
تم احالة المشاريع الى جهات التنفيذ خلال ك / 1 / 2013	-	الموصل	مشروع تاهيل المجمعات المائية في ناحية الشمال
قيد التنفيذ	16 %	الموصل	مشروع تبليط الشوارع المؤدية الى المجمعات المائية في ناحية الشمال
قيد التنفيذ	20 %	الموصل	مشروع فرش الحصى الخابط لربط القرى في ناحية الشمال
تم احالة المشاريع الى جهات التنفيذ	-	الموصل	مشروع تجهيز سترات حوضية عدد (7) لتوزيع الماء الصالح للشرب للقرى النائية في ناحية الشمال

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

## محافظة نينوى

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الاجاز الفني المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		التكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	سنة ادراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البداء						
-	-	-	24.5	20	2013	محافظة نينوى	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقراء	1.1.4

## مكونات النشاط

الملاحظات والموقعات	نسبة الاجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تاخر المشروع بسبب استبدال قطعة الارض المخصصة</li> <li>- اعدت دراسات ومخططات وكشوفات جديدة للموقع الجديد</li> <li>- تم الموافقة على الدراسات والمخططات والكشوفات الجديده من قبل وزارة التخطيط ويجري الان التهيئه للاعلان</li> </ul>	-	مركز القضاء - تل الرمان	بناء وحدات سكنية اقتصادية

## محافظة صلاح الدين

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الإنجاز الفتي المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	سنة ادرج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البدء						
12 %	2ت	2ت	20	20	2013	محافظة صلاح الدين	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقر (438) وحدة سكنية	1.1.4

## مكونات النشاط

الملاحظات والمعوقات	نسبة الإنجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
تسليم الاراضي للشركة المنفذة	16 %	الجيل- قرية الحبر	بناء وحدات سكنية اقتصادية
-	-	الدور - قرية تل البسات	بناء وحدات سكنية اقتصادية
-	15 %	الشرقاط - بعاجة شرقاط	بناء وحدات سكنية اقتصادية
-	2 %	بيجي - قرية 24 حلويات	بناء وحدات سكنية اقتصادية
-	23 %	تكريت	بناء وحدات سكنية اقتصادية
-	20 %	سامراء - قرية عروشة	بناء وحدات سكنية اقتصادية
-	22 %	بلد - الاسحافي	بناء وحدات سكنية اقتصادية
-	7 %	بلد - الضلوعية	بناء وحدات سكنية اقتصادية
-	6 %	قضاء طوزخورمقور-امرلي	بناء وحدات سكنية اقتصادية
تم تسليم الاراضي الى الشركة المنفذة	16 %	سامراء - دجلة	بناء وحدات سكنية اقتصادية

## محافظة صلاح الدين

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الانجاز الفتي المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		التكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السئوي مليار دينار (5)	سنة ادراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البدء						
% 100	2013	2012	2.400	2.400	2012	محافظة صلاح الدين	تنظيم الاسواق في الاحياء الفيرة	3.3.4

## مكونات النشاط

الملاحظات والمعلومات	نسبة الانجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
تم توزيع الاسواق الشعبية والتي تضم حوالي (262) دكان تم توزيعه وفق معايير موضوعية وبالاستعانة بذائرة الرعاية الاجتماعية في المحافظة للمستحقين الذين كانوا معضهم من العاطلين	% 100	صلاح الدين	تنظيم الاسواق في الاحياء الفقيرة

## محافظة صلاح الدين

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة ادراج النشاط (4)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	الكلفة الكلية مليار دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز الفتي المتوقع (8)
						البداية	الانتهاء	
1.1.1	توفير وادامة البنى التحتية الداعمة للإنتاج والتسويق	محافظة صلاح الدين	2012	3.300	3.300	2012	2013	% 100

## مكونات النشاط

اسم المكونات	موقع المكونات	نسبة الانجاز الفعلي
انشاء طرق زراعية بطول 30 كم	صلاح الدين	% 100

يتكون المشروع من 7 طرق موزعة على افضية المحافظة وقد تم انجازها بالكامل

## محافظة صلاح الدين

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة ادراج النشاط (4)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	الكلفة الكلية مليار دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز الفتي المتحقق (8)
						البداية	الانتهاء	
2.1.2	بناء مراكز رعاية صحية أولية مجهزة	محافظة صلاح الدين	2012	2	2	حزيران 2012	2013	% 100

## مكونات النشاط

اسم المكونات	موقع المكون	نسبة الانجاز الفعلي	الملاحظات والملاحظات
بناء بيوت صحية عدد (20) موزعة على اقصية المحافظة	قضاء طوزخورماتو	% 100	انجز العمل بالكامل
	قضاء الدجيل	% 100	
	قضاء تكريت	% 100	
	قضاء الشرفايط	% 100	
قضاء سامراء	قضاء سامراء	% 100	
	قضاء بيجي	% 100	

## محافظة كركوك

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الاجاز الفتي المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	سنة اذراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البدء						
% 7	-	1 ك 2013	15	15	2013	محافظة كركوك	تنفيذ مشاريع ابناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقر	1.1.4

## مكونات النشاط

الملاحظات والمعوقات	نسبة الاجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
تم احالة المشروع الى احدى الشركات التركية قيد التنفيذ	% 7	موقع خلف حي دوميز	بناء وحدات سكنية اقتصادية
تم احالة المشروع الى احدى الشركات التركية قيد التنفيذ	% 7	شوراو	

## محافظة الابواب

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الاجاز الفني المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	سنة اذراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البدا						
38 %	ت2 2014	ت2 2013	15	15	2013	محافظة الابواب	تنفيذ مشاريع ابناء المجتمعات السكنية الاقتصادية للفقر السكنية (365) وحدة سكنية	1.1.4

## مكونات النشاط

الملاحظات والموقعات	نسبة الاجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
المشروع قيد التنفيذ	40 %	قضاء/الفلوجة	بناء وحدات سكنية اقتصادية (100) وحدة
المشروع قيد التنفيذ	15 %	قضاء/القائم	بناء وحدات سكنية اقتصادية (40) وحدة
المشروع قيد التنفيذ	35 %	قضاء/حديثة	بناء وحدات سكنية اقتصادية (30) وحدة
المشروع قيد التنفيذ	50 %	قضاء/اروه	بناء وحدات سكنية اقتصادية (15) وحدة
المشروع قيد التنفيذ	70 %	قضاء/هيت	بناء وحدات سكنية اقتصادية (40) وحدة
المشروع قيد التنفيذ	15 %	قضاء/الوطبة	بناء وحدات سكنية اقتصادية (25) وحدة
المشروع قيد التنفيذ	40 %	قضاء/عانة	بناء وحدات سكنية اقتصادية (15) وحدة
المشروع قيد التنفيذ	40 %	قضاء/الرمادي	بناء وحدات سكنية اقتصادية (100) وحدة

محافظة ديالى

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة ادرج النشاط (4)	محافظة ديالى	2013	التخصيص السنوي مليون دينار (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز الفتي المتحقق (8)
								البدء	الانتهاء	
1.1.1	توفير وادامة البنى التحتية الدائمة للانتاج والتسويق	محافظة ديالى	2013	محافظة ديالى	2013	4.770	4.770	2	-	17 %

مكونات النشاط

اسم المكونات والمواقف	نسبة الانجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
المشروع مستمر	25 %	العبارة - قرية المد الاخضر - شارع عصفور وشارع الجامع	تبليط طريق بطول 3 كم
المشروع مستمر	30 %	المنصورة- قرية حبيب العبد الله	تبليط طريق بطول 3.5 كم
في مرحلة تسليم الموقع	-	الوجهية- قرية العروبة	تبليط طريق بطول 1 كم
تم الغاء امر الاحالة بامر المحافظ و حاليا يعاد دراسته المشروع	-	بلد روز - قرية كاظم صالح	تبليط طريق بطول 4 كم
المشروع مستمر	32 %	جلولاء - قرية جميلة	تبليط طريق بطول 3.5 كم
المشروع مستمر	30 %	مركز قضاء المقدادية - قرية امام طالب	تبليط طريق بطول 2 كم
تم الغاء امر الاحالة بامر المحافظ و حاليا يعاد دراسة المشروع	-	كفري - قرية الشيخ خليل	تبليط طريق بطول 7 كم
المشروع مستمر	20 %	كمان-قرية الحاج جاسم	تبليط طريق بطول 3.2 كم
تم الغاء امر الاحالة بامر المحافظ و حاليا يعاد دراسة المشروع	-	مركز قضاء المقدادية - قرية الكفاح	تبليط طريق بطول 600 م
العمل مستمر	35 %	هبهب - قرية الحديد	تبليط طريق بطول 5 كم

## محافظة ديالى

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة ادراج النشاط (4)	التخصيص السنوي مليون دينار (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز الفتي المتحقق (8)
						البدء	الانتهاء	
1.1.4	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقره	محافظة ديالى	2012	7	7	ايلول 2013	ايلول 2014	-

## مكونات النشاط

اسم المكونات	موقع المكونات	نسبة الانجاز الفعلي	الملاحظات والمعوقات
بناء وحدات سكنية اقتصادية 114 وحدة سكنية	قضاء بعقوبة	-	تجاوزات على موقع العمل

## محافظة دبي

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الإنجاز الفني المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	سنة ادرج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الابتداء	البدء						
100 %	1 ك 2013	2 ك 2013	1	1	2012	محافظة دبي	توفير و ادامة البنى التحتية الراجعة للانتاج والتسويق	1.1.1

## مكونات النشاط

الملاحظات والمعوقات	نسبة الإنجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
انجز المشروع	100 %	ناحية حبيبة / قرية التنن	انشاء طرق للقرى 4 كم

## محافظة ديالى

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة اذراج النشاط (4)	التخصيص السنوي (5)	الكلفة الكلية مليار دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز الفنى المتحقق (8)
						البدء	الانتهاء	
2.2.4	اتخاذ اجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لمشاريع السكن الاقتصادي	محافظة ديالى	2013	5.230	5.230	ك2 2013	-	8 %

## مكونات النشاط

اسم المكونات	موقع المكونات	نسبة الانجاز الفعلي	اجراءات تسليم الموقع	الملاحظات والمعلومات
تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	السلام - قرية الكبة	20 %	اجراءات تسليم الموقع	
تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	الخالص - قرية السنديبة	-	اعادة الاعلان	
تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	العبارة - قرية الاعور	-	اعادة الاعلان	
تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	العظيم - قرية ابو طربمش	30 %	بانتظار توقيع العقد	
تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	المنصورية - قرية حبيب العبد الله	-	اعادة الاعلان	
تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	بني سعد - قرية محمد الكاظم	-	اعادة الاعلان	
تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	جلولاء - منطقة الكحلاء	-	تم الغاء امر الاحالة بامر المحافظ وحاليا يعاد در استه المشروع	
تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	الخالص-قرية سفيط	20 %	قيد التنفيذ	
تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	مركز قضاء المقدادية	-	اعادة الاعلان	
تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	مركز قضاء خانقين - قرية جسر حلوان	-	تم الغاء امر الاحالة بامر المحافظ وحاليا يعاد در استه المشروع	
تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	مركز قضاء بلد روز - قرية جواد الحجي	-	اعادة الاعلان	
تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	منذلي - قرية عبد الله كيطان	25 %	مرحلة توقيع العقد	

## محافظة ديالى

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة اذراج النشاط (4)	التخصيص السنوي (5)	الكلفة الكلية (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الاجاز الفتي المتحقق (8)
						البدء	الانتهاء	
2.2.4	اتخاذ اجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لهذه المشاريع	محافظة ديالى	2012	2.650	2.650	ايلول 2013	-	% 25

## مكونات النشاط

اسم المكونات	موقع المكون	نسبة الاجاز الفعلي	الملاحظات والمعلومات
تنفيذ شبكات ماء في القرى	المقدادية - ابي صديا	-	تم الغاء امر الاحالة بامر المحافظ وحاليا يعاد در استه المشروع
تنفيذ شبكات ماء للقرى	خانقين - قرية الاصلاح	% 75	قيد التنفيذ
تنفيذ شبكات ماء للقرى	العبارة - الاحيمر	-	اعادة الاعلان

## محافظة ديالى

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الاجاز الفتي المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلية الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	سنة اذراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البدء						
35 %	تموز 2014	1 ك 2013	1.250	1.250	2012	محافظة ديالى	بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة	2.1.2

## مكونات النشاط

الملاحظات و الموقوفات	نسبة الاجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
قيد التنفيذ	35 %	في قرى خاتقين (قرية كهربزه وقرية النظام)	بناء مراكز رعاية صحية عدد (2)



## محافظة واسط

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الانجاز الفتي المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص المستوي مليار دينار (5)	سنة اذراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البداية						
100 %	ت 1 2013	أب 2012	11.9	11.9	2012	محافظة واسط	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقر	1.1.4

## مكونات النشاط

الملاحظات والملاحظات	نسبة الانجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم انجاز المشروع بتاريخ 2013 /10/7</li> <li>- تم تشكيل لجنة لغرض استلام الموقع</li> <li>- اعداد استمارة مفاضلة للتوزيع</li> <li>- تم احالة مشروع الخدمات الاساسية للمجمع ضمن خطة عام 2013 موازنة تنمية الاقاليم .</li> </ul>	100 %	قضاء الكوت - نصف الديلة	بناء وحدات سكنية اقتصادية ( 284 ) وحدة

## محافظة واسط

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الإيجاز الفني المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	سنة ادرج النشاط (4)	نسبة الإنجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون	
	الانتهاء	البداية							
3 %	تموز 2015	2 ت 2013	35	23.1	2013		محافظة واسط	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقر	1.1.4

## مكونات النشاط

الملاحظات والمعلومات	نسبة الإنجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
- يتكون المشروع من مرحلتين انتهت المرحلة الأولى من خلال بناء 284 وحدة سكنية - بدأ التخطيط للمرحلة الثانية حيث تم استحصال الموافقات على تخصيص اراضي في اقضية (الكوت، الصويرة، العزيزية، الحي) والمصادقة عليها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء - تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد تصاميم بناء اقصي كمرحلة ثانية - تمت المصادقة على التصاميم من المكتب الاستشاري وتم تكليف شركة المنصور العامة احدى شركات وزارة الاعمار والاسكان ويجري حاليا التعاقد مع الشركة لبناء (1625) وحدة سكنية .	3 %	وحدة سكنية في قضاء النعمانية (500) وحدة سكنية في قضاء صويرة (530) وحدة سكنية قضاء العزيزية (500) وحدة سكنية في قضاء الحي (95)	بناء وحدات سكنية اقتصادية

## محافظة بابل

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الانجاز الفني المتوقع (8)	مدة التنفيذ (7)		التكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	سنة اذراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البدء						
15 %	حزيران 2015	1 أيار 2012	16.7	12.6	2012	محافظة بابل	تنفيذ مشاريع ابناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقر	1.1.4

## مكونات النشاط

الملاحظات والمعوقات	نسبة الانجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
<p>-مدر من عام 2012</p> <p>- يتكون البناء من 15 عمارة (180) شقة مع (روضنة ،حضانة،مسجد،بنائية إدارة المجمع ،طرق وساحات خضراء ،شبكة مجاري)</p> <p>-تم تخصيص مبلغ 12،6 مليار دينار في عام 2012. ودور التخصيص لعام 2013 وذلك لعدم صرف المبلغ في عام 2012</p> <p>تأخر المشروع بالتنفيذ بسبب تخصيص الارض واعادة الاعلان اكثر من مرة وذلك لعدم تقديم المواصفات المناسبة من قبل الشركات</p> <p>-سلم الموقع للشركة المنفذة للمشروع بتاريخ 2012/12/31</p> <p>-تم وضع حجر الاساس بتاريخ 2013/4/15</p> <p>- يمر المشروع في مرحلة تسليح وصب اعمدة الينيات</p>	15 %	قضاء الحلة / ناحية ابي غرق	انشاء دور اقتصادية مع ايصال الخدمات الاساسية (180) شقة

## محافظة بابل

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة اذراج النشاط (4)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	الكلفة الكلية مليار دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز الفنى المحقق (8)
						البدء	الانتهاء	
4.2.3	وضع برنامج مساندة ودعم الحكومات المحلية لانشاء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة والإعدادية	محافظة بابل	2013	12.6	18.250	-	-	-

## مكونات النشاط

اسم المكونات	موقع المكونات	نسبة الانجاز الفعلي	الملاحظات والموقعات
بناء (16) مدرسة ابتدائية ذات (9) صف و (12) صف	<ul style="list-style-type: none"> <li>قرية او لاد الكاظم مقاطعة 7 الحصن البيكات /سدة الهندية في قضاء المسيب</li> <li>قرية ام ذرة مقاطعة 4 / سدة الهندية في قضاء المسيب .</li> <li>قرية الطابه مقاطعة 42 الشاخرة / النيل في قضاء المحاوليل .</li> <li>قرية ال بو شيخ علي / ناحية القاسم .</li> <li>قرية الجنايين / ناحية القاسم .</li> <li>قرية كاظم الصافي / ناحية الكفل .</li> <li>قرية هوى الشام / مركز قضاء الحالة .</li> <li>قرية خلف مقام الخضمر / ناحية الاسكندرية .</li> <li>قرية الكصيرات / ناحية المدحتية .</li> <li>قرية الغزالي الاكروخ / ناحية المدحتية</li> <li>قرية الفياده /ناحية الشوملي .</li> <li>محافظة العمار قرية ابو هليل / النيل في قضاء المحاوليل .</li> <li>قرية الطويل / ناحية الشوملي .</li> <li>قرية الزوية العويديين / الطليعة في قضاء الهاشمية.</li> <li>قرية البصة / مركز قضاء المحاوليل.</li> <li>قرية الحميري / المشروع في قضاء المحاوليل.</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- يتوزع النشاط على 16 موقع في قرى محافظة بابل</li> <li>- تم اعادة الاعلان للمرة الثانية في تاريخ 2013/10/1</li> <li>- وبالظر لقالة الراغبين وعزوف المقاولين فاتحت المحافظة وزارة التخطيط بتنفيذ المشروع عن طريق الدعوات مباشرة</li> <li>- تم اقامة دعوات للشركات ويمر المشروع بمرحلة التحليل والاحالة</li> </ul>

## محافظة كربلاء

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة ادراج النشاط (4)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	الكلفة الكلية مليار دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الاجاز الفتي المتحقق (8)
						البدء	الانتهاء	
2.2.4	اتخاذ اجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لمشاريع بناء الوحدات السكنية الاقتصادية	محافظة كربلاء	2013	9.8	12	حزيران 2013	آذار 2014	48 %

## مكونات النشاط

اسم المكونات	موقع المكونات	نسبة الاجاز الفعلي	الملاحظات و الموقوفات
توفير البنى التحتية لمجمع دور اقتصادية (1000) دار	مركز قضاء كربلاء	48 %	<p>- تاخر بدء التنفيذ بسبب منقلة مبلغ التخصيص من مشروع توفير البنى التحتية لمنطقة الشريفات بعد ان تم المصادقة على المشروع من قبل مجلس محافظة كربلاء بتاريخ 122/9/2012 في 2012/9/9</p> <p>- يتكون المشروع من :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مشروع انشاء شبكة محاري ثقيلة وشبكة امطار</li> <li>• مشروع اوصول خط الماء المعدي للمنطقة (مجمع )</li> <li>• مشروع اوصول اوصول تابلط شوارع المجمع</li> <li>• نسبة الاجاز 48 %</li> </ul>

## محافظة كربلاء

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الإنجاز الفتي المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلية الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	سنة الراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البدء						
-	-	-	0.450	0.400	2013	محافظة كربلاء	اتخاذ اجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لمشاريع بناء الوحدات السكنية الاقتصادية	2.2.4

## مكونات النشاط

الملاحظات والمعلومات	نسبة الإنجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
<p>- تم توجيه دعوات مباشرة للشركات ويبر المشروع بمرحلة التحليل والاحالة ، ويشمل المشروع تنفيذ دراسة وتصميم لـ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• تنفيذ شبكة كهرباء</li> <li>• انشاء بناية مركز صيانة الكهرباء</li> <li>• استحداث مغذي من محطة الون</li> </ul>	-	مركز قضاء كربلاء / ناحية الحسينية/المنطقة الشريفات	دراسة وتصميم مشروع توفير البنى التحتية

## محافظة كربلاء

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الانجاز الفني المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		التخصيص السنوي مليار دينار (5)	نسبة الانجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البداية					
-	-	ت <sup>2</sup> 2012	12	11.9	2012	محافظة كربلاء	2.2.4

## مكونات النشاط

الملاحظات والمعلومات	نسبة الانجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
- العمل مستمر بتنفيذ فحقات التصريف الجانبية . - العمل مستمر بتنفيذ محطة الرفع	86 %	قضاء عين تمر /منطقة الزكاريط	تنفيذ شبكة مجاري مع محطة المعالجة
- تعديل الكشوفات من قبل الدائر الفنية في المحافظة	-	قضاء عين تمر /منطقة الزكاريط	تنفيذ بناية لمقر الصيانة وتنفيذ شبكة ماء
- حاليا في مرحلة التهيئة للاعلان	-	قضاء عين تمر /منطقة الزكاريط	تنفيذ شبكة كهرباء
- يجري حاليا العمل على تعديل الكشوفات	-	قضاء عين تمر /منطقة الزكاريط	تنفيذ مركز صيانة للكهرباء
- تحقيق الكشوف ومداولة حول تغيير المشروع .	-	قضاء عين تمر /منطقة الزكاريط	تنفيذ شبكة اتصالات
- تعديل كشوفات - طلبت المحافظة تعديل كلفة المشروع بكتاب قسم العقود 659 في 2013 /11/24 .	-	قضاء عين تمر /منطقة الزكاريط	تنفيذ تخطيط الطرق

## محافظة كربلاء

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة اذراج النشاط (4)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	الكلفة الكلية مليار دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز الفتي المتحقق (8)
						البدء	الانتهاء	
4.2.3	وضع برنامج مساندة ودعم الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة الإعدادية	محافظة كربلاء	2013	1.9	1.9	-	-	-

## مكونات النشاط

اسم المكونات	موقع المكون	نسبة الانجاز الفعلي	الملاحظات والمعرفات
إنشاء مدرسة ابتدائية 18 صف	مركز قضاء كربلاء /ناحية الحسينية/ قرية خير الدين اللاتح	-	تم توجيه دعوات للمرة الثانية بسبب قلة الراغبين المتقدمين

## محافظة النخف

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الانجاز الفتي المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		التكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	سنة ادراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البدء						
-	-	-	7.357	7.357	2013	محافظة النخف / مديرية التخطيط والمتابعة	توسيع المشاريع لايصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	1.3.2

## مكونات النشاط

الملاحظات والمعوقات			نسبة الانجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
2013 /	شهرت 2	تم استكمال اجراءات ادراج المشروع في شهرت 2	-	قضاء الكوفة- بالقرب من ناحية العباسية- شمال الكوفة	بناء وحدة مجمعة ماء سعة 1000 م <sup>3</sup> /ساعة
2013	شهرت 2	تم استكمال اجراءات ادراج المشروع في شهرت 2 / وحاليا في مرحلة الاعلان للمرة الثانية	-	قضاء النخف-ناحية الحيدرية قرية بني زيد الجنوبية	بناء وحدة مجمعة ماء سعة 25 م <sup>3</sup> /ساعة
2013 /	شهرت 2	تم استكمال اجراءات ادراج المشروع في شهرت 2 / وحاليا في مرحلة الاعلان	-	قضاء النخف -ناحية الشبكة- قرية بحر النخف	بناء وحدة مجمعة ماء سعة 25 م <sup>3</sup> /ساعة
2013	شهرت 2	تم استكمال اجراءات ادراج المشروع في شهرت 2 / وحاليا في مرحلة الاعلان	-	قضاء النخف ناحية الشبكة- قرية الاسويد	بناء وحدة مجمعة ماء سعة 25 م <sup>3</sup> /ساعة
2013	شهرت 2	تم استكمال اجراءات ادراج المشروع في شهرت 2 / وحاليا في مرحلة الاعلان	-	قضاء النخف ناحية الشبكة- قرية حاتم الطائي	بناء وحدة مجمعة ماء سعة 25 م <sup>3</sup> /ساعة

## محافظة النجف

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الإيجاز الفني المتوقع (8)	مدة التنفيذ (7)		التكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	سنة الدراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	أسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البدء						
14 %	أب 2014	ت <sup>1</sup> 2013	7.643	7.643	2013	محافظة النجف / مديرية التخطيط والمتابعة	وضع برنامج مساعدة ودعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة الإعدادية	4.2.3

## مكونات النشاط

الملاحظات والمعرفات	نسبة الإيجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
- تم توقيع العقد بتاريخ 2013 /2/10 بمدة تنفيذ 300 يوم	9 %	قضاء المناذرة - حي الزهراء	انشاء مدرسة 18 صف
- تم توقيع العقد بتاريخ 2013 /8/9 وبمدة تنفيذ 360 يوما	28 %	قضاء الكوفة - حي ميسان	انشاء مدرسة 18 صف
- تم توقيع العقد بتاريخ 2013 /8/9 وبمدة تنفيذ 360 يوما	9 %	قضاء الكوفة - حي السلام	انشاء مدرسة 18 صف
- تم توقيع العقد بتاريخ 2013 /8/9 وبمدة تنفيذ 360 يوما	9 %	قضاء النجف - ناحية الحيدرية	انشاء مدرسة 18 صف

## محافظة الديوانية

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الانجاز الفني المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		التخصيص السنوي مليار دينار (5)	سنة ادراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البداية					
36 %	2014	2013	2	2012	محافظة الديوانية	تنظيم الاسواق في الاحياء الفقيرة	3.3.4

## مكونات النشاط

الملاحظات والمعوقات	نسبة الانجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
- العمل مستمر في إنجاز المشروع	36 %	انشاء 200 كشك مركز القضاء - انشاء 10 كشك ناحية السنية - انشاء 14 كشك ناحية الدغارة - انشاء 12 كشك ناحية الشافعية - انشاء 21 كشك قضاء الشامية - انشاء 10 كشك ناحية الصلاحية - انشاء 10 كشك ناحية المهاوية - انشاء 20 كشك ناحية ضماس - انشاء 20 كشك قضاء عفاك - انشاء 10 كشك ناحية نقر - انشاء 10 كشك ناحية سومر - انشاء 12 كشك ناحية ال بدير - انشاء 25 كشك قضاء الحمزة - انشاء 13 كشك ناحية السدير - انشاء 13 كشك ناحية الشافعية .	انشاء 400 كشك

## محافظة الديوانية

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة اذراج النشاط (4)	التخصيص السنوي بمليار دينار (5)	الكلفة الكلية بمليار دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز الفتي المتحقق (8)
						البدء	الانتهاء	
1.1.4	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقراء الاقتصادية	محافظة الديوانية	2012	4	4	-	-	5 %

## مكونات النشاط

اسم المكونات	موقع المكونات	نسبة الإنجاز الفعلي	الملاحظات والمعلومات
بناء وحدات سكنية اقتصادية / ائقبة عددها 91 دار	فضاء الديوانية	5 %	اعلن عن المشروع خلال شهر تشرين الاول 2013 وفتحت المعطاءات واحيل المشروع الى الشركة المنفذة.

## محافظة الديوانية

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة اذراج النشاط (4)	التخصيص السنوي مليون دينار (5)	الكلفة الكلية مليار دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الاجاز الفتي المتحقق (8)
						البدء	الانتهاء	
1.1.4	تنفيذ مشاريع ابناء المجتمعات السكنية الاقتصادية للفقر في الاقصادية	محافظة الديوانية	2012	4	4	-	-	5 %

## مكونات النشاط

اسم المكونات	موقع المكونات	نسبة الاجاز الفعلي	الملاحظات والمعلومات
بناء وحدات سكنية اقتصادية / عمودية عددها 94 دار	قضاء الديوانية	5 %	اعلن عن المشروع خلال شهر تشرين الاول 2013 وفتحت العطاءات واحيل المشروع الى الشركة المنفذة.

## محافظة الديوانية

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة اذراج النشاط (4)	التخصيص السنوي بمليار دينار (5)	الكلفة الكلية بمليار دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز الفتي المتحقق (8)
						البدء	الانتهاء	
1.1.4	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات سكنية اقتصادية للفقرء	محافظة الديوانية	2013	15	15	-	-	5 %

## مكونات النشاط

اسم المكونات	موقع المكونات	نسبة الانجاز الفعلي	الملاحظات والمعلومات
بناء وحدات سكنية اقتصادية مع مجمع ماء عددها (324) دار	فضاء الديوانية	5 %	اعلن عن المشروع خلال شهر تشرين الاول 2013 وفتحت العطاءات و احيل المشروع الى الشركة المنفذة.

## محافظة الديوانية

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة ادرج النشاط (4)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	الكلفة الكلية مليار دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز الفتي المتحقق (8)
						البدء	الانتهاء	
1.1.1	توفير وأدامة البنى التحتية الداعمة للأنتاج (تأهيل معمل النجارة)	محافظة الديوانية	2012	1.9	1.9	-	-	-

## مكونات النشاط

اسم المكونات	موقع المكونات	نسبة الانجاز الفعلي	الملاحظات والموقعات
أعادة تأهيل معمل النجارة	قضاء الديوانية	-	أعترضت وزارة البيئة على اعادة تأهيل المعمل، سيتم مناقشة المبلغ الى مشروع اخر

## محافظة الديوانية

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة اذراج النشاط (4)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	الكلفة الكلية مليار دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز الفتي المتحقق (8)
						البدء	الانتهاء	
4.2.3	وضع برنامج مساندة ودعم الحكومات المحلية لانشاء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة و الاعدادية	محافظة الديوانية	2013	5	5	-	-	-

## مكونات النشاط

اسم المكونات	موقع المكونات	نسبة الانجاز الفعلي	الملاحظات والمعلومات
بناء (9) مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	<ul style="list-style-type: none"> <li>قرية دجيل / قضاء الشامية</li> <li>قرية دوب شمسة / ناحية عماس</li> <li>قرية ام عجان/ قضاء عفاك</li> <li>قرية العنتاكية/ ناحية السدير</li> <li>قرية ابو الدين / ناحية الشافعية</li> <li>قرية الالهمة / قضاء الحمزة</li> <li>الثوق / قضاء الحمزة</li> <li>السراي/ ناحية الشافعية</li> <li>الرملة / ناحية الاغرة</li> </ul>	-	اعلان عن المشروع في شهر ايلول وبعد عزوف الشركات عن التقديم اعيد الاعلان خلال شهر تشرين الاول والمشروع في طور الاحالة

## محافظة ذي قار

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة ادراج النشاط (4)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	الكلفة الكلية مليار دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز الفتي المتحقق (8)
						الابتداء	البدء	
1.1.4	تنفيذ مشاريع ابناء المجمعات السكنية الاقتصادية للقراء	محافظة ذي قار	2013	40	40	-	-	-

## مكونات النشاط

اسم المكونات	موقع المكون	نسبة الانجاز الفعلي
بناء وحدات سكنية اقتصادية عددها 356 دار	قضاء الناصرية	-
		تم تقديم الدعوات المباشرة الى شركات متخصصة . - تم فتح العطاءات خلال شهر تشرين الثاني - اعادة دراسة المشروع بعد تقييم الشركات بمبلغ اعلى من الكلف التخمينية

## محافظة ميسان

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الايجاز الفني المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السنوي مليار دينار (5)	سنة ادراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البداية						
-	-	-	25	25	2013	محافظة ميسان	تنفيذ مشاريع ابناء المجتمعات السكنية الاقتصادية للفقر	1.1.4

## مكونات النشاط

الملاحظات والمعلومات	نسبة الاجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
اعلان عن المشروع اكثر من مرة ، وتم ارسال دعوات مباشرة الى شركات متخصصة، وبسبب عزوف الشركات عن التقديم سيتم اعادة دراسة المشروع	-	متعدد الوحدات الادارية	بناء وحدات سكنية اقتصادية عددها 625 دار

## محافظة المثني

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

نسب الالجاز الفني المتحقق (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية مليار دينار (6)	التخصيص السوي مليار دينار (5)	سنة اذراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
	الانتهاء	البداية						
7 %	-	1 أ 2013	45	45	2012	محافظة المثني	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقر	1.1.4

## مكونات النشاط

الملاحظات والملاحظات	نسبة الالجاز الفعلي	موقع المكون	اسم المكون
تم توقيع العقد بتاريخ 12 / 11 / 2013 مع شركة البشير للدراسات والتصاميم والشركة أنهت اعمالها النهائية للمشروع وتسليم المخططات والتصاميم للمحافظة	2 %	عشر وحدات ادارية	وحدة سكنية اقتصادية (930)
تم احواله المشروع الى الشركة المنفذة وبدأت بالتنفيذ في شهر كانون الاول 2013 ولغاية أذار 2015	5 %	قضاء السلمان	وحدة سكنية اقتصادية (35)
تم احواله المشروع الى الشركة المنفذة وبدأت بالتنفيذ في شهر كانون الاول 2013 ولغاية أذار 2015	5 %	ناحية البصية	وحدة سكنية اقتصادية (35)

## محافظة البصرة

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة اراج النشاط (4)	التخصيص السنوي مليون دينار (5)	الكلفة الكلية مليار دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الاجاز الفني المتوقع (8)
						الانتهاء	البدء	
1.1.4	تنفيذ مشاريع ابناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقر	محافظة البصرة	2013	35	35	-	-	-


## مكونات النشاط

اسم المكونات	موقع المكون	نسبة الانجاز الفعلي	الملاحظات والمعوقات
بناء وحدات سكنية اقتصادية عددها (500) دار	ناحية الامام الصادق	-	- تم اعداد الكشوفات والمخططات للمشروع - نظرا لعدم كفاية الارض المخصصة للمشروع تم اضافة قطعة ارض تكميلية لاستيعاب حجم المجمع السكني - اعلن عن المشروع ولعدم تقدم الشركات , تم اللجوء الى تقديم دعوات مباشرة الى شركات متخصصة .



## ملحق (2)

استثمارات متابعة أنشطة الوزارات والمحافظات من خطط  
تنمية الوزارات والمحافظات لعام 2013





## وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الانجاز الفني المتحقق (7)	الملاحظات والمهمات (8)
					البدء	الانتهاء		
1.3.1	تنفيذ زيارات تفتيش ومراقبة حسن تطبيق قانون العمل والضمان الاجتماعي لمراقبة بيئة العمل اللائق	- قسم تفتيش العمل - اتحاد نقابات العمال - اتحاد الصناعات	موازنة جارية	-	ك1 2013	ك2 2013	100 %	- المخطط تنفيذه خلال العام 2013 (24000) زيارة من قبل فرق التفتيش الى اصحاب العمل والمشاريع المشمولة بأحكام قانون العمل والضمان لمراقبة بيئة العمل واللائق، حيث تم تنفيذ (31994) زيارة في بغداد والمحافظات بما يفوق المخطط له
2.3.1	تضمنين قانون العمل فقرات مرتبة حول تحديد الحد الأدنى للأجر ليتناسب مع خط الفقر.	لجنة لدراسة الحد الأدنى للأجور في وزارة العمل وبرئاسة دائرة العمل وعضوية ممثلي اتحاد نقابات العمال واتحاد الصناعات العراقي.	الموازنة الجارية	-	ك1 2013	ك2 2013	مستمر (صعد اجتماعات دورية)	تم تعديل اجور العامل غير الماهر الي (250) الف دينار بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (178) لسنة 2013 بناء على ما جاء في توصيات لجنة الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر ليتناسب مع الواقع المعيشي ونفذ من الماهر 2013/7/1
3.3.1	تعريف العاملين الذين يستلمون الحد الأدنى من الاجر بحقوقهم في رفع الاجور للتوافق مع خط الفقر.	فرق تفتيش العمل في دائرة العمل قسم الاعلام.	الموازنة الجارية	-	ك1 2013	ك2 2013	100 %	يتم التوعية والتوجيه لأصحاب العمل والعمال خلال الزيارات التفتيشية التوعوية لفرق التفتيش والتي تضم في عضويتها ممثلي اصحاب العمل والعمال

## وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الإنجاز الفني المتحقق (7)	الملاحظات والموقعات (8)
					البدء	الانتهاء		
4.3.1	تشخيص وحدة في مكاتب التشغيل في جميع المحافظات يستطيع العاملون بأجر مراجعتها عند عدم التزام أرباب العمل بالقانون.	- فرق التفتيش المشكلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	الموازنة الجارية	—	ك1 2013	ك2 2013	100 %	الوحدة موجودة في قسم التفتيش المركزي في مقر دائرة العمل وشعب التفتيش في المحافظات وهي (15) شعبة، وعملها مستمر في زيارة ومقابلة اصحاب العمل والعمل
1.4.1	قيام مكاتب التشغيل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل.	دائرة التشغيل والقروض	موازنة جارية	—	ك1 2013	ك2 2013	100 %	تم التخطيط لأجراء (2640) زيارة، وبمضاعفة جهود الاستقصاء من قبل الوزارة للحصول على عدد من فرص العمل المتاحة تم تحقيق (4187) زيارة في بغداد والمحافظات لقطاعات العمل للحصول على فرص عمل لتشغيل العاطلين المسجلين حيث تم الحصول على (8532) فرصة عمل خلال الفترة المذكورة وترشيح العاطلين اليها
1.6.1	تنظيم حملات توحيه للفقرء للاتحاق بالمراكز وبرامج التدريب	- دائرة التدريب المهني - اعلام الوزارة.	موازنة جارية	—	مستمر	ك2 2013	100 %	العمل مستمر في كافة المراكز التدريبية لنشر الاعلانات والالقات بالتنسيق مع المجالس البلدية لأستقطاب المترين للمشاركة بالتدريب. و عددنا (35) اعلان وتم اجراء (20) لقاء صحفي عن طريق القوات الفضائية، وتم تعميم خطة تدريب عام 2013 على كافة الوزارات ومجالس المحافظات لغرض استقطاب المترين والفئات المستهدفة

## وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الانجاز الفني المتحقق (7)	الملاحظات والمواقف (8)
					الانتهاء	البدء		
2.4.1	قيام مكاتب التشغيل <sup>1</sup> بالتنسيق مع جهات التدريب وتأهيل وتعزيز مهارات العمل لدى الفقراء	دائرة التدريب المهني / مراكز التدريب المهني	موازنة جارية	-	أكتوبر 2013	أكتوبر 2013	100%	<p>- زيارات مدير عام دائرة التدريب المهني</p> <p>تم تحقيق (13) زيارة الى مراكز التدريب التالية (النهران (3) المركز العراقي الكوربي - المدرسة العراقية للحام - الوزيرية - المحمودية الشعبي- ميسان - المحر الكبير الشعبي - حي اور الشعبي - كربلاء) الكوربي - الوزيرية - بابل الشعبي - كربلاء)</p> <p>- زيارات معاون المدير العام</p> <p>تم تحقيق (8) زيارات الى مراكز التدريب التالية (3) الوزيرية - (4) المركز العراقي الكوربي - الوليد - زيارات المتابعة من مدراء ومسؤولي الشعب</p> <p>تم تحقيق (32) زيارة الى مراكز التدريب التالية ((2) الصدر الشعبي - (2) حي اور - الوليد - (2) الشعلة الكوت- (2) الفاصرية - سوق الشيوخ - الحباشين - الشطرة - ميسان - كربلاء - (2) الرصافة - (2) الوليد - (2) بابل الشعبي - (2) النهران (2) الوزيرية - المركز العراقي الكوربي - النجف-كربلاء-الرمادي والورش التدريبية في قسم عمل حديثة والقائم وعنه) - تم تدريب وتخرج عدد (11802) متدربة من النساء لسنة 2013</p>
3.2.6	تبني نظام متابعة مستمر لتقويم برامج تدريب النساء وتأهيلهن.	دائرة التدريب المهني	موازنة جارية	-	أكتوبر 2013	أكتوبر 2013	100%	

1 من خلال تنفيذ دورات تدريبية في مختلف الاختصاصات للفقراء ووفق احتياجات سوق العمل.

## وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الاحجاز الفني المتحقق (7)	الملاحظات والمواقف (8)
					الانتهاء	البدء		
2.2.6	صياغة اطر تعاون مع القطاع الخاص لحثه على دعم برامج تأهيل مهنية في الريف العراقي	- دائرة التدريب المهني - قسم التدريب المهني	الموازنة الجارية	-	1ك 2013	2ك 2013	-	- تم تشكيل لجنة عليا للتنسيق بين الوزارات (العمل، التربية، التعليم العالي) لتنظيم نشاطات التعليم والتدريب فيما يخص الاحتياجات التدريبية و المناهج والعودة مع مؤسسات القطاع الخاص - عمل اللجنة مستمر من اجل ايجاد الية تدريبية لحث القطاع الخاص على التعاون مع مراكز تدريب دائرة العمل لتحديد الاحتياجات التدريبية لمهن سوق العمل
3.3.6	برامج توعية موجه للنساء لاسيما في الريف العراقي للالتزام بنظام الضمان الاجتماعي	دائرة التدريب المهني	الموازنة الجارية	-	1ك 2013	2ك 2013	100%	عدد منشآت القطاع الخاص التي تمت زيارتها لمراقبة تنفيذ القانون (24887) تم التوعية من خلال الزيارات التفتيشية وتوزيع دليل التفتيش على النساء ومن خلال هذه الزيارات تم شمول (14206) امرأة فقيرة بالضمان الاجتماعي
1.1.5	اتخاذ الإجراءات لاعتماد اللامركزية في إدارة شؤون شبكة الحماية الاجتماعية	دائرة الرعاية الاجتماعية / شبكة الحماية الاجتماعية	موازنة الجارية	-	مستمرة	2ك 2012	100%	- الصيغة الحالية في إدارة شؤون شبكة الحماية الاجتماعية في المحافظات اقرت ان يكون التمسول والإعانة بصورة لامركزية من خلال تشكيل لجنة عليا لشبكة الحماية الاجتماعية يكون رئيسها النائب الأول للمحافظ وتمنح له هذه اللجان صلاحيات التمسول والإعانة إما فيما يخص التخصصات المالية فهي مركزية وذلك لضمان عدالة التوزيع بين المحافظات العسراق وان هذا الإجراء هو الأفضل والأضمن من وجهة نظر دائرة الرعاية لذا فيستتم الاستمرار بالعمل وفق هذا النهج لتفعيل الإجراءات البيروقراطية علما ان الصلاحيات الممنوحة لرؤساء اللجان عالية

## وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الانجاز الفني المتحقق (7)	الملاحظات والمواقف (8)
					الانتهاء	البدء		
2.1.5	تطوير قاعدة البيانات للأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية وتحديثها بشكل مستمر	دائرة الرعاية الاجتماعية	منحة البنك الدولي	8 مليون دولار	حزيران 2006	مستمر	95%	تم تفعيل الربط الشبكي في أقسام شبكة الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات كافة (عدا إقليم كردستان).
3.1.5	وضع برنامج لرفع القدرات لتأهيل وتدريب العاملين على حسن تطبيق نظام الشبكة	دائرة الرعاية الاجتماعية / قسم التخطيط	موازنة جارية	5 مليون دينار	1ك 2013 2ك 2013		90%	تم تنفيذ زيارة تفقيحية تفتيشية في بغداد والمحافظات (عدا إقليم كردستان) حيث تكون الحطة زيارة المحافظة كل فصل، أي تنفيذ (60) زيارة في السنة لمتابعة الأمور المالية، والية عمل الشبكة وتدريب المبالغ المسترجعة من المتجاوزين وتحقيق الضائبر والبيانات المدخلة على برنامج الشبكة وتقوم اللجنة بتحديد اعداد المتجاوزين على الشبكة وبعدها اتخاذ الاجراءات اللازمة باسترداد الاموال واحالتهم الى القضاء ولم يتم تحقيق جميع الزيارات التفتيشية الى اقسام الرعاية في المحافظات اقله الكادر المتخصص وعدم توفير تخصيص مالي على حساب الافراد
4.1.5	وضع تقارير أنظمة رقابية صارمة على البيات العمل وتنفيذ القانون من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	دائرة الرعاية الاجتماعية / شبكة الحماية الاجتماعية - قسم القانونية - قسم التحقيق - لجنة مكافحة الفساد	موازنة جارية	-	1ك 2013 2ك 2013		70%	

## وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الانجاز الفني المتحقق (7)	الملاحظات والمواقف (8)
					البدء	الانتهاء		
6.1.5	تصميم برنامج إعلامي موجه للمواطنين لتوعيتهم بحقوقهم وشروط الشمول والعقوبات الرادعة في حالة التجاوز على الشبكة	قسم الإعلام في دائرة الرعاية الاجتماعية	موازنة جارية	6	1ك 2013	2ك 2013	20%	اجراء حملات اعلامية تهدف الى نشر الوعي بين الفئات المستهدفة لأعانة الشبكة واستقبال شكاوي المواطنين بمعدل (50) شكوى يوميا ويتم الاجابة عليها خلال 48 ساعه
1.3.3	تكوين قاعدة بيانات على مستوى المحافظة والقضاء والناحية للأطفال في سن التعليم الاساسي من الأسرة الفقيرة المشمولة بشبكة الحماية	دائرة الرعاية الاجتماعية قسم تكنولوجيا المعلومات أقسام الشبكة المحافظات	موازنة استثنائية	-	تموز 2011	مستمر	90%	- تم تحويل قاعدة البيانات من برنامج (access) إلى برنامج (sql) لجميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان وبخطوات معينة باستخدام الانترنت يجري نقل المعلـــومات لتكون قاعدة البيانات متكاملة. - سيتم إكمال الربط الشبكي من قبل الإقليم بعد انجاز قواعد البيانات الخاصة بهم
2.3.3	إعادة النظر بقانون وتعليمات شبكة الحماية الاجتماعية فيما يضمن تسجيل ومواظبة أطفال الأسر المشمولة	دائرة الرعاية الاجتماعية	موازنة جارية	-	ايلول 2011	-	100%	

## وزارة التربية

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

الملاحظات والموحدات (8)	نسب الإنجاز الفني المتوقع (7)	مدة التنفيذ (6)		الكلية الكلية/ مليون دينار (5)	التحويل (4)	الجهة المنفذة (3)	أسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
		الانتهاء	البدء					
-	100%	1ت 2013	1يار 2013	-	موازنة جارية	المديرية العامة للتخطيط التربوي و المديرية العامة للمناهج	اعطاء اولوية في توزيع الخدمات التربوية ذات العلاقة بكفاءة التعليم (مختبرات وسائل تعليمية . الخ ) للنواحي والاحياء الفقيرة	1.4.3
مستمر	60%	2ت 2013	2أف 2013	62	موازنة جارية	المديرية العامة للعلاقات الثقافية	اعادة النظر بجهام قسم الاعلام التربوي لخلق الوعي بأهمية الالتزام بالتعليم الازلامي	5.1.3
عدد المتسربين للعام الدراسي 2012 - 2013 ( 99205 ) تلميذ	75%	نيسان 2014	1أف 2013	-	موازنة جارية	المديرية العامة للتخطيط التربوي و المديرية العامة لتعليم العام	تطوير نظام رصد ومتابعة المتسربين ضمن فئة التعليم الازلامي وفق برامج الخطه السنوية لوزارة التربية ( فرق المعلمين الميدانية ، اعتبار تقليص فرص التسرب مقياساً للكفاءة .... الى اخره )	6-1-3
-	100%	1يار 2015	1ت 2013	5	موازنة جارية	المديرية العامة للتخطيط التربوي	انشاء قاعدة معلومات عن توزيع المناطق الفقيرة تربوياً (جغرافيا واداريا ) وفقا لدرجة الحرمان من المدارس المتوسطة والاعدادية	1.2.3
-	75%	1يار 2014	1أف 2013	-	-	المديرية العامة للاشراف التربوي	تفعيل العلاقة مع مجالس الآباء والمعلمين وفق صيغة قانونية ومؤسسية معدة لنشر ثقافة التعليم الازلامي	4.1.3
-	100%	2013	2008	850	موازنة جارية	المديرية العامة للتعليم المهني	توفير وترويج التقارير و النشرات الدولية حول ربط التعليم المهني باحتياجات سوق العمل	1.6.3
-	70%	تموز 2013	2013	85	موازنة جارية	الهيئة العليا لمحو الامية	انشاء مراكز محو الامية	2.5.3
تم اعداد استمارة احصائية وتوزعها على المدارس كافة تتضمن بيانات على الطلبة والمعلمين والابنية حسب البيئة والجنس النشاط السنوي	100%	مستمر	1ت 2011	22	موازنة جارية	المديرية العامة للتخطيط التربوي	تكوين قاعدة بيانات للفئة العمرية المشمولة بالتعليم الازلامي وفق التوزيع الجغرافي وتحديثها باستمرار وبالتركيز على المناطق الريفية والفقيرة لتسهيل متابعة الاسر المشمولة	2-1-3

## وزارة التجارة

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المقتدة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الانجاز الفعلي المتحقق (7)	الملاحظات والموقعات (8)
					البداية	الانتهاء		
2.3.5	نظام رصد وتقييم واصلاح نظام البطاقة التموينية	وزارة التجارة	الموازنة الجارية	-	ايار 2012	اذار 2013	82%	<p>- يشمل النشاط حجب البطاقة التموينية عن العوائل ذوي الدخل العالية وتخصيصها للعوائل الفقيرة ولتحقيق ذلك تم تنفيذ مسح شامل للعوائل من خلال طبع استمارة الشمول حسب بيانات نظم التموين مصنفة حسب الفروع والمراكز التموينية وتسليمها الى وكلاء المواد الغذائية بموجب محضر وتوزيعها بعد ذلك على العوائل لادراج البيانات الخاصة بكل عائلة</p> <p>تم اعادة الاستمارة بعد ملء البيانات المطلوبه فيها بعد ذلك الى المجالس البلدية لغرض تصديقها واعيدت بعدها الى مسؤولي المراكز ومن ثم الى وحدة الحاسبة في الفروع التموينية لغرض ادخال البيانات ومن ثم تسليم الى دائرة التخطيط والمتابعة/ الحاسبة المركزية لغرض ارشفتها</p> <p>- تم اجاز المراحل العشرة الاولى من تطبيق النظام ونسبة (100%) والتي تشكل نسبة (70%) من اجمالي مراحل البرنامج من كل الفعاليات اما المرحلة الاخيرة من تطبيق النظام والتي تمثل نسبة (30%) من كل الفعاليات وهي مرحلة ادخال البيانات واستخراج النتائج فان نسبة الانجاز الفعلي يبلغ (35%) عدا اقليم كردستان .</p> <p>- حيث يتولى قسم الحاسبة الالكتروني في دائرة التخطيط والمتابعة بأشقة الاستثمارات المنجزة من قبل الفروع .</p> <p>- العمل مستمر بتحديث الاستثمارات في جميع الفروع عدا اقليم كردستان</p>

وزارة الكهرباء		مدة التنفيذ (6)		الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	التمويل (4)	الجهة المنفذة (3)	أسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
الملاحظات والمعوقات (8)	نسب الايجاز الفني المتحقق (7)	الانتهاء	البداية					
عدد الدور المستفيدة (١١٦٧)	% 100	أكتوبر 2014	أذار 2013	2.433	- موازنة الجارية	- وزارة الكهرباء	اتخاذ اجراءات اللازمة لهذه المشاريع (مشروع تنفيذ الشبكات الهوائية لكهربة الاحياء السكنية في مدينة الصدر) (1)	2.2.4

1- تنفيذ شبكات هوائية لمدينة الصدر في الاحياء الفقيرة .

## وزارة البلديات والإشغال العامة

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الاجاز الفني المتحقق (7)	الملاحظات والموقعات (8)
					البدء	الانتهاء		
1.3.2	توسيع المشاريع لإيصال الماء للصالح للشرب للمناطق الفقيرة (1)	- المديرية العامة للماء - مديرية ماء المحافظات	الموازنة الجارية	37.642	أكتوبر 2014	تموز 2010	79 %	- تم الانتهاء من نصب (190) وحدة تحلية مياه . - تالكت الشركة (العراق و العالم للتكنولوجيا) المنفذة للمشروع في نصب وحدات التحلية المنتقاة وتم توجيه اذار الى الشركة المنفذة بموجب كتاب المديرية العامة للماء المرقم م/اس17826 في 31/ 10/ 2012 -توجد وحدات تحلية بعدد (72) وحدة في مديريات ماء المحافظات(واسط،البصرة ،الانبار) وتشكل نسبة 20% من العدد الكلي للوحدات لم يتم نصبها بسبب عدم تهيئة المواقع من قبل المديريات اعلاه .

1- يشمل هذا النشاط إنشاء (350) وحدة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية في القرى والارياف في عموم المحافظات وزعت محطات التحلية الـ(350) وحدة على المحافظات كالاتي (نينوى (17) ، كركوك(17) ، صلاح الدين (30)، ديالى (23)، بغداد (12) ، الانبار (22)، بابل (23)، كربلاء المقدسة(19)، واسط (29)، النجف الاشرف(23) ، القادسية (27) ، المثنى (29) ، ميسان(23) ، ذي قار(30)، البصرة(26) . ) .

## وزارة البلديات والإشغال العامة

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الانجاز الفتي المتحقق (7)	الملاحظات والمعوقات (8)
					البدء	الانتهاء		
2.3.2	توسيع مشاريع الصرف الصحي	- المديرية العامة للماء - مديرية مياه المحافظات	الموازنة الجارية	985.039	اذار 2006	1ك 2015	36%	- يشمل هذا النشاط جميع المناطق في عموم العراق وذلك لعدم وجود حصر للمناطق الفقيرة(في مراكز المدن فقط). -النشاط مستمر - نسبة الانجاز الفعلي 36% من عمر المشروع - نسبة الانجاز المخطط 85% لعاية نهاية عام 2013 من عمر المشروع
4.3.4	توفير خدمات التخلص من النفايات	مدبريات البلدية في المحافظات	-الموازنة الجارية -تتمية الاقاليم	----	1ك 2014	2ك 2010	مستمر	- هذا النشاط يشمل جميع المواطنين ضمن حدود البلدية في المحافظات لعدم وجود حصر للمناطق الفقيرة و النشاط ينفذ سنوياً - هذا النشاط ادرج ضمن خطة تنمية الاقاليم للمحافظات ويتم الصرف والمتابعة من قبلهم اي ان المحافظة هي الجهة المسؤولة عن الصرف والتنفيد .

## امانة بغداد

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (11)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الانجاز الفتي المتحقق (7)	الملاحظات والموقعات (8)
					الانتهاء	البدء		
2.2.1	القيام بحملات التوعية بالوسائل المرئية والسمعية والمقروعة والنشرات (1) و	مديرية العلاقات والاعلام /امانة بغداد	الموازنة الجارية	-	اكف 2012	مستمر	100 %	- انجز (48) برنامج تلفزيوني من مجموع الكلي (48) برنامج - نسبة الانجاز الفعلي هي 100 % من المخطط السنوي لعام 2013
1.3.2	توسيع المشاريع لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة (2)	دائرة ماء بغداد	- موازنة استثمارية - تنمية الاقاليم	3.464	تموز 2008	اكف 2013	80 %	- نسبة الانجاز الفعلي 80 % من عمر المشروع

- 1 - يشمل النشاط برامج توعية مستمرة على مدار السنة على القنوات (العراقية ، الفجاء ، المسار ، الرشيد ، أفاق ، الندير) وصحيفة (صوت بغداد) ومجلة (ألق بغداد).
- 2 - يشمل النشاط اعمال مد شبكة ماء لمحلي (460 ، 428) بلدية الشعلة وربط تغذية للماء الصافي للمحلات (438,450,454) بلدية الشعلة .
- 3 - يشمل النشاط انشاء احواض تفتيش بقطر 1800 ملم في شارع المسعودي /بلدية الشعلة ومحطة ضخ على جانب منزل الصقلاوية جهة الجوالدين والرحمانية .

## امانة بغداد

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (11)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الاجاز الفتي المتحقق (7)	الملاحظات والمعرفات (8)
					البداية	الانتهاء		
1.1.4	تنفيذ مشاريع ابناء المجمعات السكنية للقراء بمواصفات قابلة الكافة (10*10)	أمانة بغداد /ادارة المشاريع في الامانة	- موازنة استثمارية	4.765	نيسان 2010	مستمر	-	تم احالة تقرير لجنة الدراسة والتحليل وتوصياتها مع اوليات الدعوة وثافتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض عرض الموضوع
1.3.4	تنفيذ مشاريع تبليط وازارة الطرق المؤدية الى الأحياء الفقيرة (2)	دائرة المشاريع في الامانة	- موازنة استثمارية - تنمية الاقاليم	18.734	ايلول 2012	حزيران 2013	100 %	انجز العمل

- 1 - يتنفذ مشروع (10\*10) ضمن قاطع مدينة الصدر 1. علما انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى من اعداد التصاميم مع شركة برود واي البريطانية ولمدة 145 يوم
- 2 - انجز مشروع تبليط وازارة شوارع القطاعات (25,11,44,45) ضمن قاطع بلدية الصدر/1 .

## وزارة الزراعة

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الانجاز الفني المتحقق (7)	الملاحظات والموقعات (8)
					البدء	الانتهاء		
2.1.1	برنامج لتدريب المزارعين على اساليب الزراعة والرعي الحديث	- وزارة الزراعة /الهيئة العامة للإرشاد والتعاون الزراعي	موازنة جارية	14	أكتوبر 2013	أكتوبر 2013	100%	- النشاط ينفذ سنوياً - عدد الورقات المخطط لهذا العام 250 دورة للتدريب على اساليب الري والمنفذ 264 دورة وبما فاق خططهم السنوية لهذا العام . - عدد المراكز التدريبية 15 مركز
3.1.1	الزراعية لصالح المزارعين الفقراء	- وزارة الزراعة /الدائرة القانونية	موازنة جارية	-	أكتوبر 2012	مستمر	80%	-تم انجاز ثلاث قوانين من اصل اربعة . - اما القانون الرابع (قانون توعيض الفلاحين والمزارعين عن الكوارث البيئية والمناخية) فهو قيد الدراسة . - 80% نسبة الانجاز الفعلي المتحققة من عمر النشاط

1 - القوانين هي :

- 1 - مشروع قانون القرى العصرية .. تمت المصادقة على القانون المذكور وهو قانون رقم (59) لسنة 2012 وتم نشره بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4252 في 15/ 10/ 2012
- 2 - مشروع قانون اعفاء المزارعين والفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة من ذمتهم رقم القانون 49 لسنة 2012 ونشر في جريدة الوقائع العراقية 4242 في 11/ 6/ 2013.
- 3 - مشروع قانون اجراء الاراضي الزراعية وتمليك حق التصرف والتملك فيها للخرجين الزراعيين والبيطريين رقم القانون 24 لسنة 2012 ونشر في جريدة الوقائع العراقية 4287 في 26/ 8/ 2013.
- 4 - مشروع قانون تعويض الفلاحين والمزارعين عن الكوارث البيئية والمناخية .

## وزارة التخطيط

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الانجاز الفني المحقق (7)	الملاحظات والمعمقات (8)
					البدء	الانتهاء		
1.2.5	تحديث خط الفقر الوطني سنويا بالاستفادة من مسوحات الأسر والمصادر الإحصائية الأخرى لتحديد الأسر المستهدفة بالأعانة	- الجهاز المركزي للإحصاء - هيئة احصاء اقليم كردستان	-	-	2 أيار 2011	أذار 2013	40 %	تضمن النشاط تنفيذ مسح (IHSES) المسح المستمر وتحديث خط الفقر وهو في مرحلة التنفيذ الميداني وتم الانتهاء من 41 % من مدة المسح

## محافظة نينوى

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الاجاز الفني المتحقق (7)	الملاحظات والموقعات (8)
					الانتهاء	البداية		
2.3.2	توسيع مشاريع الصرف الصحي	محافظة نينوى (مديرية مجاري نينوى)	تنمية الاقليم	29.586	حزيران 2012	حزيران 2013	75%	و عددها (9) مشاريع موزعة على اقصية المحافظة
2.2.3	تخصيص تمويل كاف ضمن الموازنة الاستثمارية التربوية حسب المراحل (اولوية للإنفاق الحكومي الإستثماري التربوي) مع اولوية في تخصيص بناء وتأهيل المدارس المتوسطة والاعدادية في القرى والأحياء الفقيرة وفق سقف زمنية ملائمة	مديرية تربية نينوى	تنمية الاقليم	68.930	حزيران 2012	حزيران 2013	40%	و عددها (78) مدرسة موزعة على اقصية المحافظة و اضافة (30) جناح موزعة على اقصية المحافظة
1.3.4	تنفيذ مشاريع تخطيط و ادارة الطرق المؤدية الى الأحياء الفقيرة	مديرية بلدية الموصل مديرية بلدية نينوى مديرية طرق وجسور نينوى	تنمية الاقليم	42.400	تموز 2012	حزيران 2013	50%	عدد المشاريع (59) مشروع بعض المشاريع قيد الاحالة
2.1.2	بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة	دائرة صحة نينوى	تنمية الاقليم	107.840	حزيران 2012	أف 2013	40%	عددها (43) مشروع
1.3.2	توسيع المشاريع لايصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	مديرية ماء نينوى	تنمية الاقليم	39.404	تموز 2012	أف 2013	50%	(33) مشروع

محافظة الانبار

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الاجاز الفني المتحقق (7)	الملاحظات والموقعات (8)
					البدء	الانتهاء		
2.2.3	تخصيص تمويل كاف ضمن الموازنة الاستثمارية التربوية حسب المراحل (أولوية للإنفاق الحكومي الإستثماري التربوي) مع اولوية في تخصيص بناء وتأهيل المدارس المتوسطة والاعدادية في القرى و الاحياء الفقيرة وفق سقف زمنية ملائمة	مديرية تربية الانبار	تنمية الاقاليم	2.935	اذار 2012	اك 2013	100 %	بناء (5) مدارس في قرى (الهضبة، الجزيرة، الملاحة، البوعينة، الو عزام، المحامدة، السناف، العش)
2.1.6	اعطاء الاولوية في انشاء مدارس البنات الابتدائية والثانوية في الاحياء الفقيرة	مديرية تربية الانبار	تنمية الاقاليم	2.887	اذار 2012	اك 2013	100 %	انشاء (4) مدارس في الاحياء الفقيرة - تم اضافة مدد اضافية بسبب الاوضاع الامنية
2.1.2	بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة	دائرة صحة الانبار	تنمية الاقاليم	1.327	اذار 2012	حزيران 2013	100 %	انشاء مراكز عدد (4) في قرى (شط العرب، الواليد، السجارية، الو علي جاسم، الصوفية)
1.3.2	توسيع المشاريع لايصال الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	مديرية ماء الانبار	تنمية الاقاليم	2.680	اذار 2012	اك 2013	100 %	توسيع المشاريع لايصال الماء الصالح للشرب عدد (5) في قرى (المجر، الو عرسان، الصفرة، النهية، خلف الحميرة) - تم اضافة مدد اضافية بسبب الاوضاع الامنية

## محافظة ديالى

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة الممولة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الاجاز الفتي المتحقق (7)	الملاحظات والمعلومات (8)
					البدء	الانتهاء		
2.2.4	اتخاذ اجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لهذه المشاريع	مديرية كهرباء ديالى	تنمية الاقليم	460	شباط 2014	نيسان 2013	73%	تأهيل الكهرباء في حي الكرامة وقرى (جميز , العثمانية)
4.2.3	وضع برنامج مساندة ودعم مع الحكومات المحلية لأشياء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة والاعدادية	مديرية تربية ديالى	تنمية الاقليم	1700	آيار 2014	نيسان 2013	60%	وعدد ها (3) مدرسة في قرى (الوربين ,حضة النجم , العزي)
1.3.4	تنفيذ مشاريع تبليط وإنارة الطرق المؤدية الى الأحياء الفقيرة	دائرة الطرق والجسور	تنمية الاقليم	500	آذار 2014	حزيران 2013	10%	تبليط طريق قرية جبارة
2.1.2	بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة	دائرة صحة ديالى	تنمية الاقليم	1500	شباط 2014	نيسان 2013	30%	انشاء مراكز عدد (2) في قرى (بسيبانه الفرعية , عتبة)
1.3.2	توسيع المشاريع لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	مديرية ماء ديالى	تنمية الاقليم	300	شباط 2014	ت 1 2013	20%	تدبير وتنفيذ شبكة ماء في قرية جيزاني في قضاء هبيب

محافظة بغداد

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	التكلفة الكلية / مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الاجاز الفني المتوقع (7)	الملاحظات والموقعات (8)
					البدء	الانتهاء		
4.2.3	وضع برنامج مساعدة ودعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس (1) خاصة المتوسطة والاعدادية	محافظة بغداد	موازنة تنمية الإقليم	38.789	اب 2012	تموز 2013	31 %	تمت المباشرة في بناء المدارس واغلب المدارس في مرحلة تنفيذ السقوف .
1.3.2	توسيع المشاريع لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة (2).	محافظة بغداد	موازنة تنمية الإقليم	21.524	تموز 2012	ك2 2014	57 %	- العمل مستمر في جميع المناطق .

- يشمل النشاط تنفيذ وإنشاء (30) مدرسة للمناطق الفقيرة في (الرشدية / مقاطعة البو دلي ، منطقة معامل البرية مقاطعة 5 عاشور ، بزير الضخيلية محلة 759 مقاطعة 16 ، القطاعات (28،29) مدينة الصدر / 1 مقاطعة 13 الخزانات ، ابو غريب /الرضوانية الغربية/مقاطعة 17 ،السويب ،ابو دشير ، هور الباشا/ مقاطعة 22 ،الشعلة ،الحرية ، مدينة الصدر/ 21 ، محلة 37 /الطيفية) .
- يشمل النشاط تفكيك ونقل وتشغيل وفحص مجمع ماء سعة 200 م<sup>3</sup> /ساعة عدد (5) مجتمعات في المناطق الفقيرة (البرسيفه/ القنوح والجباين ، التاجي /جرف الملح والفلاحات ، حي اليساري في العياجي ، ناحية الطيفية ، قرية الكرامة والسعادة ،ناحية الزهور (الحسينية الاولى)) .

## محافظة بغداد

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الاجاز الفني المتوقع (7)	الملاحظات والمعلومات (8)
					البدء	الانتهاء		
1.3.4	تنفيذ مشاريع تبليط (1) و اضاءة الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرة	محافظة بغداد	موازنة تنمية الإقليم	16.211	حزيران 2012	حزيران 2013	57%	المشروع متاكئ بسبب مخالفات من قبل مقاولين
2.1.2	بناء مراكز رعاية صحية أولية مجهزة	محافظة بغداد	موازنة تنمية الإقليم	14.504	تموز 2012	تموز 2014	30%	المشروع متاكئ بسبب تأخر فحوصات المواد

1 - يشمل النشاط تاهيل شبكة الكهرباء و اضاءة الطرق في محلات منطقة المعامل الفقيرة / بغداد المحلات (779، 777، 775، 774، 773، 772، 771).  
 2 - يشمل النشاط انشاء (3) مراكز صحية في المناطق الفقيرة في ( الحسينية ، الزعفرانية ) و مناطق فقيرة في قضاء المحمودية .

محافظة واسط

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الإنجاز الفتي المتحقق (7)	الملاحظات والمعوقات (8)
					البدء	الانتهاء		
1. 3. 2	توسيع المشاريع لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة (1)	محافظة واسط	تنمية الأقاليم	9.420	أيلول 2013	حزيران 2014	4 %	العمل مستمر
4. 2. 3	وضع برنامج مساندة ودعم الحكومات المحلية لإنشاء (2) وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة والأعدادية	محافظة واسط	تنمية الأقاليم	6.000	1 ك 2013	شباط 2015	2 %	العمل مستمر
1. 3. 4	تنفيذ مشاريع تخطيط وازارة الطرق المؤدية الى الأحياء الفقيرة (3)	محافظة واسط	تنمية الأقاليم	5.432	أيلول 2013	أب 2014	14 %	العمل مستمر

- 1- يشمل النشاط تجهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء مجمعة طاقة 3م50 اس في (3) قرى ريفية هي (قرى شاندي الغربي /قضاء النعمانية، قرى بدعه حمد /قضاء الصويرة ، خط الرسول /ناحية البشار). .
- 2- يشمل النشاط بناء (10) مدارس ذات 12 صف في المناطق الريفية ( نصف الدجلة /ناحية واسط ، قرية مسلم ابن عوسجة /الشحيبية، الوافدين /قضاء الكوفة) .
- 3- يشمل النشاط تنفيذ تخطيط وازارة الطرق في الأحياء والمناطق الفقيرة (ام النبي والصباح /الاحرار ، طريق الامام الرضا /قضاء زرباطية ، طريق قرية السوالم / قضاء الحي) .

## محافظة بابل

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الاجاز الفني المتحقق (7)	الملاحظات والمعلومات (8)
					البدء	الانتهاء		
4.2.3	وضع برنامج مساندة ودعم مع الحكومات المحلية (1) لإنشاء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة والاعدادية	ديوان محافظة بابل	تنمية الاقاليم	17.263	1 ك 2013	حزيران 2012	63%	المشروع ملكي تم سحب العمل في بعض المدارس
2.1.2	انشاء مراكز رعاية (2) صحية اولية مجزأة	ديوان محافظة بابل	تنمية الاقاليم	423	2 ث 2013	2 ث 2012	86%	المشروع ملكي
1.3.2	توسيع المشاريع (3) لايعمل الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	ديوان محافظة بابل	تنمية الاقاليم	2.717	ابريل 2013	تموز 2012	43%	المشروع ملكي

- 1- بناء مدارس (10) صف عدد 4 مدارس، (18) صف عدد 6 مدارس، في قضاء الهاشمية ناحية القاسم. انشاء مدارس (18،12،9) صف عدد 3 بلسلوب البناء الجاهز في المسيب / حرف الصخر، بناء (5) اخحة مدارس في قضاء الهاشمية ناحية الشوملي، بناء جناح عدد (2) هي جناح (6) صف طابقين في اعدادية اسماء للبنات / المحاويل/ الحي العسكري وجناح (4) صف طابقين في مدرسة الاندلس الابتدائية / ناحية الامم). بناء جناح صف طابقين في مدرسة الفيروان الابتدائية - قضاء المسيب / ناحية السدة - الاسكندرية.
- 2- هدم وبناء مركز صحي عدد (1) في قرية الباج الشمالي / حرف الصخر / قضاء المسيب.
- 3- تجهيز وفحص وتنفيذ ونصب مجمع ماء العمادية سعة 200م<sup>3</sup>/ ساعة في قضاء الهاشمية بكلفة (1.311) مليون دينار، تجهيز وفحص وتنفيذ وتشغيل مجمع ماء المهناوية قرية (5) سعة 200م<sup>3</sup>/ ساعة في ناحية السدة بكلفة (1.405) مليون دينار.

محافظة بابل

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	التكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الانجاز الفعلي المتحقق (7)	الملاحظات والمعرفات (8)
					البدء	الانتهاء		
1.3.4	تنفيذ مشاريع تبليط و انارة الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرة (1)	محافظة بابل	تنمية الاقاليم	1.194	ايار 2013	ايلول 2012	100 %	أنجز المشروع
1.1.4	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقراء (2)	محافظة بابل	تنمية الاقاليم	27.843	حزيران 2015	1 أيلول 2012	15 %	يشمل النشاط بناء 25 عمارة يبلغ عدد الشقق 300 شقة - يقرر عدد الافراد المستفيدين بحدود 2070 فرد - مدة التنفيذ 30 شهراً

- 1- انشاء طريقين في مركز قضاء المحاول (طريق حمزة كربول وطريق قرية برون ببول 3435 م)
- 2- انشاء مجمعات سكنية اقتصادية في قضاء الحلة ناحية ابي غرق بالإضافة الى الخدمات الأساسية (مدرسة ابتدائية / 2 صف، مركز دفاع منفي ، اسواق، استعلامات، شبكة مجاري للمجمع مع محطة معالجة، محطة ضخ ماء للمجمع ، طرق وساحات).

## محافظة كربلاء

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

الملاحظات والمواقف (8)	نسب الإجاز الفتي المتحقق (7)	مدة التنفيذ (6)		الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	التمويل (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
		الانتهاء	البدء					
- تم ايجاز المشروع بعد استحداث مدد اضافية	100 %	ك1 2013	تشرين 2010	7.500	- موازنة استثمارية - تنمية اقاليم	محافظة كربلاء	بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة (1)	2.1.2
- انجز المشروع - تمر اغلب المشاريع بمرحلة التسليم	100 %	ك1 2013	ك2 2010	22.961	- موازنة استثمارية - تنمية اقاليم	محافظة كربلاء	تنفيذ مشاريع لبناء المحمعات السكنية الاقتصادية للقراء (2)	1.1.4
- العمل مستمر - تم استحداث مدة اضافية للمشروع بسبب هطول الامطار	94 %	ت2 2013	ك1 2010	2.224	موازنة استثمارية	محافظة كربلاء	توسيع المشاريع لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة (3)	1.3.2
تم انجاز (14) مدرسة من اصل (15)	98 %	مستمر	تشرين 2010	48.047	- موازنة استثمارية - تنمية اقاليم	محافظة كربلاء	وضع برنامج مساندة ودعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة والاعدادية (4)	4.2.3

- 1- انشاء (3) مراكز صحية فرعية للمناطق الفقيرة في (أم غرار ،حي الغدير، قرية العتاككة/ناحية الحسينية).
- 2- تنف المشاريع البناء الاقتصادي في قضاء (عين تمر) ومناطق فقيرة في النواحي ( الحسينية ،الجمول العربي ، الحر).
- 3- تنفيذ شبكة ماء في القرى الفقيرة في (شيخ حمزة نسيب حسن ،محرم عيشة ،الطنبي ،الكص الشمالي ،سيف سعد ) وحي التحدّي الفقير .
- 4- بناء (15) مدرسة في المناطق الفقيرة في النواحي (الحر ، الحسينية ،الخيرات ،الجدول الغربي).

## محافظة النجف

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	التكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الإيجاز الفني المتحقق (7)	الملاحظات والموقعات (8)
					البدء	الانتهاء		
1.3.2	توسيع المشاريع (1) للإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	- المحافظة - دائرة الماء	- تنمية الأقاليم - الموازنة التشغيلية	11.398	تموز 2013	شباط 2011	100 %	انجز مشروع
2.1.2	بناء مراكز رعاية صحية أولية مجهزة (2)	دائرة الصحة	تنمية الأقاليم	730	تموز 2013	تموز 2012	100 %	انجز المشروع
1.3.4	تنفيذ مشاريع تخطيط وإنارة الطرق المؤدية الى الأحياء الفقيرة (3)	- المحافظة - مديرية بلدية النجف - مديرية كهرباء النجف	تنمية الأقاليم	4.321	أب 2013	أب 2012	100 %	انجز مشروع

- 1- يشمل النشاط إنشاء مجمع ماء وخطوط ناقلية في ناحية الحيدرية/ قضاء النجف وإنشاء وجمع ماء سعة 1000 م<sup>3</sup> / ساعة في ناحية الحيرة/ قضاء الكوفة ومد خط انابيب لمنطقة الرضويه الريفية التي تعتمد 5 كم عن مدينة النجف مع مجمع ماء البراكية وخطوط ناقلية في ناحية الحيدرية .
- 2- بناء مركز صحي في منطقة الحوائم/ قضاء الكوفة .
- 3- تأهيل الجزء المتبقي من حي القاسم في ناحية الحيدرية/ قضاء النجف وكهربية قرية النور /مقاطعة مظلوم / قضاء النجف، وتنفيذ طريق رمل ال شيل في ناحية القادسية/ قضاء المشخاب وتأهيل منطقة الوقف في ناحية الحي / قضاء الكوفة و تباطئ طريق حصيد في الهارمية/ قضاء المشخاب .

## محافظة ذي قار

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الايجاز الفني المتحقق (7)	الملاحظات والمعرفات (8)
					البداية	الانتهاء		
1.3.4	تنفيذ مشاريع تبليط وازارة الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرة	محافظة ذي قار	تنمية الاقاليم	5.700	1 ت 2013	2 اك 2015	% 18	العمل مستمر
2.2.4	اتخاذ اجراءات لتوفير النفي التحتية اللازمة لمشاريع السكن الاقتصادي ( ايصال التيار الكهربائي )	محافظة ذي قار	تنمية الاقاليم	3000	1 ت 2013	حزيران 2015	% 7	العمل مستمر
4.2.3	وضع برنامج مساندة ودعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة و الاعدادية	محافظة ذي قار	تنمية الاقاليم	4000	اب 2013	2 ت 2015	-	لم يبدأ الشروع

## محافظة الديوانية

## خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	التكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسب الانجاز الفتي المتحقق (7)	الملاحظات والمواقف (8)
					البدء	الانتهاء		
1.3.2	توسيع المشاريع لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	محافظة الديوانية	تنمية الاقاليم	49.901	شباط 2014	2ك 2012	60 %	العمل مستمر
1.3.4	تنفيذ مشاريع تخطيط وازارة الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرة	محافظة الديوانية	تنمية الاقاليم	1.440	ايار 2015	ايلول 2013	65 %	العمل مستمر
4.2.3	وضع برنامج مساعدة ودعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة والإعدادية	محافظة الديوانية	تنمية الاقاليم	14.572	1ك 2013	ايار 2102	100 %	أنجز المشروع
2.2.4	اتخاذ اجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لمشاريع المجمعات السكنية	محافظة الديوانية	تنمية الاقاليم	39.655	2ك 2013	ايار 2102	100 %	أنجز المشروع

محافظة ميسان		مدة التنفيذ (6)		الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	التمويل (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
الملاحظات والمعوقات (8)	نسب الاجاز الفني المتحقق (7)	الانتهاء	البداية					
العمل في مرحله النهائية	86 %	العمل مستمر	2011	48.750	تنمية الاقاليم	محافظة ميسان	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقر في الاقاليم	1.1.4
العمل في مرحله النهائية	95 %	العمل مستمر	اذار 2011	5.280	تنمية الاقاليم	محافظة ميسان	وضع برنامج مساندة ودعم مع الحكومات المحلية لأشياء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة والاعدادية	4.2.3

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013

محافظة المثنى	ملاحظات والمعلومات (8)	نسب الإنجاز الفني المحقق (7)	مدة التنفيذ (6)		التكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	التمويل (4)	الجهة المنفذة (3)	أسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
			الانتهاء	البدء					
العمل مستمر		30 %	شباط 2014	نيسان 2012	2150	تعمية الاقاليم	محافظة المثنى	بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة	2.1.2
العمل مستمر		68 %	شباط 2014	أكتوبر 2012	1900	تعمية الاقاليم	محافظة المثنى	تنفيذ مشاريع تلميط و نارة الطرق المودية الى الاحياء الفقيرة	1.3.4
المشروع منتهي		89 %	حزيران 2013	أذار 2012	26.275	تعمية الاقاليم	محافظة المثنى	وضع برنامج مساندة ودعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس الخاصة المتوسطة و الاعيادية	4.2.3
المشروع منتهي		50 %	أيار 2013	أذار 2012	6.070	تعمية الاقاليم	محافظة المثنى	إنشاء نوادي رياضية و علمية و متنزهات عامة	5.3.4

محافظة البصرة		مدة التنفيذ (6)		الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	التمويل (4)	الجهة المنقذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
الملاحظات والمعوقات (8)	نسب الانجاز الفعلي المتحقق (7)	الانتهاء	البداية					
انجز العمل	% 100	أيار 2013	نيسان 2011	1.379	تنمية اقاليم	محافظة البصرة	بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة	2.1.2
انجز العمل	% 100	أيار 2013	نيسان 2012	1.842	تنمية الاقاليم	محافظة البصرة	وضع برنامج مساندة ودعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس الخاصة المتوسطة و الأعدادية	4.2.3
