



## التقرير السنوي

لمتابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية

التخفيف من الفقر لعام 2015



جمهورية العراق  
وزارة التخطيط



الادارة التنفيذية  
لإستراتيجية التخفيف من الفقر



# التقرير السنوي لمتابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2015

نيسان 2016



## المحتويات

## تقديم

1	المقدمة.....
1	خلاصة تنفيذ أنشطة ومشاريع إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2015.....
3	المتحقق والمنجز من أنشطة تخفيف الفقر ضمن خطة الاعوام 2012 - 2015.....
38	خطة تخفيف الفقر من تخصيصات الاستراتيجية من الموازنة الاستثمارية لعام 2015.....
	ملحق (1) : استمارات متابعة أنشطة الوزارات والمحافظات الممولة من تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2015.....
39	الاستثمارية لعام 2015.....
	ملحق (2) : استمارات متابعة أنشطة الوزارات والمحافظات الممولة من تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الجارية لعام 2015.....
93	الجارية لعام 2015.....
97	ملحق (3) : استمارات متابعة أنشطة الوزارات والمحافظات الممولة من خطط تنمية الوزارات والمحافظات لعام 2015.....



## تقديم

في ضوء توجيهات اللجنة العليا لإستراتيجية التخفيف من الفقر، وبعد مرور خمس سنوات على صدور اول تقرير لمتابعة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر في عام 2011، يسرّ اللجنة الفنية أن تقدم تقريرها الخامس لمتابعة وتقويم الانجازات المتحققة على طريق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وتشخيص التحديات والصعوبات التي تواجهها.

للمضي قدماً في خطتنا الوطنية لتخفيف الفقر، تم رصد مبلغ 209.400 مليار دينار من الموازنة الاستثمارية لعام 2015 لتنفيذ أنشطة الإستراتيجية.. وبتكاتف الجهود ومن خلال أنشطة ومشاريع تخفيف الفقر من خطة الإستراتيجية فضلاً عن تنفيذ بعض الوزارات والادارات المحلية في المحافظات ضمن السياق ذاته ... كل ذلك اثمر عن نسبة انجاز بلغت % 59 وهي نسبة اقل من نسبة انجاز العام المنصرم بسبب ازمته انخفاض اسعار النفط وارهاب داعش وتأخر حصول جهات التنفيذ على التمويل....عكس ذلك على مستوى التفاعل والتواصل الحكومي والمجتمعي لتحقيق إنجازات افضل على طريق تخفيف الفقر في العراق.

لقد حرصنا في إعداد تقرير المتابعة الخامس على تسليط الضوء على اهم المنجزات المتحققة حتى 31/12/2015 وعلى المشاكل والتحديات بالاستفادة من المعلومات التي تم جمعها ميدانياً من الوزارات والحكومات المحلية المشمولة بأنشطة الإستراتيجية، وفي ضوء استمارات المتابعة المعتمدة التي يتولى نقاط الارتكاز المنسقون بالتعاون مع الادارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر انجازها.

نغتنم فرصة اعداد هذا التقرير لتقديم الشكر والامتنان للجنة العليا لإستراتيجية التخفيف من الفقر، و السادة الوزراء أعضاء اللجنة العليا لدعمهم وتواصلهم المستمر..

كما نقدم الشكر والتقدير لمعالي وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي لدعمه الكبير للجنة الفنية وللإدارة التنفيذية ومتابعته الدقيقة لأعمالها، وللكوادر القيادية الفنية والمسؤولت عن إدارة الموازنة الإستثمارية في الوزارة الى جانب الكوادر القيادية لوزارة المالية لضمان وتأمين تخصيصات في الموازنة العامة للدولة للأعوام 2012 و 2013 و 2014 و 2015.

اخيراً نوجه الشكر للسيدات والسادة اعضاء اللجنة الفنية الدائمة لإستراتيجية التخفيف من الفقر وللأدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر لاسيما الست نجلاء علي مراد المدير العام التنفيذي ولكل العاملين معها وهم كل من السيد حيدر صلاح، السيدة ميرفت عبدالله هادي، السيد شوان خالد، السيد نور محمد رحمة، السيد احمد رعد، السيد حاتم جاسم زيدان، الانسة رنا رجاء، الانسة ابتسام جاسم محمد، السيدة بيداء محمود جاسم السيدة قبس غسان لإخلاصهم وحرصهم في انجاز الاعمال ومنها بشكل خاص اعداد هذا التقرير.

والله ولي التوفيق..

د. مهدي محسن العلاق

رئيس اللجنة الفنية الدائمة

لاستراتيجية التخفيف من الفقر

نيسان / 2015



برزت تداعيات الفقر على الجانب الاقتصادي والسياسي في العراق على حد سواء بعد عقد من الحصار الاقتصادي تلاه حروب وتهجير ونزوح طالت نسبة واسعة من المجتمع... اسهم ذلك في مجمله الى قبوع حوالي ربع سكان العراق تحت خط الفقر وفق تقديرات الفقر لعام 2007 ... الامر الذي استدعى تبني رؤى استراتيجية لعلاج هذه المشكلة في العراق والذي تبلور في استراتيجية التخفيف من الفقر.

تمتاز الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر بكونها اول وثيقة رسمية تعني بحقوق الفقراء في العراق والارتقاء بمستواهم المعيشي وتخفيف تبعات الفقر متعدد الابعاد عن كاهلهم... وقد تناولت مشكلة الفقر بالعلاج المتدرج والشامل من خلال خطة خمسية استمرت 2010 - 2014... وعلى الرغم من ما واجه تلك الخطة من تحديات شملت محدودية التخصيصات المالية وتاخر ورودها لجهات التنفيذ فضلا عن محددات اخرى كثيرة... الا انها استطاعت ان تطل المجتمع الفقير بالتغيير والتمكين من خلال جملة من المشاريع التي تهدف الى مكافحة الفقر وتخفيف وطأته على تلك الشريحة الهشة في المجتمع...

بدأ العمل في خطة شاملة متدرجة بالاهداف منذ عام 2012 من خلال تخصيص حوالي 445 مليار دينار شملت المحافظات السبعة الاكثر فقرا فضلا عن الوزارات الخدمية ذات الصلة بالفقر وابعاده المختلفة... في عام 2013 وبجهود استثنائية من الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر ارتفع سقف التخصيص الى حوالي 605 مليار دينار وتوسع التنفيذ ليشمل محافظات العراق كافة عدا اقليم كردستان... وانتهاجا للمبدأ ذاته وعلى الرغم من تحديات اقرار الموازنة في عام 2014 فقد نجحت الادارة التنفيذية للاستراتيجية في توفير حوالي (252.401) مليار دينار للحفاظ على ديمومة واستمرار تنفيذ مشاريع تخفيف الفقر... وبعد تعرض العراق لأزمتهين متتاليتين في النصف الثاني من عام 2014 احدهما جاءت نتيجة الانخفاض الحاد في اسعار النفط والاخرى احتلال داعش لمناطق عديدة. فمنذ حزيران 2014 تراجعت اسعار النفط الخام ولما كان العراق يعتمد بشكل كبير على النفط فيما يتعلق بالنتائج الاجمالية والصادرات وباعتباره المصدر الرئيسي للايرادات الحكومية فان الانخفاض في اسعاره ترك اثره القاسية على البلد، مما ادى الى انخفاض تخصيص إستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2015 لتصل الى ( 209.400 ) مليار دينار من الموازنة الاستثنائية و (6) مليار دينار من الموازنة الجارية تم توزيعها وفق نسب الفقر على جهات التنفيذ مع مراعاة ديمومة تمويل المشاريع المستمرة.

حددت الاستراتيجية خلال سنوات التنفيذ هدفا تصبو لتحقيقه وهو تخفيض نسبة الفقر من 23 % الى 16 % وبالرغم من التحديات والمعوقات التي واجهتها الا انها وما صاحبها من خطط حكومية اخرى نجحت في تخفيض نسبة الفقر الى 19 % حتى نهاية عام 2012 وهي ماضية في تحقيق اهدافها من خلال مشاريع وانشطة شملت فئات هشة في المجتمع وابعاد مختلفة للفقر وقد انخفضت نسبة الفقر الى 15 % في النصف الاول من عام 2014 ولولا ازمته انخفاض اسعار النفط وارهاب داعش على عدد من محافظات العراق التي زادت معاناة السكان المدنيين لتقرب للمستوى التي كانت عليه عام 2007 كنتيجة للاضطرابات التي تمت الاشارة اليها.

يسرنا اليوم ان نطلق تقريرنا الدوري الخامس لخطة تخفيف الفقر لعام 2015 وما تنفذ منها بمنتهى الشفافية...تتمتع لجهود الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر الرامية الى توخي مبادئ الحوكمة في ادارة خطط تخفيف الفقر.

## خلاصة تنفيذ أنشطة ومشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2015

الفقر مشكلة عالمية وظاهرة اجتماعية لها امتدادات اقتصادية وانعكاسات سياسية... وهي ظاهرة لا يخلو منها اي مجتمع مع التفاوت في حجم وطبيعة الفئات المتضررة منها، الا ان حدة الفقر تزداد في المجتمعات التي يلهث نموها الاقتصادي خلف نموها السكاني... طالت هذه الظاهرة المجتمع العراقي على اثر عقود من الحصار والحروب والتهجير والنزوح وتركت اثرا بالغاً على كل اطرافه وفئاته مخلفة نسب بطالة عالية وامية وازمة سكن ومشاكل صحية متفاقمة... الامر الذي دفع الادارة التنفيذية للاستراتيجية الى ايجاد حلول وتبني خطط ترمي الى تخفيف المعاناة عن الفقراء والفئات الهشة في المجتمع... وقد قطعت الادارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر شوطا في تنفيذ خطط سنوية بدأت بتخصيصات من الموازنة الاستثمارية لعام 2012 واستمرت عام 2013 وواجهت تحديات الموازنة والتخصيص في الاعوام 2014، 2015 وبالرغم من العقبات الاقتصادية التي يمر بها العراق تم تخصيص مبلغ يربو على 209 مليار دينار من الموازنة الاستثمارية لعام 2015 لتنفيذ مشاريع قائمة ومستمرة خلال الاعوام 2012، 2013، 2014 وتم انجاز (6) مشاريع خلال عام 2015... كما دأبت على متابعة تنفيذ المشاريع وحل ما يواجهها من محددات تحول دون الانجاز...تم توزيع نصف التخصيص المذكور الى وزارات وجهات اخرى لمعالجة تداعيات الفقر. في حين حازت محافظات العراق) عدا اقليم كردستان( على النصف الثاني من التخصيص لتنفيذ مشاريع تحقق اهداف توفير دخل اعلى للفقراء، تحسين وضعهم الصحي وتحسين تعليمهم فضلا عن تهيئة بيئة سكن مناسبة لهم حصلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على نسبة تخصيص بواقع 17 % كونها الجهة ذات التماس المباشر مع الفقراء، فيما حصلت كل من وزارتي الصحة والاعمار والاسكان على 20 %، كما حصلت بقية المحافظات على نسبة 49 %، فضلا عن حصول الوقفين (السنني، الشيعي) على نسبة 14 % من التخصيص لعام 2015 والشكل (1) يوضح نسب التخصيص التي حازت عليها الوزارات و المحافظات.



تصدرت المحصلة الخامسة حماية اجتماعية فعالة باقي محصلات الاستراتيجية إذ حققت نسبة إنجاز بلغت 97% من خلال تنفيذ نشاطين أحدهما مشروع إستهداف الممولين بإعانة شبكة الحماية الاجتماعية وذلك بتنفيذ مسح البحث الاجتماعي للممولين بشبكة الحماية الاجتماعية والثاني مشروع تنفيذ مشروع البيئة التبريرية لإصلاح نظام البطاقة التموينية، كما نفذت وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط (5) أنشطة من المحصلة الخامسة كان أبرزها اتخاذ الاجراءات لاعتماد اللامركزية في ادارة شؤون شبكة الحماية الاجتماعية، تطوير قاعدة البيانات للأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية وتحديثها بشكل مستمر، وضع برامج لرفع القدرات وتأهيل وتدريب العاملين على حسن تطبيق نظام شبكة الحماية، وضع تقارير صارمة على آليات العمل وتنفيذ القانون من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تصميم برامج اعلامية موجهة للمواطنين، فضلا عن تحديث خط الفقر الوطني سنويا بالاستفادة من المسوح الاحصائية الاخرى لتحديد الاسر المشمولة بالاعانة.

حلت محصلة نشر وتحسن تعليم الفقراء في المرتبة الثانية من حيث التنفيذ إذ بلغت نسبة إنجاز هذه المحصلة 72% وشملت تنفيذ (20) مشروع من تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر وهي بناء مدارس بدل الطينية فضلا عن بناء مدارس في محافظات (بابل، كربلاء، النجف)، كما نفذت الوزارات والمحافظات ضمن خططها التنموية (13) نشاطا تنوعت الأنشطة ما بين بناء مدارس، تفعيل العلاقات مع مجالس الآباء والمعلمين، سن قانون محو الامية وإنشاء مراكز لتعليمهم، إعادة النظر بقانون وتعليمات شبكة الحماية الاجتماعية بما يضمن تسجيل ومواظبة اطفال الاسر المشمول، انشاء قاعدة معلومات في توزيع المناطق الفقيرة تربوياً من خلال برنامج EMIS، تطوير نظام المتسربين ضمن فئة التعليم الالزامي.

حلت محصلة البعد الصحي في المرتبة الثالثة إذ حققت نسبة إنجازها 70% من خلال تنفيذ (71) مشروعاً من تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2015 وقد تنوعت تلك الأنشطة بين بناء مراكز صحية وتوفير عيادات متنقلة واجهزة طبية متعددة الأغراض واجهزة مختبرية وتوفير مشاريع الماء الصالح للشرب وغيرها من المشاريع التي تساهم مخرجاتها في تحسن الواقع الصحي للفقراء. كما نفذت الوزارات والمحافظات ضمن خططها التنموية (8) أنشطة كان أبرزها حملات توعية بالوسائل المرئية والسمعية للأمراض الانتقالية، تقوية الرصد الوبائي للأمراض الانتقالية والأصابات بالأمراض المشمولة بالتحصين، تنفيذ الحملات التلقائية فضلاً عن القيام بحملات توعية لبرنامج الصحة الانجابية، بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة، توسيع مشاريع الصرف الصحي وايصال الماء الصالح للشرب في المناطق الفقيرة.

وقد حلت في المرتبة الرابعة المحصلة الاولى دخل اعلى من العمل للفقراء إذ حققت نسبة تنفيذ بلغت 41% علماً أن هذه المحصلة تم احتسابها من مشاريع وأنشطة نفذت من تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية للاعوام 2012، 2015 فقط، التي شملت مشروع القروض الصغيرة للفقراء وفق ضوابط وآليات محددة فضلاً عن اقامة دورات تدريبية لتسليمي القروض لتأهيلهم. على الرغم من وجود عدد غير قليل من الأنشطة ومشاريع نصب في هدف هذه المحصلة من خطط تنمية الوزارات والمحافظات الا انه لم تشمل في الحساب لصعوبة حصر تخصيصاتها ونسب إنجازها إذ تنفذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (10) أنشطة لتمكين الفقراء وتحسن وضعهم المعاشي، تنوعت هذه الأنشطة ما بين تشريع قوانين للمزارعين الفقراء وحملات تفتيشية لمراقبة حسن تطبيق قانون العمل والشؤون الاجتماعية الجديد وحملات متنوعة لإرباب العمل لضمان حقوق العاملين بما يتناسب مع تحديد الحد الأدنى لإجورهم وأنشطة أخرى مختلفة تهدف في مجملها تمكين الفقراء وتحسين وضعهم المعاشي

أخيراً جاءت المحصلة الرابعة بيئة سكن افضل للفقراء في المرتبة الثالثة من حيث التنفيذ إذ بلغت 37%، نفذت (73) مشروع من تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر شملت توفير دور اقتصادية للفقراء وتوفير بنى تحتية، كما نفذت الوزارات والمحافظات ضمن خططها السنوية (9) أنشطة كان أبرزها انشاء مجمعات اقتصادية في المحافظات، مشاريع البنى التحتية (ماء، مجاري، كهرباء) تبليط وانارة الطرق المؤدية للإحياء الفقيرة والنوادي الرياضية والمتنزهات في المناطق الفقيرة فضلاً عن تنفيذ برامج خدمية تشمل التخلص من النفايات في عموم المحافظات.

تعني المحصلة السادسة بتوفير الحماية للنساء الفقيرات من التمييز النوعي وخاصة في ظل المجتمع الذكوري الساري في الريف العراقي بالدرجة الاساس و على الرغم من ايلاء الادارة التنفيذية للاستراتيجية أهمية خاصة للمرأة الا ان عدد الأنشطة المتبناة في هذه المحصلة لم يتجاوز (4) أنشطة من اصل (11) نشاط وقد انجزت وزارة المرأة عدداً من الأنشطة للنهوض بواقع المرأة الريفية بتنفيذ عدد من البرامج تنوعت ما بين انشاء مدارس ثانوية للبنات وتنفيذ برامج موجه للنساء لاسيما في الريف العراقي.

### المتحقق والمنجز من أنشطة تخفيف الفقر ضمن خطة الاعوام 2012 - 2015

في سياق استعراض المشاريع المنجزة من خطة إستراتيجية التخفيف الفقر للاعوام 2012 - 2015 والتي شملت (48) نشاطاً بواقع (199) مشروعاً... أنجز منها (82) مشروعاً، والتي تناولت ابعاد الفقر المختلفة من خلال توليد دخل اعلى للفقراء وتحسين الوضع الصحي وخلق بيئة سكن افضل للفقراء، كما ان هذه المشاريع ساهمت في احدي مراميها في تمكين المرأة الريفية والفقيرة من خلال تبني مشاريع تحقق اكثر من هدف وتعالج اكثر من بعد من ابعاد الفقر المختلفة. ومما لا يخفى على الجميع التحديات التي تلت احداث حزيران 2014 وما صاحبها من ازمات مالية وامنية والذي اثر سلباً على مستوى التنفيذ حيث توقفت اغلب المشاريع.

### المشاريع قيد التنفيذ في عام 2015 والمستمرة من الاعوام السابقة

يجري تنفيذ مشاريع تخفيف الفقر المستمرة من الاعوام 2012 و2013 و2014 والمشاريع التي ادرجت خلال عام 2015 وتمت المباشرة في تنفيذها في نفس العام وبنسب تنفيذ مختلفة... وفيما يلي استعراضاً لتلك المشاريع وفق محصلات تنفيذها:

## المحصلة الأولى (دخل أعلى من العمل للفقراء)

يعد الدخل المنخفض احد اهم الاسباب التي تؤدي الى الفقر، لذا فان استراتيجية التخفيف من الفقر تنتهج تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المرتبط بزيادة الانتاجية وتمكين الفقراء من خلال خلق فرص العمل والاقرض الميسر، الا ان ذلك لا يشكل بديلا عن السياسات الاجتماعية المرتبطة بتمكين الفقراء انفسهم وتحسين فرص وصولهم الى الموارد المهمة الاخرى، وانطلاقا من ذلك تبنت الاستراتيجية عددا من المشاريع التي تتكامل مع الهدف الانمائي الاول القضاء على الفقر المدقع والجوع فضلا عن المشاريع التي تساهم في زيادة الانتاجية.

## اولا: برنامج إقراض لتنفيذ أنشطة مدرة للدخل للفقراء

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : نشاط دعم مشروع القروض الصغيرة للفقراء وبكلفة كلية (168.750) مليار دينار مدرج في عام 2012 :

يشمل النشاط منح قروض صغيرة وفق ضوابط واليات محددة تشمل فئات كل من ( المعوقين ، المهجرين العائدين ، الارامل والمطلقات والمعيلات لاسرهن ، المطلق سراحهم من السجون ، المتضررين من العمليات الارهابية ، معيلي الاسر غير المستقرة من سكنة مناطق الطمر الصحي ، المتسولين ) لتوفير فرص عمل من شانها تحسين وضعهم المعيشي.

بدأ البرنامج في 1/ 9/ 2012 بشمول المحافظات السبعة الاكثر فقرا واستمر العمل فيه للاعوام 2012 - 2015 بعد ان تم التوسع به ليشمل محافظات العراق كافة (عدا اقليم كردستان) ضمن عدد معاملات مخططة بلغت 20877 معاملة وهو عدد المستفيدين من المشروع، تتراوح قيمة كل قرض بين (5 - 10) مليون دينار، وتمنح استنادا الى تقرير اللجان المختصة، وان هذه القروض تكون بدون فوائد وبمدة سماح تبلغ سنة واحدة من تاريخ تسلم القرض، فيما تسدد الاقساط على مدى ثمانية أعوام، وتمنح هذه القروض دفعة واحدة لكل الفئات باستثناء المتسولين وسكان مناطق الطمر الصحي، والتي تكون بدفعتين، اذ تدفع الدفعة الثانية بعد المباشرة بالمشروع وبناء على تقرير من اللجنة الفرعية في المحافظة يصدر خلال ( 30 ) يوما من تاريخ تسلم الدفعة الاولى. كما يمنح المقترض مبلغ مليون دينار كقرض اضافي في حالة تشغيله لاي عامل اضافي بعد مرور فترة لا تقل عن ستة اشهر من تنفيذ المشروع وبما لا يتجاوز سقف الاقراض المقرر واستنادا الى توصيات اللجنة المركزية في المحافظة ومصادقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ويعضى ورتة المقترض المتوفي مما تبقى بدمته في حالة غلق المشروع وعدم قدرة الورثة على ادارته واستنادا لتقرير اللجنة المركزية في المحافظة والمصادقات الاصولية.

يجري توزيع القروض وفق خطط اعدتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن الملاحظ محدودية مراعاتها لتقليل التفاوت بين النساء والرجال والذي لم يدعم تمكين المرأة، اذ تم توزيع اغلب القروض في المحافظات للرجال وبنسبة 98 % مقابل نسبة 2% للنساء . كما يتضح من تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان اغلب المقترضين كانوا من المتزوجين والذين شكلوا نسبة حوالي 86 % من مجموع المقترضين . وقد بينت تقارير وزارة العمل ان النسبة الاكبر من القروض استثمرت لتنفيذ مشاريع تجارية مدره للدخل وبنسبة 70 % ومشاريع خدمية بنسبة 16% وزراعية بنسبة 6% وصناعية بنسبة 8 % .

## اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى توفير القروض الميسرة والتي تعد الاساس لبدء مشاريع صغيرة مدرة لدخل الفقراء تساعد في تمكينهم وتهيئة الارضية التي يستند لها النمو الاقتصادي المستدام المرتبط بزيادة الانتاجية وخلق فرص عمل للفئات المهمشة والفقيرة.


## الشرائح المستفيدة :

تم التخطيط لاقراض 20877 مستفيد من العاطلين الفقراء.

## في طريق الانجاز

استمر العمل في اقراض الفقراء وبلغ عدد القروض الممنوحة خلال عام 2015 مقترضين بعدد 2250 ليصبح مجموع ما تم اقراضه للاعوام السابقة 10178 بمصرف تراكمي بلغ (79.682) مليار دينار

## شكل (2) : يوضح توزيع القروض على المستفيدين خلال السنوات 2012 - 2015

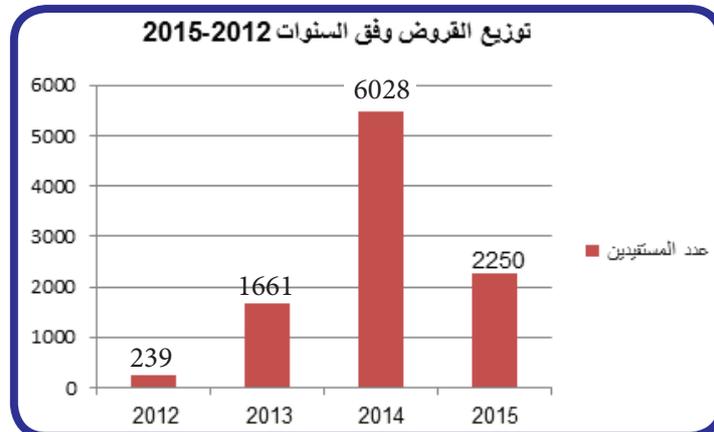

## ثانياً:تنظيم برامج تدريب للفقراء الذين استلموا القروض لمساعدتهم في استخدامها

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: برنامج تدريب المقترضين الفقراء وبكلفة ( 30 ) مليار دينار مدرج في عام 2013 :

تبنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن اولوياتها لتخفيف الفقر في عام 2013 برنامج تدريب المقترضين الفقراء وذلك بالنظر للتوسع الهائل في مجال التدريب المهني ولدخول مهن جديدة لسوق العمل، فضلاً عن توفير كوادر فنية باختصاصات قادرة على قيادة واستخدام المعدات الثقيلة، وسيتم شراء الاجهزة والمكائن التدريبية المتطورة في مجالات العمل المختلفة لضمان جودة التدريب وتطوير ورفع كفاءة المتدربين بالاساليب المتقدمة والتي تكون باهضة الثمن احياناً. تعتمد البرامج التدريبية بالدرجة الاساس على التدريب المهني وحسب احتياجات سوق العمل .

وقد تم تحديد خطة اولية لتهيئة القاعدة المعرفية للمقترضين ضمن برنامج القروض الصغيرة الممول من تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر تتراوح فترتها من شهرين الى 6 اشهر ... شملت خطة التدريب مجموعة ورش منها (الرافعات الشوكية والخياطة واجهزة التبريد والتكييف والمصاعد والصناعات الجلدية والصناعات الغذائية والمصوغات الذهبية وصيانة الموبايل والالكترونيك والطباعة بالسكرين والكوافير وصيانة السيارات واللحام، وغيرها ) مما يعد الاكثر طلباً في سوق العمل....ومن الجدير بالذكر ان هذه الدورات هي الخطوة الاولى ضمن برنامج تاهيل متكامل تنفذه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع الادارة التنفيذية لاسراتيجية التخفيف من الفقر والذي يشمل تدريب ومن ثم اقراض الفقراء فضلاً عن برامج اضافية في بعض المحافظات

## اهداف المشروع :

فتح برامج تدريبية للمقترضين ضمن برنامج دعم مشروع القروض الصغيرة للفقراء والحد من البطالة والتخفيف من الفقر وخلق فرص عمل لشريحة العاطلين عن العمل من خلال اشراكهم بدورات تدريبية لاكسابهم مهارات فنية تمكنهم من إقامة مشاريع صغير توفر دخل مناسب لهم .

## الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد المستفيدين من المشروع في حال انجازه وفق ما تم التخطيط له 15440 فرد من الفقراء العاطلين

## في طريق الانجاز

الورش المنجزة :

❖ أجهزة عرض

❖ مولدات

❖ رافعات شوكية

❖ أجهزة تبريد وتكييف

❖ باصات نقل

الورش الغير محالة :

❖ تجهيز ورش تبريد وتكييف

❖ تجهيز ورش نموذجية للحمام

❖ تجهيز ورش الموبايل

❖ تجهيز ورش مصاعد وسلالم كهربائية

❖ تجهيز ورش الالكترون

❖ تجهيز ورش طباعة بالشبكة الحرارية (طباعة بالسكرين)

❖ تجهيز ورش الكوافير وتجميل السيدات

❖ تجهيز ورشة خياطة

❖ تجهيز ورش للصناعات الجلدية

❖ تجهيز ورش لصيانة السيارات

❖ تجهيز ورش للصناعات الغذائية

❖ انشاء ورشة متكاملة للمصوغات الذهبية

❖ علماً تمت احالة مشروع (تجهيز حاسبات وماسح ضوئي وطابعات واجهزة استنساخ ) الى احدى شركات القطاع الخاص وتوقف توقيع العقد بسبب توجيهات مجلس الوزراء بالترتيب باجراءات الاحالة، التعاقد.

## اولاً: توفير وادامة البنى التحتية الداعمة للانتاج والتسويق

محافظة ديالى: تبليط ( 10 ) طرق في قرى ريفية متعددة في المحافظة بطول ( 32.800 ) كم وبكلفة ( 4.770 ) مليار دينار مدرج في عام 2013 .

اخترت المحافظة ضمن اولوياتها لتخفيف الفقر في عام 2013 مشروع تبليط طرق لقرى متعددة ، نظرا لحاجة تلك القرى والتي تمتاز بكثافة سكانية عالية الى انشاء شوارع لربط المناطق مع بعضها البعض وربطها بالمدن بهدف ايصال الخدمات الاساسية الى جميع سكان القرى الفقيرة في المحافظة وتسهيل ايصال المحاصيل الزراعية من المزارع الى مراكز البيع في المدن.

## اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى :

❖ توفير الطرق للقرى الريفية

❖ ربط المناطق الريفية بمركز المحافظة

❖ تسهيل ايصال المحاصيل الزراعية من المزارع الى الاهالي والاسواق

## الشرائح المستفيدة :

سكان القرى التي تصل بينها تلك الطرق والبالغ عددهم (29750) فرداً.



طريق قرية كاظم

صالح - بلدروز بطول 4 كم

## في طريق الإنجاز

- تم انجاز (7) طرق وهي...
- طريق المد الاخضر 100 %
- طريق لقرية امام طالب وحي سارة 100 %
- طرق في الحديد 100 %
- طريق قرى جميلة - حاتم - صالح حبيب 100 %
- طريق قرية كاظم صالح ولفتن العنكود 100 %
- طريق ريفي لقرية حبيب العبد الله 100 %
- طريق قرية الحاج جاسم حسين 100 %

## طرق قيد الإنجاز

- انشاء طريق الحساوية-العربية- طريق المدارس بطول 1 كم 16 %
- المشاريع التي لم تحال
- تبليط طريق قرية الكفاح بطول 600م
- تبليط طريق قرية الشيخ خليل 7 كم /قرية تبت

## الاجراءات المتخذة للمشاريع المنجزة ضمن المحصلة الاوول

اولا : انشاء 400 كشك توزع على مراكز الوحدات الادارية في محافظة الديوانية بكلفة (2) مليار دينار مدرج في عام 2012 :

شمل المشروع إنشاء (435) كشك تعد الاساس لتوفير فرص عمل للفقراء فضلا عن ضمان بيئة ملائمة محيطية بالسكن. وزعت (200) كشك منها في مركز محافظة الديوانية ووزعت (235) كشك المتبقية على الاقضية والنواحي في محافظة الديوانية، علما ان مساحة الكشك الواحد تراوحت بين (2\*3) متر و(2.5\*2.5) متر. يوفر المشروع فرص عمل لـ435 رئيس اسرة من اسر العاطلين الفقراء.... وقد انجز المشروع خلال شهر تشرين الثاني 2014 .... تشكلت لجنة لتوزيع الاكشاك على مستحقيها برئاسة احد اعضاء مجلس المحافظة وفي عضويتها ممثل عن اللجنة الفنية لإستراتيجية التخفيف من الفقر وممثل عن الادارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر. حيث تمت المفاضلة على المتقدمين وفق استمارة اعدتها الادارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر وصادقت عليها الامانة العامة لمجلس الوزراء واستخدام اختبار سبل المعيشة البديل والمتبع دوليا لإجل المفاضلة بينهم. حيث تم اختيار (435) مستفيد من المشروع حسب النقاط التي حصلوا عليها ، حاليا في طور توزيع الاكشاك على مستحقيها بعد حصول موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على ضوابط التوزيع التي صدرت بالقرار 71 لسنة 2016 والتي نصت على ان تتحمل الحكومة نسبة 50 % من كلفة الاكشاك والدكاكين الفعلية ويتحمل المستفيد نسبة 50 % من الكلفة المتبقية على ان تسدد بأقساط شهرية على مدى 5 سنوات كما اعدت بلدية المحافظة خارطة لتوزيع هذه الاكشاك فضلا عن النشاط الاقتصادي المطلوب ممارسته تبعاً للموقع .



صور الاكشاك في محافظة الديوانية

الاكشاك ذات المساحة (2.5\*2.5)



صورة توضح مواقع توزيع الاكشاك

## المحصلة الثانية (تحسن المستوى الصحي للفقراء)

ان وضع سياسات صحية تهدف الى الحد من المشكلات الصحية، وتقليل اثرها السلبي على الفقراء، وتحسين المستوى الصحي والرعاية والخدمات المقدمة لهم، هي غاية اساسية تسعى استراتيجية التخفيف من الفقر الى تحقيقها مع التاكيد على الخدمات الصحية الوقائية الى جانب الخدمات الصحية العلاجية وتشمل هذه السياسات خدمات الرعاية الصحية الاولية المحسنة والتي تضم عدداً من الأنشطة والمشاريع .

## بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة

اولاً : وزارة الصحة: بناء وتأهيل وحدات التدرن مع توفير متطلباتها بكلفة (50 مليار دينار) مدرج في عام (2012) :

يضم المشروع بناء وحدة تدرن لكل محافظة من محافظات العراق (عدا اقليم كردستان)، ويهدف الى تحسين المستوى الصحي من خلال توفير خدمات رعاية صحية اولية محسنة للفقراء يسهل عليهم الوصول اليها عن طريق بناء ( 28 ) وحدة تدرن موزعة على المحافظات (ميسان 2 ، ذي قار 1، المثنى 2، الديوانية 1، بغداد 3، صلاح الدين 2، كركوك 2، كربلاء 2، واسط 2، بابل 2 ، الانبار 3، النجف 1، ديالى 1، نينوى 2، البصرة 2 ) تم تحديد مواقع وحدات التدرن في المحافظات تبعاً الى انتشار المرض في الرقعة الجغرافية ضمن المحافظة ونسبة الفقر فيها، اذ يعد هذا المرض من الامراض الصديقة للفقير. مساحة الوحدة الواحدة ( 600 ) متر مربع، تتكون من ثلاث طوابق، يضم الطابق الارضي عيادة استشارية تتكون من غرفة طبيب ومختبر وصيدلية وغرفة اشعة ومكتب احصائي وقاطع تذاكر، اما الطابق الثاني والثالث فيضم شقق سكنية للكادر العامل في الوحدات، وسيتم اشغال هذه الوحدات بواسطة 2 طبيب و 2 مساعد مختبر و 2مساعد صيدلي و 2مصور اشعة و 2 احصائي وقاطع تذاكر، وتكون كل وحدة مسؤولة عن تشخيص ومتابعة حالات التدرن وتزويد المرضى بالعلاج اللازم للقضاء على هذا المرض.

## اهداف المشروع :

تعد هذه الوحدات مراكز استشارية لفحص مرضى التدرن في المناطق الفقيرة التي تبني فيها تلك المراكز فضلاً عن توفير الادوية اللازمة لعلاج المرضى .

## الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد المستفيدين من المشروع بـ(150) الف فرد للمركز الواحد .

## في طريق الانجاز


- يتم تنفيذ المشروع من مرحلتين البناء والمرحلة الثانية التجهيز ضمن نفس المقاولات

♦ المرحلة الاولى: استكمل بناء هياكل 24 مركز تدرن في المحافظات (كركوك ، صلاح الدين ، الانبار ، بغداد ، ديالى ، بابل ، واسط ، النجف ، كربلاء، ميسان ، القادسية ، البصرة ، المثنى ) . سيتم استكمال باقي الهياكل حال توفر تمويل كافي .

♦ المرحلة الثانية: التي تضم تجهيز المراكز بالمواد والاجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بمراكز التدرن والذي توقف العمل بها بسبب عدم توفر تمويل كافي بلغت نسبة الإنجاز الكلي 75 % .

- تم افتتاح مركزين في محافظة المثنى على الرغم من وجود بعض النقصات والتي لا تحول دون افتتاح المركز مثل تجهيز بعض غرف مبيت الكادر الطبي بالأثاث وقطع اجهزة التبريد ... الخ).

- علماً ان اغلب المشاريع توقفت منذ نهاية عام 2014 بسبب الازمة المالية .

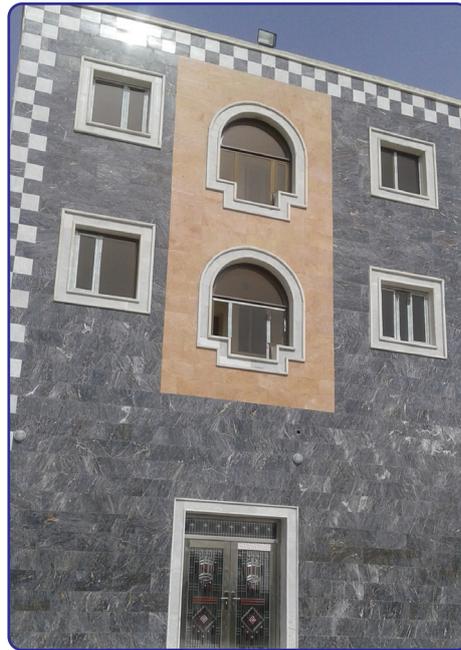

وحدة التدرن في محافظة بابل

## جدول ( 2 ) : نسب إنجاز وحدات التدرن حسب المحافظات

ت	المحافظة	نسبة الانجاز %
1	نينوى / النهروان	10 %
	نينوى / الكرامية	10 %
2	كركوك / داقوق	30 %
	كركوك / الحويجة	30 %
3	ديالى	90 %
	الانبار / القائم	90 %
4	الانبار / الفلوجة	90 %
	الانبار / حديثة	90 %
5	بغداد / الكرخ	100 %
	بغداد / الكاظمية	100 %
6	بابل / الاساتدة	100 %
	بابل / المحاويل	100 %
7	كربلاء / الحي العسكري	63 %
	كربلاء / حي النصر	85 %
8	واسط / الحي	62 %
	واسط / الكوت	77 %
9	صلاح الدين / بيحي	17 %
	صلاح الدين / تكريت	37 %
10	النجف / الحرية	90 %
	الديوانية	75 %
12	المنثى / الحضر	99 %
	المنثى / السماوة	99 %
13	ذي قار / الزهراء	72 %
	ميسان / العزيز	89 %
14	ميسان / علي الغربي	80 %
	البصرة / القبلة	85 %
15	البصرة / الزبير	51 %

## ثانياً : محافظة ديالى : بناء مراكز رعاية صحية عدد (2) مركز وبكلفة ( 1.250 ) مليار دينار مدرج في عام 2012 :

يضم المشروع بناء مركزين صحيين في قريتي (كهريزه، النظام) في قضاء خانقين ، ويرمي الى تحسين المستوى الصحي من خلال توفير خدمات رعاية صحية للفقراء يسهل عليهم الوصول اليها ، يتكون مركز قرية كهريزا من بناية من طابق واحد على مساحة (800) متر مربع ، اما مركز قرية النظام فيتكون من طابق واحد على مساحة (300) متر مربع، وسيتم تجهيز المركزين بكادر طبي وادوية بالتنسيق مع وزارة الصحة .

## اهداف المشروع :

الهدف من انجاز هذه المراكز الصحية هو توفير خدمات صحية للفقراء تشمل تقديم العلاجات و فحص المرضى في المناطق الفقيرة التي تبني فيها تلك المراكز .

## الشرائح المستفيدة:

يخدم كل مركز صحي حوالي ( 15000 ) فرد من الفقراء ضمن الرقعة الجغرافية التي تغطيها.

## في طريق الانجاز

- تم احالة المشروع نهاية كانون الاول 2013 وتم توقيع العقد بمدة ( 210 ) يوماً .

- أنجز المشروع بتاريخ 1 / 7 / 2014 وبانتظار تسديد باقي مستحقات الشركة المنفذة .



مركز صحي في ديالى

ثالثاً: محافظة الانبار : مشروع تجهيز عيادات متنقلة عدد (9) عيادات بضمنها عيادة طب اسنان عدد (1) واشعة نسائية عدد(1) ضمن برنامج إغاثة النازحين بكلفة و تخصيص (1.498) مليار دينار مدرج عام 2015  
اهداف المشروع :

- تبنت المحافظة مشروع تجهيز عيادات متنقلة و عيادة طب الاسنان واشعة نسائية ضمن خطة اغاثة النازحين من محافظة الانبار ويهدف المشروع الى تلبية المتطلبات الصحية والتي يجب توفيرها على المدى المتوسط والبعيد حيث يتطلب تلبية الاحتياجات التالية :
  - تعزيز خدمات الرعاية الصحية
  - تعزيز برنامج الوقاية الصحية
  - التركيز على تطوير النظام الصحي
- حيث يعمل المشروع على تحقيق الاهداف المذكورة من خلال تحسين النظام الصحي في عموم المحافظة ضمن رعاية صحية اولية وتقديم اسعافات اولية للنازحين والعوائل العائدة للمناطق المحررة .

#### عدد المستفيدين

يخدم المشروع (180000) عائلة نازحة من اقصية ( الفلوجة ، الجزيرة ، هيت ، عنه ، القائم، البغدادي) وغيرها من المناطق .

#### في طريق الانجاز

- لم يحال المشروع بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد.

#### استمرار توفير المواد والمستلزمات القياسية

اولاً: وزارة الصحة : توفير أجهزة ومعدات مختبريه للمراكز الصحية وبكلفة (29.500) مليار دينار)مدرج في عام (2012) :

يشمل النشاط شراء (21) نوع من الاجهزة المختبرية الخاصة باغراض فحص الاغذية والتلوث والدم وفحص الرئة واجهزة معالجة الشبكية ومعالجة وتنقية الماء الابيض واجهزة قياس ذروة تدفق الزفير واشعة ماموكرام ومحارير الكترونية وثلاجات لحفظ اللقاح ومراقب انجماد وحامل اللقاح وصندوق حفظ اللقاح وناظور لفحص عنق الرحم مع ملحقاته وسونار متنقل مع مجس لحديثي الولادة وغيرها، اذ سيتم تجهيز المراكز الصحية بالاجهزة الضرورية وحسب حاجة تلك المراكز للاجهزة خاصة تلك التي تقع على اطراف المدن والمؤشرة كمناطق فقيرة .

#### اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى تعزيز شمول المناطق الفقيرة بالعناية الطبية الضرورية من خلال تجهيز المراكز الصحية بالاجهزة المختبرية ومستلزماتها وتوفير الخدمة الصحية اللازمة للفقراء .

#### في طريق الانجاز

واجه المشروع محدودية في انجازه لاسباب تعود الى مركزية تنفيذه، لذا تم منح صلاحيات تنفيذه الى المحافظات الخمسة عشر والتي حددت احتياجاتها من الاجهزة والمواد المختبرية لإنجاز المشروع في (14) محافظة ، علماً تم رفع المشروع في دائرتي صحة (بغداد / الكرخ ، القادسية) بسبب إيقاف إحالة المشاريع التي لم توقع عقودها بموجب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد س.ل/ 651 في 9 /12/ 2015

المحافظة	نسبة الانجاز %
نينوى	100 %
كركوك	100 %
ديالى	100 %
الانبار	100 %
بغداد / الرصافة	100 %
بابل	100 %
كربلاء	100 %
واسط	100 %
صلاح الدين	100 %
النجف	100 %
المثنى	100 %
ذي قار	100 %
ميسان	100 %
البصرة	100 %

#### ثانياً: وزارة الصحة : توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض بكلفة ( 500 ) مليار دينارمدرج في عام 2012 :

يتضمن النشاط شراء أجهزة ومعدات طبية ذات استعمالات مختلفة توزع على المراكز الصحية ويتم تحديدها حسب حاجة وإلوية المراكز الصحية ذاتها. ومن الجدير بالذكر ان توفير هذه الأجهزة يؤدي الى تحسين الخدمات التشخيصية التي تقوم بها تلك المراكز ، وتشمل (أجهزة اشعة وملحقاتها وحضانات اطفال واجهزة اسنان و C.SCAN واجهزة سونار واجهزة الصدمة الكهربائية واجهزة تخطيط القلب واجهزة الفحص الجزئي الحديث لعصيات التدرن وثلاجات حفظ الادوية واللقاحات واجهزة طبية للعيون واجهزة تنقية الهواء وغيرها من الاجهزة الطبية متعددة الاغراض) .

#### اهداف المشروع :

يرمي المشروع الى توفير الاجهزة ذات الاغراض المتعددة للمراكز الصحية وحسب الحاجة لضمان توفير الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين بالاستناد الى رؤية القائمين على تلك المراكز الصحية.

#### في طريق الانجاز

بسبب تأخر مركز الوزارة في انجاز اجراءات الشراء، تم منح صلاحيات تنفيذه الى المحافظات الخمسة عشر والتي حددت نوع احتياجاتها من الاجهزة ذات الاغراض المتعددة.....انجز المشروع في (15) محافظة وتم ادخال الاجهزة في الخدمة الصحية ، كما موضح في الجدول التالي :

#### جدول (4) : توفير الاجهزة والمعدات متعددة الإغراض حسب المحافظات

المحافظة	نسبة الانجاز %
نينوى	100 %
كركوك	100 %
ديالى	100 %
الانبار	100%
بغداد/الكرخ-الرصافة	100% الرصافة، 100% الكرخ
بابل	100 %
كربلاء	100 %
واسط	100 %
صلاح الدين	100 %
النجف	100 %
القادسية	100 %
المثنى	100 %
ذي قار	100 %
ميسان	100 %
البصرة	100 %

## صور الاجهزة متعددة الاغراض التي تم شرائها في محافظة الديوانية



ثالثاً: وزارة الصحة : تنفيذ برنامج التحصين ( تلقيح الاطفال من مرض شلل الاطفال ومرض الحصبة) بكلفة (6) مليار دينار مدرج في عام 2015 :

خصصت الادارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر مبلغ (1.5) مليار ونصف دينار ضمن تخصيصات الموازنة الجارية لوزارة الصحة لعام 2015 لتنفيذ برنامج التحصين المتضمن ( تلقيح الاطفال من مرض شلل الاطفال ومرض الحصبة) وبلغت كلفة المشروع (6) مليار دينار . وساهمت الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر بجزء من هذا المبلغ لتغطية المناطق الفقيرة ومجمعات النازحين حيث تم تحصين (333193) طفل فضلاً عن قرى فقيرة في عموم العراق، نفذ برنامج التحصين على جولتين خلال عام 2015، ويمكن تلخيص الحملتين بالتالي :

## اولاً:- التحصين من شلل الاطفال

تقوم دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بتنفيذ اربع حملات وطنية للتلقيح بلقاح شلل الاطفال الفموي بالاضافة الى حملات احاطة موقعية قد تنفذ في حزمة محافظات او محافظة واحدة او اجزاء منها تمثل استجابة طارئة للتطورات الوبائية لاسيما وان العراق قد شهد اصابات بمرض شلل الاطفال في عام 2014 وقد كانت تلك الحملات ركناً اساسياً في عملية القضاء على مرض شلل الاطفال بحلول شهر ايار عام 2015 بالرغم من التحديات الصعبة والظروف الامنية التي مر بها البلد منذ العام الماضي وبالتالي تستمر الاجراءات الوقائية الطارئة لمنع عودة ظهور ذلك المرض في ظل الظروف المحيطة بنا.

## ثانياً :- مرض الحصبة

تقوم دوائر الصحة بتنفيذ حملات وطنية ضد مرض الحصبة في حال حدوث تفشيات وبائية للحصبة وتكون محددة جغرافياً وعمرياً حسب المؤشرات الوبائية التي يتم تحديدها من قبل المختصين الجديوى الاقتصادية المتحققة من تلك الحملات تتمثل اولاً في منع الاصابة للأفراد بتلك الامراض حيث يسبب مرض شلل الاطفال الوفاة او مضاعفات خطيرة تؤدي الى الاعاقة الدائمة في الغالب ويسبب مرض الحصبة مضاعفات خطيرة قد ينتج عنها وفاة الطفل وتتمثل ثانياً ببناء مناعة مجتمعية ضد امراض عالية الخطورة وسريعة الانتقال قد ينتج عنها وباء على المستوى الوطني او الدولي في حال انخفاضها.

## في طريق الانجاز

- تم انجاز المشروع بنسبة انجاز كلي 100 %

## توسيع المشاريع لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة

اولاً : محافظة الأنبار : مشروع تجهيز سيارات حوضية عدد 19 سيارة لتوفير الماء الصالح للشرب للنازحين ادراج المشروع في عام 2015 بكلفة (4.950) مليار دينار

يهدف المشروع الى توفير الماء الصالح للشرب في المناطق التي يتواجد فيها النازحين

## عدد المستفيدين

يغطي المشروع المناطق المحررة في المحافظة ومخيمات النازحين .

## في طريق الانجاز

- جهزت السيارات من قبل وزارة التجارة بنسبة انجاز 100 % وتم استلامها من قبل دوائر البلديات ودخلت الخدمة

ثانياً: محافظة النجف، انشاء وحدة مائتة مجمعة سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، بكلفة 3.933 مليار دينار مدرج في عام 2013 :

حددت محافظة النجف ضمن اولوياتها من تخصيصات الاستراتيجية من الموازنة الاستثمارية لعام 2013 مشروعاً يهدف الى تحسين واقع المحافظة الصحي وذلك من خلال انشاء وحدة مائتة مجمعة سعة 1000 متر مكعب / ساعة لتغذية مجموعة من القرى شمال مدينة الكوفة، وقد تم توفير مستلزمات ادراجه وفق الضوابط الادراج المعتمدة .

## اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى تزويد الماء الصالح للشرب لقرى شمال الكوفة وضمان تقليص انفاق المواطنين على شراء ماء الشرب.

يقدر عدد المستفيدين من المشروع 25856 من سكان القرى الفقيرة المشمولة بالمشروع

### في طريق الانجاز

❖ اعلن عنه بتاريخ 2013/ 11/ 17

❖ تم المباشرة في شهر ايلول /2014

❖ نسبة الانجاز 35% علما ان العمل متوقف بسبب الازمة المالية



صور مجمع ماء سعة 1000 م<sup>3</sup> / ساعة في النجف

ثالثاً: وزارة البلديات والاشغال العامة، تجهيز آليات تخصصية في اعمال المجاري بكلفة وتخصيص (8) مليار دينار مدرج في عام 2013:

ضم المشروع الذي تبنته وزارة البلديات والاشغال العامة تجهيز اليات تخصصية في اعمال المجاري للاستفادة منها في تشغيل وصيانة شبكات المجاري في المحافظات الخمسة عشر وبعده (28) آلية تتوزع على (15) محافظة، تتضمن اربع عشر سيارة سحب مياه ثقيلة واربع عشر سيارة صاروخية سعة السيارة الواحدة 8000 لتر مكعب، تخدم مناطق متفرقة في المحافظات وتعمل باشراف دوائر المجاري في المحافظات المشار اليها اعلاه .

### اهداف المشروع :

توفير اليات تخصصية لصيانة شبكات الامطار والصرف الصحي وسحب المياه فضلا عن السيارات الصاروخية التي تستخدم لفتح الانسدادات التي تحدث داخل انابيب الشبكات ومداخل احواض التفتيش

### الشرائح المستفيدة:

تخدم هذه الالات حوالي (212443) فردا من سكان المناطق التي تصل اليها في المحافظات الخمسة عشر

### في طريق الانجاز

❖ اعيد ادراج المشروع خلال عام 2015 بكلفة تبلغ (8) مليار دينار وبعده (28) آلية بدل تجهيز اليات حوضية بعده (42) البية وكلفة (10.450) مليار دينار .

❖ احيل المشروع الى احدى شركات القطاع الخاص و تمت مباشرة الشركة بعد فتح الاعتماد المالي بتاريخ 2015/ 11 /9

❖ نسبة الانجاز 30% تمثل نسبة توقيع العقد وفتح الاعتماد المالي .

❖ توقف تنفيذ المشروع بسبب الازمة المالية التي يمر بها البلد وعدم توفر السيولة النقدية.

## المحصلة الثالثة (نشر وتحسين تعليم الفقراء)

تبنت الاستراتيجية مجموعة من المخرجات للوصول الى نشر وتحسين تعليم الفقراء في ضوء مبادئ الاستراتيجية الرامية الى تمكين الاطفال الفقراء ذكورا واناثا من اكمال دراستهم ضمن خطة تزامنت وتوازت مع خطة الاهداف الانمائية للالفةية باعتبار بعد التعليم من الابعاد الاساسية للفقر، كل ذلك دفع الجهات القائمة على الاستراتيجية الى توجيه اهتماما بالغا لتوفير البيئة الدراسية المناسبة من خلال تبني مشروع هدم واعادة بناء المدارس الطينية في العراق وهو من اهم ما نفذته الاستراتيجية فضلا عن مشاريع كانت تستهدف تحسين الواقع التعليمي للفقراء في العراق .

تخصيص تمويل كاف ضمن الموازنة الاستثمارية التربوية حسب المراحل (اولوية للانفاق الحكومي الاستثماري التربوي) مع اولوية في تخصيص بناء وتاهيل المدارس المتوسطة والاعدادية في القرى والاحياء الفقيرة ووفق سقف زمنية ملائمة .

اولا : ألف : وزارة التربية : مشروع ازالة المدارس الطينية في العراق بكلفة (283910) ملياردينارمدرج في عام 2012:

تم تخصيص مبلغ ( 140 ) مليار دينار في عام 2012 لمشروع ازالة المدارس الطينية ، والذي يشمل هدم ( 409 ) مدرسة طينية، وبناء مدارس بديلة وفق نمط البناء التقليدي او الجاهز وحسب ما تقتضيه عملية فحص التربة في تلك المنطقة...شمل المشروع محافظات العراق عدا اقليم كردستان كما لم يشمل التخصيص المحافظات ( الانبار ، كربلاء ، النجف ) لعدم وجود مدارس طينية فيها.

خضعت ( 227 ) مدرسة في الوسط والجنوب الى نمط البناء التقليدي ، في حين واجهت مدارس محافظات ديالى، صلاح الدين، كركوك، نينوى تحديات البناء الجاهز(الكونكريتي) بسبب طبيعة تلك المناطق. عانى النشاط من تأخير في التنفيذ بسبب تلك الشركات المنفذة وخاصة للمدارس التي بنيت وفق نمط البناء الجاهز وقد تم تشخيص الخلل في الاعوام السابقة والذي يعود الى محدودية شركات البناء الجاهز وحدثة تجربة البناء وفق هذا الاسلوب في العراق مما حدا الى مخاطبة الجهات المعنية بهدف حل تلك التحديات وتمت الاستجابة من خلال تغيير جهة التنفيذ الى الادارات المحلية وتغيير اسلوب البناء في بعض المواقع من اسلوب البناء الجاهز الى اسلوب البناء التقليدي.

علما ان المشروع احيل الى ثلاث شركات حكومية هي:

♦ الشركة العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية رقم المزاولة ( 33 ) وزارة الصناعة والتي تنفذ (126)مدرسة في المحافظات ( البصرة ، ميسان ، المثنى ، ذي قار) وبنسبة انجاز حوالي 56 %

♦ شركة المنصور العامة رقم المزاولة ( 34 ) وزارة الاعمار والاسكان والتي تنفذ ( 100 ) مدرسة في المحافظات القادسية، واسط، بابل، الكرخ 1، الكرخ 2، الكرخ 3 وبنسبة انجاز حوالي 61 %

♦ شركة الصمود العامة رقم المزاولة ( 36 ) وزارة الصناعة والتي تنفذ ( 62 ) مدرسة باسلوب البناء الجاهز و( 55 ) مدرسة باسلوب البناء التقليدي في المحافظات ديالى وبنسبة انجاز 94 % ، صلاح الدين، كركوك، نينوى وبنسبة انجاز 54.68 %، تنفذ هذه المدارس وفق نمط البناء الجاهز .

♦ تم تغيير جهة التنفيذ لـ (66) مدرسة في محافظات صلاح الدين، نينوى، ديالى ، كركوك من وزارة التربية الى الإدارات المحلية في المحافظات المذكورة اعلاه ، وقد توقف المشروع بسبب الظروف الامنية .

## اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى القضاء على المدارس الطينية كافة واستبدالها بمدارس ذات مواصفات تؤدي الى تحسين كفاءة التعليم في المدارس التي يرتادها الفقراء بشكل خاص وتشكل عاملا حاسما في اجتذاب المزيد منهم الى مقاعد الدراسة وضمان عدم تسربهم من المدارس.

## الشرائح المستفيدة:

تخدم المدارس حوالي 129 الف طالب في المناطق الفقيرة التي انشأت ضمنها .

## في طريق الانجاز

تم انجاز (144) مدرسة في حين ماتزال(365)مدرسة قيد التنفيذ... منها (117) مدرسة في محافظات كركوك وصلاح الدين ونيوى وديالى متوقف العمل فيها بسبب الاوضاع الامنية ، بلغت نسبة الانجاز الكلي للمشروع 71 % ، كما موضح في الجدول الاتي :

جدول (5) : يوضح اعداد المدارس البديل الطينية

ت	الموقع	عدد المدارس لكل قطاع	نسبة الانجاز	الملاحظات
1-	نينوى	بناء تقليدي عدد (19) مدرسة	47 %	تم انجاز 5 مدارس من المجموع الكلي قبل احداث حزيران 2014 التي تسببت بتوقف المشروع
		بناء جاهز عدد (7) مدارس	54 %	
2-	كركوك	بناء تقليدي عدد (13) مدرسة	19 %	تم انجاز 3 مدارس من المجموع الكلي - المشروع متكئ
		بناء جاهز عدد (12) مدرسة	62 %	
3-	ديالى	بناء تقليدي عدد (5) مدرسة	77 %	تم انجاز 4 مدارس من المجموع الكلي - المشروع متكئ
		بناء جاهز عدد (6) مدرسة	31 %	
4-	بغداد	بناء عدد (12) مدرسة/ كرخ 1	100 %	انجز المشروع/ عدد المدارس المنجزة 19 مدرسة
		بناء عدد (6) مدارس/ كرخ 2	95 %	
		بناء (1) مدرسة/ كرخ 3	100 %	
5-	بابل	بناء (10) مدرسة	100 %	انجز المشروع/ عدد المدارس المنجزة 10 مدرسة
6-	واسط	بناء جاهز عدد (26) مدرسة	100 %	انجز المشروع/ عدد المدارس المنجزة 26 مدرسة
7-	صلاح الدين	بناء تقليدي عدد (18) مدرسة	51 %	توقف المشروع بسبب الوضع الامني
		بناء جاهز عدد (37) مدرسة	55 %	
8-	القادسية	بناء (45) مدرسة	97 %	المشروع منجز/ عدد المدارس المنجزة (45) مدرسة
9-	المنثنى	بناء (15) مدرسة	68 %	المشروع متكئ/ عدد المدارس المنجزة (6) مدرسة
10-	ذي قار	بناء (106) مدرسة	54 %	المشروع متكئ/ عدد المدارس المنجزة (11) مدرسة
11-	ميسان	بناء (4) مدارس	36 %	المشروع متكئ
12-	البصرة	بناء (1) مدرسة	100 %	انجز المشروع/ عدد المدارس المنجزة 1 مدرسة
	المجموع	343 مدرسة		

تم الغاء (66) مدرسة وتغيير جهة تنفيذها الى الحكومات المحلية وسيتم تنفيذها بعد استكمال عملية تسوية المتعلقة مع وزارة التربية



مدارس بديل طينية في محافظة بابل

اولاً : وزارة التربية : تنفيذ مشاريع وزارة التربية ضمن الموازنة الجارية بكلفة (1.5) مليار دينار مدرج في عام (2015) :

ضمن الموازنة الجارية تم تخصيص مبلغ مليار ونصف دينار لمشاريع وزارة التربية لعام 2015 ضمن استراتيجية التخفيف من الفقر لتنفيذ ثلاث أنشطة للمحصلة التربوية وكما يلي :

- اعداد وتكوين قاعدة بيانات تربوية عن المناطق الريفية الفقيرة المشمولين بالتعليم الازامي واعداد الطلبة المتسربين في المراحل كافة لحساب درجة الحرمان التربوي في تلك المناطق.
- اعطاء اولوية في توزيع الخدمات التربوية وتجهيز مدارس المناطق الفقيرة والريفية بالمختبرات والمواد المختبرية والوسائل التعليمية ووسائل الايضاح... الخ .
- اعداد برنامج تدريبي للكوادر التربوية في المناطق الفقيرة والريفية
- لم تنفذ الأنشطة خلال عام 2015 لاسباب تعود الى تاخر في المخاطبات الادارية والمالية واعيدت المبالغ الى الخزينة العامة للدولة على ان تنفذ هذه الأنشطة خلال اعوام لاحقة.

### وضع برنامج مساندة ودعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة والاعدادية .

#### اولا: محافظة الديوانية، انشاء (9) مدارس ذات (9) صف بكلفة (5) مليار دينار مدرج في عام 2013:

يشمل النشاط انشاء 9 مدارس ابتدائية تتكون كل مدرسة من 9 صف مع ساحة وجناح ادارة وغيرها، توزع هذه المدارس كالآتي:

- 1 - القطعة ( 37 ) مقاطعة 7 ابو تبين / قرية دعبل / قضاء الشامية
- 2 - القطعة ( 17 ) مقاطعة 14 / قرية دوب شمسة / ناحية غماس
- 3 - القطعة ( 24 ) مقاطعة ام عجبان / قرية ام عجبان / قضاء عفك
- 4 - القطعة ( 7 ) مقاطعة 7 ابو عرابيد/ قرية العنتاكية/ ناحية السدير
- 5 - القطعة 1 / 1 و 3 / 1 مقاطعة 18 الصايلية/ قرية ابو الدين / ناحية الشافعية
- 6 - القطعة (4/2) مقاطعة 11 الرملة / قرية الدهمة العارضيات / قضاء الحمزة
- 7 - القطعة (1173/8) مقاطعة 4 الشوفة / قضاء الحمزة
- 8 - القطعة (1/2453) مقاطعة السراي/ ناحية الشنافية
- 9 - القطعة (22/84) مقاطعة الرملة / ناحية الدغارة

#### اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى :

- ✦ نشر تعليم الفقراء وتوفير بيئة دراسية مناسبة وبناء جيل متعلم والقضاء على الامية
- ✦ تقليل الزخم في المدارس المجاورة وبما يساعد على رفع كفاءة التعليم
- ✦ تشغيل الايدي العاملة في المحافظة عن طريق تعيين الخريجين كملاك تعليمي وكذلك تعيين عمال الخدمات والحراس

#### الشرائح المستهدفة :

توفر هذه المدارس بيئة دراسية ملائمة لحوالي ( 2835 ) طالب من الاسر الفقيرة في المحافظة

#### في طريق الانجاز

- اعلن عن المشروع في ايلول 2013 ولم يحال بسبب عزوف المقاولين عن التقديم
- لم يحال المشروع خلال عام 2015 حسب توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء بايقاف اجراءات (الاعلان ، الاحالة ، التعاقد) للمشاريع الغير محالته .
- سيتم رفع المشروع من خطة عام 2016 توقفت اجراءات (الاعلان ، الاحالة ، التعاقد ) حسب توصيات اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (30) لسنة 2015 بموجب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد س.ل/ 651 في 9 / 12 / 2015

#### ثانيا: محافظة النجف : انشاء (4) مدارس ذات 18 صف بكلفة ( 7.643 ) مليار دينار مدرج في عام 2013:

تبنت المحافظة ضمن اولوياتها لتخفيف الفقر انشاء (4) مدارس تتالف المدرسة من طابقين وتضم 18 صف يتسع كل صف الى 35 طالب . موزعة على المناطق الاتية:

- حي السلام / قضاء الكوفة
- ناحية الحيدرية / قضاء النجف
- حي ميسان / قضاء الكوفة .
- حي الزهراء / قضاء المناذرة

#### اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى :

- فك الاختناقات الحاصلة في المدارس ذات الدوام المزدوج
- توفير فرص عمل في المحافظة خلال مدة انجاز المشروع

#### الشرائح المستفيدة :

يقدر عدد الطلاب المستفيدين من المشروع بحوالي 2520 طالب

- تم احالة المشروع الى احدى شركات القطاع الخاص خلال عام 2013
- انجز مشروع انشاء مدرسة في قضاء الكوفة/حي ميسان وتم افتتاح المدرسة من قبل الحكومة المحلية والإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر .
- العمل متوقف في المدارس الثلاث المتبقية وبنسب انجاز متباينة ( ناحية الحيدرية 35%، حي السلام 90%، حي الزهراء 70%) بسبب الازمة المالية التي يمر بها البلد .



### مدرسة في محافظة النجف

ثالثا : محافظة كربلاء : انشاء مدرسة ابتدائية ذات 18 صف بكلفة ( 1.9 ) مليار دينار مدرج في عام 2013:

يشمل المشروع انشاء مدرسة ابتدائية في منطقة الالاح في ناحية الحسينية والتي تخلو من مدارس ابتدائية، تتكون المدرسة من ( 18 ) صف وجناح ادارة مع مجموعة صحية للطلاب وبمدة انجاز 420 يوم .

### اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى :

- تعليم الفقراء في المناطق الريفية الفقيرة .
- تقليل المسافة بين القرى الفقيرة والمدارس الابتدائية

### الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد الطلاب المستفيدين من المشروع بحوالي 450 طالب .

### في طريق الانجاز

- اعلن عن المشروع لأول مرة بتاريخ 23 / 10 / 2013
- تم توجيه دعوات مباشرة للمرة الثانية بسبب قلة المتقدمين للمشروع .
- ابرم العقد مع شركة قطاع خاص بتاريخ 18 / 3 / 2015
- مدة العقد (420) يوم من تاريخ المباشرة الفعلية
- لم تباشر الشركة بالتنفيذ في عام 2015 بسبب الازمة المالية

رابعا: محافظة بابل : بناء مدارس في قرى فقيرة ، بكلفة (18.250) مليار دينار مدرج في عام 2013 :

يشمل المشروع بناء ( 16 ) مدرسة ابتدائية ، موزعة على قرى محافظة بابل وكالاتي :

- ❖ قرية اولاد الكاظم مقاطعة 7 الحصن البيكات /سدة الهندية في قضاء المسيب .
- ❖ قرية ام ذرة مقاطعة 4 / سدة الهندية في قضاء المسيب .
- ❖ قرية الطابه مقاطعة 42 الشاخة / النيل في قضاء المحاويل .
- ❖ قرية ال بوشايخ علي / ناحية القاسم .
- ❖ قرية الجنابين / ناحية القاسم .
- ❖ قرية كاظم الصالفي / ناحية الكفل .
- ❖ قرية هوى الشام / مركز قضاء الحلة .
- ❖ قرية خلف مقام الخضر / ناحية الاسكندرية .
- ❖ قرية الكصيرات / ناحية المدحتية .
- ❖ قرية الغزالي الاكرع / ناحية المدحتية
- ❖ قرية الفياده / ناحية الشوملي

- ❖ منطقة العمار قرية ابو هليل / النيل في قضاء المحاويل .
- ❖ قرية الطويل / ناحية الشوملي .
- ❖ قرية الزوية العويدين / الطليعة في قضاء الهاشمية.
- ❖ قرية البدعة / مركز قضاء المحاويل.
- ❖ قرية الحميري / المشروع في قضاء المحاويل.

#### اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى:

- ❖ توفير مدارس يسهل وصول الفقراء اليها وكذلك تخفيف الزخم في المدارس الابتدائية المجاورة فضلا عن استيعاب الزيادات المتوقعة للسكان مستقبلاً .
- ❖ تحسين الواقع التربوي وتأمين المتطلبات الاساسية للطالب وتبني ثقافة جودة التعليم ورفع المستوى التعليمي

#### الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد المستفيدين من المشروع بحوالي 3760 طالب

#### في طريق الانجاز

- ❖ لم يحال المشروع خلال عام 2014 بسبب عزوف المقاولين عن التقديم
- ❖ توقفت اجراءات (الاعلان ، الاحالة ، التعاقد ) حسب توصيات اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (30) لسنة 2015 بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بالكتاب المرقم بالعدد ش.ل/15943/15/30 بتاريخ 5/12/2015 بايقاف بالاعلان والاحالة والتعاقد .
- ❖ سيتم رفع المشروع من خطة عام 2016 بموجب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد س.ل/ 651 في 9/12/2015

#### المحصلة الرابعة (بيئة سكن افضل للفقراء)

يعاني الفقراء من مشكلات البيئة التي يعيشون فيها، من تدني نوعية السكن ، والاكتظاظ والتلوث، وعدم ملائمة البنى التحتية حيث يعكس سوء السكن الحرمان الذي يعانيه الفقراء ويساهم في تعميقه، لذا صبت الاستراتيجية جل اهتمامها لتوفير بيئة سكن مناسبة للفقراء والذي تبلور في عدد من مشاريع السكن والبنى التحتية.

تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقراء .

اولا : وزارة الاعمار والاسكان : بناء مجمعات سكنية اقتصادية بكلفة (500) مليار دينار مدرج عام 2012:

اولت استراتيجية التخفيف من الفقر اهتماما خاصا لمشاريع بناء مجمعات سكنية اقتصادية في خمس محافظات فقيرة هي ( بابل، ذي قار، صلاح الدين، الديوانية ، المثنى) ... بواقع 1389 وحدة سكنية.

#### اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى توفير بيئة سكن مناسبة للفقراء من خلال توفير سكن اقتصادي ملائم يحل مشاكل تدني نوعية السكن والاكتظاظ

#### في طريق الانجاز

فيما يلي جدول يبين الموقف من مشروع بناء وحدات سكنية في خمس محافظات الذي تنفذه وزارة الاعمار والاسكان حسب المحافظات وعدد الوحدات السكنية وعدد المستفيدين :



مجمع سكني في محافظة القادسية

## جدول (6) : يوضح مجمعات سكنية التي تنفذها وزارة الاعمار والاسكان

الملاحظات	نسبة الانجاز %	عدد المستفيدين	موقع المشروع	المحافظة
- تمت الاحالة المشروع بمبلغ (10.849.800) مليار دينار . -تمت المباشرة خلال شهرشباط /2013 - توقف المشروع بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد .	38.8 %	864	الشامية الجبسة/144 وحدة	الديوانية
تمت احالة المشروع بمبلغ (43.840.366)مليار ديناربتاريخ 6/2/2014.	-	1986	الشنافية/ 331 وحدة	الديوانية
- تمت احالة المشروع بمبلغ ( 9.094.600 ) مليار ديناربتاريخ 30 / 10 / 2014 توقف المشروع بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد	7.6 %	390	السنية / 65 وحدة	الديوانية
تمت احالة المشروع بمبلغ (16.556.281) مليار ديناربتاريخ 13 / 8 / 2014توقف المشروع بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد.	9 %	672	طحربة /112 وحدة	المنى
تمت احالة المشروع بمبلغ (32.802.961) مليار ديناربتاريخ 9 / 7 / 2014 توقف المشروع بسبب الوضع المالي .	6 %	1560	عكيكة/260 وحدة	ذي قار
تمت احالة المشروع بمبلغ ( 30.935.975 ) مليار ديناربتاريخ 4 / 6 / 2014 تاجيل التوقيع العقد بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد	لم يباشر المفاوض	1446	الشمولي/240 وحدة	بابل
اعلن عن المشروع الا انه توقف بسبب الوضع الامني وتم رفع المشروع من خطة 2016 .	-	1422	(يثرب+1 يثرب2) /237 وحدة	صلاح الدين
		8334	1389	المجموع

## ثانياً : محافظة نينوى : بناء مساكن اقتصادية للفقراء بكلفة ( 24.5 ) مليار دينار مدرج عام 2013 :

- ❖ بناء مجمع سكني اقتصادي على مساحة ارض تقدر بـ ( 215271 ) متر مربع ، يشمل المشروع بناء (500) وحدة سكنية بمساحة (150) متر مربع للوحدة السكنية الواحدة وبمساحة بناء (100) متر مربع، يتكون الدار من طابق واحد ... يضم غرفتي نوم ومطبخ وصالة ومجمع خدمات ، وسيتم تبليط الشوارع الرئيسية والفرعية وصب الارصفة وتوفير خدمات الكهرباء والمجاري وايصال الماء للدور ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم، فضلا عن انشاء مباني خدمية تتضمن الاتي:
- ❖ مدرسة ابتدائية ذات (12) صف، مساحتها (1000) متر مربع
- ❖ مدرسة ثانوية ذات (12) صف، مساحتها (1000) متر مربع
- ❖ جامع مساحته (400) متر مربع
- ❖ مستوصف مساحته (700) متر مربع
- ❖ مجموعة مواقف سيارات ومواقع تجارية ومناطق خضراء ينفذ المشروع خلال فترة (12 - 15) شهر.

## اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى :

- ❖ توفير سكن ملائم للعوائل الفقيرة
- ❖ المساهمة بالحد من ازمة السكن الحاد في المحافظة
- ❖ تشجيع الهجرة العكسية (الهجرة من المدينة الى الريف) حيث ان موقع المشروع يقع خارج مدينة الموصل .
- ❖ خلق فرص عمل اضافية تساهم بالحد من ظاهرة البطالة
- ❖ تقليل الاضرار الاجتماعية التي يمكن ان تنشأ مثل هذه الشرائح عند عدم توفر سكن ملائم لهم.

❖ يعد هذا المشروع نواة لمشاريع مشابهة تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام ويمكن ان تساهم بها الحكومات المحلية مستقبلا لرفع المستوى المعاشي لمواطنيها

#### الشرائح المستفيدة :

يخدم المشروع حوالي ( 500 ) اسرة فقيرة اي ما يعادل (3000) فرد .

#### في طريق الانجاز

❖ تم تسمية المشروع ضمن اولويات المحافظة الا ان قطعة الارض المخصصة من قبل المحافظة لم تكن كافية وتم استبدالها بقطعة ارض اخرى  
❖ تم اعداد الدراسات والتصاميم الجديدة بعد استبدال قطعة الارض باخرى تابعة لنفس القضاء، وتم تسليم المخططات الجديدة الى دائرة تخطيط القطاعات وحصلت المصادقة عليها .

❖ توقفت كافة الاجراءات بسبب الاوضاع الامنية

سيتم رفع المشروع من خطة عام 2016 بموجب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد س.ل/ 651 في 9 / 12 / 2015

#### ثالثاً : محافظة كركوك : تنفيذ مجمعين سكنيين ، بكلفة ( 15 ) مليار دينار مدرج عام 2013 :

يتكون المشروع من بناء مجمعين سكنيين على عرصّة مساحتها ( 35 ) دونم تقريبا، يضم كل مجمع (150) وحدة سكنية على شكل شقق سكنية بمساحة بناء (90) متر مربع ، وتحتوي على غرفتي نوم ومطبخ وغرفة معيشة مع مرافق وحمام ومخزن ومناور داخلية عدد 2 وحديقة امامية مع ممشي وكراج ، مدة تنفيذ المشروع تقدر ب ( 360 ) يوم عمل لكل من المجمعين.

#### اهداف المشروع

يهدف المشروع الى توفير سكن ملائم لشريحة من المواطنين المتعفيين وذوي الدخول المحدودة وتوفير فرص عمل في المدينة طيلة فترة انجاز المشروع .

#### الشرائح المستفيدة:

توفير السكن الاقتصادي ل (300) اسرة فقيرة اي مايعادل (1800) فرد

#### في طريق الانجاز

نسبة الانجاز 95 % ... في المراحل النهائية



المجمع السكني في محافظة كركوك

#### رابعاً : محافظة ديالى: تنفيذ مجمع سكني اقتصادي لإسكان الفقراء ، بكلفة (7) مليار دينار مدرج عام 2012 :

يضم المشروع تنفيذ ثلاث مجمعات سكنية في قرى (الكبة، بهرز، الاحيمر) في قضاء بعقوبة في محافظة ديالى، ويتكون من (105) وحدة سكنية موزعة على القرى المذكورة .

#### اهداف المشروع :

❖ تقليل مشكلة السكن لشريحة الفقراء في المجتمع

❖ ايجاد فرص عمل جديدة ومحاولة الحد من مشاكل البطالة .

#### الشرائح المستفيدة :

يخدم المشروع (105) اسرة اي بما يعادل ( 630 ) فرد من الفقراء في المحافظة .

#### في طريق الانجاز

❖ اهيل المشروع الى احدي شركات القطاع الخاص

❖ لم تباشر الشركة بسبب وجود تجاوزات على الارض المخصصة للمشروع

❖ سيتم رفع المشروع من خطة عام 2016 بموجب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد س.ل/ 651 في 9 / 12 / 2015

**خامساً : محافظة الأنبار: بناء دور سكنية اقتصادية بكلفة قدرها ( 15 ) مليار دينار مدرج عام 2013 :**

ويشمل المشروع بناء (365) دار اقتصادية في اقصية الرمادي ، الفلوجة ، هيت ، حديثة ، عنه ، راوه ، القائم ، الرطبة، تشيد الدار الواحدة على قطعة ارض بمساحة ( 200 ) متر مربع وتضم غرفة نوم كبيرة واخرى صغيرة وصالة ومطبخ وحمام ومرافق صحية مع حديقة وكراج،مدة انجاز المشروع هي ستة اشهر من تاريخ تسلم الارض.

**اهداف المشروع**

يهدف المشروع الى تقليل معاناة الفقراء من مشكلات تدني نوعية السكن والاكتظاظ والتلوث وعدم ملائمة البنى التحتية والتي تعكس الحرمان الذي يعاني منه الفقراء لذا فان هذا المشروع يهدف الى توفير السكن الملائم لفقراء المحافظة

**الشرائح المستفيدة :**

يخدم المشروع (365) اسرة فقيرة اي ما يعادل (2190) فردا .

**في طريق الانجاز**

- بلغت نسبة الانجاز الفعلي 77 % .

- توقف المشروع بسبب الاوضاع الامنية

**سادساً : محافظة بابل : تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقراء في محافظة بابل مع ايصال الخدمات الاساسية (روضة ، حضانتة، مسجد ،طرق داخلية،شبكة مجاري ، ساحات خضراء ) وبكلفة ( 18 ) مليار دينار)مدرج في عام (2012) وينفذ على مدى ثلاث سنوات:**

حددت المحافظة اولوياتها من تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2012 بناء مجمعات سكنية اقتصادية للفقراء وقد خصصت لتحقيق هذا الهدف قطعة ارض مساحتها ( 12 ) دونم في ناحية ابي غرق وبواقع ( 15 ) عمارة، كل عمارة تحتوي على ( 12 ) شقة ، مساحة الشقة الواحدة ( 100 ) متر مربع .

**اهداف المشروع**

يهدف المشروع الى تحسين بيئة السكن للفقراء من خلال توفير مجمع سكني متكامل مع الخدمات الاساسية.

**الشرائح المستفيدة:**

يستهدف المشروع توفير بيئة سكن مناسبة لـ 180 اسرة فقيرة في المحافظة اي ما يعادل (1080) فرد .

**في طريق الانجاز**

❖ احيل المشروع الى شركة الفوا الهندسية للمقاولات احدى شركات وزارة الإعمار والإسكان بأمر الاحالة المرقمة 13953 في 15 / 12 / 2012

❖ تمت المباشرة بتاريخ 30 / 12 / 2012 بمدة انجاز (900) يوم

❖ تم صب جميع هياكل البنائيات وبناء الجدران لـ (12) عمارة مع صب ارضية بنايتي الحارس ومبنى الإدارة .

❖ نسبة الانجاز الكلي 35 % والعمل متوقف بسبب الازمة المالية .



مجمع سكني في محافظة بابل

**سابعاً : محافظة واسط: تنفيذ المرحلة الثانية لمشاريع بناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقراء في محافظة واسط في اقصية الحي والصويرة والعزيبية بكلفة (35) مليار دينار مدرج في عام 2012 :**

يتكون المشروع من اربع مجمعات سكنية في الاقصية (الكوت ،الصويرة ،الحي ،العزيبية ) بكلفة كلية 35 مليار دينار ، تم تخصيص مبلغ 11.900 مليار دينار عام 2012 لبناء مجمع سكني في قضاء الكوت بواقع 284 وحدة سكنية وقد تم انجازه خلال عام 2013 .. تم تخصيص مبلغ 5 مليار دينار في عام 2015 لتنفيذ المرحلة الثانية في الاقصية (الحي ،الصويرة ،العزيبية) .

## اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى حل مشكلة سكن الفقراء في محافظة واسط من خلال مشروع ينجز باكثر من مرحلة يستهدف شريحة مهمة من المجتمع ذات الدخل المحدود ( دخل يقع تحت خط الفقر) .

## الشرائح المستفيدة:

استهدف المشروع في مرحلته الاولى حل مشكلة سكن (5500) فرد من الفقراء

## في طريق الانجاز

✦ انجز المشروع بكلفة (11.900) مليون دينار كمرحلة أولى وشكلت لجنة لغرض استلام الموقع

✦ تم احالة مشروع الخدمات الاساسية للمجمع ضمن خطة عام 2013 موازنة تنمية الاقليم بنسبة انجاز فعلي 60 %

✦ شكلت لجنة لغرض توزيع وجمع استمارات المفاضلة التي اعدتها الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر وصادق عليها مجلس الوزراء وتعتمدها المحافظات بموجب الكتاب الامانة العامة ذي العدد ش.ل /ت/م/025869 في 13 / 8 / 2014 برئاسة مستشار المحافظ لشؤون المجتمع ومجلس المحافظة مشرفاً على اعمال اللجنة واعضاء من الحكومة المحلية (مدير التخطيط والمتابعة ، مدير شؤون المواطنين، قسم العقود ) فضلاً عن ممثل عن الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر .

✦ وزعت استمارات المفاضلة على العوائل الفقيرة وتم التركيز على المناطق العشوائية

✦ تم إدخال البيانات لغرض مفاضلتها .



## ثامناً: محافظة صلاح الدين: بناء مساكن اقتصادية للفقراء ، بكلفة كلية ( 20 ) مليار دينار مدرج في عام 2013:

تألف المشروع من ( 438 ) دار ، لا تقل مساحة بناء الدار الواحدة عن ( 100 ) متر مربع، ومن المؤمل ان يخدم عدد من سكان المحافظة ، كما انه سيؤدي الى تحسين بيئة الانسان ليكون له دور فاعل في التنمية الوطنية ورفع المستوى الخدمي السكني الذي يؤدي الى خفض الانفاق ورفع المستوى المعاشي للمواطنين وتخفيض معدلات الفقر . كما ان المشروع سيقدم خدمة اجتماعية لسكان المحافظة من خلال توفير السكن والبنية التحتية المتطورة وسيتم تقديم الخدمات من قبل المحافظة ضمن خطة تنمية الاقليم .

## اهداف المشروع:

يهدف المشروع الى توفير سكن اقتصادي ملائم للفقراء فضلاً عن توفير فرص عمل للعاطلين خلال فترة إنجاز المشروع .

## الشرائح المستفيدة:

ستوزع الدور على (438) اسرة وبما يعادل ( 2628 ) فرداً من الشرائح الإجتماعية المتضررة بالاعتماد على استمارة المفاضلة التي اعدتها الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر منها:

✦ عوائل الشهداء التي استشهد معيها جراء الانفجارات ولا تملك وحدة سكنية.

✦ العوائل المتعففة التي ليس لها معيل او شخص يعمل في القطاع الحكومي ويفضل العوائل التي تعيلها امراة

## في طريق الانجاز

✦ نسبة الانجاز الفعلي 18 % وتوقف العمل بسبب الاحداث التي تلت احداث حزيران/ 2014

✦ سيتم استئناف العمل بالمشروع حال تحسن الوضع الامني بعد تحرير المحافظة بشكل كامل وشمول العوائل العائدة بالتوزيع.

## تاسعاً: محافظة الديوانية: تنفيذ مشاريع لبناء مجمعين سكنيين إقتصاديين للفقراء في محافظة الديوانية وبكلفة (4) مليار دينار لكل مجمع من المجمعين افقي وعمودي مدرج في عام 2012:

تم تخصيص قطعة الارض المرقمة (8/21) مقاطعة (5) ام العباسيات بمساحة (270) دونم، لبناء مجمعات سكنية افقية وعمودية اقتصادية ، تكون مساحة الوحدة السكنية في المجمعات السكنية الافقية (90) متر مربع بناء (عدا مساحة الحديقة والكراج)، وتتكون الوحدة السكنية من غرفتي نوم وصالة ومطبخ وحمام، اما بالنسبة للبناء العمودي فتكون مساحة الوحدة السكنية (80) متر مربع وتتكون من غرفة نوم وصالة ومطبخ وحمام .

## اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى حل مشكلة السكن للعوائل الفقيرة في المحافظة من خلال نوعين من البناء العامودي والافقي في المحافظة والتي تعد من المحافظات الفقيرة في العراق .

## الشرائح المستفيدة:

يقدر عدد المستفيدين من المشروع ب 185 اسرة، وبما يعادل 1110 فرداً.

## في طريق الانجاز

- ❖ بعد اعلان المشروعين وفتح العطاءات تمت الاحالة الى الشركة المنفذة ،حيث باشرت الشركة عملها في شهر شباط / 2014
- ❖ نسبة انجاز المجمع السكني العمودي هي 45 % وتمثل مرحلة بناء الجدران وتسقيف بعض الوحدات .
- ❖ تبلغ نسبة انجاز المجمع السكني الافقي 70 % وتمثل مرحلة تثبيت الابواب والشبابيك والتاسيسات الكهربائية.
- ❖ توقف المشروع بسبب الوضع المالي



## مجمع سكني في محافظة الديوانية

## عاشراً : محافظة الديوانية ، انشاء وحدات سكنية اقتصادية مع مجمع ماء ،بكلفة ( 15 ) مليار دينار مدرج في عام 2013 :

المشروع هو احد اولويات المحافظة من تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2013 ، ويتكون من :

- ❖ انشاء وحدات سكنية عمودية مع مجمع ماء في ناحية الشافعية - مقاطعة 5 أم العباسيات جنوب غرب المحافظة، وبمدة تنفيذ (240) يوماً...يضم المشروع 162 مبنى سكني عمودي ، يتكون كل مبنى سكني من شقتين تستوعب كل منها (6) اشخاص وتتكون كل شقة من غرفتي نوم ومطبخ وغرفة معيشة ومجموعة صحية ، علماً ان الخدمات اللازمة للمشروع ( شبكة الماء، الكهرباء، الطرق) وغيرها ستنفذ كمرحلة ثانية بعد انجاز مشروع البناء.
- ❖ مشروع تجهيز ونصب مجمع ماء سعة (200) متر مكعب /ساعة مع مد شبكة انابيب بلاستيكية باقطار ( 110،160،250، 315) ملم وبنائة خدمة وحوض تغطية ومولدة كهربائية (500 KV) وتعد مديرية ماء محافظة الديوانية هي المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

## اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى التخفيف من ظاهرة انتشار دور المتجاوزين للعوائل الفقيرة في احياء المحافظة من خلال توزيع الوحدات السكنية لهم بعد اكتمال هذا المشروع كما يسهم المشروع بتشغيل الايدي العاملة والتي معظمها من ذوي الدخل المحدود، اما مجمع الماء فسيؤمن الماء الصالح للشرب للعوائل الفقيرة التي تسكن المجمع .

## الشرائح المستفيدة:

يخدم المشروع حوالي ( 324 ) اسرة اي ( 1944 ) فردا من الفقراء في المحافظة ،وسيكون توزيع المساكن بحسب العوائل الاشد فقرا وحرماناً وفق استمارة المعايير المعدة لهذا الغرض.

## في طريق الانجاز :

- ❖ اعلن عن المشروع واحيل الى الشركة المنفذة باشرت في تاريخ شباط / 2014 .
- ❖ نسبة الانجاز الكلي 50 % وتمثل مرحلة بناء الجدران وتسقيف بعض الوحدات السكنية .
- ❖ المشروع متوقف حالياً بسبب الأزمة المالية .

## احد عشر: محافظة المثنى: تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقراء في محافظة المثنى بكلفة(45) مليار دينار مدرج في عام 2012:

تبنت المحافظة انشاء مجمعات سكنية مخصصة للفقراء مع كافة الخدمات والبنى التحتية اللازمة لها وبواقع (1000)وحدة سكنية، توزع حسب النسبة السكانية للوحدات الادارية في المحافظة مع اجراء بعض التعديل للوحدات التي تعاني من نسب فقر اكبر. تتكون كل وحدة سكنية من طابق واحد وتحتوي على غرفتين

وصالته ومطبخ وصحيات فضلا عن حديقة امامية وكراج، وتختلف مساحة الاراضي المخصصة في اقصية المحافظة اذ تم تخصيص ( 200 ) متر مربع لكل وحدة سكنية في قضاء السماوة، و ( 250 ) متر مربع لكل وحدة سكنية في اقصية (الخضر، الرميثة، السلطان ) و (300) متر مربع لكل وحدة سكنية في كل من النواحي (الوركاء، الكرامة، النجمي، السوير، الدراجي، بصية، الهلال، المجد) الا ان مساحة البناء لكل وحدة سكنية ولكل الاقصية هي (106) متر مربع.

#### اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى توفير سكن اقتصادي ملائم لفقراء المحافظة فضلا عن توفير البنى التحتية الملائمة والتي تؤدي بمجمها الى تحسين بيئة السكن الخاصة بالفقراء.

#### الشرائح المستفيدة:

يستهدف المشروع تحسين الواقع السكني لـ ( 1000 ) اسرة وبما يعادل (6000) فردا في المحافظة.

#### في طريق الانجاز

- نظرا لمحدودية عدد المساكن الاقتصادية في قضائي السلطان والبصية قامت المحافظة بأعداد الكشوفات والدراسات والتصاميم للمشروع .
- ادرج المشروع عام 2012 وتوفيق المحافظة في احالة المشروع خلال عامي 2013-2012
- تم احالة مجمعين في (قضاء السلطان ، ناحية البصية) الى الشركة المنفذة بواقع 70 وحدة سكنية و باشرت الشركة بالتنفيذ في ك2 / 2014 وبلغت نسبة الانجاز للمجمعين %60 والتي تمثل صب تسقيف 50 دار واعمال المبخ من الداخل والخارج .
- اما بخصوص باقي الوحدات الادارية قد تم احالة مشروع اعداد (الدراسات والتصاميم) الى احدى شركات القطاع الخاص التي انجزت عملها خلال عام 2014 .
- توقفت اجراءات (الاعلان، الاحالة، التعاقد ) حسب توصيات اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (30) لسنة 2015 بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بالكتاب المرقم بالعدد ش.ل/30/15/15943 بتاريخ 5/12/2015 بايقاف بالاعلان والاحالة والتعاقد .



#### مجمع سكني في محافظة المنى

#### اثنا عشر :محافظة ذي قار : بناء مجمع سكني اقتصادي وبكلفة (40) مليار دينار مدرج في عام 2013:

لتنفيذ المشروع تم تخصيص مبلغ (6) مليار دينار في عام 2015 .... يتضمن انشاء مجمع سكني افقي اقتصادي ضمن مساحة ارض تبلغ ( 58 ) دونم، يضم دور سكنية اقصية بمساحة ( 200 ) ( متر مربع للدار الواحدة تتلائم مع بيئة الحضر التي تعيشها العوائل، وبعدد دور اجمالي يصل الى 356 دار سكنية وابنية خدمية متكاملة مع شبكات البنى التحتية لهذا المجمع .

#### اهداف المشروع:

- توفير الوحدات السكنية لمواطني المحافظة التي تعاني من الفقر، وسد جزء من الحاجة السكنية في المحافظة
- تطوير المنطقة الحضرية من خلال انشاء مجمعات سكنية مخدومة بابنية عامة كمحلة سكنية متكاملة لخدمة اهالي القضاء ، بالاضافة الى توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل من خلال اعمال البناء في المجمع السكن .
- تحسين دخل الاسر الفقيرة بتوفير المبالغ التي كانت تدفع بدلاً للإيجار .

#### الشرائح المستفيدة :

يخدم المشروع حوالي ( 356 ) اسرة اي بما يعادل (2136) نسمة من الفقراء في البيئية الحضرية.

#### في طريق الانجاز:

- اهيل المشروع بأسلوب الدعوات المباشرة الى احدى الشركات المختصة للتنفيذ .
- بنسبة انجاز الكلي 13 % التي تمثل ( مرحلة حدل الارض وصب الاسس )و توقف المشروع بسبب الازمة المالية .

## ثلاث عشر: محافظة ميسان : انشاء مساكن اقتصادية للفقراء بكلفة 25 مليار دينار مدرج في عام 2013 .

يضم المشروع مباني سكنية عدد ( 625 ) وحدة سكنية تبنى بالمواد الانشائية المتيسرة محليا مثل البلوك والطابوق وغيرها من المواد ، تصل مساحة قطعة ارض الدار الواحدة داخل مركز المحافظة ( 200 ) متر مربع وفي الاقضية والنواحي ( 250 ) متر مربع ... مساحة البناء للدار الواحدة ( 100 ) متر مربع او ( 120 ) متر مربع وسيتم تنفيذ الخدمات (الطرق ، شبكة الماء ، شبكة الكهرباء) من موازنة تنمية الاقاليم.

## اهداف المشروع :

- ❖ يساعد المشروع في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال توفير السكن الملائم
- ❖ سد جزء من الحاجة السكنية في المحافظة التي تعاني من نقص السكن الحاد .
- ❖ تطوير المنطقة الحضرية من خلال انشاء الدور السكنية المخدمه بابنية عامة مكونة محلة سكنية متكاملة
- ❖ توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل علما ان الايدي العاملة الماهرة وغير الماهرة متوفرة
- ❖ تحسين دخل الاسرة الفقيرة بتوفير المبالغ التي كانت تدفع كبديل للإيجار .

## الشرائح المستفيدة :

يخدم المشروع حوالي ( 625 ) اسرة وما يعادل ( 3750 ) فردا في المحافظة .

## في طريق الانجاز:

- ❖ طالبت المحافظة بزيادة كلفة المشروع وتم رفض الطلب من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية
- ❖ تم رفع المشروع حسب توصيات الامانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة الشؤون الاقتصادية ( رفع المشاريع الغير محالته) بموجب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد س.ج/ 651 في 9 / 12 / 2015
- ❖ حاليا يتم اعداد كشف لادراج مشروع جديد بدل السابق بكلفة (8) مليار دينار وبعده (125) وحدة سكنية مع الخدمات الاساسية .

## اربع عشر: محافظة البصرة ، بناء وحدات سكنية اقتصادية بكلفة (35) مليار دينار مدرج في عام 2013:

تبنت المحافظة مشروع بناء ( 500 ) وحدة سكنية اقتصادية وضمها الخدمات والذي يقع في قضاء المدينة / ناحية الامام الصادق، مقاطعة طرة بني منصور، تبنى بالمواد الانشائية المتوفرة محليا، حيث تصل مساحة البناء للدار الواحدة الى (100) متر مربع ومساحة الدار في النواحي (250) متر مربع وفق نمط البناء الافقي وتشارك الدور كافة بالاسيجة مما يقلل تكاليف البناء وامكانية تقديم الخدمات البلدية وانشاء المدارس والمرافق الصحية وانشاء المجاري وكافة الخدمات ضمن المجمع .

## الشرائح المستفيدة:

يخدم المشروع 500 اسرة ، وبما يعادل 3000 فردا من الفقراء في المحافظة

## في طريق الانجاز:

- ❖ تأخرت المحافظة بأحالة المشروع خلال الاعوام السابقة (2013 - 2014 - 2015 ) لاسباب :
- ❖ اعادة النظر بقطعة الارض المخصصة من خلال اضافة قطعة ارض اضافية .
- ❖ تغير موقع المشروع

❖ عزف الشركات عن التقديم بسبب قلته هامش الربح

❖ سيتم رفع المشروع من خطة عام 2016 بموجب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد س.ج/ 651 في 9 / 12 / 2015

## خامس عشر : ديوان الوقف الشيعي، تنفيذ مجمع سكني اقتصادي لإسكان الفقراء بعدد (316) وحدة سكنية، بكلفة (20) مليار دينار مدرج في عام 2015:

تبنى ديوان الوقف الشيعي تنفيذ مشروع لبناء (316) وحدة سكنية مع كافة الخدمات (جامع ، مدرسة ابتدائية ، روضة للاطفال ، مجموعة محلات تجارية 10 محلات، ساحات خضراء ، مواقف سيارات ) فضلاً عن البنى التحتية اللازمة لها ويقع المشروع في مركز محافظة كربلاء على القطعة (رقم 3 مقاطعة 611 جزيرة) ضمن المخطط الاساسي للمدينة بمساحة 100 دونم ، وان الاسلوب المستخدم في التنفيذ هو اسلوب البناء التقليدي الافقي وقد تم اختيار هذا الاسلوب بسبب الظروف الاجتماعية بمساحة 90 متر مربع للوحدة السكنية الواحدة .

## اهداف المشروع:

يهدف المشروع الى توفير سكن اقتصادي ملائم لفقراء المحافظة فضلاً عن توفير البنى التحتية الملائمة والتي تؤدي الى تحسين بيئة السكن الخاصة بالفقراء ، حيث يستهدف المشروع حوالي 1896 فرد.

## في طريق الانجاز:

❖ ادرج المشروع في شهر حزيران / 2015

❖ توقف اجراءات الاعلان حسب توصيات اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (30) لسنة 2015 بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بالكتاب المرقم بالعدد ش.ل/ 30/15/15943/أ بتاريخ 5/12/2015 بايقاف بالاعلان والاحالة والتعاقد .

## اتخاذ اجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لمشاريع بناء الوحدات السكنية الاقتصادية

اولاً: محافظة نينوى : مشروع تجهيز سيارات حوضية عدد 7 وتأهيل الطرق في ناحية الشمال بكلفة (10) مليار دينار مدرج في عام 2013 :

يتضمن المشروع (تطوير مجمعات ماء حطين - اليرموك - خنصور القديمة ، فرش الحصى الخابط للطرق الرابطة بين القرى وتبليط الشوارع المؤدية الى المجمعات المائية التابعة لناحية الشمال وتجهيز سيارات حوضية عدد 7 لمديرية ماء نينوى ) والتي تتولى مهام توزيع المياه الصالحة للشرب الى القرى النائية، وينفذ المشروع في ناحية الشمال في محافظة نينوى والتي تعاني من نقص في الماء الصالح للشرب وذلك لبعدهم عن مصادر المياه والاعتماد على مياه الابار لهذا الغرض .

## اهداف المشروع :

تجهيز مناطق في المحافظة تعاني من قلة توفر الماء الصالح للشرب، فضلاً عن توفير فرص عمل للعاطلين في تلك المناطق، كما ان هذا المشروع يخدم مناطق تضم قرى تعاني من تدني نسبة الطرق والشوارع الداخلية المبلطة مما يؤدي الى صعوبة الوصول الى المراكز الخدمية وخاصة في ظل صعوبة التنقل كون تلك المناطق جبلية

## الشرائح المستفيدة:

يخدم هذا المشروع سكان تلك القرى والبالغ عددهم (214) الف نسمة .

## في طريق الانجاز:

- ❖ تم احالة مشروع تبليط الطرق الرابطة بين القرى وبلغت نسبة الانجاز 50 %
- ❖ تم احالة مشروع فرش الحصى الخابط للطرق المؤدية الى المجمعات السكنية في ناحية الشمال 65 %
- ❖ تم احالة مشروع تجهيز سيارات حوضية عدد 7
- ❖ لم يحال مشروع تطوير مجمعات ماء حطين - اليرموك - خنصور القديمة بسبب الوضع الامني .
- ❖ توقفت جميع المشاريع بسبب الوضع الامني التي تلت احداث حزيران عام 2014

ثانياً : محافظة ديالى : مشروع تنفيذ مجمعات ماء صالح للشرب بكلفة (2.650) مليار دينار مدرج في عام 2012:

يتضمن المشروع مد شبكات ماء لقرى ( ابو صيدا ، الاصلاح ، الأحيمر )

## اهداف المشروع :

تجهيز مناطق في المحافظة يصعب الحصول فيها على الماء الصالح للشرب ضمن القرى المشار اليها اعلاه فضلاً عن توفير فرص عمل للعاطلين في تلك المناطق.

## الشرائح المستفيدة:

يخدم هذا المشروع سكان القرى والذين يبلغ عددهم (1450) فرداً.

## في طريق الانجاز:

تم الاعلان عن المشروع خلال عام 2013 وبسبب التغييرات الادارية في المحافظة تم ايقاف جميع الاحالات في القرى عدا مشروع قرية الاصلاح الذي بلغت نسبة انجازه الفعلي 75 % وقد توقف العمل في المشروع بسبب الاوضاع الامنية التي تلت حزيران/2014 .

ثالثاً : محافظة بغداد، مشروع تبليط شوارع ناحية الحسينية) بكلفة قدرها (7846) مليون دينار مدرج في عام 2015 :

تبنت محافظة بغداد ضمن اولوياتها لتخفيف الفقر من تخصيصات الاستراتيجية من الموازنة الاستثمارية لعام 2015 مشروعاً لتبليط شوارع ناحية الزهور "الحسينية سابقاً" ... يضم المشروع جزئين من المقاولات (تبليط الشارع الممتد من مدخل جسر الناحية الى تقاطع الجريخي ) بطول (590) متر مربع (وتبليط شارع الجريخي ) بطول (4) متر مربع .



تبليط شوارع في محافظة بغداد

يهدف المشروع الى توفير الطرق للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ذات الطابع الفقير مع ايصال الخدمات الاساسية لجميع المواطنين فضلاً عن تسهيل ايصال المحاصيل الزراعية من المزارع الى الاهالي والاسواق ويقع المشروع في ناحية الحسينية .

## الشرائح المستفيدة :

يقدر عدد المستفيدين من المشروع بحوالي (450) الف نسمة

## في طريق الانجاز

❖ ادرج المشروع في عام 2015

❖ اهيل الى الشركة المنفذة في شهر اذار /2015

❖ نسبة الانجاز الكلي 90 % التي تمثل تسوية الارض مع فرش الحصى الخابط ومشبكات الامطار واعمال (RIGET) صب الكونكريتي المسلح والاكساء بالاسفلت .

رابعاً: محافظة كربلاء:تضمن خطة المحافظة لعام 2012 انشاء بنى تحتية في المحافظة ويتكون من التفاصيل الآتية:

أ - إنشاء البنى التحتية لمجمع دور اقتصادية (1000) دار ، بكلفة (12) مليار دينار ...

❖ نفذ المشروع مطلع عام 2013 ويمثل مشروع توفير البنى التحتية لمجمع دور اقتصادية تم بناءه سابقاً بعدد (1000) دار والذي يتكون من ( تنفيذ شبكة مجاري ثقيلة وشبكة امطار، ايصال خط الماء المغذي ،اعمال تبليط للشوارع )



## اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى تحسين بيئة السكن من خلال توفير البنى التحتية

لمجمع دور (1000) دار تم بناءها سابقاً ضمن موازنة تنمية الاقاليم

## عدد المستفيدين :

يقدر عدد المستفيدين من المشروع بحوال (6000) فرد .

## في طريق الانجاز

❖ تم انجاز المشروع في شهر اذار 2014

❖ سيتم الاعتماد على استمارة المفاضلة المعدة من قبل الادارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر والمصادق عليها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء في توزيع الدور .

ب - توفير البنى التحتية لمنطقة الزكاريط في قضاء عين التمر ، بكلفة (12) مليار دينار .

## اهداف المشروع :

ويهدف المشروع الى توفير خدمة ملائمة لشريحة من المواطنين المتعفيين وذوي الدخل المحدودة وتوفير فرص عمل في المنطقة طيلة فترة انجاز .

## عدد المستفيدين :

يقدر عدد المستفيدين من المشروع بحوال (3000) فرد .

## في طريق الانجاز :

## جدول (7) : مكونات النشاط مع نسب الانجاز الفعلي

اسم المكون	موقع المكون	نسب الانجاز %	الملاحظات والمعوقات
تنفيذ شبكة مجاري مع محطة المعالجة	قضاء عين تمر / منطقة الزكاريط	77 %	- العمل متوقف بسبب الازمة المالية
تنفيذ بناية لمقر الصيانة وتنفيذ شبكة ماء	قضاء عين تمر / منطقة الزكاريط	-	- توقفت الاجراءات في مرحلة التحليل بسبب الازمة المالية
تنفيذ شبكة كهرباء	قضاء عين تمر / منطقة الزكاريط	-	- تم احالة المشروع وتوقفت الاجراءات بسبب الازمة المالية
تنفيذ مركز صيانة الكهرباء	قضاء عين تمر / منطقة الزكاريط	-	- تم احالة المشروع وتوقفت الاجراءات بسبب الازمة المالية
تنفيذ شبكة اتصالات	قضاء عين تمر / منطقة الزكاريط	-	توقفت الاجراءات في مرحلة الاعلان بسبب الازمة المالية
تنفيذ تبليط الطرق	قضاء عين تمر / منطقة الزكاريط	-	- تم تعديل الكشوفات - توقفت الاجراءات في مرحلة الاعلان بسبب الازمة المالية

### 3 - دراسة وتصميم مشروع توفير البنى التحتية لمشاريع السكن في منطقة الشريفات بكلفة قدرها (450) مليون دينار (مدرج في عام 2013) :

يتضمن المشروع اعداد دراسة لإنشاء مجمع سكني متكامل في منطقة الشريفات / محافظة كربلاء والتي ستنفذه المحافظة ضمن مبالغ تخصصها الادارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر بعد اكمال الدراسة والتصاميم والمخططات بواقع (1000) وحدة سكنية ويشمل المشروع توفير دراسة وتصاميم إلى :

✦ تنفيذ شبكة كهرباء

✦ انشاء بناية مركز صيانة الكهرباء

✦ استحداث مغذي من محطة الوند

#### اهداف المشروع :

تقديم الخدمة الاساسية للعوائل الفقيرة والتي يصعب الحصول عليها في تلك المناطق.

#### في طريق الانجاز :

✦ احيل مشروع (دراسات وتصاميم منطقة الشريفات) الى مكتب الاستشاري (كلية الهندسة/جامعة كربلاء) شهر ك2/ 2014

✦ انجز العمل من قبل المكتب الاستشاري ولم يتم تسليم الاوليات لحين الايفاء بمبلغ التعاقد بسبب الازمة المالية

**خامساً: محافظة ديالى ، تاهيل وتنفيذ شبكات كهرباء في المناطق الريفية بكلفة ( 5.230 ) مليار دينار مدرج في عام 2013 :**

يتالف من ( 12 ) مشروع ويشمل تنفيذ وتاهيل شبكات كهرباء في قرى متعددة داخل المحافظة.

#### اهداف المشروع :

✦ توفير شبكة الكهرباء بصورة مستمرة للمناطق والقرى الفقيرة

✦ تاهيل الطاقة الكهربائية للقرى والمناطق البعيدة

#### الشرائح المستفيدة :

سكان القرى المشار اليها اعلاه والبالغ عددهم (14842) فردا.

#### في طريق الانجاز :

✦ السلام - قرية الكبة بنسبة انجاز 100 %

✦ العبارة - قرية الاعور بنسبة انجاز 100 %

✦ بني سعد - قرية محمد الكاظم بنسبة انجاز 100 %

✦ الخالص - قرية سفيط بنسبة انجاز 100 %

✦ مركز قضاء بلد روز - قرية جواد الحجى بنسبة انجاز 100 %

✦ مندلي - قرية عبد الله كيطان بنسبة انجاز 100 %

✦ العظيم - قرية ابو طريمش بنسبة انجاز 87 %

✦ مركز قضاء المقدادية بنسبة انجاز 60 %

✦ مركز قضاء خانقين - قرية جسر حلوان بنسبة انجاز 54 %

✦ جلولاء - منطقة الكحلاء بنسبة انجاز 1 %

✦ المنصورية - قرية حبيب العبد الله بنسبة انجاز 1 %

✦ الخالص - قرية السنديّة 100 %

#### ثالثاً: تحديات مشاريع السكن


احدى مستلزمات ادراج مشاريع السكن...توفر الارض الخاصة بالمشروع والتي تعد اكبر محدد للمشاريع التي كانت جهات التنفيذ تروم تولي تنفيذها ضمن خطط تخفيف الفقر... اذ ان الجهات لم تخصص بصورة مسبقة قطع اراضي لمشاريع الامر الذي ادى الى تاخر البدء بعدد غير محدود من تلك المشاريع . عدم وجود نماذج قياسية للدور الاقتصادية للفقراء .

معتمدة من الجهات المعنية ادى الى خضوع مواصفات تلك الدور الى ميول ورغبات الجهات المنفذة والمستفيدة وانعكس على تقديم مستلزمات ادراج تلك المشاريع في الوقت المحدد والذي اثر على موعد التنفيذ والانجاز وكذلك كلف بناء هذه الدور.

عدم وجود ضوابط لمسائلة الوزارة او المحافظة عن اسباب عدم المباشرة او تأخر تنفيذ مشاريع وانشطة تخفيف الفقر ومنها مشاريع السكن ادى الى تأخر تنفيذ عدد غير قليل منها وتلك في تحقيق اهداف الاستراتيجية ضمن الوقت المحدد.

يتطلب ادراج اي مشروع سكني الى وجود دراسة جدوى فنية وهي لم تكن متكاملة في الوقت المحدد لدى عدد من جهات التنفيذ مما حد من سرعة تبني تلك المشاريع من قبل الجهات المعنية .

تفاوتت كلف التنفيذ المقدمة من قبل جهات التنفيذ لوحدة السكن الاقتصادي والتي تزيد في بعض الاحيان عن الحد المسموح به مما يؤدي الى رفضها من قبل الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر والجهات المعنية في وزارة التخطيط وينعكس على الاستفادة من تخصيصات الاستراتيجية وسرعة تنفيذ خطط الفقر نستعرض في نهاية هذه المحصلة ملخصاً بعدد الدور السكنية الاقتصادية ونسب إنجازها حسب المحافظات وفق الجدول الآتي :

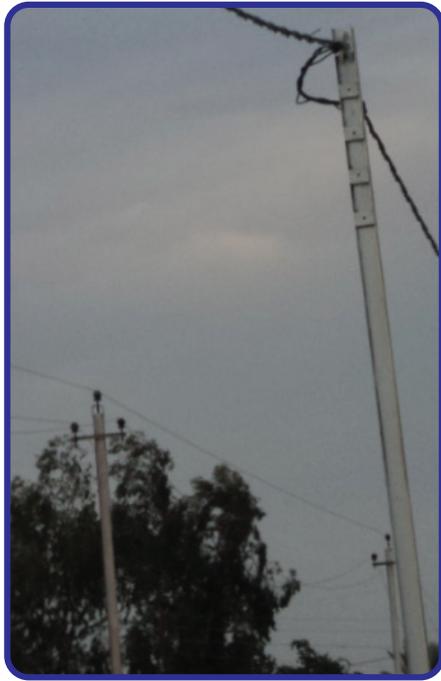

شبكة كهرباء قرية محمد كاظم /محافظة ديالى

## جدول (8) : توزيع عدد الدور الاقتصادية ونسب انجازها على المحافظات

ت	الجهة	عدد الدور	نسبة الانجاز الفعلي	الملاحظات
1	وزارة الاسكان والاعمار محافظة الديوانية/الجبسة	144	38.8 %	توقف المشروع بسبب الازمة المالية
2	وزارة الاسكان والاعمار محافظة الديوانية / السنية	65	7.6 %	توقف المشروع بسبب الازمة المالية
3	وزارة الاسكان والاعمار محافظة الديوانية / الشناقية	331	-	تمت الاحالة وتوقفت الاجراءات بسبب الازمة المالية
4	وزارة الاسكان والاعمار محافظة ذي قار / عكبة	260	6 %	توقف المشروع بسبب الازمة المالية
5	وزارة الاسكان والاعمار محافظة بابل / الشوملي	240	-	تم تأجيل توقيع العقد بسبب الازمة المالية
6	وزارة الاسكان والاعمار محافظة المثنى / طحربة	112	9 %	توقف المشروع بسبب الازمة المالية
7	وزارة الاسكان والاعمار محافظة صلاح الدين / يثرب	237	-	- توقف المشروع بسبب الوضع الامني والازمة المالية
8	محافظة نينوى	500	-	توقفت اجراءات تنفيذ المشروع بعد احداث حزيران 2014
9	محافظة كركوك	300	95 %	المشروع في مراحلها النهائية
10	محافظة ديالى	105	-	توقفت الاجراءات بسبب وجود تجاوز على موقع العمل
11	محافظة الانبار	365	77 %	توقف المشروع بسبب الوضع الامني
		212	18 %	المشروع مستمر
12	محافظة بابل	108	35 %	توقف المشروع بسبب الازمة المالية
13	محافظة واسط	284	100 %	منجز
		591	0	المشروع متلكىء مشاكل في الاجراءات التعاقدية
14	محافظة صلاح الدين	438	18 %	توقف المشروع بسبب الظروف الامنية
15	محافظة الديوانية	409	50 %	توقف المشروع بسبب الازمة المالية
16	محافظة المثنى	1000	60 %	-احالت المحافظة مجمعين في قضاء السلمانية وناحية البصية -لم توفيق المحافظة في احالة باقي الوحدات الادارية
17	محافظة ذي قار	356	13 %	توقف المشروع بسبب الازمة المالية
18	محافظة ميسان	625	-	تلكت المحافظة في احالة المشروع
19	محافظة البصرة	500	-	تلكت المحافظة في احالة المشروع
20	ديوان الوقف الشيعي	316	-	توقفت الاجراءات بسبب توصيات لجنة الامر الديواني رقم (31) لسنة 2015 لسنة 2015 بايقاف اجراءات الاحالة والتعاقد
	مجموع الوحدات	7498		








الجنة العليا التوجيهية لمشروع العشوائيات

### في إطار العمل الفني والاداري :


تم تنفيذ ورشة عمل في شهر آب 2015 لبناء قدرات الكادر الفني المسؤول عن التنفيذ للجهات المعنية بالمشروع والذي يتضمن وضع الحلول الدائمة وتصنيف مواقع الحلول للعشوائيات وقضايا الاراضي وقرار الامور اللوجستية.

وضع اليه تثبيت مواقع السكن العشوائي بالاعتماد على الصور الفضائية الحديثة عالية الدقة وذات المواصفات (الدقة اقل من 60 سم ، world view 1.2.3 ، QB ، geol) والمجهزة من قبل منظمة الهيئات للمناطق الحضرية في محافظات العراق عدا اقليم كردستان لاجراء نماذج الخرائط الاولية والتي توضح التجمع العشوائي ويتم المصادقة عليها من قبل لجان المحافظات لتتبع القانون على اساس وجودها ومنع توسعها ، حيث تم تشكيل لجان فرعية ترتبط باللجنة التوجيهية العليا تتولى هذه اللجان الاشراف وادارة المشروع معها فضلا عن تشكيل لجان فنية اخرى تقوم بتثبيت مواقع السكن العشوائي وتحديثها ميدانيا بالاعتماد على الصور الفضائية ونتائج المسح التمهيدي لرصد وتسجيل تجمعات السكن العشوائي لسنة 2013 .

### نموذج تثبيت تجمعات السكن العشوائي لمشروع معالجة وتأهيل السكن العشوائي

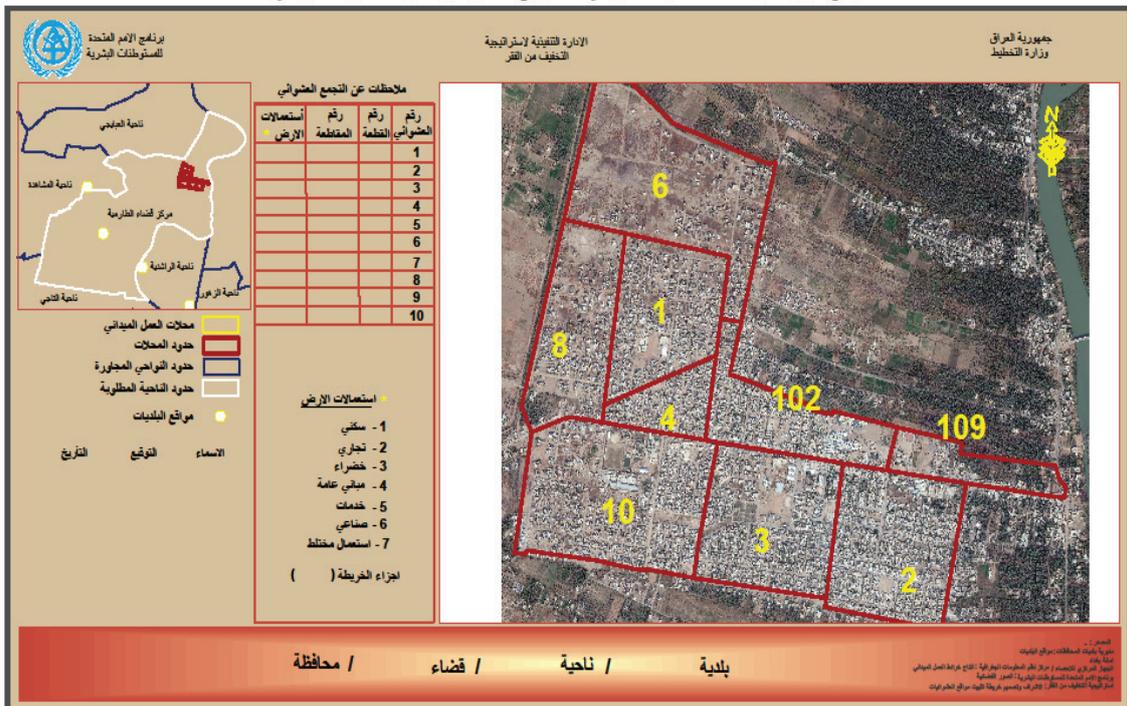

تم اختيار منطقتين عشوائيتين في محافظتي (بغداد، البصرة) سواء كانت للارتقاء او اعادة التوطين لإقرارها من قبل اللجنة التوجيهية العليا لمشروع معالجة العشوائيات كبيئة تجريبية للمشروع.

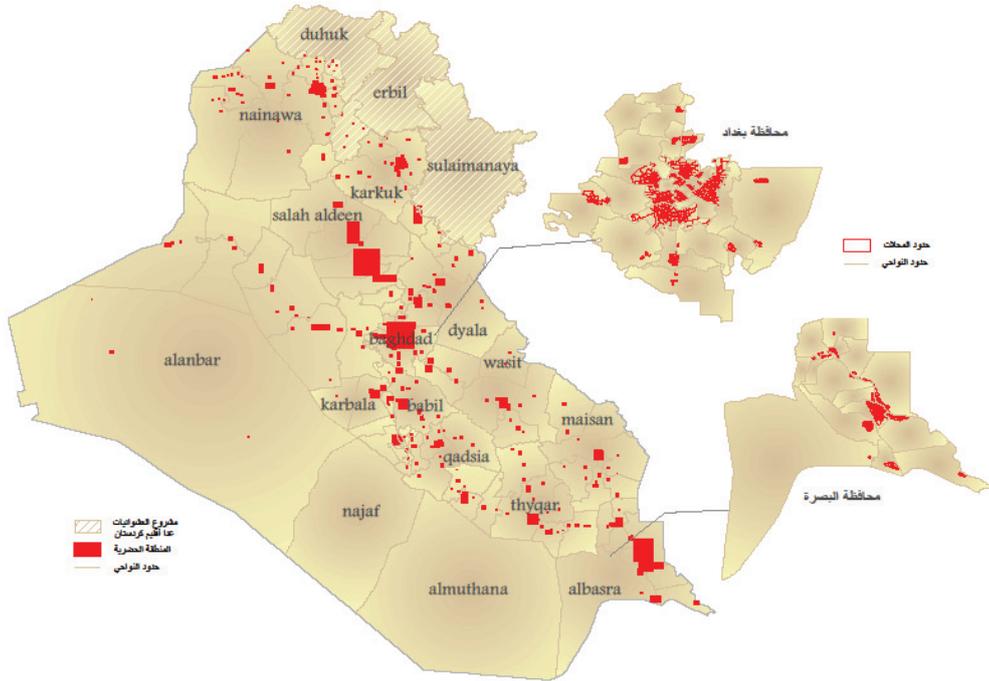

خارطة (1) توضح المناطق الحضرية

اعداد برنامج تفصيلي لدعم تنفيذ المشروع حيث تم استخدام برنامج Access والمعد على اساس نموذج مبني على بيانات إجتماعية وإقتصادية سابقة ضمن المواصفات العالمية، ويتم ادخال المعلومات الخاصة بالمسح الجديد بعد حصر العشوائيات وربط بياناتها بالصور الفضائية التي تنظم في جداول هذا البرنامج وتدخل ضمن معادلات صممت من وفق منهجية دولية في مجال العشوائيات وعلى اساس هذه المدخلات يحدد نوع التدخل (ارتقاء، اعادة توطين) لكل عشوائية.

اعداد كراس خارطة الطريق لمعالجة العشوائيات لأعمامه على الحكومات المحلية والوزارات والجهات ذات العلاقة للتوعية في تنفيذ البرنامج.

#### الطابعات الانشائية ثلاثية الأبعاد

لغرض توفير مجمعات سكنية اقتصادية سريعة الانجاز خاطبت وزارة التخطيط ووزارة الخارجية العراقية لغرض مفاتحة كل من السفارة الصينية في العراق والسفارة العراقية في الصين للاطلاع والتفاوض مع الشركات الصينية حول امكانية استخدام هذا النوع من البناء لكلفته الواطئة وسرعة الانجاز.



طابعة إنشائية ثلاثية الأبعاد

- ❖ اقيمت ورشة خاصة بحضور المختصين من الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنفيذ خلال شهر ايلول /2015. لاعداد مسودة تشريع بديل لقراري مجلس الوزراء المرقمين (154) و (156) لسنة 2001 الذي يتناول معالجة العشوائيات وفق خارطة الطريق وقد تم التوصل الى :
  - اعداد مسودة تشريع بديل للقرار (154) لسنة 2001 الذي يتناول ازالة العشوائيات وفق خارطة الطريق .
  - اعداد مسودة تشريع بديل للقرار (156) لسنة 2001 الذي يتناول معالجة العشوائيات وفق خارطة الطريق .

### المحصلة الخامسة: حماية اجتماعية فعالة للفقراء

على الرغم من تمتع المجتمع العراقي باساليب التكافل العشائري والديني ( الزكاة، والصدقات... الخ) الا ان مستوى تنفيذ تلك الممارسات لم يكن كافيا لتحقيق العدالة الاجتماعية كما انها لم تكن تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية، لذا اتجهت الحكومة العراقية الى نظام شبكة الحماية الاجتماعية في نهاية عام 2005 لمساعدة الفقراء بالشكل الاساس ، وقد مر هذا النظام بتطورات عدة ليضي بمستلزمات حياة الفقراء واحتياجاتهم وتم تحديد الفئات المستهدفة منهم وتابعت الادارة التنفيذية لاسراتيجية التخفيف من الفقر تنفيذ هذا النظام من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بآليات المتابعة الخاصة بها.

### اولاً: نظام رصد وتقييم واصلاح نظام البطاقة التموينية

استكمالاً لجهود الإدارة التنفيذية في المساهمة في تفعيل نظام البطاقة التموينية وربطه بنظام الحماية الاجتماعية الذي هو احد انشطة إستراتيجية تخفيف الفقر لجعله اكثر فاعلية..تواصل العمل على تطوير نظام البطاقة التموينية الذكية لتحقيق الاستهداف الدقيق للفقراء والفئات المهمشة من خلال توفير قواعد البيانات الالكترونية للمستفيدين فضلاً عن تحسين جودة مفرداتها وتيسير الحصول عليها من عدة منافذ بقيام القطاع الخاص بتوفير المواد التموينية. ويضمن هذا المشروع عدم تسرب مزايا البطاقة التموينية لغير المحتاجين ويكفل منع هدر موارد الدولة تحت مظلة برنامج اصلاح حديث ومتكامل، وفي هذا الشأن تم تشكيل لجنة عليا وضعت الاطار العام للبرنامج وآليات العمل به وسلسلت فعالياته وفق اولويات واسبقيات الاستهداف.

حيث تقوم فكرة مشروع البطاقة التموينية الذكية على اعتماد التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الحصول على المفردات التموينية المخصصة للأسرة شهرياً باستخدام البطاقة الذكية فضلاً عن توفر قاعدة بيانات الكترونية لكل الاسر العراقية المشمولة بالبطاقة و اعطاء القطاع الخاص دور للمساهمة في نمو النشاط الاقتصادي ، وتخفيف العبء عن اجهزة الدولة كي تنشغل بمهام الاشراف والتخطيط في هذا المجال .

### الاطار العام لنظام البطاقة التموينية

- ❖ يعتمد النظام امكانية تجهيز الاسر من الاسواق المحلية (التجار او الاسواق الكبيرة) في بيئة المشروع الريادي بطريقة تكاملية مدروسة لتبديل نوعية المواد حسب رغبة المستفيد.
- ❖ يقوم المواطن بالتعامل من خلال البطاقة مع الوكيل او المتاجر وكذلك يقوم الوكيل بمراجعة اقرب منفذ مالي مخصص لتثبيت المعلومات المطلوبة لصرف الاموال مع امكانية استخدام الاجهزة المتطورة لاستلام الاموال.
- ❖ انشاء بوابة الكترونية مخصصة للتعريف والاعلام واملء النماذج.
- ❖ طبع البطاقات التموينية الذكية لكل مركز تمويني وتوزيعها على الوكلاء والتجار والمواطنين.
- ❖ توفير بطاقات ذكية توزع على العوائل المشتركة في التجربة (واحد لكل عائلة) لها مواصفات مناسبة من ناحية الامان والسعة التخزينية والكفاءة والمعايير الامنية العادية والمصرفية .
- ❖ اعتماد مصرف تتوفر لديه البنى التحتية التقنية الضرورية لتنفيذ المشروع من خلال اتباع الطرق والمعايير الأمنية في حماية جميع اطراف العملية مع توفير الية ضمنية في النظم المستخدمة لأغراض التعريف والتحقق والتأكيد عند اجراء أي عملية تناقل بالأرصدة بين جميع الأطراف المشتركة في العملية
- ❖ اعتماد معايير الامن المعلوماتي وتجربة البنك المركزي في اختيار التقنيات والبرامجيات يكفل منع هدر موارد الدولة تحت مظلة برنامج اصلاح حديث ومتكامل .

### اهداف المشروع :

- ضمان وصول الدعم للمشمولين من خلال نظام آلي وقاعدة بيانات محدثة وقواعد استهداف دقيقة .
- توفير اليات محكمة في الرقابة والسيطرة على معدلات الفقد والتسرب والفساد الاداري والمالي في مختلف مفاصل البرنامج.
- توفير مناخ حضاري لصرف الخدمات المختلفة للمواطن المستحق لهذه الخدمة.
- توفير امكانية تحديد انماط الاستهلاك للأسرة العراقية جغرافياً ونوعياً وكمياً.
- تشجيع الاسرة العراقية على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وضمان الحصول على الخدمات بسهولة.
- تحقيق الشفافية وتوفير الية لتفاعل المواطن مع الحكومة في عملية ترشيد وادارة الدعم .
- رفع المؤشر التكنولوجي العالمي للعراق من خلال الاستخدام الامثل لتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا البطاقات الذكية لتقديم الخدمات المختلفة للمستحقين.
- توفير قاعدة بيانات موسعة تدعم اتخاذ القرار لدى القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بالإضافة الى توفير فرص حقيقية لصناع القرار في اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة ومبنية على قراءات ومعطيات ميدانية وواقعية.
- توفر قاعدة البيانات امكانية الربط مع قاعدة بيانات شبكة الحماية الاجتماعية لإستهداف الفقراء

لغرض تحديد تحديات التنفيذ واستخلاص الدروس لتطبيق النظام بشكله النهائي على مستوى محافظات العراق كافة، ستنفذ بيئة تجريبية في ناحية الحرية / محافظة النجف التي يبلغ عدد سكانها حوالي (34) الف فرد اي حوالي (5700) الف اسرة تزود كل اسرة ببطاقة ذكية ورقم تعريفى بحسب عدد افرادها، للحصول على تلك المواد خلال فترة اقصاها (30) يوماً من تاريخ التوزيع بعدها يسقط حق الأسرة من التموين لذلك الشهر جدول التالي يوضح عدد المشمولين وعدد الوكلاء وبيانات اخرى في ناحية الحرية :

الجهة	اسم المركز	رقم المركز	عدد العوائل المستفيدة	عدد الافراد	عدد الاطفال	عدد وكلاء الغذائية	عدد وكلاء الطحين	عدد المشمولين بالبطاقة التموينية الذكيّة / فرد
محافظة النجف	الحرية	655	6407	34647	595	22	10	31978

ستساهم عدة جهات في تنفيذ مشروع برنامج الاصلاح وهي كل من ( وزارة التخطيط / الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر، وزارة التجارة / دائرة التخطيط والتموين، وزارة الاتصالات/شبكة الاتصالات الدولية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/المكتب الاستشاري والحكومة المحلية في محافظة النجف ... تم وضع توقيتات زمنية لتنفيذ البيئة التجريبية للبطاقة التموينية لإنشطة التهيئة والتحضير، كما موضح في الجدول الآتي :

### جدول (9) : يوضح البيئة التجريبية لإصلاح نظام البطاقة التموينية

ت	النشاط	الجهة المسؤولة	التاريخ	الموقف
1 -	تحديث قاعدة البيانات الاسر المشمولة	وزارة التجارة	2015/ 6/ 22	منجز
2 -	تسليم قاعدة البيانات من وزارة التجارة الى وزارة الاتصالات	وزارة التجارة	2015/ 7/ 1	منجز
3 -	توفير اجهزة جمع المعلومات الحياتية البالغ عددها (22) جهاز	وزارة الاتصالات	2015/ 7/ 28	منجز
4 -	تسليم اجهزة القطع للوكلاء	- وزارة الاتصالات - وزارة التجارة	2015 /8/ 16	منجز
5 -	نصب الاجهزة والربط الشبكي لها مع الخادم	وزارة الاتصالات	2015/ 8/ 16	منجز
6 -	طبع البطاقات التموينية الذكيّة للأسر المشمولة	وزارة الاتصالات	2015/ 10/ 18	منجز
7 -	تسليم البطاقات التموينية الذكيّة الى وزارة التجارة	وزارة الاتصالات	-	لم يحدد بعد
8 -	توزيع البطاقات الذكيّة على الاسر المشمولة	وزارة التجارة	-	لم يحدد بعد
9 -	تجهيز مبالغ المواد للمجهزين	وزارة التجارة	2016	- تقديم (5) عروض من قبل الشركات قطاع خاص لإختيار الشركة المنفذة
10 -	اقامة دورة تدريبية للوكلاء حول استخدام اجهزة القطع وآلية العمل	- وزارة الاتصالات - وزارة التجارة	-	منجز
11 -	الشروع بالتوزيع بموجب البطاقة التموينية لـ 3 أشهر	وزارة التجارة	-	لم يحدد بعد
12 -	توفير الخزين الاستراتيجي	وزارة التجارة	2015/ 11/ 25	متوفرة حالياً
13 -	تقديم تقارير حول متابعة تنفيذ الخطة	وزارة التخطيط	كل نهاية شهر من اشهر التنفيذ	-

## في طريق الانجاز

- تم انجاز الخطوات التالية بشأن تنفيذ البيئة التجريبية للمشروع وهي :
- اعداد خطة لتنفيذ البيئة التجريبية لإصلاح البطاقة في (ناحية الحرية / محافظة النجف)
- اعداد نظام شبكي الكتروني بدعم من وزارة الاتصالات والربط مع قاعدة بيانات وزارة التجارة
- اصدار بطاقات الكترونية ذكية للناحية المشمولة بالتجربة
- توفير اجهزة القطع التي يبلغ عددها (28) جهاز توزع على محلات البيع
- تم توجيه دعوة مباشرة لشركات قطاع خاص لتوفير مواد التموين لدعم تنفيذ التجربة
- وبالنظر لتأخر اجراءات التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتوفير التموين لم تنفذ البيئة التجريبية في الشروع بالتوزيع رغم استكمال البنى التحتية المطلوبة للمشروع وسيتم تنفيذ التجربة حال توفر مواد التموين .



نموذج يوضح البطاقة التموينية الذكية

## ثانياً: وضع برنامج لرفع القدرات لتأهيل وتدريب العاملين على حسن تطبيق نظام الشبكة

يجري تنفيذ النشاط من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث تم تحديد مبلغ قدره (1.500) مليار دينار لعام 2015 تم وضع برنامج للتدريب في المجال القانوني والبحث الاجتماعي والحسابات والبرمجة وادخال البيانات والشؤون المالية... وبلغ عدد الورش (10) ورشة بعدد (109) مشارك وعدد الندوات (31) ندوة بعدد (151) مشارك وبلغ عدد الدورات (42) دورة بعدد (123) مشارك في الدورات ... كما تم مشاركة موظفي شبكة الحماية الاجتماعية بدورات خارجية من خلال المركز الوطني للتدريب والتطوير الاداري التابع الى وزارة التخطيط .

## ثالثاً: وضع تقارير انظمة رقابية صارمة على اليات العمل وتنفيذ قانون الحماية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

يستمر العمل على متابعة مدى دقة تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية وبصورة دورية سنوية في اقسام دائرة الرعاية الاجتماعية في بغداد والمحافظات ... حيث تم تشكيل لجان للمراقبة في اقسام الدائرة المالي فقد تمت زيارة اقسام الدائرة في المحافظات (بغداد/الرصافة، البصرة، ذي قار، واسط، الديوانية، كربلاء، النجف، المثنى، ميسان) وفي هذا الشأن بلغ عدد المتجاوزين من غير الموظفين المحالين الى القضاء (1306) متجاوز على النظام ... وبلغ عدد المتجاوزين من الموظفين المحالين الى دوائهم (411) متجاوز . اما بالنسبة للمتجاوزين على اموال الحماية الاجتماعية الذين سددوا ما بذمتهم على شكل اقساط او دفعة واحدة بلغ (13467) متجاوز .

## رابعاً: تصميم برنامج اعلامي موجه للمواطنين لتوعيتهم بحقوقهم وشروط الشمول والعقوبات الرادعة في حالة التجاوز على الشبكة.

تم تبني برنامج اعلامي موجه للمواطنين لتوعيتهم بحقوقهم وشروط الشمول والعقوبات الرادعة في حالة التجاوز على الشبكة تضمن توجيه حملات اعلامية تهدف الى نشر الوعي بين الفئات المستحقة لاعانة الشبكة واستقبال شكاوي المواطنين، وفي هذا الشأن تم استقبال ما يقارب (4123) شكوى لغاية نهاية عام 2015، كما تم تنفيذ (98) زيارة ميدانية للعوائل الفقيرة، فضلاً عن التواصل مع القنوات الفضائية والصحف اليومية لتوعية المواطنين واعلامهم عن موعد الدفعات وحل جميع مشاكلهم.

## خامساً: وضع آلية لربط مبلغ الاعانة بمعدل التضخم مع امكانية توفير معدلات التضخم للسلع الاساسية .

يهدف النشاط الى منح مبلغ اعانة مناسب للفقراء مع المحافظة على القيمة النقدية للعملة والفئات الهشة في المجتمع ، ولتحقيق ذلك تم وضع الية لربط مبلغ الاعانة بمعدل التضخم مع امكانية توفير معدلات التضخم للسلع الاساسية وفقاً لقانون شبكة الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 الذي يشير الى ربط مبلغ الاعانة بمعدل التضخم السنوي ، وقد تم التنسيق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط حول تلك الالية وتحديد مبلغ الاعانة وفق معدلات التضخم السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء.

## سادساً: تحديث خط الفقر الوطني سنوياً بالاستفادة من مسوحات الاسر والمصادر الاحصائية الاخرى لتحديد الاسر المستهدفة بالاعانة

يقوم الجهاز المركزي للاحصاء بتحديث خط الفقر الوطني سنوياً بناءً على معدلات التضخم السنوية، بالاعتماد على نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي المستمر الذي ينفذه الجهاز سنوياً لتحديد الاسر المستهدفة بمبلغ الاعانة تأكيداً على دقة الاستهداف ومنع تسرب المزايا لغير المستحقين وبهذا يكون هذا النشاط مكملًا للنشاط الذي يسبقه إذ سيتم تحديد المستفيدين من الفقراء الذين يقل دخلهم عن خط الفقر الوطني اي (105) الف دينار .

اهتمت الحكومة بشكل كبير خلال السنوات الماضية بزيادة الموارد المالية المخصصة لنظام الحماية الاجتماعية للوفاء باحتياجات الفقراء. وعلى الرغم من تحقيق هذا النظام لفوائد ومزايا للأسر الفقيرة وللشباب غير القادرة، إلا أن هناك إجماعاً بين الحكومة والدوائر الاقتصادية على ضرورة اصلاح هذا النظام وزيادة كفاءته. ومع ارتفاع فاتورة الدعم ظهرت الحاجة الى ضرورة تجنب استفادة الطبقات غير المحتاجة وبالتالي توجيه قدر أكبر من الموارد للطبقات غير القادرة. تشير نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي لسنة 2012 الى أن 7.3% من الافراد يعيشون في أسر مشمولت بنظام الحماية الاجتماعية، كما تبين النتائج أن 80.2% من الأسر المشمولت بالنظام هي أسر غير فقيرة و 19.8% فقط من الأسر المشمولت بنظام الحماية الاجتماعية فقراء. وهذه النتائج تؤكد اعتماد معايير غير صحيحة للشمول بالنظام ولا تساهم هذه المعايير في التخفيف من الفقر.

وأظهرت نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة لسنة 2012 أيضاً أن المشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية يتركزون في المناطق الحضرية على الرغم من أن الفقر يتركز في المناطق الريفية، حيث أن 68.9% من الأسر المشمولت بالنظام تقطن في المناطق الحضرية و 31.1% يقطنون في المناطق الريفية. يتضح مما سبق قصور معايير الاستهداف الموضوعت حالياً للاستفادة من برنامج الدعم، ونتائج الدراسة تشير الى منح الدعم لمجموعة من الافراد الذين لا تنطبق عليهم المعايير (تسرب الدعم) وتترك كثيراً من المستحقين الفعليين بدون تغطيتهم ببرامج الدعم (عدم التغطية).

تستهدف استراتيجية تخفيف الفقر شمولاً أوسع للفقراء بشبكة الحماية الاجتماعية مما يتطلب اصلاح نظام الاستهداف في تحديد المشمولين من خلال الدروس المستنبطة من تطبيقها خلال السنوات الاربع الماضية، شخصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض التحديات التي واجهتها اثناء التطبيق تدعو الاستراتيجية الى معالجتها لتحقيق درجة أعلى من الاستفادة للفقراء من خلال :

**أولاً : تعديل قانون الحماية الاجتماعية باعتماد خط الفقر الوطني الفئات المستفيدة الذي صدر في عام 2014 بالرقم (11) بدلاً عن الاستهداف الفئوي الذي كان معتمداً سابقاً**

**ثانياً : استهداف الفقراء**

يتطلب أسلوب استهداف الأسر ان تقوم إدارة البرنامج بتقييم مدى استحقاق الافراد أو الأسر المتقدمة للحصول على مزايا البرنامج كل على حدة. وقد تتم عملية استهداف الأسر بالاستعانة بأسلوب مباشر في الاستهداف يعرف بأسلوب اختبار سبل المعيشة (Means Testing). ويعتمد اختبار سبل المعيشة في تحديد الفئات الفقيرة على معرفة دخل الأسر أو الافراد كمييار أساسي في التمييز بين المستحقين وغير المستحقين. وعلى الرغم مما يتسم به هذا الأسلوب من دقة في تحديد الفئات الفقيرة حيث يعد تطبيقه ملائماً لظروف الدول المتقدمة نظراً لتوافر بيانات الدخل، إلا أنه لا يتناسب مع ظروف الدول النامية والتي عادة ما يشوب بيانات الدخل فيها عدم الدقة أو الصعوبة في جمعها والحصول عليها، بالإضافة الى ارتفاع التكلفة الإدارية المصاحبة لتطبيق هذا الأسلوب.

**إختبار سبل المعيشة البديل**

تستخدم هذه الطريقة في مناطق بؤر الفقر (على مستوى الناحية) التي تم تحديدها باستخدام خرائط الفقر في المرحلة الاولى ليمت بمقتضاها التمييز بين الفقراء وغير الفقراء، والذي يعد أسلوب بديل يلائم ظروف الدول النامية، حيث يعتمد في تحديد المجموعة المستهدفة (الفقراء) على مجموعة من المؤشرات التي يستدل بها على مستوى معيشة الأسرة والتي تعتبر بمثابة خصائص اجتماعية واقتصادية للأسر، لذا يعرف أسلوب اختبار سبل المعيشة البديلة باستهداف الخصائص ونظراً لغياب الدخل أو الانفاق والتي تعد معايير مباشرة فيعرف كذلك بالاستهداف غير المباشر في تحديد الأسر الفقيرة، وتتلخص مجموعة المؤشرات المستخدمة في هذا الأسلوب على خصائص المسكن والخصائص الديموغرافية للأسرة من حيث حجم الأسرة وعدد الأطفال في الأسرة ونوع رب الأسرة والمستوى التعليمي لرب الأسرة وافرادها وحالة العمل وامتلاك الأصول (السلع المعمرة) ومكان الإقامة (ريف/حضر) وغيرها من الخصائص.

والجدير بالذكر ان هذه المنهجية تركز على أسلوب التقييم الفردي لاستهداف الفقراء باستخدام سبل المعيشة البديلة نظراً لإمكانية تطبيقه ودقته في تحديد الفئات الأكثر حاجة للدعم وتخفيض معدل التسرب الى غير الفقراء.

تتلخص هذه الطريقة باستخدام نموذج انحدار خطي لتقدير قيمة الانفاق للأسرة التي يتم بموجبها تحديد أهلية الأسرة للمشمول باعانات شبكة الحماية الاجتماعية، وقد تم اعتماد بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في بناء هذا النموذج، أما بيانات الأسر المشمولت حالياً بالبرنامج فقد تم استيفائها من خلال مسح نفذته وزارة العمل بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء والإدارة التنفيذية والذي غطى (580) الف مستفيد على مستوى محافظات العراق عدا إقليم كردستان ومحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وقد ساهمت وزارة التخطيط بتنفيذ الأنشطة التالية في الإصلاح :

- 1- اعداد وتصميم وطبع استمارة المسح
- 2- اعداد برنامج ادخال البيانات باستخدام الماسح الضوئي
- 3- ادخال بيانات المسح ومعالجتها
- 4- تطبيق منهجية الاستهداف باستخدام نموذج الانحدار
- 5- تحديد الأسر الفقيرة وغير الفقيرة المشمولت بالبرنامج
- 6- تحديد عدد الأسر المشمول الجديد في كل محافظة بالاستناد الى المبلغ المخصص من كل محافظة

أما الموقف من اجراءات الاصلاحات فهي :

❖ الانتهاء من ادخال كافة البيانات ومعالجتها .

❖ تم ارسال ملف بيانات الادخال الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإضافة الرقم الشبكي للأسرة المشمولت بالبرنامج وذلك لإكمال الاجراءات اللاحقة .

❖ تم استخلاص نتائج محافظة النجف وتحديد الأسر الفقيرة من المشمولين بالنظام حيث يبلغ عدد المشمولين حالياً باعانات شبكة الحماية الاجتماعية (42157) أسرة، أما الأسر الفقيرة التي تستحق الشمول فقد بلغت نسبتها 56.71% أي حوالي (23907) أسرة .

### ثامناً : توزيع منحة النازحين

بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية للعوائل النازحة من المناطق التي تعرضت الى ارباب داعش .. تبنت الادارة التنفيذية وبعد مصادقة اللجنة العليا لستراتيجية التخفيف من الفقر برنامجاً لدعم الأسر النازحة الفقيرة وكان معيار استهدافها هو الأسر التي تقيم في المخيمات وهاكل البناء والمساجد والمدارس لشمولها بمنحة مالية قدرها (200) الف دينار لكل اسرة من هذه الأسر ولمرة واحدة والبالغ عددها (7500) أسرة والتي تسكن في محافظة بغداد فقط بسبب محدودية التخصيص والبالغ (1.5) مليار دينار

- تشكلت لجنة عليا في وزارة التخطيط برئاسة الوكيل الإداري والمالي للوزارة ضمت ممثلين عن جهات اخرى لوضع ضوابط واليات التوزيع
- تشكيل لجان فرعية تختص بالتوزيع والتدقيق والتمويل
- تنفيذ مسح ميداني لحصر واعداد قوائم بالعوائل المشمولة ومقاطعتها مع قواعد بيانات وزارة الهجرة والوزارات الاخرى لمنع تكرار الاسماء
- انجز البرنامج بتغطية وشمول (7500) اسرة نازحة في بغداد



صور توزيع منحة النازحين

#### المحصلة السادسة

تفاوت اقل بين النساء والرجال الفقراء تستهدف الاستراتيجية تقليل التفاوت بين النساء والرجال وتمكين المرأة اقتصاديا عبر تحقيق التكافؤ في التعليم وفرص العمل، والحصول على دخل منصف يعد من المرتكزات الاساسية لتخفيف فقر النساء. تلقت هذه المحصلة والهدف الرابع من الاهداف الانمائية للالافية "تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" وتعمل بموازاته لخلق مستقبل افضل للمرأة العراقية يجعلها قادرة على تنشئة جيل متعلم وواعي من خلال دعمها معرفيا واقتصاديا واجتماعيا.

دأبت الاستراتيجية على تنفيذ ما ترمي له هذه المحصلة وهو تمكين المرأة على المستويات كافة من خلال خطط ومشاريع تحقق التكافؤ في فرص التعليم والعمل... الا انها واجهت محدودات لتحقيق اهدافها بسبب محدودية صلاحيات وزارة المرأة وعدم تبني جهات التنفيذ لمشاريع تتكفل بتقليل فجوة النوع الاجتماعي وخاصة في الريف ... كل ذلك قيض جهود الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر في تقليل التفاوت بين النساء والرجال الفقراء... عدا عدة مشاريع لم ترقى الى طموح الادارة التنفيذية ومبتغاها والتي تلخصها بالاتي:

**أولاً: إعطاء أولوية في انشاء مدارس البنات الابتدائية والثانوية في الاحياء الفقيرة**

تنفذ وزارة التربية من موازنتها مشروع انشاء عدد من المدارس الابتدائية للبنات في الاحياء الفقيرة حيث تم انجاز مدارس ابتدائية ومدارس ثانوية ورياض اطفال من موازنة تنمية الاقاليم خلال عام 2015 وهي بناء (102) مدرسة في عموم المحافظات عدا اقليم كردستان بواقع (51) ابتدائي و(39) ثانوي و(12) رياض اطفال موزعة على أغلب المحافظات وكالاتي (31) مدرسة في واسط و(29) مدرسة في كركوك و (19) مدرسة في البصرة و (5) مدرسة في ديالى ، فضلاً عن (12) جناح مدرسة (5) اجنحة في القادسية سعة 6 صف وجناح (1) في ذي قار سعة 4 صف و (4) جناح في البصرة سعة 6 صف و(2) جناح في كركوك سعة 4 صف .

**ثانياً: صياغة اطر تعاون القطاع الخاص لحثه على دعم برامج تأهيل مهنية في الريف العراقي**

تولت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة التدريب المهني مع جهات اخرى للتنسيق مع القطاع الخاص لوضع استراتيجية لتحديد احتياجات سوق العمل المهني والتي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من 27/ 6/ 2014 ، حيث تم تشكيل لجنة عليا للاشراف والمتابعة بموجب امر ديواني من الامين العام لمجلس الوزراء وكالة وقد بدأ العمل مع منظمة اليونسكو وبمشاركة ممثلي سوق العمل والمؤسسات التدريبية والتعليمية المهنية والتقنية (TVET) وبالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء باعداد استمارة لمسح سوق العمل لتحديد احتياجات السوق من المهن والمهارات وقد وصلت صياغة الاستمارة الى مراحلها النهائية .


**ثالثاً: تبني نظام متابعة مستمر لتقويم برامج تدريب النساء وتأهيلهن**


تنفذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة التدريب المهني وبالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص نظاما مستمرا لتقويم برامج تدريب النساء من خلال فتح دورات اختصاصية بالمهن النسائية وقد تم تدريب وتخرج (2546) متدربة لغاية 31/ 12/ 2015

**خطة تخفيف الفقر من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعام 2016**

سيراً على النهج الذي سلكته الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر خلال سنوات التنفيذ وحرصاً منها على استمرار تحريك عجلة العمل الرامي لتخفيف الفقر واستمراريته .... وبالرغم من كل المحددات التي واجهتها مشاريع تخفيف الفقر فضلاً عن المحددات الاقتصادية التي يمر بها العراق. تم تخصيص مبلغ (117.130) مليار دينار من الموازنة الاستثمارية لعام 2016 لتنفيذ مشاريع تخفيف الفقر وفق خطة تصاعدية لتشمل محافظات العراق كافة (عدا اقليم كردستان) ووزارات و جهات اخرى ذات صلة بابعاد الفقر المختلفة... تم توزيع المبلغ على الشكل الآتي:


**شكل ( 4 ) : تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2016 / مليار دينار**

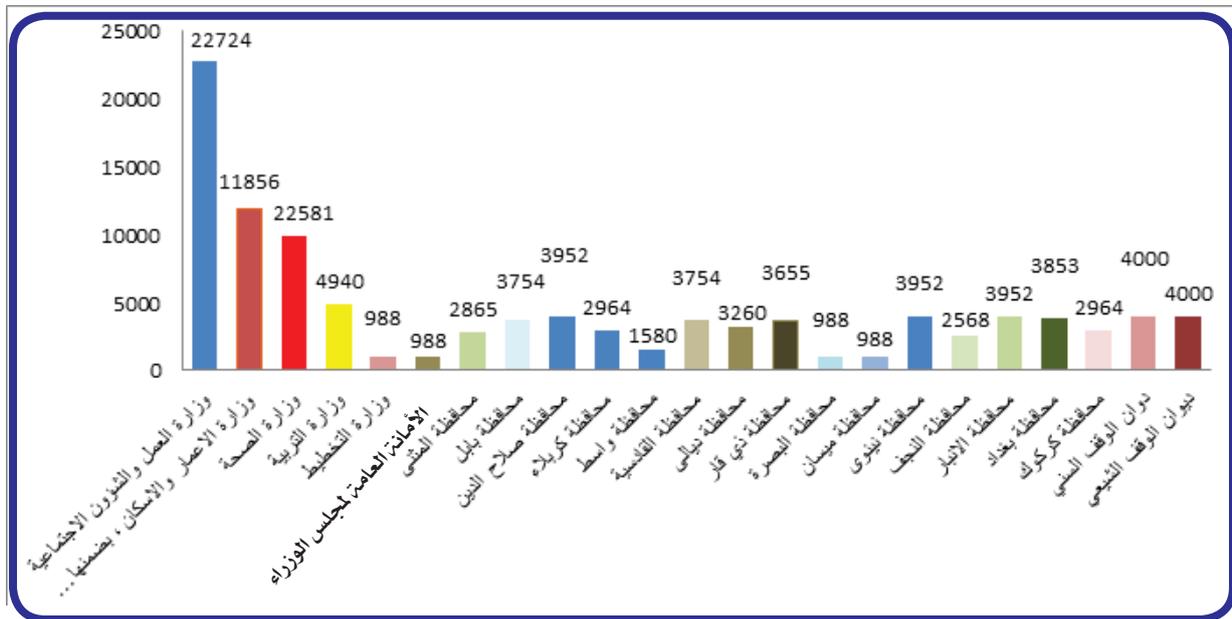



## ملحق (1)

إستمارة متابعة أنشطة الوزارات والمحافظات الممولة من  
تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة  
الإستثمارية لعام 2015





وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنظمة	سنة الأراج النشاط	التخصيص السفوي مليون دينار	الكلفة /الكثير/ مليون دينار	مدة التنفيذ		المشروف التركمي /مليون دينار	نسبة الانجاز الفعلي %	عدد المستفيدين
						البدء	الانتهاء			
1	تنظيم برنامج تدريب للفقراء الذين استلموا القرروض لمساعدتهم في استخدامها	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	2013	10000	30000	1	1	5195	28.5%	15440
2										
3										
4										
5										
6										

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والعوقات
1	تجهيز اجهزة تبريد وتكثيف	10	متعدد	800	1 ت 2014	1 ك 2015	100	9	- انجز المشروع - الغرض من الاجهزة هو تأهيل المراكز التدريبية
2	تجهيز اجهزة عرض	15	متعدد	1800	1 ك 2014	1 يار 2015	100	9	- تم تجهيز كامل المواد العقد وتم صرف كافة المستحقات المالية
3	تجهيز باصات نقل	20	متعدد	600	1 يار 2015	1 حزيران 2015	100	9	تم استلام 20 باص نوع هوندي كوستر كاوونتي والمجهزة من الشركة العامة للسيارات وتم توزيعها على المراكز التدريبية
4	تجهيز مولدات	17	متعدد	1360	1 فيسان 2014	1 اب 2014	100	9	- انجز المشروع - الغرض من المولدات هو للاغراض التدريبية
5	تجهيز رافعات شوكة	14	متعدد	1120	1 فيسان 2014	1 اب 2014	100	9	- انجز المشروع - الغرض من الرافعات هو للاغراض التدريبية
6	انشاء ورشة متكاملة للمصوغات النخيلية	1	متعدد	80	-	-	1	9	ايضاح احوال المشاريع التي لم توقع عقودها / حسب قرار مجلس الوزراء

وزارة العمل والشؤون الإجتماعية

مكونات النشاط

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والعوقات
7	تجهيز حاسبات وماسح ضوئي وطابعات واجهزة استنساخ	6	متعدد	480	-	-	0	تم الترتيب بالتعاقد حسب توصيات الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتايها (15943) في 12/5/2015
8	تجهيز ورش نموذجية للحام	9	متعدد	720	-	-	2.5	تم سحب العمل من الشركة المجهزة لعدم مطابقة المواد المجهزة للمواصفات المطلوبة
9	تجهيز ورش الالكترون	10	متعدد	800	-	-	1	إيقاف احالة المشاريع التي لم توقع عقودها / حسب قرار مجلس الوزراء
10	تجهيز ورش الصناعات الغنائية	4	متعدد	320	-	-	1	إيقاف احالة المشاريع التي لم توقع عقودها / حسب قرار مجلس الوزراء
11	تجهيز ورش الكواخير وتجميل السيارات	100	متعدد	1200	-	-	1	إيقاف احالة المشاريع التي لم توقع عقودها / حسب قرار مجلس الوزراء
12	تجهيز ورش النوبيل	12	متعدد	960	-	-	1	إيقاف احالة المشاريع التي لم توقع عقودها / حسب قرار مجلس الوزراء
13	تجهيز ورش تدريبية للتبريد	10	متعدد	800	-	-	1	إيقاف احالة المشاريع التي لم توقع عقودها / حسب قرار مجلس الوزراء
14	تجهيز ورش خياطة	20	متعدد	2400	-	-	1	إيقاف احالة المشاريع التي لم توقع عقودها / حسب قرار مجلس الوزراء

## وزارة العمل والتؤون الإجتماعية

## مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والعوقات
15	تجهيز ورش طباعة بالشبكة الحبرية ( طباعة السكرين )	6	متعدد	480			1	إيقاف إحالة المشاريع التي لم توقع عقودها / حسب قرار مجلس الوزراء
16	تجهيز ورش لصيانة السيارات	5	متعدد	400			1	إيقاف إحالة المشاريع التي لم توقع عقودها / حسب قرار مجلس الوزراء
17	تجهيز ورش للصناعات الجلدية	10	متعدد	800			1	إيقاف إحالة المشاريع التي لم توقع عقودها / حسب قرار مجلس الوزراء
18	تجهيز ورش مصاعد وسلام كهربائية	4	متعدد	320			1	إيقاف إحالة المشاريع التي لم توقع عقودها / حسب قرار مجلس الوزراء



وزارة الصحة

عدد المستفيدين (10)	نسبة الانجاز الفني الفعلي % (9)	المصروف التراكمي / مليون دينار (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية / مليون دينار (6)	التخصيص السنوي مليون دينار (5)	سنة اذراع النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)				
			الابتداء	الانتهاء										
4.200 مليون	73	10116	2015	آب	2013	فيسان	50000	7679	2012	وزارة الصحة	بناء مراكز رعاية صحية اولية محفزة	2	1	2

مكونات النشاط

الملاحظات والمعلومات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
بسبب الوضع الأمني و المالي الرهين حال دون تنفيذ المشروع للفترة المحددة له	10	آب 2015	ت1 2013	300 الف	محافظة ديتوى	2	بناء وتأهيل وحدات التدنن	1
بسبب الأزمات المالية، حال دون تنفيذ المشروع للفترة المحددة له	30	أيلول 2014	أيلول 2013	300 الف	محافظة كركوك	2	بناء وتأهيل وحدات التدنن	2
بسبب الوضع الأمني و المالي الرهين حال دون تنفيذ المشروع للفترة المحددة له	90	أذار 2014	تموز 2013	150 الف	محافظة ديالى	1	بناء وتأهيل وحدات التدنن	3
بسبب الوضع الأمني و المالي الرهين حال دون تنفيذ المشروع للفترة المحددة له	90	-	حزيران 2013	450 الف	محافظة الايتار	3	بناء وتأهيل وحدات التدنن	4

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والعوقات
5	بناء وتأهيل وحدات التدن	3	محافظة بغداد	450 الف	1 ت 2013	2 ت 2014	100	انجز المشروع
6	بناء وتأهيل وحدات التدن	2	محافظة بابل	300 الف	1 ت 2013	شباط 2015	100	انجز المشروع
7	بناء وتأهيل وحدات التدن	2	محافظة كربلاء	300 الف	ايلول 2013	2 ت 2014	74	بسبب الوضع المالي الراهن حال دون تنفيذ المشروع للفترة المحددة له
8	بناء وتأهيل وحدات التدن	2	محافظة واسط	300 الف	ايلول 2013	تموز 2014	70	بسبب الوضع المالي الراهن حال دون تنفيذ المشروع للفترة المحددة له
9	بناء وتأهيل وحدات التدن	2	محافظة صلاح الدين	300 الف	اب 2013	1 ت 2014	27	بسبب الوضع الأمني والمالي الراهن حال دون تنفيذ المشروع للفترة المحددة له
10	بناء وتأهيل وحدات التدن	1	محافظة النجف	150 الف	2 ت 2013	حزيران 2014	100	انجز المشروع

وزارة الصحة		مكونات النشاط										
الاملاحظات والمواقف	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت				
بسبب الوضع المالي الراهن حال دون تنفيذ المشروع للفترة المحددة له	75	ايلول 2014	ت2 2013	150 الف	محافظة القادسية	1	بناء وتأهيل وحدات التنرن	11				
تم افتتاح المركزين	99	شباط 2014	ايار 2013	300 الف	محافظة المنفى	2	بناء وتأهيل وحدات التنرن	12				
بسبب الوضع المالي الراهن حال دون تنفيذ المشروع للفترة المحددة له	72	ايار 2014	اب 2013	150 الف	محافظة ذي قار	1	بناء وتأهيل وحدات التنرن	13				
بسبب الوضع المالي الراهن حال دون تنفيذ المشروع للفترة المحددة له	84	حزيران 2014	اب 2013	300 الف	محافظة ميسان	2	بناء وتأهيل وحدات التنرن	14				
بسبب الوضع المالي الراهن حال دون تنفيذ المشروع للفترة المحددة له	68	ايلول 2014	فيسان 2013	300 الف	محافظة البصرة	2	بناء وتأهيل وحدات التنرن	15				

وزارة الصحة

عدد المستفيدين (10)	نسبة الانجاز الفعلي % (9)	المصرف التراكمي / مليون دينار (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية / مليون دينار (6)	التخصيص السنوي مليون دينار (5)	سنة ادراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)				
			الانتهاء	البداية						3	2			
28114 مليون	100	85456	2015	14	2013	ادار	500000	43718	2012	وزارة الصحة	استمرار توفير المواد والمستلزمات القياسية	3	6	2

مكونات النشاط

الاطلاحات والمواقف	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البداية	عدد المستفيدين	موقع المكان	عدد الوحدات	اسم المكان	ت
انجز المشروع	100	2ت 2013	آذار 2013	0	محافظة زينوى	1	توفير أجهزة ومعدات متعددة الأغراض	1
انجز المشروع	100	نيسان 2014	1ت 2013	2032409	محافظة كركوك	1	توفير أجهزة ومعدات متعددة الأغراض	2
انجز المشروع	100	ايار 2014	ايلول 2013	0	محافظة ديالى	1	توفير أجهزة ومعدات متعددة الأغراض	3
انجز المشروع	100	14 2014	ايلول 2013	0	محافظة الأنبار	1	توفير أجهزة ومعدات متعددة الأغراض	4

وزارة الصحة

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والعوقات
5	توفير اجهزة ومعدات متعددة الأغراض	1	محافظة بغداد/الرصافة	1100615	ت2 2013	شباط 2014	100	انجز المشروع
6	توفير اجهزة ومعدات متعددة الأغراض	1	محافظة بغداد/الكرخ	2707910	نيسان 2013	ايلول 2013	100	انجز المشروع
7	توفير اجهزة ومعدات متعددة الأغراض	1	محافظة بابل	1846933	ت1 2013	نيسان 2014	100	انجز المشروع
8	توفير اجهزة ومعدات متعددة الأغراض	1	محافظة كربلاء	4136253	حزيران 2013	ت2 2014	100	انجز المشروع
9	توفير اجهزة ومعدات متعددة الأغراض	1	محافظة واسط	561263	اب 2013	نيسان 2014	100	انجز المشروع
10	توفير اجهزة ومعدات متعددة الأغراض	1	محافظة صلاح الدين	0	اذار 2013	ت1 2014	100	انجز المشروع
11	توفير اجهزة ومعدات متعددة الأغراض	1	محافظة النجف	6110000	ت2 2013	اذار 2014	100	انجز المشروع

وزارة الصحة

مكونات النشاط

انجز المشروع	100	شباط 2014	اب 2013	1964431	محافظة القادسية	1	توفير اجهزة ومعدات متعددة الأغراض	12
انجز المشروع	100	ايار 2014	تموز 2013	192506	محافظة المنبى	1	توفير اجهزة ومعدات متعددة الأغراض	13
انجز المشروع	100	1 ك 2014	فيسان 2013	2914979	محافظة ذي قار	1	توفير اجهزة ومعدات متعددة الأغراض	14
انجز المشروع	100	1 ك 2014	1 ت 2012	1050580	محافظة ميسان	1	توفير اجهزة ومعدات متعددة الأغراض	15
انجز المشروع	100	2 ت 2014	2 ت 2013	3496893	محافظة البصرة	1	توفير اجهزة ومعدات متعددة الأغراض	16



مكونات النشاط	وزارة الصحة
ت	الملاحظات والمعلومات
نسبة الانجاز الفعلي %	100
سنة الانتهاء	1 آذار 2014
سنة البدء	1 تم 2013
عدد المستفيدين	1100615
موقع المكون	محافظة بغداد / الرصافة
عدد الوحدات	1
اسم المكون	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للسر اكرز الصحية الاولى
6	توقف المشروع بسبب الازمة المالية
1	1
محافظة بغداد / الكرخ	محافظة بغداد / الكرخ
1	1
توفير اجهزة ومعدات مختبرية للسر اكرز الصحية الاولى	محافظة بغداد / الكرخ
7	انجز المشروع
مختبرية للسر اكرز الصحية الاولى	100
1	100
توفير اجهزة ومعدات مختبرية للسر اكرز الصحية الاولى	1846933
محافظة بابل	1 تم 2013
1	1
توفير اجهزة ومعدات مختبرية للسر اكرز الصحية الاولى	محافظة بابل
8	انجز المشروع
الصحية الاولى	100
1	100
توفير اجهزة ومعدات مختبرية للسر اكرز الصحية الاولى	4136253
محافظة كربلاء	2 تم 2014
1	1
توفير اجهزة ومعدات مختبرية للسر اكرز الصحية الاولى	محافظة كربلاء
9	انجز المشروع
الصحية الاولى	100
1	100
توفير اجهزة ومعدات مختبرية للسر اكرز الصحية الاولى	561263
محافظة واسط	2 تم 2014
1	1
توفير اجهزة ومعدات مختبرية للسر اكرز الصحية الاولى	محافظة واسط
10	انجز المشروع
الصحية الاولى	100
1	100
توفير اجهزة ومعدات مختبرية للسر اكرز الصحية الاولى	صفر
محافظة صلاح الدين	2 تم 2014
1	1
توفير اجهزة ومعدات مختبرية للسر اكرز الصحية الاولى	محافظة صلاح الدين
11	انجز المشروع
الصحية الاولى	100
1	100
توفير اجهزة ومعدات مختبرية للسر اكرز الصحية الاولى	6110000
محافظة البجف	2 تم 2014
1	1
توفير اجهزة ومعدات مختبرية للسر اكرز الصحية الاولى	محافظة البجف

وزارة الصحة

مكونات النشاط

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والمقرات
12	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية الاولية	1	محافظة الدوائية	صفر	—	—	1	توقف المشروع بسبب الازمة المالية حال دون تنفيذه
13	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية الاولية	1	محافظة المنى	192506	1 ثا 2013	انار 2014	100	انجز المشروع
14	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية الاولية	1	محافظة ذي قار	2914979	ايول 2013	شباط 2014	100	انجز المشروع
15	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية الاولية	1	محافظة ميسان	1050580	1 ثا 2012	تموز 2014	100	انجز المشروع
16	توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية الاولية	1	محافظة البصرة	3496893	1 ثا 2013	2 ثا 2014	100	انجز المشروع

وزارة التربية

عدد المستفيدين المستفيدين (10)	نسبة الانجاز الفعلي % (9)	المصرف التراكمي / مليون دينار (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة / التكلفة / مليون دينار (6)	التخصيص السنوي مليون دينار (5)	سنة اذراج النشاط (4)	الجهة الممولة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
			الانتهاء	البداية						
128835	71	93360	2013	كانون الثاني	283910	5000	2012	وزارة التربية	وضع برنامج مساندة ودعم الحكومات الملية لانشاء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة والاعدادية	4 2 3

مكونات النشاط

الملاحظات والموقات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البداية	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
-انجز المشروع/ عدد المدارس المنجزة (1) مدرسة	100	2 تم 2013	2 تم 2012	315	البصرة	1	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	1
انجز المشروع/ عدد المدارس المنجزة (45) مدرسة	97	2 تم 2013	2 تم 2012	14175	القادسية	45	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	2
- المشروع متوقف/ عدد المدارس المنجزة (6) مدرسة	68	2 تم 2013	2 تم 2012	4725	المنشي	15	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	3
انجز المشروع/ عدد المدارس المنجزة (10) مدرسة	99	2 تم 2013	2 تم 2012	3150	بابل	10	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	4
انجز المشروع/ عدد المدارس المنجزة (19) مدرسة	99	2 تم 2013	2 تم 2012	5985	بغداد	19	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	5

وزارة التربية

مكونات النشاط

المشروع متوقف / تم الغاء (6) مدارس وتغير جهة تنفيذها الى الادارة المحلية/ تم انجاز عدد (4) مدرسة فقط	55	2 ك 2013	2 ك 2012	5355	ديالى	17	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	6
المشروع متوقف/ عدد المدارس المنجزة (11) مدرسة	55	2 ك 2013	2 ك 2012	33903	ذي قار	106	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	7
المشروع متوقف / تم الغاء (43) مدرسة وتغير جهة تنفيذها الى الادارة المحلية/ تم انجاز (14) مدرسة	53	2 ك 2013	2 ك 2012	30870	صلاح الدين	98	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	8
المشروع متوقف / تم الغاء (4) مدارس وتغير جهة تنفيذها الى الادارة المحلية/ تم انجاز (3) مدرسة	40	2 ك 2013	2 ك 2012	9135	كركوك	29	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	9
المشروع متوقف / تم الغاء (1) مدارس وتغير جهة تنفيذها الى الادارة المحلية	37	2 ك 2013	2 ك 2012	1575	ميسان	5	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	10
المشروع متوقف / تم الغاء (12) مدارس وتغير جهة تنفيذها الى الادارة المحلية/ عدد المدارس المنجزة (5) مدرسة	51	2 ك 2013	2 ك 2012	11970	بنوي	38	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	11
انجز المشروع / عدد المدارس المنجزة (26) مدرسة	100	2 ك 2013	2 ك 2012	8190	واسط	26	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	12

وزارة الأعمار والإسكان		مدة التنفيذ (7)		الكلفة / الكلية / مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	سنة اذراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط				
عدد المستفيدين (10)	نسبة الانجاز النسبي الفعلي %	المصرف التراكمي / مليون دينار (8)	الانتهاء							البدء	الانتهاء	البدء	
8334	15.3	4.013	2016	2013	تموز	500000	20500	2012	وزارة الأعمار والإسكان	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية بمواصفات قلبية الكلفة	1	1	4

#### مكونات النشاط

الاتصالات والموقوفات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	اسم الكون	ت
متوقف بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد.	38.8	2016	تموز 2013	864	محافظة السويدانية	144	بناء وحدات سكنية اقتصادية/الضامية / جيسة	بناء وحدات سكنية اقتصادية/عكبة	1
متوقف بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد.	6	2016	آذار 2014	1560	محافظة ذي قار	260	بناء وحدات سكنية اقتصادية/عكبة	بناء وحدات سكنية اقتصادية/عكبة	2
متوقف بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد.	9	حزيران 2016	1 ت 2014	672	محافظة النجف	112	بناء وحدات سكنية اقتصادية/طحربة	بناء وحدات سكنية اقتصادية/السنية	3
متوقف بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد.	7.6	1 ت 2015	شباط 2013	390	محافظة السويدانية	65	بناء وحدات سكنية اقتصادية/السنية	بناء وحدات سكنية اقتصادية/السنية	4
اعلن عن المشروع عام 2014 ولم يحال بسبب الوضع الامني .	0				محافظة صلاح الدين	237	بناء وحدات سكنية اقتصادية/ يثرب	بناء وحدات سكنية اقتصادية/ يثرب	5
متوقف بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد.	0		شباط 2015	1986	محافظة السويدانية	313	بناء وحدات سكنية اقتصادية/السنية	بناء وحدات سكنية اقتصادية/السنية	6
توقف بسبب توصيات مجلس الوزراء، بالتريث باجراءات الاحالة والتعاقد .	0				محافظة بابل	240	بناء وحدات سكنية اقتصادية/الشوملي	بناء وحدات سكنية اقتصادية/الشوملي	7

وزارة البلديات

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة اذراج النشاط	التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة / مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		المصرف التراكمي / مليون دينار	نسبة الانجاز الفعلي %	عدد المستفيدين
						البدء	الانتهاء			
2	توسيع مشاريع لا يصلح الماء الصالح للشرب	وزارة البلديات والاشغال	2015	8000	8000	شباط	تموز	2015	30	141628
3										
1										

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الاملاحيات والعوقات
1	تجهيز البات سحب واليات صاروخية تتوزع على (15) محافظة	28	كافر الاحفطات (عدا اقليم كركستان)	141628	شباط 2015	تموز 2015	30	- اعيد اذراج المشروع خلال عام 2015 بكلفة تبلغ (8) مليار دينار وبعده (28) الية - اجيل المشروع الى احدى شركات القطاع الخاص - تاخر تنفيذ المشروع بسبب عدم توفر السيولة التقديرية - حاليا بانتظار تجهيز الشركة بالاليات

محافظة بنى

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفنى الفعلي %	المصرف التراكمي / مليون دينار	مدة التنفيذ		التكلفة / الكليّة / مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	سنة اذراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط
			الانتهاء	البداية						
(10)	(9)	(8)		(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
3000	0	0			24500	1700	2013	محافظة بنى	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية بمواصفات قليلة التكلفة	1 1 4

مكونات النشاط

الملاحظات والمواقف	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
اعلن عن المشروع بداية عام 2014 ولم يحال المشروع بسبب الوضع الامني.	0			3000	مركز قضاء الموصل	500	بناء وحدات سكنية اقتصادية	1

محافظة نينوى

عدد المستفيدين (10)	نسبة الانجاز الفعلي % (9)	المصرف التراكمي / مليون دينار (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية / مليون دينار (6)	التخصيص السنوي مليون دينار (5)	سنة اذراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)	
			الانتهاء	البداية						1	2
10000	0	0			1438	1300	2013	محافظة نينوى	توسيع المشاريع لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	1	3 2

مكونات النشاط

الملاحظات والحوقات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البداية	عدد المستفيدين	موقع المكون	عدد الوحدات	اسم المكون	ت
تم التعاقد مع الجهة المنفذة بداية 2014 ولم تجهز السيارات بسبب الوضع الامني في المحافظة	0			10000	موصل	1	مشروع تجهيز سيارات حوضية عدد (7) لتوزيع الماء الصالح للشرب للقرى النائية في ناحية الشمال	1

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة ادرج النشاط	التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة / التكلفة / مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		المصروف التراكمي / مليون دينار	نسبة الانجاز الفعلي %	عدد المستفيدين
						البدء	الانتهاء			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	1 ك	2013	0	(9)	(10)
2	اتخاذ اجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لهذه المشاريع	محافظة نينوى	2012	4000	5600	1 ك	2014	58	58	4000
4										

## مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز % الفعلي	الاتاحظات والموافات
1	مشروع قرش الحصى الحابط للطرق الرابط بين القرى	1	الموصل / ناحية الشمال	2000	2013	2014	65	احيل المشروع نهائياً عام 2013 وتوقف المشروع بسبب الوضع الأمني
2	تخطيط الشوارع المؤدية للمجمعات السكنية التابعة لناحية الشمال	1	الموصل / ناحية الشمال	2000	2013	2014	50	احيل المشروع نهائياً عام 2013 وتوقف المشروع بسبب الوضع الأمني

محافظة كركوك

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي %	المسروف التراكمي / مليون دينار	مدة التنفيذ		الكلفة الكلية / مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	سنة اذراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط				
			الابتداء	البدء										
(10)	(9)	(8)	(7)		(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)				
1800	95	10000	2015	شباط	2013	1 ك	15000	4000	2013	محافظة كركوك	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية بمواصفات قليلة الكلفة	1	1	4

مكونات النشاط

الاملاحيات والعيوقات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
المشروع في المراحل النهائية وتوقف بسبب عدم توفر تمويل كافٍ من قبل وزارة المالية	95	شباط 2015	كانون الاول 2013	900	شورا	150	بناء وحدات سكنية اقتصادية	1
المشروع في المراحل النهائية وتوقف بسبب عدم توفر تمويل كافٍ من قبل وزارة المالية	95	شباط 2015	كانون الاول 2013	900	موقع خلف حي دوميز	150	بناء وحدات سكنية اقتصادية	2

محافظة ديالى

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي %	المصروف التراكمي / مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية / مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	سنة اذراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط
			الانتهاء	البدء						
30000	96	780	2014	تموز	1250	470	2012	محافظة ديالى	بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة	2 1 2

مكونات النشاط

الملاحظات والوقاات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
- المشروع في مراحلته النهائية و بانتظار تسديد باقي مستحقات الشركة المنفذة	96	تموز 2014	1 ك 2013	15000	قضاء خانقين / قرية كهربيرة	1	بناء مركز صحي	1
- المشروع في مراحلته النهائية و بانتظار تسديد باقي مستحقات الشركة المنفذة	96	تموز 2014	1 ك 2013	15000	قضاء خانقين / قرية النظام	1	بناء مركز صحي	2

محافظة ديارى

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز النسبة الفعلية %	المصرف الترامكي / مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكليّة/ مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	سنة اذراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط
			الانتهاء	البدء						
(10)	(9)	(8)			(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
630	0		2014	2013	7000	1150	2012	محافظة ديارى	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية اقتصادية للفقرء	1 1 4

مكونات النشاط

الاتاحات والموقات	نسبة الانجاز الفعلية %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
محال ولم يباشر بسبب وجود مشاكل في تخصيص الارض .	0	ايلول 2014	ايلول 2013	630	قضاء بعقوتة / بهرز / الكبة الاحيمر	105	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقرء	1

محافظة ديالى

عدد المستفيدين (10)	نسبة الانجاز الفعلي % (9)	المصروف التراكمي / مليون دينار (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية / مليون دينار (6)	التخصيص السنوي مليون دينار (5)	سنة ادراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
			الانتهاء	البداية						
29750	70	2790	2014	2013	4770	949	2013	محافظة ديالى	توفير وادارة النفي التحتية الماصمة لالانتاج والتسويق	1 1 4

مكونات النشاط

الملاحظات والمواقف	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البداية	عدد المستفيدين	موقع المكون	عدد الوحدات	اسم المكون	ت
انجز المشروع	100	حزيران 2014	1 ك 2013	3500	قضاء القنادية / قرية امام طالب	1	تبليط طريق بطول 2 كم	1
انجز المشروع	100	ايار 2014	2 ك 2014	4000	قضاء بعقوبة / ناحية العبارة قرية المد الاخضر / شارع مصفور وشارع الجامع	1	تبليط طريق بطول 3 كم	2
انجز المشروع	100	حزيران 2014	2 ك 2013	2000	كنعان / قرية الحاج جاسم	1	تبليط طريق بطول 3.2 كم	2
انجز المشروع	100	حزيران 2014	1 ك 2013	3500	المنصورية / قرية حبيب العبدالله	1	تبليط طريق بطول 3.5 كم	4
انجز المشروع	100	اذار 2014	1 ك 2013	2500	جولاه قرية جملة	1	تبليط طريق بطول 3.5 كم	5

محافظة ديالى	مكونات النشاط							
الاحاطات والمواقات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
-أنجز المشروع -تم استلام المشروع استلام أو لي وسيتم استلامه حيث الايطاء بالتزامات الشركة المنفذه	100	حزيران 2014	1 ت 2013	2250	بلدروز / قرية كاظم صالح	1	تخطيط طريق بطول 4 كم	6
انجز المشروع	100	حزيران 2014	2 ت 2013	2500	قضاء الخالص / ههب / قرية الحديد	1	تخطيط طريق بطول 5 كم	7
غير محال بسبب الأزمته المالية التي يمر بها البلد.	1			3000	كفري / قرية الشيخ خليل	1	تخطيط طريق بطول 7 كم	8
غير محال بسبب الأزمته المالية التي يمر بها البلد.	1			2500	مركز قضاء القنادية / قرية الكفاح	1	تخطيط طريق بطول 600 م	9
احيل المشروع وتوقف بسبب الظروف الامنية.	1			4000	الوجهية / قرية العروبة	1	تخطيط طريق بطول 1 كم	10

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة اذراج النشاط	التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة / اكلية / مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		المصرف التراكمي / مليون دينار	نسبة الانجاز الفعلي %	عدد المستفيدين
						الانتهاء	البداية			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	ك 2	ك 2	1942	89	14842
	اتخاذ اجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لهذمه المشاريع	محافظة ديالى	2013	2307.	5230	ك 2	ك 2	2015	2015	2013

مكونات النشاط

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	نسبة الانجاز الفعلي %	المعمل مستمر
1	تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	1	الحالص / قرية سفيط	350	ك 2 2013	نيسان 2014	100%	100%	تم استلام المشروع استلام اولي.
2	تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	1	السلام / قرية الكبيبة	1640	ك 2 2013	اذراج 2014	100%	100%	تم استلام المشروع استلام اولي.
3	تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	1	العبارة / قرية الاحور.	160	ك 1 2013	اذراج 2015	100%	100%	انجز المشروع
4	تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	1	العظيم / قرية الابو طريمش	648	ك 1 2013	حزيران 2014	87%	87%	المعمل مستمر
5	تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	1	بني سعد / قرية محمد الكاظم	300	ك 1 2014	ك 1 2014	100%	100%	تم استلام المشروع استلام جزئي و بانتظار تسديد باقي المستحقات للشركة المنفذة .
6	تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	1	جولاء / منطقة السكك في حي العليمة	3560	ك 1 2014	ك 0	0	0	تم احوالة المشروع وتوقف العمل بسبب الظروف الامنية.

## محافظة ديالى

## مكونات النشاط

الملاحظات والموقات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع المكون	عدد الوحدات	اسم المكون	ت
العمل مستمر	60 %	فبراير 2014	2 ت 2014	400	مركز قضاء القمادانية / قرية الشبيحة	1	تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	7
- انجز المشروع تم استلام المشروع استلام اولي و بانتظار تسديد باقي المستحقات للشركت المنفذة.	100 %	2 ت 2015	ايلول 2014	552	مركز قضاء بلد روز / قرية جواد الحججي	1	تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	8
- تم انجاز شبكة كهرباء قرية جسر حلوان .	54 %	2 ت 2015	ايلول 2014	448	مركز قضاء خانقين / قرية جسر حلوان و قرية البي جودة	1	تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	9
انجز المشروع	100 %	2 ت 2014	1 ت 2013	1640	مندي / قرية محمد الموسى و قرية عبد الله كيطان.	1	تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	10
غير محال بسبب الظروف الأمنية التي يمر بها البلد .	0			240	الخالص / قرية السندينة	1	تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	11
محال وتوقف بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد .	0			4909	المنصورية / قرية حبيب العبد الله / القصبية	1	تنفيذ شبكات كهرباء للقرى	12

محافظة ديالى

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي %	المصرف الاثراكي / مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية / مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	سنة اذراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط
			الانتهاء	البداية						
(10)	(9)	(8)	الانتهاء	البداية	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1450	75	344	2014	2013	2650	1122	2012	محافظة ديالى	توسيع الشاربع لاتصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	1 3 2

مكونات النشاط

الاملاحيات والمواعيد	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البداية	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
متوقف بسبب الوضع الامني	75	2 تم 2014	ايلول 2013	550	جلولاه / قرية الاصلاح	1	تنفيذ شبكات ماء للقرى	1
غير محال	0			500	المقادية / المخيم	1	تنفيذ شبكات ماء للقرى	2
غير محال	0			400	العبارة / الاحيمر	1	تنفيذ شبكات ماء للقرى	3

محافظة الأنبار

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة ادراج النشاط	التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة الكلية/ مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		المصرف التراكمي / مليون دينار	نسبة الانجاز الفعلي %	عدد المستفيدين
						الانتهاء	البدء			
(1)	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقراء <td>3</td> <td>2013</td> <td>1452</td> <td>15000</td> <td>2014</td> <td>2014</td> <td>8379</td> <td>77%</td> <td>2190</td>	3	2013	1452	15000	2014	2014	8379	77%	2190
1	1	4	محافظة الأنبار							

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الاتحats والعوقات
1	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	25	قضاء الرطبة	150	2013	2014	45	متوقف بسبب الوضع الامني
2	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	100	قضاء الرمادي	600	2013	2014	85	متوقف بسبب الوضع الامني
3	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	100	قضاء الفلوجه	600	2013	2014	85	متوقف بسبب الوضع الامني
4	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	40	قضاء القائم	240	2013	2014	45	متوقف بسبب الوضع الامني
5	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	30	قضاء حديثة	180	2013	2014	70	متوقف بسبب الوضع الامني

محافظة الأثيار

مكونات النشاط

ملاحظات النشاط	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والعوقات
6	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	15	قضاء راه	90	2 ت 2013	2 ت 2014	95	متوقف بسبب الوضع الأمني
7	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	15	قضاء عانز	90	2 ت 2013	2 ت 2014	95	متوقف بسبب الوضع الأمني
8	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	40	قضاء هيت	240	2 ت 2013	2 ت 2014	95	متوقف بسبب الوضع الأمني

محافظة الأنبار

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة اذراج النشاط	التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة الكلية/ مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي %	عدد المستفيدين
						البدء	الانتهاء			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	2015	2015	4950	100 %	(10)
1	توسيع المشاريع لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	محافظة الأنبار	2015	4950	4950	2015	2015	4950	100 %	العوائل النازحة في المناطق المتحرره
3										
2										

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والعيقات
1	تجهيز سيارات حوضية لتوفير الماء الصالح للشرب للنازحين	19	تخدم النازحين في المناطق المحرره	العوائل النازحة في المناطق المتحرره	2015	2015	100 %	- تم تجهيز السيارات من قبل وزارة التجارة -هدف المشروع إيصال الماء الصالح للشرب للعوائل النازحة بعد عودتها الى مناطقها

محافظة الأنيار

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي %	المصرف التراكمي / مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية / مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	سنة ادراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط
			الانتهاء	البدء						
(10)	(9)	(8)			(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1272	18		2016	2015	2500	2500	2015	محافظة الأنيار	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للفقراء	1 1 4

مكونات النشاط

الملاحظات والموقات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع المكون	عدد الوحدات	اسم المكون	ت
يتخذ المشروع لخدمته العوائل النازحة في المحافظة	18 %	2016	2015	1272	الفلوجة	212	تجهيز ونصب كرفانات عدد 212	1

محافظة الأبنار

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي %	المصروف التراكمي / مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية / مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	سنة ادراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط
			الانتهاء	البدء						
(10)	(9)	(8)			(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1950		0			16000	0	2014	محافظة الابنار	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية الاقتصادية للمفقره	1 1 4

مكونات النشاط

الملاحظات والمعلومات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
- لم يعلن عن المشروع بسبب الوضع الأمني.	0			1950	في جميع اقصية المحافظة	325	بناء وحدات سكنية اقتصادية للمفقره	1

محافظة الأبنار

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة ادرج النشاط	التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة الكلية/ مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		المصرف التراكمي / مليون دينار	نسبة الانجاز الفعلي %	عدد المستفيدين
						البدء	الانتهاء			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(8)	(9)	(10)
	زيادة اعداد العيادات المتلقية للمناطق النائية	محافظة الأبنار	2015	0	1490					18000

مكونات النشاط

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الاملاحظات والمعوقات
1	تجهيز عيادات متنقلة/ يضمها عيادة طب اسنان واشعة نسائية	9	الأبنار	18000			0	لم يحال المشروع بسبب الازمة المالية التي يمر بها البلد.

محافظة بغداد

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة الراج النشاط	التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة / الكليتر / مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		المصرف التراكمي / مليون دينار	نسبة الانجاز الفعلي %	عدد المستفيدين
						البدء	الانتهاء			
2	اتخاذ الاجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لهذة المشاريع	محافظة بغداد	2015	5000	7846	آذار 2015	آذار 2016	500	90	30000
2										
4										

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والموافات
1	تليط الطرق بطول م 4590	1	ناحية الزهور (الحسينية)	30000	آذار 2015	آذار 2016	90	- تم ادراج المشروع في عام 2015 - تم تنفيذ المشروع في شهر اذار 2015 - تم تمويل المحافظة بمبلغ (500) مليون دينار في عام 2015 - العمل مستمر

محافظة بابل

عدد المستفيدين (10)	نسبة الانجاز الفعلي % (9)	المصرف التراكمي / مليون دينار (8)	مدة التنفيذية (7)		الكلفة الكلية/ مليون دينار (6)	التخصيص السنوي مليون دينار (5)	سنة اذراج النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
			الانتهاء	البدء						
3760					18250	1000	2013	محافظة بابل	وضع برنامج مساندة ودعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة والاعدادية	4 2 3

مكونات النشاط

الملاحظات والمواقف	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع المكون	عدد الوحدات	اسم المكون	ت
<p>-تم الاعلان للمرة الثانية في تاريخ 2013/10/1 وبسبب عزوف المتاولين عن التقديم تم اعتماد اسلوب الدعوات المباشرة للشركات</p> <p>-لم يتم احالة المشروع في عام 2015 بسبب إيقاف إحالة المشاريع التي لم توف عقودها / حسب توصيات مجلس الوزراء</p>				3760	<p>-مركز قضاء الحلة (2) مدارس</p> <p>- قضاء المسيب (4) مدارس</p> <p>-قضاء المحاويل (4) مدارس</p> <p>-قضاء الهاشمية (6) مدارس</p>	16	بناء مدارس في قرى مختلفة من المحافظات	1

محافظة بابل

عدد المستفيدين (10)	نسبة الانجاز الفني الفعلي % (9)	المصرف التراكمي / مليون دينار (8)	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية / مليون دينار (6)	التخصيص السنوي مليون دينار (5)	سنة ادراج النشاط (4)	الجهة المنظمة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
			الانتهاء	البدء						
1080	35	5000	2015	اب	18000	4 000	2012	محافظة بابل	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قياسية الكلفة	1 1 4

مكونات النشاط

الملاحظات والموقعات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع المكون	عدد الوحدات	اسم المكون	ت
يتكون المشروع من مجمع سكني فيه 15 عمارة ذات ثلاث طوابق (180 شقة) مع الخدمات الاساسية. -توقف المشروع بسبب الازمة المالية التي يمر بها البلد.	35	اب 2015	1ك 2012	1080	محافظة بابل قضاء الحلة ناحية ابي غرق	180	بناء وحدات سكنية اقتصادية	1

محافظة كربلاء

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي %	المصرف التراكمي / مليون دينار	مدة التنفيذ		الكلفة / الكلفة / مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	سنة ادراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط
			(7)	البدء						
(10)	(9)	(8)	الانتهاء	البدء	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
630			2016	2015	1900	900	2013	محافظة كربلاء	وضع برنامج مساندة ودعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة والاعدادية	4 2 3

مكونات النشاط

الملاحظات والموقات	نسبة الانجاز %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع المكون	عدد الوحدات	اسم المكون	ت
- ابرم العقد مع إحدى شركات القطاع الخاص بتاريخ 18/3/2015 -مدة العقد (420) يوم من تاريخ المباشرة الفعلية - تم مباشر الشركة المنفذة بسبب الأزمات المالية		ايار 2016	اذار 2015	630	مركز قضاء كربلاء- ناحية الحسينية- قرية خير الدين الألائح	1	انشاء مدرسة ابتدائية ذات (18) صف	1

محافظة كربلاء

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة الأرباح النشاط	التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة الكلية/ مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		المصرف التركيبي / مليون دينار	نسبة الانجاز الفني الفعلي %	عدد المستفيدين
						البدء	الانتهاء			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	البدء	الانتهاء	(8)	(9)	(10)
2	اتخاذ الاجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لهيئة المشاريع	محافظة كربلاء	2012	3700	24000	2ت	2012	11046	56	9000
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

مكونات النشاط

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والمعلومات
1	توفير البنى التحتية لمنطقة الزكاريط	6	قضاء عين تهر - الزكاريط	3000	2ت 2014	2ت 2014	13	يتكون المشروع من (6) مكونات مشروع تنفيذ شبكة مجاري مع المحطة للمعالجة/ العمل متوقف ونسبة الانجاز 77% توقفت الاجراءات في بعض المشاريع بسبب توصيات مجلس الوزراء بإيقاف احداث المشاريع التي لم توقع عقودها
2	توفير البنى التحتية لجمع دور اقتصادية (1000) دار	1	مركز قضاء كربلاء	6000	حزيران 2013	آذار 2014	100	-الجزء المشروع خلال شهر آذار 2014 -يتكون المشروع من (البناء شبكة مجاري تقبلية وشبكة امطار ، ايصال خط الماء الفندي للمجمع ، مشروع تخطيط شوارع المجمع)

محافظة كربلاء

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنقذة	سنة ادر اج النشاط	التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة الكلية/ مليون دينار	مدة التنفيذ		المصروف التراكمي /مليون دينار	نسبة الانجاز الفعلي %	عدد المستفيدين
						البدء	الانتهاء			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	اتخاذ الاجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لهذه المشاريع	محافظة كربلاء	2013	400	450	2014	2014	-	100	3000

مكونات النشاط

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والموقات
1	دراسة وتصميم مشروع توفير البنى التحتية لمنطقة الشريعات	3	مركز قضاء المحافظة ناحية الحسينية منطقة الشريعات	3000	2014 / تموز	2014 / ايلول	100	- تم التعاقد مع مكتب الاستشاري /كليات الهندسة/ جامعة كربلاء - انجز العمل من قبل المكتب الاستشاري ولم يتم تسليم الارشادات لحين الايقاع بمبلغ التعاقد بسبب الازمة المالية

محافظة واسط

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة ادراج النشاط	التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة الكلية/ مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		نسبة الانجاز الفعلي %	عدد المستفيدين
						البدء	الانتهاء		
1	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية للفقره بمواصفات قليلة الكلفة	3	2012	3500	35000	اب	2012	(9)	10
4		محافظة واسط	2012	3500	35000	اب	2012	(8)	5500

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والموقات
1	بناء وحدات سكنية اقتصادية	284	قضاء الكوت نصف الدجيلة	1704	اب 2012	ت 1 2013	100	<p>- انجز المشروع بكلفة (11.900) مليون دينار</p> <p>- العمل مستمر في مشروع توفير الخدمات الاساسية للمجمع (ماء ، كهرباء، شبكة مجاري، طرق) ضمن موازنة تنمية الاقليم ونسبة انجاز فعلي 60%.</p> <p>- تشكيل لجنة في المحافظة وتضم في عضويتها ممثلين عن جهات التنفيذ وممثل عن الإدارة التنفيذية الإستراتيجية التخفيف من الفقر لتوزيع الوحدات السكنية وفق استمارة المفصلة بعد اكمال مشروع الخدمات</p>

## محافظة واسط

## مكونات النشاط

مكونات النشاط	ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الاجاز الفعلي %	اللاحظات والعوقات
	2	بناء وحدات سكنية اقتصادية	591	اقيضية (الصويرة، العزيزية، الحي)	3796			0	- بعد الانتهاء من المرحلة الاولى من المشروع في قضاء الكوت ، المحافظة تقوم باعمال التهيئة للمشاريع في الاقضية المتبقية . - لم يتم احالة المشروع خلال عام 2015 بسبب مشاكل قانونية

محافظة صلاح الدين

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة الراجح للنشاط	التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة /الكلية/ مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		المصروف التراكمي /مليون دينار	نسبة الانجاز الفعلي %	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	مكونات النشاط	
						البدء	الانتهاء								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	البدء	الانتهاء	(8)	(9)						
	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة بعدد (438) دار	محافظة صلاح الدين	2013	8500	20000	2ت	2013	1900	18	2628	قضاء الراجيل - قرية الحير	34	بناء وحدات سكنية اقتصادية	مكونات النشاط	
1	1	4													

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والوقوفات
1	بناء وحدات سكنية اقتصادية	34	قضاء الراجيل - قرية الحير	204	2013/2ت	2014/2ت	23	توقف المشروع بسبب الوضع الأمني
2	بناء وحدات سكنية اقتصادية	50	قضاء طوز خورمتو	300	2013/2ت	2014/2ت	15	توقف المشروع بسبب الوضع الأمني
3	بناء وحدات سكنية اقتصادية	74	قضاء الشرفاقط - بعاجت	444	2013/2ت	2014/2ت	20	توقف المشروع بسبب الوضع الأمني
4	بناء وحدات سكنية اقتصادية	26	قضاء بلد - الضالوعية	156	2013/2ت	2014/2ت	25	توقف المشروع بسبب الوضع الأمني
5	بناء وحدات سكنية اقتصادية	24	قضاء بلد - الاسحافي	144	2013/2ت	2014/2ت	25	توقف المشروع بسبب الوضع الأمني
6	بناء وحدات سكنية اقتصادية	76	قضاء بييجي - قرية 24 حليمات	456	2013/2ت	2014/2ت	5	توقف المشروع بسبب الوضع الأمني
7	بناء وحدات سكنية اقتصادية	78	قضاء تكريت	468	2013/2ت	2014/2ت	20	توقف المشروع بسبب الوضع الأمني
8	بناء وحدات سكنية اقتصادية	25	قضاء سامراء	150	2013/2ت	2014/2ت	16	توقف المشروع بسبب الوضع الأمني
9	بناء وحدات سكنية اقتصادية	25	قضاء سامراء - قرية عرومشة	150	2013/2ت	2014/2ت	20	توقف المشروع بسبب الوضع الأمني
10	بناء وحدات سكنية اقتصادية	26	قضاء طوز خورمتو - امرلي	156	2013/2ت	2014/2ت	10	توقف المشروع بسبب الوضع الأمني

محافظة النجف

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي %	المصرف التراكمي / مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية / مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	سنة ادراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط
			الانتهاء	البداية						
10	9	8			6	5	4	3	2	1
2520	74	3088	2014	2013	7643	1828	2013	محافظة النجف	وضع برنامج مساندة ودعم الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس الخاصة المتوسطة والاعدادية	4 2 3

مكونات النشاط

الاطلاعات والوقوات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع المكان	عدد الوحدات	اسم المكان	ت
-توقف العمل في مراحل اعمال الصبغ وصبب المشاي الخارجية والصحبات	90	2014	2013	630	قضاء الكوفة حي السلام	1	انشاء مدرسة (18) صف	1
- توقف العمل بسبب الازمة المالية		2014	2013	630	قضاء الكوفة حي ميسان	1	انشاء مدرسة (18) صف	2
- انجز المشروع	100	2014	2013	630	قضاء المتازة حي الزهراء	1	انشاء مدرسة (18) صف	3
-توقف العمل في مرحلة اللبغ للجدران من الداخل والخارج وتطبيق الكاشي	70	2014	2013	630	قضاء النجف ناحية الحيدرية حي السلام	1	انشاء مدرسة (18) صف	4
- توقف العمل بسبب الازمة المالية		2014	2013	630	قضاء النجف ناحية الحيدرية حي السلام	1	انشاء مدرسة (18) صف	4

محافظة النجف

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي %	المصرف / مليون دينار	مدة التنفيذية (7)		الكلفة الكلية / مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	سنة اذراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط					
			الانتهاء	البداية											
37856	87	2645	2015	حزيران	2013	آذار	7321	3172	2013	محافظة النجف	توسيع مشاريع لايصال الماء الصالح للشرب	1	3	2	

مكونات النشاط

الملاحظات والمواقف	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
- انجز العمل - لم يدخل المشروع الخدمة بسبب ارتفاع نسبة الأملاح والذي يعيق عملية تحلية الماء - يتطلب تعديل التصميم لوحدة التحلية المائية	100	اب 2014	آذار 2014	3000	قضاء النجف - ناحية الشبكة - قرى بحر النجف	1	بناء مجمع ماء سعته 25 م <sup>3</sup> /سا	1
انجز العمل	100	اب 2014	آذار 2014	3000	قضاء النجف - ناحية الحيدرية - قرية بني زيد الجنوبية	1	بناء مجمع ماء سعته 25 م <sup>3</sup> /سا	2
انجز العمل	100	اب 2014	آذار 2014	3000	قضاء النجف ناحية الشبكة - قرية الاساويد	1	بناء مجمع ماء سعته 25 م <sup>3</sup> /سا	3
انجز العمل	100	اب 2014	آذار 2014	3000	قضاء النجف ناحية الحيدرية - قرية حاتم الطائي	1	بناء مجمع ماء سعته 25 م <sup>3</sup> /سا	4
العمل متوقف بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد	35	حزيران 2015	ابول 2014	25856	قضاء الكوفة - بالقرب من ناحية العباسية - شمال الكوفة	1	بناء مجمع ماء سعته 1000 م <sup>3</sup> /سا	5

محافظة الديوانية

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنظمة	سنة اذراج النشاط	التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة الكلية/ مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		المصرف التراكمي / مليون دينار	نسبة الانجاز الفعلي %	عدد المستفيدين
						البدء	الانتهاء			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	2012	2013	1691	(9)	(10)
	تنظيم الاسواق في الاحياء الصغيرة	محافظة الديوانية	2012	660	2000	2012	2013	1691	(9)	(10)
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

مكونات النشاط

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	اللائحظات والملاحظات
1	انشاء اسواق في الوحدات الادارية بعدد (435) كشك الادارية	435	متعدد الوحدات الادارية	435	ايار 2013	2ت 2014	100	- انجز المشروع -تمت المفاضلة بعد ادخال أسماء وبيانات للفقراء المتقدمين على الاكشاك وارسلت الاسماء الى المحافظة

محافظة الديوانية

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	سنة اذراج النشاط	التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة الكلية/ مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		المصرف التراكمي / مليون دينار	نسبة الانجاز الفعلي %	عدد المستفيدين
						البدء	الانتهاء			
(1)	بناء وحدات سكنية للفقراء مع جميع ماء	محافظة الديوانية	2013	2291	15000	شباط 2014	ت 1	3278	50%	1944
4	بناء وحدات سكنية للفقراء	محافظة الديوانية	2013	2291	15000	شباط 2014	ت 1	3278	50%	1944
1	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء مع جميع ماء	محافظة الديوانية	2013	2291	15000	شباط 2014	ت 1	3278	50%	1944

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الاتجاهات والوقوات
1	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء مع جميع ماء	324	قضاء الديوانية ناحية الشايعية	1944	شباط 2014	ت 1 2015	50%	المشروع متوقف بسبب الأزمة المالية

محافظة الديوانية

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنظمة	سنة اذراج النشاط	التخصص السنوي مليون دينار	الكلفة الكلية/ مليون دينار	مدة التنفيذية		المصرف التراكمي / مليون دينار	نسبة الانجاز الفعلي %	عدد المستفيدين
						البدء	الانتهاء			
(1)	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	محافظة الديوانية	2012	2,649	8000	شباط 2014	ت 2	2679	58%	1110
(2)	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	محافظة الديوانية	2012	2,649	8000	شباط 2014	ت 2	2679	58%	1110
(3)	الجهة المنظمة	محافظة الديوانية	2012	2,649	8000	شباط 2014	ت 2	2679	58%	1110
(4)	اسم النشاط	محافظة الديوانية	2012	2,649	8000	شباط 2014	ت 2	2679	58%	1110
(5)	التخصص السنوي مليون دينار	محافظة الديوانية	2012	2,649	8000	شباط 2014	ت 2	2679	58%	1110
(6)	الكلفة الكلية/ مليون دينار	محافظة الديوانية	2012	2,649	8000	شباط 2014	ت 2	2679	58%	1110
(7)	مدة التنفيذية	محافظة الديوانية	2012	2,649	8000	شباط 2014	ت 2	2679	58%	1110
(8)	المصرف التراكمي / مليون دينار	محافظة الديوانية	2012	2,649	8000	شباط 2014	ت 2	2679	58%	1110
(9)	نسبة الانجاز الفعلي %	محافظة الديوانية	2012	2,649	8000	شباط 2014	ت 2	2679	58%	1110
(10)	عدد المستفيدين	محافظة الديوانية	2012	2,649	8000	شباط 2014	ت 2	2679	58%	1110

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الاتجاهات والموقات
1	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	94	قضاء الديوانية	564	شباط 2014	ت 2 2015	45	المشروع متوقف بسبب الازمة المالية
2	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	91	قضاء الديوانية	546	شباط 2014	أذار 2015	70	المشروع متوقف بسبب الازمة المالية

محافظة الديوانية

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي %	المصرف التراكمي / مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية/ مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	سنة الراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط
			الابتداء	البدء						
2835	1	0	-	-	5000	400	2013	محافظة الديوانية	وضع برنامج مساندة ودعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة والاعدادية	4 2 3

مكونات النشاط

اللاحقات والمواقف	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
لم يحال المشروع بسبب توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإيقاف إجراءات الإحالة والتعاقد	1	-	-	2835	متعدد الوحدات الادارية	9	بناء مدارس في المناطق والقرى الفقيرة	1

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي %	المصروف التراكمي / مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية/ مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	سنة اذراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط
			الانتهاء	البدء						
(10)	(9)	(8)			(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
6000	60%	1791	-	-	45000	6000	2012	محافظة المنى	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	1 1 4

مكونات النشاط

الاتاحات والموقات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع المكون	عدد الوحدات	اسم المكون	ت
توقف العمل بسبب الازمة المالية التي يمر بها البلد - تم صب الارضيات للدور وتسقيف 25 دار واعمال الليخ من الداخل والخارج	60	اذار 2015	ت2 2014	210	قضاء السلمان	35	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	1
توقف العمل بسبب الازمة المالية التي يمر بها البلد - تم صب الارضيات للدور وتسقيف 25 دار واعمال الليخ من الداخل والخارج	60	اذار 2015	ت2 2014	210	قضاء البصية	35	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	2
احالت المحافظة مشروع اعداد الدراسة والتصميم مشروع انشاء 930 وانجزت المحافظة اعداد الدراسة والتصميم من قبل مكتب استشاري - تم بحال المشروع السكني بسبب توصيات مجلس الوزراء بإيقاف إحالة المشاريع التي لم توقع عقودها	صفر	-	-	5580	عشرة وحدات ادارية	930	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء	3

محافظة ذي قار

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي %	المصرف التراكمي / مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية / مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	سنة اوج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط
			الانتهاء	البدء						
2136	13 %	-	2016	2014	40000	6000	2013	محافظة ذي قار	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية للفقره بمواصفات قليلة الكلفة	1 1 4

مكونات النشاط

الملاحظات والموقات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
- احيل المشروع بأسلوب السموات المباشرة الى احدى شركات القطاع الخاص - حاليا المشروع في مرحلة صب الاسس	13	يول 2016	اب 2014	2136	قضاء الناصرية	356	بناء وحدات سكنية اقتصادية	1

محافظة ميسان

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المفضلة	سنة اذراج النشاط	التخصيص السنوي مليون دينار	الكلفة / الكمية / مليون دينار	مدة التنفيذ (7)		المصرف التراكمي / مليون دينار	نسبة الانجاز الفعلي %	عدد المستفيدين
						البدء	الانتهاء			
(1)	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقره	(3)	(4)	(5)	(6)	البدء	الانتهاء	(8)	(9)	(10)
1	1	محافظة ميسان	2013	6000	25000	-	-	-	صفر	3750
4	1	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقره								

مكونات النشاط

ت	اسم المكون	عدد الوحدات	موقع المكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الالاحظات والملاحظات
1	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقره	625	متعدد الوحدات الادارية	3750	-	-	صفر	- طالبت المحافظة بزيادة كلفة المشروع وتم رفض الطلب من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية

محافظة البصرة

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة اذراج النشاط (4)	التخصيص السنوي مليون دينار (5)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		الاصروف التراكمي / مليون دينار (8)	نسبة الانجاز الفعلي % (9)	عدد المستفيدين (10)
						البدء	الانتهاء			
	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقر	محافظة البصرة	2013	6000	35000	-	-	-	صفر	3000
1										
1										
4										

مكونات النشاط


ت	اسم الاكون	عدد الوحدات	موقع الاكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %	الاحاطات والمعوقات
1	بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقر	500	قضاء المدينة	3000			صفر	تاخرت المحافظت في احوال المشروع خلال الاعوام السابقه بسبب اشكاليات ادارية ورتبئية

ديوان الوقف الشيعي

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز الفعلي %	المصرف التركيبي / مليون دينار	مدة التنفيذ		الكلفة الكلية / مليون دينار	التخصيص السنوي مليون دينار	سنة ادراج النشاط	الجهة المنفذة	اسم النشاط	رمز النشاط
			الانتهاء	البدء						
10	(9)	(8)	(7)		(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
1896	-	-	-	-	20000	20000	2015	ديوان الوقف الشيعي	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية للفقرى بمواصفات قليلة الكلفة	1 1 4


مكونات النشاط

الملاحظات والعمودات	نسبة الانجاز الفعلي %	سنة الانتهاء	سنة البدء	عدد المستفيدين	موقع الكون	عدد الوحدات	اسم الكون	ت
- يتكون المشروع من مجمع سكني (316) دار مع الخدمات ( روضة ، مدرسة ابتدائية ، جامع محلات عدد 10) . - ادراج المشروع في شهر حزيران / 2015 - تم بحال المشروع بسبب توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإيقاف إجراءات الإحالة والتعاقد	-	-	-	1896	محافظة كربلاء - مركز القضاء	316	بناء وحدات سكنية اقتصادية	1



## ملحق (2)

إستمارة متابعة أنشطة الوزارات والمحافظات الممولة من  
تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة  
الجارية لعام 2015





وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

عدد المستفيدين	نسبة الانجاز النفي الفعلي %	المصرف الراكمي / مليون دينار (8)	مدة التنفيذ		الكلفة الكلية/ مليون دينار (6)	التخصيص السئوي مليون دينار (5)	سنة اذراع النشاط (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
			الابتداء	البيء						
580 الف	95%	3116	2015	1 ٢٠١٥	4500	4500	2015	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	تطوير قاعدة البيانات للأسر الشموية وتحديثها بشكل مستمر	2 1 5

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البيء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز النفي %
1	استهداف المشمولين بشبكة الصحافة الاجتماعية	15	متعدد	580 الف	2٠١5	1 ٢٠١٥	95 %

تم تخصيص (3) مليار دينار من الموازنة الإستثمارية و(1.5) مليار دينار من الموازنة  
الاجارية لإنجاز مشروع استهداف المشمولين بشبكة الصحافة  
- وضعت الادارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر الية بالتنسيق مع وزارة  
العمل والشؤون الاجتماعية تضمن عدم تسرب منحرة الاعانة الاجتماعية لغير الفقراء  
باعتقاد اختيار سبل العيشة البديلة للمحل (PMT).  
- اجرت وزارة التخطيط تحليل ومعالجة بيانات كل من محافظات ( ديالى، النخف،  
القادسية، ميسان، النجف) واظهرت نتائج التحليل للمحافظات المذكورة ان نسبة 40%  
من المشمولين فيها حاليا هم غير فقراء.

وزارة الصحة


رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	سنة اذراع النشاط (4)	التخصيص السنوي مليون دينار (5)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		المصرف التراكمي / مليون دينار (8)	نسبة الانجاز الفعلي % (9)	عدد المستفيدين (10)
						البدء	الانتهاء			
		وزارة الصحة	2015	1500	6000	1 <sup>هـ</sup>	2015	6000	100	11.300
	تنفيذ الحملات التلقيحية									
2										
4										

مكونات النشاط

ت	اسم الكون	عدد الوحدات	موقع الكون	عدد المستفيدين	سنة البدء	سنة الانتهاء	نسبة الانجاز الفعلي %
1	تنفيذ حملات تلقيح ضد شلل الأطفال وامرض الحصبة	15	متعدد	11.300	2015	1 <sup>هـ</sup>	100


- النخر الشروع

- خصصت الادارة التنفيذية لمرست التلقيح الخفيف من القفر مبلغ (1.5) مليار ونصف دينار ضمن تخصيصات الموازنة الجارية لوزارة الصحة لعام 2015 لتنفيذ برنامج التحصين المتضمن (تلقيح الأطفال من مرض شلل الأطفال ومرض الحصبة). نفذ المشروع بكلفة (6) مليار دينار وساهمت المرست التلقيح الوطنية للتخفيف من القفر بجزء من هذا المبلغ لتغطية المناطق القروية ومجمعات التازحين حيث تم تلقيح (333193) طفل من العوائل التازحة فضلا عن قرى فقيرة في عموم العراق



### ملحق (3)

إستثمارات متابعة أنشطة الوزارات والمحافظات  
من خطط تنمية الوزارات والمحافظات لعام 2015





وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز الفعلي (%) (7)	ملاحظات والوقاات (8)
					البدء	الانتهاء		
1	تنفيذ زيارات تفتيش ومراقبة حسن تطبيق قانون العمل والضمان الإجتماعي لمرافقة بيئة العمل اللائق	- قسم تفتيش العمل - اتحاد نقابات العمال - اتحاد الصناعات	موازنة جارية	—	1 2015	2 2015	100 %	المخطط تنفيذه خلال عام 2015 (24000) زيارة من قبل فرق التفتيش الى اصحاب العمل والشاريع المشمولة باحكام قانون العمل والضمان لمرافقة بيئة العمل اللائق، حيث تم تنفيذ (24216) زيارة في بغداد والمحافظات (عدا المحافظات الساخرة المتبنا) بما يفوق المخطط له
1	تضمين قانون العمل فقرات مرتبة حول تحديد الحد الأدنى للأجر ليتناسب مع خط الفقر.	لجنة الدراسة الحد الأدنى للأجور في وزارة العمل وبرئاسة دائرة العمل وعضوية ممثلي اتحاد نقابات العمال واتحاد الصناعات العراقي.	الموازنة الجارية	—	1 2015	2 2015	مستمر (عقد) اجتماعات دورية	تم تعديل اجور العامل غير الماهر الي (250) الف دينار بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم (178) لسنة 2013 بناء على ما جاء في توصيات لجنة الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر ليتناسب مع الواقع المعيشي وتنفذ من 1/7/2013
1	تعزيز العاملين المنين يستلمون الحد الأدنى من الاجر بحقوقهم في رفع الاجور للتوافق مع خط الفقر.	فرق تفتيش العمل في دائرة العمل قسم الاعلام.	الموازنة الجارية	—	1 2015	2 2015	100 %	يتم التوعية والتوجيه لأصحاب العمل والعمال خلال الزيارات التفتيشية اليومية لفرق التفتيش والتي تضم عضويتها ممثلي اصحاب العمل والعمال

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المتفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز الفعلي % (7)	ملاحظات والوقوات (8)
					البدء	الانتهاء		
1	تشخيص وحدة في مكاتب التشغيل في جميع المحافظات يستطلع العاملون بأجر مرجمتها عند عدم التزام أرباب العمل بالقانون.	- فرق التفتيش المشككة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	الموازنة الجارية	—	1ك 2015	2ك 2015	100 %	الوحدة موجودة في قسم التفتيش المركزي في مقر دائرة العمل وشعب التفتيش في المحافظات وهي (15) شعبية، وعملها مستمر في زيارة ومقابلة اصحاب العمل والعمل
4	قيام مكاتب التشغيل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل.	دائرة التشغيل والقروض	موازنة جارية	—	1ك 2015	2ك 2015	100 %	تم تحقيق (2723) زيارة في بغداد والمحافظات لقطاعات العمل للحصول على فرص عمل لتشغيل العاطلين المسجلين حيث تم الحصول على (4790) فرصة عمل خلال الفترة المتكورة وترشيح العاطلين اليها
1	تنظيم حملات توعيه للعقراء للاتحاق بالراكز وبرامج التدريب	- دائرة التدريب المهني - اعلام الوزارة.	موازنة جارية	—	مستمر	2ك 2015	100 %	العمل مستمر في كافة المراكز التدريبية لنشر الاعلانات واللغات بالتنسيق مع الجاسس البلدية لاستقطاب التبرين والهجين العالدين للمشاركة بالتدريب. دعم برامج التدريب اعلاميا لغرض كسب القراء الباحثين عن العمل وشاركهم في السورات من خلال طبع اعلانات ورقية تحتوي على انواع السورات وشروط القبول وتوزيعها في الجامعات والمدارس والاسواق وغيرها من الاماكن المرحمة بالسكان وكذلك عن طريق المصحات الجدية ونصب فلكسات اعلانية. عمل صفحة تواصل اجتماعي (facebook)

وزارة العمل والشؤون الإجتماعية

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	التكلفة الكلية مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز الفعلي % (7)	ملاحظات والمواقف (8)
					البدء	الانتهاء		
1	قيام مكاتب التشغيل بالتنسيق مع جهات التدريب وتأهيل وتعزيز مهارات الفقراء	دائرة التدريب المهني / مراكز التدريب المهني	موازنة جارية	—	1 2015	2 2015	70%	تفقد دورات تدريب العاطلين المسجلين في بغداد والمحافظات على الدورات المهنية والتعليمية (اللغة الانكليزية ، الحاسبات ، اللغة العربية ) والتدريب المهني (النجارة ، الحداة ، تكثيف ، تربية كهرتاه ، صيانة ، موبائل ) - بلغ عدد المتخرجين من الدورات اعلاه و لغاية شهر تم 1 عام 2015 (10158) متدربا من الدورات المهنية والتعليمية في جميع مراكز التدريب الشعبية والمهنية والبالغ عددها ( 32 ) مركز تدريب. - بسبب قلة التخصصات المالية وعدم صرف مكافئة مالية للمتدرب والبالغه (5000) دينار مما ادى الى قلة الاقبال على الدورات التدريبية من قبل العاطلين عن العمل - من خلال دورات تدريبية في مختلف الاختصاصات للفقراء وفق احتياجات سوق العمل .
2	تبنى نظام متابعة مستمر للتقويم برامج تدريب النساء وتأهيلهن.	دائرة العمل والتدريب المهني	موازنة جارية	—	1 2015	2 2015	100%	بلغ عدد المتخرجات من النساء المتدربات (7475) متدربة للفترة من تم 2015 لغاية تم 1 2015 من خلال الدورات التدريبية للعاطلات المسجلات في بغداد والمحافظات (عنا المحافظات الساكنة امبيا)

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة الممولة	التمويل	التكلفة مليون دينار	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز الفعلي الفعلي %	الملاحظات والوقوات (8)
					البدء	الانتهاء		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				
6	صياغة: طر تعاون مع القطاع الخاص لحثه على دعم برامج تأهيل مهنية في الريف العراقي	- دائرة العمل والتدريب المهني - قسم التدريب المهني	الوازنة الجارية	—	1 2015	2 2015	—	تم اقرار الاستراتيجية من قبل مجلس الوزراء ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من 27/6/2014 حيث تم تشكيل لجنة عليا للاشراف والمتابعة بموجب امر ديواني من الامين العام لمجلس الوزراء وقد بدأ العمل مع منظمة اليونسكو وبشراكة من ممثلي سوق العمل والؤسسات التدريبية والتعليمية والمهنية والتفنية (TVEET) وبالتعاون مع الجهات المركزي للاحصاء باعداد استمارة تسج سوق العمل لتحديد احتياجات السوق من المهن والمهارات وقد وصلت صياغة الاستثمار الى مراحلها النهائية.
3	برامج توعية موجه للنساء لاسيما في الريف العراقي للالتزام بنظام الضمان الاجتماعي	دائرة العمل والتدريب المهني	الوازنة الجارية	—	1 2015	2 2015	100%	عدد منشآت القطاع الخاص التي تمت زيارتها لم اقية تنفيذ القانون (9218) تم التوعية من خلال الزيارات التفتيشية وتوزيع دليل التفتيش على النساء ومن خلال هذه الزيارات تم شمول (1930) امرأة فقيرة بالضمان الاجتماعي
5	اتخاذ الإجراءات لاعتماد الالامر كزنية في ادارة شؤون شبكة الحماية الاجتماعية	دائرة الرعاية الاجتماعية / شبكة الحماية الاجتماعية	موازنة الجارية	—	مستمرة	2 2015	100%	- الصيغة الحالية في ادارة شؤون شبكة الحماية الاجتماعية في المحافظات والإعانة بصورة لامركزية من خلال تشكيل لجنة عليا لشبكة الحماية الاجتماعية يكون رئيسها النائب الاول للمحافظة وتتمتع لهيئة الاجان صلاحيات الشمول والإعانة أما فيما يخص التخصصيات المالية فهي مركزية وذلك لضمان عدالة التوزيع بين محافظات العراق وان هذا الاجراء هو الأفضل والأفضل من وجهة نظر دائرة الرعاية لنا فسيتم الاستمرار بالعمل وفق هذا النهج لتسهيل الإجراءات البيروقراطية علما ان الصلاحيات المنوطة لرؤساء الاجان عالية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	التمويل	الكلفة الكلية مليون دينار	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز الفعلي الفعلي %	ملاحظات والمواعيد
					البدء	الانتهاء		
(1)	تطوير قاعدة البيانات للأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية	دائرة الرعاية الاجتماعية	منحة البنك الدولي	5	حزيران 2006	مستمر	95%	تم تفعيل الربط الشبكي في أقسام شبكة الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات كافة (صا إقليم كردستان).
2	تطوير برنامج لرفع القدرات لتأهيل وتدريب العاملين على حسن تطبيق نظام الشبكة	دائرة الرعاية الاجتماعية / قسم التخطيط	موازنة جارية	5	1 تم 2015	2 تم 2015	90%	تم وضع برنامج للتدريب في المجال القانوني والبحث الاجتماعي والحاسبات والبرمجة وإدخال البيانات والشؤون المالية لكن لم تتحقق جميعها يتطلب زيادة في التخصصات المالية لشركاء الأقسام في المحافظات والتي تتعلق بالإيجاد بإضافة الى ذلك يقوم قسم التخطيط بدوره بإدخال الكادر بدورات خارجية من خلال المركز الوطني للتطوير الإداري التابع الى وزارة التخطيط وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و وزارة حقوق الإنسان. حيث بلغ عدد الدورات (42) وعدد الندوات (31) وعدد الورش (10) وعدد المشاركين (387) مشارك
4	وضع تقارير أنظمة رقابية صارمة على أليات العمل وتنفيذ القانون من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	دائرة الرعاية الاجتماعية / شبكة الحماية الاجتماعية / قسم القانوني / قسم التدقيق / لجنة مكافحة الفساد	موازنة جارية	—	1 تم 2015	2 تم 2015	100%	تشكيل لجان للمراقبة في أقسام الحماية في بغداد والمحافظات وحسب التخصص المالي حيث تمت زيارة الأقسام في المحافظات (بغداد/الرصافة، البصرة، ذي قار، واسط، الديوانية، كربلاء، النخيف، المثنى، ميسان) وبلغ عدد المتجاوزين الذين قامو بتسديد ما بينهم (13467) متجاوز. وبلغ عدد المتجاوزين من غير الموظفين الحاليين الى القضاء (1306) متجاوز. وبلغ عدد المتجاوزين من الموظفين الحاليين الى دوائهم (411) متجاوز

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنظمة	التمويل	الكلفة الكلية مليون دينار	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز الفني الفعلي %	الاتصالات والعوقات (8)
					البدء	الانتهاء		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(7)	
5	تصميم برنامج اعلامي موجه للمواطنين لتوعيتهم بحقوقهم وشروط التمويل والعقوبات الراضية في حالة تجاوز على الشبكة	قسم الاعلام في دائرة الرعاية الاجتماعية	موازنة جارية	6 ملايين دينار	ت1 2015	ت2 2015	100 %	- اجراء حملات اعلامية تهدف الى نشر الوعي بين الفئات المستهدفة لاعضاء الشبكة واستقبال شكاوي المواطنين ما يقارب (4123) شكوى - القيام بـ (98) زيارة ميدانية جماعية للعوائل الفقيرة .
3	تكوين قاعدة بيانات على مستوى الحافظات والقضاء والساحية للاطفال في سن التعليم من الأسرة الفقيرة المشمولين بشبكة الحماية	دائرة الرعاية الاجتماعية قسم تكولوجيا العمومات اقسام الشبكة الحافظات	موازنة استثمارية	-	تتموز 2011	تتموز 2011	90 %	- تم اعداد قاعدة بيانات للاطفال المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية ضمن الاسر وحسب عنوان السكن .
3	اعادة النظر بقانون وتعليمات شبكة الحماية الاجتماعية بما يضمن تسجيل ومواظبة اطفال الاسر المشمولين	دائرة الرعاية الاجتماعية	موازنة جارية	-	ايلول 2011	ايلول 2011	90 %	تم اقرار قانون الحماية الجديد ذي العدد (11) لسنة 2014 من قبل مجلس النواب والنشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية ذي العدد (4316) الصادر في 24/3/2014 حالياً قيد التنفيذ.



رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنظمة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية / مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز الفني الفعلي % (7)	ملاحظات والمعلومات (8)
					البدء	الانتهاء		
3	انشاء مراكز محو الامية	الهيئة العليا لمحو الامية	الوزارة الاستثمارية	-	-	آيار 2016	100%	دعوة اولياء امور الطلبة لزيارة المدارس للتعرف على مستويات ابحاثهم الدراسية وعلى الرعايات التي تقدمها المدرسة لهم ودعمها للحضور في المناسبات الخاصة التي تقدمها المدرسة، كما لا تنسى الفنية والرياضية والترويحية والعمالية والاسواق الخيرية والهرفانات والحلقات وتشكيل لجان في بداية كل سنة دراسية من ذوي الخبرة والكفاءة في الشؤون التربوية والتعليمية والفنية من اولياء امور الطلاب لمساعدة المدرسة على اداء رسالتها ودعم دورها في البحث و سد حاجاتها المادية والاقتصادية واستثمار كفاءات اولياء الامور والمجتمع المحلي للاستفادة من خبرتهم لرفع الوعي الصحي والاجتماعي والتربوي في المدرسة وتحسين بيئتها وعقد اجتماعها فصلية قبل نصف السنة وعقدها
2	تنفيذ العلاقة مع مجالس الآباء والعلمين وفق صيغة قانونية ومؤسسية	المديرية العامة للاشراف التربوي	-	-	-	آيار 2016	100%	الانشاط يتخذ سنويا
5	معدة نشر ثقافة التعليم الالزامي	مجلس التربية والتعليم وفق صيغة قانونية ومؤسسية	-	-	-	ت 2015	100%	عدد المراكز لمحو الامية في عموم العراق على اقليم كردستان والمنطق الساكنة الاجمالي (1258) اي حضر (776) مركز (482) مركز لغاية كانون الاول 2015

وزارة التربية

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز الفعلي % (7)	ملاحظات والمواقف (8)
					البدء	الانتهاء		
	وضع برنامج مساندة ودعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل مدارس خاصة للتوسطة والاعدادية	المديرية العامة للتخطيط التربوي / قسم الابنية	الموازنة الإستثمارية تنمية الأقاليم بترو دولار	6.469	1 تم 2015		تم بناء (448) مدرسة متوسطة واعدادية في كافة محافظات العراق فضلا عن (864) مدرسة قيد الإنجاز في المناطق الفقيرة بالإضافة الى ترميم بعض المدارس وقد ساهمت الوزارة والمحافظات والمنظمات في بناء هذه المدارس	
	برنامج لرفع كفاءة ونوعية التعليم المهني والمتابعة الجادة لتنفيذ	المديرية العامة للتعليم المهني	الموازنة الجارية	1000	حزيران 2015	2 ت 2014	100 %	لا توجد اي موقوفات في تجهيز معمارات زراعية حديثة لتطوير التعليم الزراعي ورفع نسبة القبول
	تفعيل العلاقة مع مجالس الآباء والعلميين وفق صيغة قانونية ومؤسسية معية لتبشر ثقافة التعليم الازلامي	المديرية العامة للإشراف التربوي	لا يحتاج	—	ايار 2015	2 ت 2014	100 %	مستمر

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	التمويل	الكلفة الكلية / مليون دينار	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والمعوقات
					البدء	الانتهاء		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	
3	حملة التوعية اللائحة بمراكز محو الامية	الجهاز التنفيذي لمحو الامية / شعبية الاعلام	الوازنة الجارية	950	1 تم 2015	2 تم 2015	75%	- يتم الاعلان عن طريق التلفزيون التربوي ومن طريق الصحف المحلية، النشر اعلام الجهاز معها بالعمل وهي (الصباح، الوارث، طريق الشعب، الشرق، البيئة) وهذه الصحف تتولى نشر الاعلانات وهذه الصحف تتولى نشر الاعلانات لمحو الامية - النشاط يتنفذ سنويا
5	اعادة النظر بهام قسم الاعلام التربوي لخلق الوعي باهمية الالتزام بالتعليم الازلامي	المديرية العامة للعلاقات الثقافية	الوازنة الجارية	62	مستمر	2 تم 2013	70%	مستمر
6	تطوير نظام رصد ومتابعة المتسربين ضمن فئة التعليم الازلامي وفق برنامج الخططة السنوية (فرق المعلمين الميسرين)، اعتبار تقايص فرص التسرب حيارا للكفاءة	المديرية العامة للتخطيط التربوي والمديرية العامة للتعليم العام	الوازنة الجارية	---	1 تم 2015	1 تم 2014	100%	

وزارة البلديات والأشغال

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنظمة (3)	التمويل (4)	التكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز الفعلي % (7)	ملاحظات والمعلومات (8)
					البدء	الانتهاء		
1	توسيع الشوارع لإيصال الماء للصالح للشرب للمناطق الفقيرة (1)	- المديرية العامة للماء - مديريّة مياه المحافظات	الموازنة الإستثمارية	37,642	1 تموز 2010	1 كانون 2014	54%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تم الانتهاء من نصب (190) وحدة تحلية مياه .</li> <li>- تراكمت الشركة (العراق والعالم للتكنولوجيا) المتقدمة للمشروع في نصب وحدات التحلية التلقية وتم توجيه انظار الى الشركة المتقدمة بموجب كتاب المديرية العامة للماء الرقم م/س 17826 في 31/10/2012</li> <li>- توجد وحدات تحلية بعدد (77) وحدة في مديريات مياه المحافظات (واسط،الحصرة،الأنبار) وتشكل نسبة 22% من العدد الكلي للوحدات لم يتم نصبها بسبب عدم تهيئة الواقع من قبل المديرية اعلاه .</li> <li>- نسبة الانجاز الفعلي المتحقق %54 من عمر المشروع .</li> <li>- المشروع متوقف بسبب الازمة المالية.</li> </ul>

1- يشمل هذا النشاط انشاء (350) وحدة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية في القرى والأرياف في عموم المحافظات وزعت محطات التحلية الـ(350) وحدة على المحافظات كالاتي (نينوى (17)، كركوك(17)، صلاح الدين (30)، ديالى (23)، بغداد (12)، الأنبار (22)، بابل (23)، كربلاء المقدسة (19)، واسط (29)، النجف الاشرف (23)، القادسية (27)، المثنى (29)، ميسان (23)، ذي قار (30)، البصرة (26) ) .

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز الفعلي الفعلي % (7)	الإلاحيات والمعوقات (8)
					البدء	الانتهاء		
2	توسيع مشاريع الصرف الصحي	- المديرية العامة للماء - مديرية مياه المحافظات	- الموزنة الإستثمارية - تنمية الاقاليم	958802	1 آذار 2006	1 كانون 2015	36 %	- يشمل هذا النشاط جميع المناطق في عموم العراق وذلك لعدم وجود حصر للمناطق الفقيرة (في مراكز المدن فقط). - الكلفة السابقة للمشروع كانت 930.540 مليون دينار وقد خفضت الوزارة كلفة المشروع في خطتها لعام 2012 - المشروع متوقف
4	توفير خدمات التخلص من النفايات	مديريات البلدية في المحافظات	- تنمية الاقاليم	---	1 كانون 2014	2 كانون 2010	مستمر	- هذا النشاط يشمل جميع المواطنين ضمن حدود البلدية في المحافظات لعدم وجود حصر للمناطق الفقيرة والنشاط يتفد سنويا.

## وزارة الزراعة

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	التمويل	الكلفة الكلية/ مليون دينار	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز الفعلي % (7)	الملاحظات والمعوقات (8)
					البدء	الانتهاء		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ت1	ت2		
	برنامج للتدريب المزارعين على اساليب الزراعة والري الحديث	- وزارة الزراعة - الهيئة العامة للإرشاد والتعاون الزراعي	موازنة جارية	_____	ت1 2015	ت2 2014	100 %	- النشاط ينفذ سنوياً - تم تنفيذ ( 60 ) دورة للتدريب على اساليب الري خلال عام 2015 - عدد المراكز التدريبية (54) مركز
	أعادة النظر بجزمة (1) التشريعات والسياسات الزراعية لصالح المزارعين الفقراء	- وزارة الزراعة / المادة القانونية	موازنة جارية	_____	ت1 2015	ت2 2012	100 %	- تم انجاز القوانين

القوانين هي :

- 1- مشروع قانون القرى العصرية .. تمت المصادقة على القانون المذكور وهو قانون رقم (59) لسنة 2012 وتم نشره بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4252 في 15/10/2012
- 2- مشروع قانون اعفاء المزارعين والفلاحين المقتضين من فوائد القروض المساقطة المترتبة من ذمتهم رقم القانون 49 لسنة 2012 ونشر في جريدة الوقائع العراقية 4242 في 11/6/2013.
- 3- مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية وتعليق حق التصرف والتملك فيها للخرجين الزراعيين والبيطريين رقم القانون 24 لسنة 2012 ونشر في جريدة الوقائع العراقية 4287 في 26/8/2014.
- 4- مشروع قانون تعويض الفلاحين والمزارعين عن الكوارث البيئية والمناخية.

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4) البلد	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز الفعلي الفعلي % (7)	الملاحظات والموقات (8)
					الانتهاء	البدء		
1	تحديث خط الفقر الوطني سنويا بالاستفادة من مسوحات الاسر والمصادر الاحصائية الاخرى لتحديد الاسر المستهدفة بالأعمال	-الجهاز الركزي للإحصاء -هيئة اقليم كردستان	-الوزارة، الاستثمارية -البنك الدولي	-	اب 2015	ت 2011	100 %	-تضمن النشاط تنفيذ مسح (IHSESID) وتحديث خط الفقر -سيتم اعتماد نتائج المسح المستمر ونتائج مسح خارطة الفقر ووفيات الامهات اصافة الى بيانات مسح التازحين - اجل تحديث مؤشرات الفقر في ظل النزوح
2								
5								

محافظة بغداد

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنظمة	التمويل	التكلفة الكلية / مليون دينار	مدة التنفيذ		نسبة الانجاز الفعلي %	اللاحتكات والمواقات
					(6)	(7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	الابتداء	الانتهاء	(7)	(8)
1	تنفيذ مشاريع تبييط وانارة الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرة	محافظة بغداد	تنمية الاقاليم	597	ايلول 2014	نيسان 2015	% 100	المشروع منجز
2	وضع برنامج مساندة ودعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة والاعدادية	محافظة بغداد	تنمية الاقاليم	300	شباط 2015	اب 2015	% 100	المشروع منجز
3								

- 1- تنفيذ مشروع تبييط الطريق في قرية الحمزة قضاء اليوسفيين بطول 650 متر و400متر في منطقة تركي عطية في قضاء المطيفية
- 2- تنفيذ بناء مدرسة ثانوية ذات 18 صف في منطقة الخرنابات قضاء ابي غريب وهموم واعادة بناء مدرسة ابوتحام سعتا 18 صف في شارع جيفا

محافظة بابل

الملاحظات والمعلومات (8)	نسبة الانجاز الفعلي الفعلي % (7)	مدة التنفيذ (6)		الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	التمويل (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)		
		الانتهاء	البدء							
-انجز العمل .	100 %	تموز 2014	حزيران 2012	2300	تمهية الأقاليم	محافظة بابل	وضع برنامج مساندة ودعم مع الحكومات المحلية (1) لإنشاء وتأهيل المدارس خاصة للتوسط والاقتصادية	4	2	3
-العمل متوقف بسبب الأزمة المالية	36%	حزيران 2015	1 تم 2012	27843	تمهية الأقاليم	محافظة بابل	تنفيذ مشاريع لبناء (2) مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة	1	1	4

بناء 13 جناح للمدارس في اقصية (الهاشمية / ناحية شوملي ، السيب / ناحية السدة والاسكندرية ، المحاول / ناحية الامام) .

انشاء دور واطلة الكلفة في قضاء الحلة / ناحية ابي غرق بالأضافة الى خدمات هي ( مدرسة ابتدائية / 18 صف ، مركز دفاع مدني ، اسواق ، استعلامات ، شبكة مجاري للمجتمع مع محطة معالجة ، محطة ضخ ماء للمجتمع ، طرق وساحات ) .

## محافظة كربلاء

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية/ مليون دينار (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز الفعلي الفعلي % (7)	الاحصاءات والمؤقات (8)
					البدء	الانتهاء		
		محافظة كربلاء	تنمية الأقاليم	1.215	ايار 2013	تموز 2015	100 %	- انجز المشروع - تم استلامه اولى في عام 2015 - يوجد التزام مالي

1 - انشاء مدرسة في منطقة الدخانية على التقطع رقم 83 مقاطعت 17 في قضاء الحسينية

محافظت واسط

ملاحظات والموقات (8)	نسبة الانجاز الفعلي الانجاز الفعلي (7)	مدة التنفيذ (6)		التكلفة الكلية / مليون دينار (5)	التمويل (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)		
		الانتهاء	البداية							
- المشروع في مراحلها النهائية - توقفت اعمال المشروع بسبب الوضع المالي	98 %	1 ت 2015	اليول 2014	1223	تمتية الأقاليم	محافظت واسط	وضع برنامج مساندة ودعم مع الحكومات المحلية (1) الإتشاء وتأهيل المدارس خاصة للتوسط والاقتصادية	4	2	3
- توقفت اعمال المشروع بسبب الوضع المالي	73 %	2 ت 2016	ايار 2014	9115	تمتية الأقاليم	محافظت واسط	الاتحاد الاجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لهذة المشاريع	2	2	4
- انجز المشروع	100 %	1 ت 2015	ايار 2015	552	تمتية الأقاليم	محافظت واسط	بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة	2	1	2

- 1- انشاء مدرسة ابتدائية سعة 18 صف في قضاء الكوت/ حي الحكيم
- 2- يتنفذ مشروع توفير البنى التحتية لمجمع سكني اقتصادي يعدد 284 وحدة سكنية ( منفذ سابقاً) في قضاء الكوت
- 3- يتنفذ المشروع في قضاء الصويرة / حي كسبية

محافظة النجف الأشرف

محافظة النجف الأشرف	الملاحظات والموقات (8)	نسبة الانجاز الفعلي الفعلي % (7)	مدة التنفيذ (6)		الكلفة الكلية/ مليون دينار (5) الانتهاء	التمويل (4) البناء	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
			الفعلي او المتحقق	المخطط الكللي					
المشروع متوقف		20%	1 تا 2015	فيسان 2015	139	العوزة الجارية	- ديوان محافظة النجف	توسيع المشاريع لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق (1) الفقرية	1 3 2

1- يتخذ هذا النشاط في حي ابو طالب قضاء الكوفة بطول 3.2 متر مكعب

محافظة المنى

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز الفعلي % (7)	الملاحظات والمواقات (8)
					البدء	الانتهاء		
	بناء مراكز رعاية صحية اولية	محافظة المنى	تنمية الاقاليم	1600	شباط 2015	ايلول 2013	70%	لم ينجز المشروع خلال الفترة المحددة بسبب الأزمات المالية التي يمر بها البلد
	توسيع المشاريع لايصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	محافظة المنى	تنمية الاقاليم	1500	شباط 2015	انار 2014	100%	
	وضع برنامج مساعدة ودعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة والاعدادية	محافظة المنى	تنمية الاقاليم	800	ايار 2015	شباط 2014	70%	لم ينجز المشروع خلال الفترة المحددة بسبب الأزمات المالية التي يمر بها البلد

## محافظة ذي قار

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التعميل (4)	التكلفة الكلية (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الانجاز الفعلي % (7)	الملاحظات والعيقات (8)
					البدء	الانتهاء		
	وضع برنامج مساندة ودعم مع الحكومات المحلية لانشاء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة والاعدادية	محافظة ذي قار	تنمية الاقاليم	2800	اذار 2014	نيسان 2016	33 %	العمل متوقف حالياً بسبب عدم صرف المستحقات المالية للشركة
	توفير وادامة البنى التحتية الدائمة للإنتاج والتسويق	محافظة ذي قار	تنمية الاقاليم	6000	شباط 2014	نوف 2016	73 %	قدم القاول طلب لفسخ العقد ووافقت اللجنة المشكلة لهذا الغرض حسب القرار 347 لعام 2015
	انشاء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة	محافظة ذي قار	تنمية الاقاليم	500	ايلول 2014	ايلول 2015	18 %	تم فسخ العقد رضائياً حسب القرار 347 لعام 2015 حسب الامر الديواني 32 في 10/1/2016 الصادر من قسم العقود الحكومية

رمز النشاط	اسم النشاط	الجهة المنفذة	التمويل	الكلفة الكلية	مدة التنفيذ		نسبة الانجاز الفعلي %	الملاحظات والموقات
					(6)	(7)		
(1)	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة	محافظة ميسان	تنمية الاقاليم	17478	حزيران 2012	اب 2014	100 %	تم توزيع الدور على شرائح الفقراء
	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة	محافظة ميسان	تنمية الاقاليم	16768	1 ك 2011	ايار 2014	100 %	تم توزيع الدور على شرائح الفقراء

## محافظة البصرة

محافظة البصرة	رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	التمويل (4)	الكلفة الكلية (5)	مدة التنفيذ (6)		نسبة الاجراء الفني الفعلي % (7)	الاحداثيات والموقعات (8)
						البدء	الانتهاء		
		التخاذ اجراءات لتوفير ابني التحتية اللازمه للمشاريع	محافظة البصرة	تمهية اقليم	1426	ت 1 2015	ك 1 2012	100 %	انجزت المشاريع
		توسيع المشاريع لايصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	محافظة البصرة	تمهية الاقاليم	9447	حزيران 2015	ت 2 2013	100 %	انجزت المشاريع
		توسيع المشاريع لايصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	محافظة البصرة	تمهية الاقاليم	1515	ادار 2015	ك 1 2013	100 %	انجزت المشاريع
