

جمهورية العراق
وزارة التخطيط



الادارة التنفيذية لاستراتيجية
التخفيف من الفقر



تقرير متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012

نيسان 2013

المحتويات

تقديم

المقدمة

الملخص التنفيذي

- 1 خلفية عن أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر المنفذة عام 2011
- 2 خلاصة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعام 2012
- 3 تنفيذ مشاريع ضمن تخصيصات اضافية تستهدف الفقر
- 4 خلاصة تنفيذ أنشطة الاستراتيجية لعام 2012 من خطة التنمية للمحافظات والوزارات المعنية بالاستراتيجية
- 5 تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2013

تقديم

في ضوء توجيهات اللجنة العليا لإستراتيجية التخفيف من الفقر التي يرأسها دولة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس، يسرّ اللجنة الفنية أن تقدم تقريرها الثاني لمتابعة وتقويم الانجازات المتحققة على طريق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر (2010 - 2014) وتشخيص التحديات والصعوبات التي تواجهها.

وعلى الرغم من محدودية التخصيصات التي أُقرت لعام 2012 والبالغة حوالي (445) مليار دينار، ومع ان نسب التنفيذ التي لم تتجاوز (20%) والتي تعكس امكانية تحسين أداء الأنشطة والفعاليات المدرجة تحت بنود هذه الإستراتيجية بشكل أفضل.. إلا أن ماينبغي الإشارة اليه هو مستوى التفاعل والتواصل الحكومي والمجتمعي لتحقيق إنجازات افضل على طريق تخفيف الفقر في العراق.

لقد حرصنا في إعداد تقرير المتابعة الثاني تسليط الضوء على اهم المنجزات المتحققة حتى (31/12/2012) وعلى المشاكل والتحديات بالاستفادة من المعلومات التي تم جمعها ميدانياً من الوزارات والحكومات المحلية المشمولة بأنشطة الإستراتيجية، وفي ضوء استمارات المتابعة المعتمدة، التي يتولى نقاط الارتكاز (المنسقون) التعاون مع الادارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر على انجازها.

نغتنم فرصة اعداد هذا التقرير لتقديم الشكر والامتنان لدولة نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس /رئيس اللجنة العليا، ولعالي السادة الوزراء أعضاء اللجنة العليا لدعمهم وتواصلهم المستمر..

كما نقدم الشكر والتقدير لمعالي وزير التخطيط الأستاذ الدكتور علي يوسف الشكري لدعمه الكبير للجنة الفنية وللإدارة التنفيذية ومتابعته الدقيقة لأعمالها، وللكوادر القيادية الفنية في الوزارة الى جانب الكوادر القيادية لوزارة المالية لضمان وتأمين تخصيصات في الموازنة العامة للدولة لسنتي 2012 و2013.

اخيراً نوجه الشكر للسيدات والسادة اعضاء اللجنة الفنية الدائمة لإستراتيجية التخفيف من الفقر وللأدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر لاسيما الست نجلاء علي مراد المدير العام التنفيذي ولكل العاملين معها لأخلاصهم وحرصهم في انجاز الاعمال ومنها بشكل خاص اعداد هذا التقرير.

والله ولي التوفيق..

د.مهدي محسن العلاق
وكيل الوزارة
رئيس اللجنة الفنية الدائمة
لإستراتيجية التخفيف من الفقر
نيسان 2013

مقدمة

يعد الفقر من الظواهر الاجتماعية الخطيرة ذات الابعاد المتعددة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأهداف الإنمائية للألفية، كما ويعد القضاء عليه الهدف الإنمائي الأول الذي تصبو الدول لتحقيقه، ولما عانى منه المجتمع العراقي على مدى عقود مضت من الحروب والعقوبات الاقتصادية وتوقف عجلة التنمية وتبديد الموارد فقد ظهرت الحاجة الى صيغة تشريعية واطار عام يسعى الى تخفيف الفقر من خلال تمكين الفقراء ومساعدتهم على تعزيز اندماجهم في المجتمع وتحقيق دورهم في التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، ويتكامل مع خطة التنمية الوطنية الخمسية 2010 - 2014.

انطلاقاً من ذلك جاءت استراتيجية التخفيف من الفقر لإستهداف الفقر في العراق بجهود متميزة من وزارة التخطيط ومن خلال تشكيل لجنة وطنية يرأسها وكيل وزارة التخطيط وتضم في عضويتها ثلاثة من اعضاء مجلس النواب وممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة فضلاً عن ممثلين من اقليم كردستان، لتكون برنامجاً اصلاحياً اقتصادياً ومالياً وادارياً لتحقيق بصمات مميزة في العمل وفق برامج التنمية. وبعد استكمال تشكيلات استراتيجية التخفيف من الفقر تبلورت جهودها عام 2012 في اطار تخصيص مالي للمحافظات الاكثر فقراً بحسب نتائج قياس وتحليل الفقر في العراق لعام 2007 فضلاً عن الوزارات المعنية بالاستراتيجية لتنفيذ عدداً من الانشطة المقررة في وثيقتها والتي بوبت تحت 4 محصلات .

تولت الادارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر مهمة التنسيق مع الوزارات والمحافظات في تحديد الانشطة التي لها اولوية اولى لتنفيذها فضلاً عن متابعتها وفق اليات اعدت لهذا الغرض لرصد وتقويم التنفيذ.. ومن خلال الاجتماعات الدورية تحرص الادارة التنفيذية على عرض الموقف على كل من اللجنة الفنية الدائمة واللجنة العليا لإستراتيجية التخفيف من الفقر وكذلك تقوم برفع تقارير دورية الى اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة الإداء الحكومي بناءً على طلب اللجنة للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه سير التنفيذ لتقديم الدعم اللازم لها .

يسرنا ان نقدم التقرير السنوي الثاني لمتابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012 بعد ان تم اصدار التقرير السنوي الاول لمتابعة تنفيذ أنشطة الاستراتيجية لعام 2011 في مطلع عام 2012، بحسب محصلات الانشطة وبشكل تفصيلي وعلى مستوى الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بتنفيذ أنشطة الاستراتيجية.

يضم التقرير خمسة اقسام فضلاً عن المقدمة والمخلص التنفيذي، يتناول القسم الاول خلفية عن أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر المنفذة ضمن خطة تنمية الوزارات والمحافظات عام 2011. اما القسم الثاني فيتناول موقف الوزارات والمحافظات من تنفيذ أنشطة التخفيف من الفقر والممولة من تخصيصات الإستراتيجية من الموازنة الاستثمارية لعام 2012 مصنفة حسب محصلات تلك الأنشطة اضافة الى المعوقات والتحديات التي واجهت عملية التنفيذ. ويركز القسم الثالث على تفاصيل تنفيذ مشروع متكامل تبنته وزارة التخطيط من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعام 2013 من خلال الادارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر متمثلاً بمشروع بناء مجمعات سكنية قليلة الكلفة لاستهداف العشوائيات في بغداد والمحافظات، وكذلك تنفيذ مشروع مسح خارطة الفقر في العراق في عام 2012 الذي يعد أحد ادوات اعداد خارطة الفقر بالاضافة الى نتائج قياس وتحليل الفقر في العراق. في حين يقدم القسم الرابع خلاصة تنفيذ الأنشطة والمشاريع لعام 2012 والتي تنفذها الوزارات والمحافظات المعنية بأنشطة الاستراتيجية ضمن خططها التنموية ومن موازنتها السنوية. اما القسم الخامس فيتناول توزيع تخصيصات الإستراتيجية من الموازنة الاستثمارية لعام 2013 على المحافظات والوزارات واهم الأجراءات المتخذة والمتعلقة بتحديد اولويات المشاريع وتوفير متطلبات ادراج هذه المشاريع ضمن تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعام 2013. اضافة الى ذلك تضمن التقرير ملاحق تضم استمارات متابعة أنشطة تخفيف الفقر لعام 2012 وحسب الجهات المنفذة.

الملخص التنفيذي

اغلب الأنشطة تهدف الى تحسين المستوى الصحي للفقراء ونشر وتحسن تعليم الفقراء وتحقيق بيئة سكن افضل للفقراء في حين نفذت بعض الجهات المعنية بالاستراتيجية أنشطة كانت تصب في هدف تحقيق دخل اعلى من العمل للفقراء وتحقيق حماية اجتماعية فعالة للفقراء وتحقيق تفاوت اقل بين النساء والرجال الفقراء. كما استعرض التقرير اهم التحديات التي واجهت الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر خلال متابعة التنفيذ، فضلا عن استعراض منحى تطور عمل الاستراتيجية بالاتجاه الايجابي من خلال طرح اولويات تخفيف الفقر في المحافظات والجهات المعنية بالفقر من تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2013.

وفي اطار العرض المُرَكز لأنشطة الاستراتيجية البالغ عددها 24 نشاطاً في عام 2012 ، نفذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وثلاث محافظات هي (صلاح الدين،الديوانية، وديالى) خمسة أنشطة تستهدف الفقر كانت الغاية منها تحقيق دخل اعلى من العمل للفقراء (ضمن المحصلة الاولى) وقد حققت بمجموعها نسبة انجاز بلغت (20%).

تبنت استراتيجية التخفيف من الفقر تنفيذ اربعة وعشرين نشاطاً في عام 2012 مبنية على المحصلات الاربعة الاولى في الاستراتيجية والتي لم تتجاوز نسبة انجازها (20%) لغاية 2012/12/31.

يستخدم هذا التقرير اطاراً قائماً على معالجة الفقر متعدد الابعاد من خلال استعراض أنشطة تخفيف الفقر المنفذة في عام 2012 من تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية والتي راعت في تنفيذها شمولها لأكثر من بعد من ابعاد الفقر، واستعراض مشروعات اضافيين تستهدف الفقراء تبنتها الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر وهي مشروع تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات (اطلاق مبادرة بتطوير منطقة عشوائية او اكثر، بهدف الارتقاء بمستوى المعيشة للمناطق العشوائية والمتدهورة عن طريق امدادها بالخدمات وتحسين وضعها المعيشي) ومسح خارطة الفقر في العراق لعام 2012 (توفير خارطة للفقر مبينا عليها التوزيع الجغرافي لجيوب الفقر الذي سيقبل من نسبة الهدر في الموارد المالية في تنفيذ المشاريع التي تستهدف الفقراء)، كما رسمت صورة عن أنشطة تخفيف الفقر من خطط التنمية والبالغ عددها (93) نشاطاً موزعة على ست محصلات. وقد كانت

جدول (1) الانجاز المتحقق ضمن المحصلة الاولى : (دخل اعلى من العمل للفقراء)

المحصلة	الجهات	النشاط	نسبة الانجاز
المحصلة الاولى (دخل اعلى من العمل للفقراء)	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	دعم مشروع صندوق القروض الصغيرة للفقراء (مشروع لاقرض حوالي (10350) فقير في المحافظات السبعة الاكثر فقراً)	14%
	محافظة صلاح الدين	توفير وادامة البنى التحتية الداعمة للانتاج والتسويق (إنشاء طرق زراعية بطول (30 كم))	72%
		إستيراد أبقار حليب هولندية عدد (800) توزع على الأرامل	100%
	محافظة الديوانية	تاهيل معمل النجارة	لم يبدأ تنفيذه بسبب وجود بعض المشاكل البيئية لوقوع المعمل داخل التصميم الاساس للمحافظة
	محافظة ديالى	توفير وادامة البنى التحتية الداعمة للانتاج والتسويق (إنشاء طرق ريفية بطول (4) كم)	تاخر اقرار المشروع بسبب عدم استقرار الحكومة المحلية في المحافظة خلال تلك الفترة
المجموع			5

(2). في حين نفذت وزارة التربية نشاطات إزالة المدارس الطينية وبناء مدارس بديلة ضمن المحصلة الثالثة وبنسبة انجاز بلغت حوالي (28%) وكما في الجدول (3).

وقد تبنت وزارة الصحة فضلاً عن محافظتي صلاح الدين وديالى خطة لتنفيذ ثماني أنشطة تستهدف الفقر ضمن محصلة تحسن المستوى الصحي وبنسبة انجاز بلغت حوالي 11% والتي كانت متنوعة في تحقيق اغراضها الصحية وكما في الجدول

جدول (2) الانجاز المتحقق ضمن المحصلة الثانية: (تحسن المستوى الصحي)

المحصلة	الجهات	النشاط	نسبة الانجاز
المحصلة الثانية (تحسن المستوى الصحي)	وزارة الصحة	بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة (بناء وتأهيل 27 وحدة تدرن مع توفير متطلباتها توزع على محافظات العراق عدا اقليم كردستان)	تم احالتها الى المحافظات لغرض الاعلان والفتح والتحليل والاحالة وتوقيع العقود والتنفيذ والاشراف والمتابعة من قبل دوائر الصحة فيها
		زيادة اعداد العيادات المتنقلة للمناطق النائية (شراء 8 عيادات متنقلة خاصة بالتدرن توزع على دوائر الصحة في المحافظات السبعة الاكثر فقراً بالإضافة الى محافظة بغداد)	5%
		استمرار توفير المواد والمستلزمات القياسية (شراء 21 جهاز مخبري وتوزيعها على المراكز الصحية في المحافظات كافة عدا اقليم كردستان)	15%
		استمرار توفير المواد والمستلزمات القياسية (شراء اجهزة ومعدات طبية متعددة الاغراض وتوزيعها على المراكز الصحية في المحافظات كافة عدا اقليم كردستان)	10%
		تدريب ملاكات مراكز الرعاية الصحية الاولية (بناء القدرات وزيادة الوعي الصحي وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الاولية في المناطق الفقيرة عن طريق اقامة 613 دورة من مجموع 693 دورة تدريبية مخططة في مجال الرعاية الصحية الاولية)	90%
		بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة (انشاء بيوت صحية عدد 20)	80%
المجموع	محافظتي ديالى	بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة (انشاء مركزان صحيان في القرى الفقيرة في قضاء خانقين)	تاخر اقرار المشروع بسبب عدم استقرار الحكومة المحلية في المحافظة خلال تلك الفترة
	محافظتي ديالى	تنفيذ (4) مجمعات ماء في القرى والمناطق النائية في المحافظة مع مد شبكات ماء	تاخر اقرار المشروع بسبب عدم استقرار الحكومة المحلية في المحافظة خلال تلك الفترة
		8	

جدول (3) الانجاز المتحقق ضمن المحصلة الثالثة: (نشر وتحسن تعليم الفقراء)

المحصلة	الجهات	النشاط	نسبة الانجاز
المحصلة الثالثة (نشر وتحسن تعليم الفقراء)	وزارة التربية	مشروع ازالة المدارس الطينية في العراق (هدم واعادة بناء 409 مدرسة طينية موزعة على كل محافظات العراق عدا اقليم كردستان والمحافظات: الانبار، كربلاء، النجف)	28%
		1	
		المجموع	

تنفيذ مشروعا لكل منها عدا محافظة الديوانية التي كان لها خطة لتنفيذ ثلاث أنشطة في هذا المجال والتي حققت بمجموعها نسبة انجاز بلغت حوالي (13%)

اغلب أنشطة عام 2012 تندرج تحت هدف تحقيق بيئة سكن افضل للفقراء وقد شاركت المحافظات السبع الاكثر فقرا وهي (المثنى ، الديوانية ، بابل ، واسط ، ديالى ، صلاح الدين ، كربلاء) فضلا عن وزارة الاعمار والاسكان في تحقيق هذا الهدف من خلال

جدول (4) الانجاز المتحقق ضمن المحصلة الرابعة: (بيئة سكن افضل للفقراء)

المحصلة	الجهات	النشاط	نسبة الانجاز
المحصلة الرابعة (بيئة سكن افضل للفقراء)	وزارة الاعمار والاسكان	بناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة (بناء 175 دار سكني قليل الكلفة في محافظة الديوانية)	5%
	محافظة صلاح الدين	تنظيم الاسواق في الاحياء الفقيرة (انشاء 8 أسواق شعبية في كافة الاضية وكل سوق يتكون من 32 محل)	77%
	محافظة ديالى	بناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة (بناء 70 وحدة سكنية في قرى فقيرة في قضاء بعقوبة)	تاخر اقرار المشروع بسبب عدم استقرار الحكومة المحلية في المحافظة خلال تلك الفترة
	محافظة الديوانية	بناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة (بناء مجمع سكني عمودي يتكون من 82 وحدة سكنية)	10%
		تنظيم الاسواق في الاحياء الفقيرة (انشاء اسواق تضم 400 كشك موزعة على مراكز الوحدات الادارية)	15%
	محافظة المثنى	بناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة (بناء مجمع سكني افقي يتكون من 61 وحدة سكنية)	10%
		بناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة (بناء 1000 وحدة سكنية)	5%
	محافظة كربلاء	اتخاذ اجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لمشاريع بناء الوحدات السكنية قليلة الكلفة (توفير بنى تحتية لقرى فقيرة في المحافظة)	3%
	محافظة بابل	بناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة (بناء 180 وحدة سكنية مع اوصول الخدمات الاساسية لها في المحافظة)	3%
	محافظة واسط	بناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة (بناء 284 وحدة سكنية مع اوصول الخدمات الاساسية لها في المحافظة)	48%
المجموع		10	

يرمي الى توفير سكن ملائم للفقراء من خلال تخصيص اكثر من (40%) من مشاريع خطة تخفيف الفقر لعام 2013، كما تناولت الخطة تنفيذ مشاريع لتوفير بنى تحتية وبناء مدارس وتوفير طرق ريفية وتاهيل شبكات كهرباء وبناء ابار ارتوازية وانشاء محطات تحلية ومشاريع لاوصول الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة وبناء وتوسيع مراكز صحية اولية وتجهيز مستلزمات طبية للمراكز الصحية في جميع المحافظات، وشراء مختبرات متنقلة ودعم برنامج القروض مع توفير التدريب اللازم لتاهيل المستفيدين من القروض الصغيرة.

تبنت الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر متابعة (93) نشاطا يستهدف الفقراء من خطط تنمية الوزارات والمحافظات. وقد واجهت أنشطة التخفيف من الفقر من تخصيصات الاستراتيجية من الموازنة الاستثمارية عددا من التحديات كان اغلبها ينطوي تحت تخصيص قطع الاراضي للمشاريع وصعوبة المتابعة مع نقاط ارتكاز الاستراتيجية الذين كانوا غير متفرغين لهذا العمل و عدم توفر خارطة للفقراء مسقط عليها جيوب الفقر في العراق مما ادى الى ان يكون استهداف الفقراء في تنفيذ المشاريع غير دقيق حيث ان بعض المشاريع تتسرب مزاياها الى غير الفقراء.

اتسعت خطة عمل الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر في عام 2013 لتشمل كل محافظات المركز وعددا من الجهات المعنية بالاستراتيجية لتنفيذ (29) نشاطا كان اغلبها

4. قياس الانجاز المتحقق من تنفيذ أنشطة تخفيف الفقر وفق الديات حديثة ودولية لاستخلاص الدروس المستفادة وتفعيل الجوانب الايجابية ومعالجة التحديات التي ظهرت اثناء التنفيذ
5. التنسيق للاستفادة من الدعم المقدم من المنظمات الدولية في تنفيذ بعض أنشطة الاستراتيجية التي تقع ضمن اهتماماتها او تخصصها.
6. وضع خطة اعلامية فاعلة لتعريف الفقراء بمشاريع تخفيف الفقر واستقطابهم لها وتوفير الرؤية الاعلامية لمنع تسرب مزايا تلك المشاريع لغير الفقراء
7. فتح قنوات تواصل مع الوزارات والجهات الاخرى التي تعمل ضمن برامج لها علاقة بالفقر متعدد الابعاد مثل سياسات التشغيل والشباب وحماية الطفل وحقوق المرأة وغيرها لغرض توحيد الجهود والخروج بنتائج اكثر فاعلية
1. تخصيص قطع اراضي لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر لدعم التنفيذ ومنع تاخير العمل
2. تحديد نقاط ارتكاز متفرعين ولو جزئيا للعمل ضمن استراتيجية التخفيف من الفقر وتأهيلهم لتسهيل المتابعة وانسياب المعلومات الى الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر فضلا عن تأمين الدعم اللازم لهم في المحافظة
3. زيادة مبلغ الدعم اللازم لتنفيذ أنشطة تخفيف الفقر بكفاءة

1- خلفية عن أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر المنفذة عام 2011

- تضمن التقرير السنوي الاول لمتابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2011 متابعة الأنشطة ضمن خطة تنمية الوزارات والمحافظات والتي نفذت تلك الأنشطة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (409) لسنة 2009 وجرى متابعة تلك الأنشطة من قبل الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر وفق استمارات اعدت لهذا الغرض. تبنت الوزارات المعنية بالاستراتيجية والمحافظات تنفيذ (100) نشاطا لتخفيف الفقر في كل محافظات العراق، وقد كانت تلك الأنشطة موزعة على المحصلات الستة للاستراتيجية والتي تحقق مجموعها الهدف العام تخفيف الفقر وسيتم عرضها حسب اولوية المحصلات في التنفيذ وكما ياتي:
1. كان للمحصلة الثانية النصيب الاكبر في استهداف الفقر من خلال تحسين المستوى الصحي وقد شاركت في تحقيق هذا الهدف ثلاث وزارات هي الصحة، والبلديات والاشغال العامة، وامانة بغداد وانطلاقا من التخصص في تحقيق اهداف هذه المحصلة فقد جاءت وزارة الصحة في الترتيب الاول بتنفيذ 9 أنشطة تسعى لتحسين المستوى الصحي، كما نفذت (12) محافظة في العراق هي نينوى، الأنبار، بابل، ميسان، كربلاء، واسط، النجف، المثنى، ذي قار، البصرة، بغداد، ديالى (24) نشاطا صحيا كان اغلبها من أنشطة المخرج
2. في حين كان للمحصلة الرابعة الترتيب الثاني في تحقيق أنشطة تخفيف الفقر من خلال تنفيذ (22) نشاطا كان الهدف منه تحقيق بيئة سكن افضل للفقراء، حيث نفذت اربع وزارات هي الكهرباء، الاعمار والاسكان، البلديات والاشغال العامة، امانة بغداد (8) أنشطة كان لامانة بغداد الحصة الاكبر في تنفيذ تلك الأنشطة والتي تنوعت بين انشاء نوادي رياضية، وتنظيم الاسواق في الاحياء الفقيرة، وتنفيذ مشاريع تبليط وانارة الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرة وغيرها من المشاريع التي تهدف الى توفير بيئة مناسبة للفقراء، في حين نفذت (8) محافظات هي نينوى، ديالى، ميسان، واسط، النجف، المثنى، ذي قار، البصرة (14) نشاطا كان اغلبها تنفيذ مشاريع تبليط وانارة الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرة فضلا عن تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة واتخاذ اجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لهذه المشاريع وتوفير خدمات التخلص من النفايات وانشاء نوادي رياضية وعلمية ومنتزهات عامة وتنظيم اسواق في الاحياء الفقيرة.
3. وقد كان لنشر وتحسن تعليم الفقراء نصيبا فاعلا في أنشطة التخفيف من الفقر لعام 2011 من خلال تنفيذ (17) نشاطا ضمن المحصلة الثالثة تبنت وزارة التربية تحقيق (7) أنشطة منها في

وزارة الزراعة نشاطين في هذا المجال لتكمل (12) نشاطا في عام 2011.


5. ونفذت ثلاث وزارات هي (العمل والشؤون الاجتماعية والتجارة والتخطيط) (10) أنشطة ضمن المحصلة الخامسة (حماية اجتماعية فعالة للفقراء) نفذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (8) أنشطة في هذا المجال اي بنسبة (80%) من مجموع أنشطة هذه المحصلة، انجزت كل تلك الأنشطة وفق السقف الزمني المخطط لها ، كما ونفذت كل من وزارة التجارة ووزارة التخطيط نشاطا واحدا ضمن المحصلة ذاتها .

6. ولتقليل التفاوت بين النساء والرجال الفقراء فقد تم تنفيذ (3) أنشطة ضمن المحصلة السادسة ساهمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بنشاطين منها وهي صياغة اطر تعاون مع القطاع الخاص لحثه على دعم برامج تاهيل مهنية في الريف العراقي، وتبني نظام متابعة مستمر لتقويم برامج تدريب النساء وتاهيلهن. ونفذت محافظة الانبار نشاطا واحدا ضمن هذه المحصلة من خلال هدم وبناء (24) مدرسة للبنات في القرى الريفية في المحافظة والذي انجز بالكامل في عام 2011.

حين نفذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (3) أنشطة ، كما ونفذت سبع محافظات هي كل من نينوى ، بابل ، واسط ، النجف ، الديوانية ، المثنى ، ذي قار نشاطا واحدا يصب في تحقيق هذا الهدف وهو وضع برنامج مساندة ودعم الحكومات المحلية لانشاء وتاهيل المدارس خاصة المتوسطة والاعدادية .

4. كما ونفذت وزارتان هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزارة الزراعة (12) نشاطا لتحقيق دخل اعلى من العمل للفقراء ضمن المحصلة الاولى نفذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (83%) من هذه الأنشطة والتي توزعت بين أنشطة وضع ضوابط تضمن شمول اوسع للفقراء ببرامج الاقراض لانشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل ، وتدريب الفقراء المستلمين للقروض لمساعدتهم في استخدامها وتنفيذ زيارات تفتيش ومراقبة حسن تطبيق قانون العمل، وتضمين قانون العمل فقرات مرنة حول تحديد الحد الأدنى للاجر ليتناسب مع خط الفقر وتعريف العاملين الذين يستلمون الحد الأدنى من الاجر بحقوقهم في رفع الاجور لتتوافق مع خط الفقر وتشخيص وحدة في مكاتب التشغيل في جميع المحافظات يستطيع العاملون باجر مراجعتها عند عدم التزام ارباب العمل بالقانون وغيرها من الأنشطة التي تصب في هدف تحقيق دخل اعلى من العمل للفقراء .ونفذت

شكل (1) توزيع أنشطة الاستراتيجية من خطة تنمية الوزارات والمحافظات لعام 2011 على جهات التنفيذ

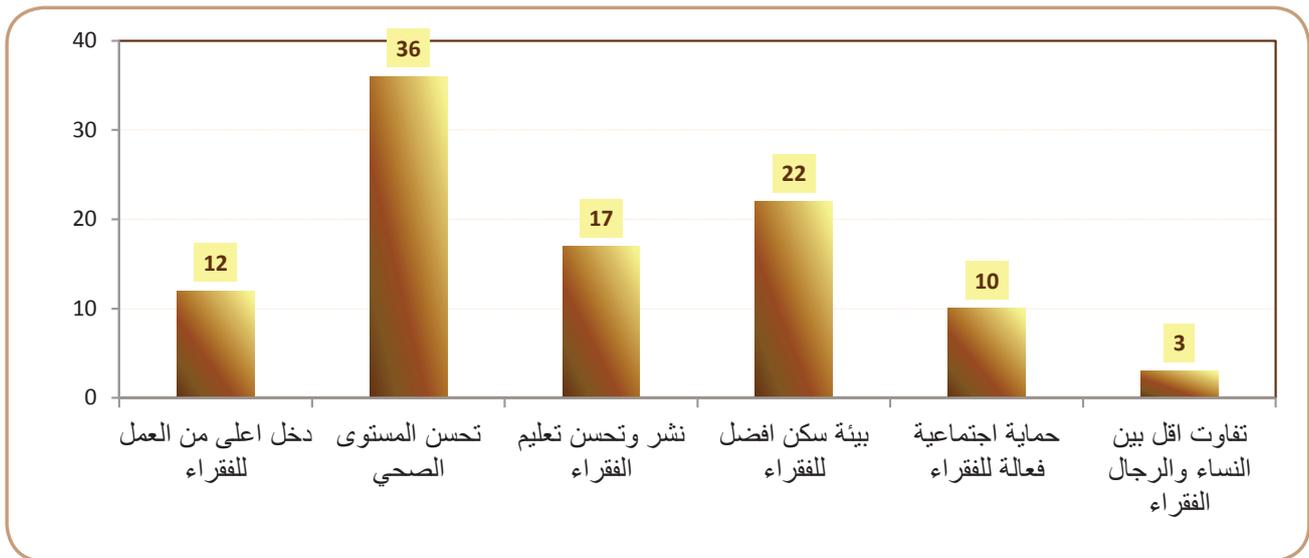

2- خلاصة تنفيذ أنشطة إستراتيجية التخفيف من الفقر من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعام 2012

الموازنة الاستثمارية لعام 2012 بـ تخفيف الفقر في العراق من خلال (تحقيق دخل اعلى من العمل للفقراء، وتحسن المستوى الصحي، ونشر وتحسن تعليم الفقراء، وتحقيق بيئة سكن افضل للفقراء).

جدول (5) نسب الانجاز الفعلي لمحصلات الاستراتيجية لعام 2012

المحصلة	التخصيص المالي للمحصلة (مليون دينار)	نسبة الانجاز (%)
دخل اعلى من العمل للفقراء	95100	20
تحسين المستوى الصحي للفقراء	128400	11
نشر وتحسن تعليم الفقراء	140000	28
بيئة سكن افضل للفقراء	81400	13
المجموع الكلي لمحصلات الاستراتيجية	444900	19


تولت المحافظات تنفيذ (16) نشاط و كان لمحافظة صلاح الدين والديوانية النصيب الاكبر حيث تبنت كل منهما 4 أنشطة ، وفيما يخص الوزارات فان 8 أنشطة من الـ 24 نشاط كانت من نصيب الوزارات الخدمية و كان لوزارة الصحة الجزء الاكبر حيث تبنت تنفيذ 5 أنشطة و كما موضح في جدول (6).

في اطار دعم تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر تم تخصيص (444.9) مليار دينار من الخطة الاستثمارية لعام 2012 لتمويل أنشطة لها اولوية اولى في تخفيف الفقر في العراق وقد تم متابعة تنفيذ هذه الأنشطة وفق منهجية وآلية اعدت لهذا الغرض، شملت الخطة تنفيذ (24) نشاطاً تمحورت حول تخفيف الفقر من خلال توفير الدور السكنية وما يرافقها من خدمات بنى تحتية وبنية مدرسية ومراكز صحية وتدريب لبناء قدرات وفق منهج شامل يعالج الفقر وتداعياته، توزعت تلك الأنشطة بين اربع وزارات والمحافظات السبعة الاكثر فقراً، وقد تم مراعاة عدة معايير في تحديد الأنشطة من خلال لجنة كلفت بذلك وهي:

- أن يحقق النشاط أو المشروع أهداف أكثر من محصلة.
- ان يكون للمشروع اولوية لدى الفقراء وله تاثير عليهم.

تم تخصيص (80.3%) من المبلغ الكلي للوزارات المعنية بوثيقة الاستراتيجية (وزارة التربية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة الاعمار والاسكان)، اما فيما يتعلق بالمحافظات فقد كان لمحافظة المثنى الحصة الاكبر من التخصيصات بين المحافظات كونها تقع في اعلى سلم المحافظات الفقيرة، الشكل (2) يبين توزيع مبلغ تخصيصات المشاريع لعام 2012 على الوزارات والمحافظات المعنية بأنشطة الاستراتيجية. اختصت أنشطة تخفيف الفقر من تخصيصات الاستراتيجية من

شكل (2): توزيع تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2012 على الوزارات والمحافظات المعنية بتنفيذ أنشطة الاستراتيجية (المبالغ: مليار دينار)

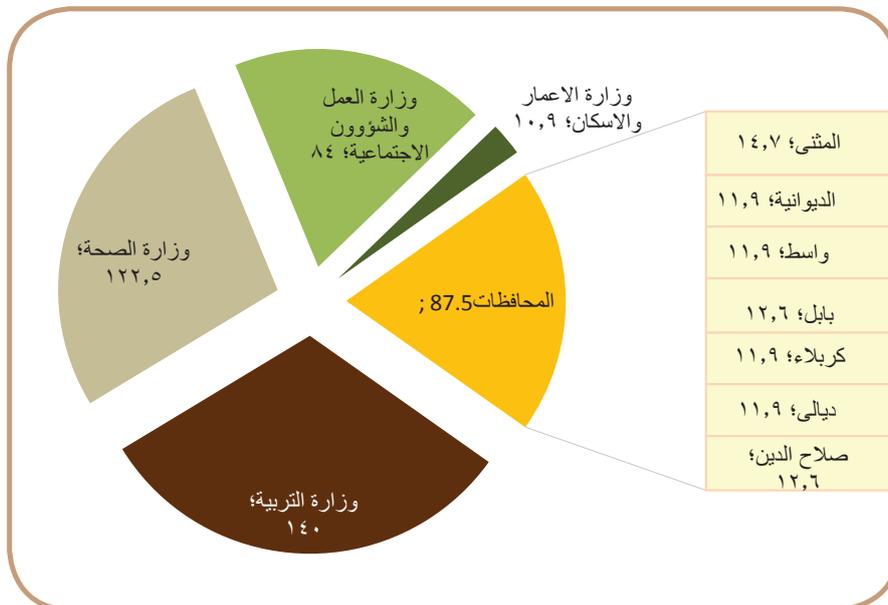

جدول (6): توزيع أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر التي تم دعمها من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعام 2012 حسب المحصلات والجهات المعنية بالاستراتيجية

عدد الأنشطة التي لم تبدأ بالتنفيذ	عدد الأنشطة قيد التنفيذ	عدد الأنشطة المنجزه	عدد الأنشطة الكلية	الجهات	المحصلة
	1		1	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	المحصلة الاولى (دخل اعلى من العمل للفقراء)
	1	1	2	محافظة صلاح الدين	
1			1	محافظة الديوانية	
1			1	محافظة ديالى	
2	2	1	5	المجموع	
	5		5	وزارة الصحة	المحصلة الثانية (تحسين المستوى الصحي)
	1		1	محافظة صلاح الدين	
1			1	محافظة ديالى	
1			1	محافظة ديالى	
2	6		8	المجموع	
	1		1	وزارة التربية	المحصلة الثالثة (نشر وتحسن تعليم الفقراء)
	1		1	المجموع	
	1		1	وزارة الاعمار والاسكان	المحصلة الرابعة (بيئة سكن افضل للفقراء)
	1		1	محافظة صلاح الدين	
1			1	محافظة ديالى	
	3		3	محافظة الديوانية	
	1		1	محافظة المثنى	
	1		1	محافظة كربلاء	
	1		1	محافظة بابل	
	1		1	محافظة واسط	
1	9		10	المجموع	
5	18	1	24	المجموع الكلي	

خارطة (1): توزيع الأنشطة المنفذة في عام 2012 حسب المحصلات على محافظات العراق (عدا اقليم كردستان)



وبدا البرنامج في (1/9/2012)، كانت تخصيصات كل محافظة تتراوح ما بين (12-14) مليار دينار بحسب نسبة الفقر فيها، وان قيمة كل قرض تتراوح بين (5-10) ملايين دينار، وتمنح استنادا الى تقرير اللجان المختصة، وان هذه القروض ستكون بدون فوائد وبمدة سماح تبلغ سنة واحدة من تاريخ تسلم القرض، فيما تسدد الاقساط على مدى ثماني سنوات، وتمنح هذه القروض دفعة واحدة لكل الفئات باستثناء المتسولين وسكان مناطق الطمر الصحي، فستكون بدفعتين، اذ تدفع الدفعة الثانية بعد المباشرة بالمشروع وبناء على تقرير من اللجنة الفرعية في المحافظة الذي يصدر خلال (30) يوما من تاريخ تسلم الدفعة الاولى. كما يمنح المقترض مبلغ مليون دينار كقرض اضافي في حالة تشغيله لاي عامل اضافي بعد مرور فترة لا تقل عن ستة اشهر من تنفيذ المشروع وبما لا يتجاوز سقف الاقراض المقرر واستنادا الى توصيات اللجنة المركزية في المحافظة ومصادقة معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ويعضى ورثة المقترض المتوفي

وفيما يأتي عرض للأنشطة المشمولة بمبلغ الدعم لعام 2012، وتفصيلها مدرجة في ملحق رقم (1) والذي يتضمن معلومات على مستوى كل نشاط وكما وردت في استمارة المتابعة:


2.1. المحصلة الاولى (دخل اعلى من العمل للفقراء)

2.1.1. نشاط دعم مشروع صندوق القروض الصغيرة للفقراء والذي تنفذه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبتخصيص (84) مليار دينار:

يشمل النشاط منح قروض صغيرة وفق ضوابط واليات محددة تشمل فئات كل من (المعوقين ، المهجرين العائدين، الارامل والمطلقات والمعيلات لاسرهن، المطلق سراحهم من السجون، المتضررين من العمليات الارهابية، معيلي الاسر غير المستقرة من سكنة مناطق الطمر الصحي، المتسولين) لتوفير فرص عمل من شأنها تحسين وضعهم المعيشي.

وبسبب قلة عدد المتقدمين لطلب القروض الذي بلغ حوالي (33%) من المبلغ الكلي، تم شمول محافظة ذي قار (لان المؤشرات الاقتصادية الأولية تشير الى انها ضمن قائمة المحافظات الاكثر فقراً) بالقروض الصغيرة لتحقيق نسب التنفيذ المطلوبة من تخصيصات عام 2012.

شكل (3) : عدد المعاملات المروجة من المخطط الكلي لعام 2012 حسب المحافظات السبعة الاكثر فقراً

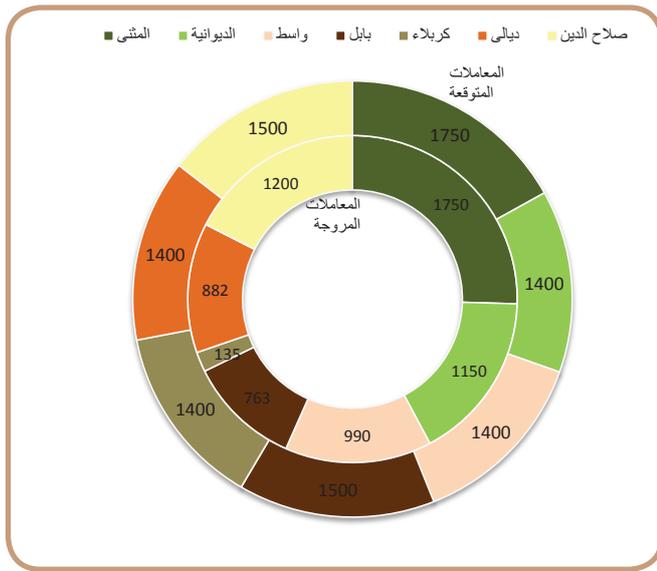

مما تبقى بدمته في حالة غلق المشروع وعدم قدرة الورثة على ادارته واستنادا لتقرير اللجنة المركزية في المحافظة والمصادقات الاصولية.

كما خصصت الإدارة التنفيذية مبلغ (30) مليار من المبالغ الإضافية لموازنة عام 2012 لدعم نشاط تدريب وتأهيل المستفيدين من صندوق القروض الصغيرة، يتم من خلال هذا النشاط الاهتمام بتوفير دورات تدريب مهنية متخصصة لتكون قاعدة علمية يستند اليها طالب القرض لبدائية مرحلة العمل متسلحاً بالادوات المعرفية الضرورية، وبسبب تأخر وصول التخصيص للوزارة الذي كان بتاريخ 2012/12/31 لذا تم تدوير المبلغ الى عام 2013.

- يجري الان دراسة معاملات الاقراض وتصديق ما يستوفي الشروط منها وتحرير الصكوك، حيث تم المصادقة على 14% من المعاملات المخططة لعام 2012
- يخدم النشاط 10350 مستفيد

الانجاز المتحقق:

تشكلت لجنة عليا دائمة تضم ممثلين عن وزارة العمل واللجنة الفنية الدائمة لإستراتيجية التخفيف من الفقر فضلاً عن مكتب المفتش العام في وزارة العمل، وقد قامت اللجنة العليا بوضع ضوابط وتعليمات منح القروض بما يضمن شمول الفقراء، وفي ضوء ذلك وزعت المبالغ على المحافظات السبع الاكثر فقرا حسب نسبة الفقر فيها (المثنى حوالي 14 مليار، بابل وصلاح الدين 12 مليار لكل منهما، واسط وكربلاء وديالى والقادسية حوالي 11 مليار لكل منهم).

تشكلت لجنة برئاسة مدير عام التدريب والتأهيل المهني في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وتضم اعضاء من اقسام الوزارة وممثل عن وزارة التخطيط للنظر بالطلبات وتحديد المستوفين لشروط الإقراض، فضلاً عن تشكيل لجان فرعية في المحافظات السبع الأكثر فقراً، وقد تم الاعلان والتعريف بالبرنامج من خلال وسائل الاعلام المحلية في المحافظات وفي الوقت ذاته جرى أعداد وتجهيز استمارة الحصول على القرض واستلام الطلبات للفترة من 1/8 ولغاية شهر تشرين الثاني عام 2012.

عدد المعاملات المخططة (10350) معاملة والمروجة (6870) معاملة، منها (1446) معاملة استوفت الشروط وتمت المصادقة عليها كما وتم تحرير (240) صك.

عانى النشاط من بعض التلكؤ بسبب ضوابط واجراءات الاقراض.

2.1.2 نشاط توفير وادامة البنى التحتية الداعمة للانتاج والتسويق (إنشاء طرق زراعية بطول (30 كم)) في محافظة صلاح الدين وبكلفتة (3.3) مليار دينار:

يهدف النشاط الى تحقيق دخل اعلى من العمل للفقراء عن طريق توفير العوامل التي تسهل تسويق الانتاج الزراعي بانشاء وتبليط طرق في المناطق الريفية والزراعية الفقيرة بطول (30) كم لربط المناطق الزراعية بالمدن والتي تسهل نقل الانتاج الزراعي لعلوات البيع المباشر، تمت المباشرة بهذا النشاط في حزيران 2012، وقد عانى من بعض التلكؤ بسبب النزاعات العشائرية والاوضاع الامنية، والجدول (7) يعرض تفاصيل تنفيذ الطرق حسب القرى المستفيدة منها او المخدومة بهذه الطرق.

- تم انجاز ثلاث طرق من اصل سبع طرق ويجري العمل في تنفيذ باقي الطرق وبنسب تنفيذ جيدة حيث كانت نسبة تنفيذ النشاط لجميع الطرق 72%
- يقدر عدد المستفيدين من النشاط ب(13000) نسمة من سكان المناطق الزراعية وجميع القرى المؤدية لها تلك الطرق

صور اثناء تبليط احد الطرق الزراعية في محافظة صلاح الدين



جدول (7): تفاصيل تنفيذ الطرق الزراعية في محافظة صلاح الدين

ت	الطريق	طول الطريق (كم)	التخصيص المالي (بالالف)	نسبة الانجاز (%)	عدد المستفيدين
1	طريق مطيبيقة - حميرين (بين ناحية الضلوعية وقرية العظيم)	12	1.304.000	30%	1349
2	طريق قرية الشهيد عبد الله جبارة	3	310.000	50%	1445
3	طريق قرية سلمان مكحول	3	300.000	50%	1030
4	طريق الشهيد ضامن (قرية ابو حمد)	3	300.000	100%	195
5	طريق يمر بالقرى (بسطلبي، جردغلي، بروجلي، طريق ابو حسن) / قضاء الطوز	5	599.350	100%	8140
6	طريق قرية النبع / سليمان بيك	2	23.450	75%	195
7	طريق قرية قره ناز امرلي	2	229000	100%	683

ب (6480) فردا، ووزعت الابقار على الاقضية حسب الكثافة السكانية ونسبة الارامل فيها، ومن الجدير بالذكر ان النشاط لم يواجه اي معوقات وانجز وفق السقف الزمني المحدد له وكالاتي:

وزعت (800) بقرة على ارامل المحافظة، بدأ العمل في حزيران 2012 وانتهى توزيع الابقار بالكامل بتاريخ 30/9/2012 وبنسبة تنفيذ 100%

2.1.3 نفذت محافظة صلاح الدين نشاط إستيراد أبقار حليب هولندية عدد (800) توزع على الأرامل وبتخصيص (4.9) مليار دينار:

تم الاتفاق مع شركة عراقية على تجهيز (800) بقرة هولندية توزع على الارامل في محافظة صلاح الدين وفق استمارة مفاضلة ضمت فضلا عن المعلومات التعريفية (عدد افراد العائلة من الذكور والاناث وعمل كل منهم وتاريخ وفاة الزوج وسببه بالإضافة الى مصدر دخل الارملة وملكية السكن) وغيرها من المعايير التي حددت اختيار الارامل وقد تم شمول الارملة التي لها خمسة ابناء فاكثر حيث يقدر عدد المستفيدين من عوائل الارامل

والتنفسية في بغداد وشراء الأجهزة اللازمة له ، ويهدف النشاط الى تحسين المستوى الصحي من خلال توفير خدمات رعاية صحية اولية محسنة للفقراء يسهل عليهم الوصول اليها عن طريق بناء (27) وحدة تدرن موزعة على المحافظات (ميسان 2 ، ذي قار 2، المثنى 2، الديوانية 1، بغداد 2، صلاح الدين 2، كركوك 2، كربلاء 2، واسط 1، بابل 2، الانبار 3، النجف 1، ديالى 1، نينوى 2، البصرة 2).

مساحة الوحدة الواحدة (200) م² تتكون من ثلاث طوابق ، يضم الطابق الارضي عيادة استشارية تتكون من غرفة طبيب ومختبر وصيدلية وغرفة الاشعة ومكتب احصائي وقاطع تذاكر ، اما الطابق الثاني والثالث فيضم شقق سكنية للكادر العامل في الوحدات، وسيتم اشغال هذه الوحدات بواسطة طبيب ومساعد مختبر ومساعد صيدلي ومصور اشعة واحصائي وقاطع تذاكر، وتكون كل وحدة مسؤولة عن تشخيص ومتابعة حالات التدرن وتزويد المرضى بالعلاج اللازم للقضاء على هذا المرض.

تخدم كل وحدة تدرن 150-200 الف فرد ضمن الرقعة الجغرافية التي تغطيها

الانجاز المتحقق:

احالة مواقع التدرن في (بغداد والمحافظات) الى قسم العقود للاعلان عن مناقصة الانشاء من خلال تقسيمها الى اربعة مناطق (شمالية وجنوبية ووسطى وفرات اوسط) وتم اعادة الاعلان لعدم كفاية المتقدمين من الشركات، وتم تمديد تاريخ غلق المناقصة ولم تحصل الوزارة على عطاءات لذلك تم احالتها الى المحافظات لغرض الاعلان والفتح والتحليل والاحالة وتوقيع العقود والتنفيذ والاشراف والمتابعة من قبل دوائر الصحة فيها، لكن الصرف سيكون مركزيا من قبل الوزارة ، وقد تم تحديد الاثاث الطبي والاداري ضمن وحدات منسقي التدرن (لكادر الطبي العامل فيها) .

2.2.2 زيادة اعداد العيادات المتنقلة للمناطق النائية (خاصة بالتدرن):

شراء عيادات متنقلة ذات مواصفات عالية تحتوي على سيارات مجهزة بجهاز اشعة مع مجهر ثنائي العدسة لاكتشاف حالات التدرن الجديدة وخاصة في مناطق الاختطار العاليي والمجاميع الواهنة والتي هي ضمن خط الفقر وبتخصيص (2 مليار دينار) لعام 2012. بعدد (8) عيادات تتوزع على دوائر صحة المحافظات السبعة الاكثر فقرا بالاضافة الى محافظة بغداد .

جدول (8): توزيع الابقار حسب الاقضية في محافظة صلاح الدين

القضاء	تكريت	الطوز	سامراء	بلد
عدد الابقار	85	120	160	115
القضاء	بيجي	الدور	الشرقاو	الدجيل
عدد الابقار	90	45	120	65

صور توزيع الابقار على الارامل في قضاء سامراء



2.2. المحصلة الثانية : تحسن المستوى الصحي

تم تخصيص مبلغ (122.5) مليار دينار لوزارة الصحة لخدمات الرعاية الصحية الاولية للفقراء من خلال تنفيذ خمسة أنشطة وكالاتي :

1.2.2 بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة (بناء وتأهيل وحدات التدرن مع توفير متطلباتها):

تم تخصيص (50) مليار دينار لتنفيذ هذا النشاط الذي ينجز على مدى سنتين، وبواقع (25) مليار دينار لكل سنة، يضم المشروع بناء وحدة تدرن لكل محافظة من محافظات العراق (عدا اقليم كردستان)، فضلا عن تأهيل مركز الامراض الصدرية

بعملية الشراء.

المحافظات التي قامت بالشراء هي (المثنى، صلاح الدين، واسط، الانبار، دائرة صحة الرصافة).

4.2.2. استمرار توفير المواد والمستلزمات القياسية (توفير أجهزة ومعدات متعددة الأغراض) وبتخصيص (79.5) مليار دينار:

يتضمن النشاط شراء أجهزة ومعدات طبية ذات استعمالات مختلفة، توزع على المراكز الصحية ويتم تحديدها حسب حاجة وأولوية المراكز الصحية ذاتها. إذ يتم توفير أجهزة مختبرية إلى مختبر الصحة العامة المركزي وفروعه في بغداد إضافة إلى مختبرات المراكز الصحية الأولية بهدف تحسين الخدمات التشخيصية والمختبرية التي تقوم بها تلك المختبرات وشملت (أجهزة أشعة ثابتة، وأجهزة فحص السمع وموازين ولوحات قياس الطول ومنظومة الكشف المبكر عن العيوب الأيضية لحديثي الولادة وجهاز فحص عكورة المياه وغيرها من الأجهزة الضرورية للمراكز الصحية وحسب تحديد تلك المراكز).

الإنجاز المتحقق:

تم اكتمال المواصفات والكلف التخمينية وأحيلت إلى المحافظات للشراء المباشر حيث تم استحصال الموافقات اللازمة للدعوة المباشرة للشركات لضمان سرعة الشراء.

تم تحويل المبالغ للمحافظات للمباشرة بعملية الشراء وقد قامت بعض المحافظات بالشراء وهي (صلاح الدين، الانبار، دائرة صحة الرصافة) وبنسبة تنفيذ بلغت 10% من المخطط.

2.2.5. تدريب ملاكات مراكز الرعاية الصحية الأولية (بناء القدرات وزيادة الوعي الصحي وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق الفقيرة) وبتخصيص (3) مليار دينار:

يتكون النشاط من شقين، الشق الأول هو بناء القدرات من خلال تنظيم دورات تدريبية لمتطوعات صحيات تم تسميتهن ضمن برنامج الاستراتيجية في المراكز والقرى الفقيرة في محافظات العراق كافة (عدا إقليم كردستان) وبواقع (10) دورات حضر و(10) ريف شهريا في كل دائرة صحة عدا دائرة صحة النجف فقد تضمنت 3 مناطق (2) ريف و(1) حضر) شهريا، وقد تم تحديد(30) متطوعة لكل دورة، بدأت الدورات في (5/9/2012) ولمدة (3) أشهر هي مدة تنفيذ البرنامج، غير ان البرنامج لم ينفذ وفق السقف الزمني المعد له بسبب المدة اللازمة لتحويل المبالغ للمحافظات، ويتضمن برنامج الدورات الشهري الآتي :

تتكون كل عيادة من سيارة كرفانية ذات طابق واحد يتكون من غرفة مقسمة إلى أربعة أقسام يضم الأول جهاز أشعة، أما الثاني فيحتوي على جهاز أشعة رقمي ويضم الثالث مختبر مجهز بمجهر ثنائي العدسة والقسم الأخير مجهز بسريير لاسعاف الحالات الطارئة، يلحق الكرفان بمولدة كهرباء عدد (2) لتشغيل أجهزة الأشعة والميكروسكوب وتهدف هذه العيادات إلى توفير التدابير اللازمة في حالة اكتشاف مريض التدرن وعلاجه بالسرعة اللازمة.

يعمل في كل عيادة طبيب مختص بالأمراض الصدرية ومصور أشعة ومساعد مختبر، وتكون عائلية هذه العيادات إلى مركز الأمراض الصدرية والتنفسية التخصصي (بغداد) وضمن البرنامج الوطني لمكافحة التدرن . واجه النشاط عقبات أخرت سير العمل تمثلت بتأخر استحصال موافقات الشراء

الإنجاز المتحقق:

تم اعداد المواصفات والكلف التخمينية الخاصة بعربة العيادات المتنقلة وأجهزتها، حيث تم تنفيذ ما نسبته 5% من النشاط. تم التخطيط لتوزيع العيادات على دوائر صحة المحافظات السبع الأكثر فقرا إضافة إلى محافظة بغداد للإعلان والفتح والتحليل والأحالة خلال عام 2013 .

2.2.3 استمرار توفير المواد والمستلزمات القياسية (توفير أجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية) وبتخصيص (13) مليار دينار:

يشمل النشاط شراء (21) جهاز مختبري تنوعت اغراضه بين فحص الأغذية والتلوث والدم وفحص الرئة وأجهزة معالجة الشبكية ومعالجة وتنقية الماء الأبيض وأجهزة قياس ذروة تدفق الزفير. وتخطيط القلب وأشعة ماموكرام ومحارير الكترونية وثلاجات لحفظ اللقاح ومراقب انجماد وحامل اللقاح وصندوق حفظ اللقاح وناظور لفحص عنق الرحم مع ملحقاته وسونار متنقل مع مجس لحديثي الولادة وغيرها، إذ سيتم تجهيز المراكز الصحية بالأجهزة الضرورية وحسب حاجة تلك المراكز للأجهزة خاصة تلك التي تقع على اطراف المدن والمؤشرة كمناطق فقيرة .

وزعت المبالغ المرصودة للنشاط على محافظات العراق كافة عدا إقليم كردستان وقامت خمس محافظات منها بالشراء وبما يحقق نسبة تنفيذ 15% من المخطط

الإنجاز المتحقق:

تم استحصال الموافقات اللازمة على الدعوة المباشرة للشركات لضمان سرعة الشراء، وتم تحويل المبالغ للمحافظات للمباشرة

سيتم التوعية ونشر الفائدة في كل المناطق التي يعمل فيها هؤلاء المتدربين.

- شراء حقائب اسعافات اولية تدريبية للمتطوعات بعدد(1200) حقيبة و(750) شاشة عرض و(250) داتا شو.

6.2.2. بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة (إنشاء بيوت صحية عدد 20 تنفذها محافظة صلاح الدين وبتخصيص 2 مليار دينار):

يشمل النشاط انشاء بيوت صحية مخصصة للمناطق الفقيرة التي تخلو من المستشفيات والمراكز الصحية، يتكون كل بيت صحي من كرفان ضمن قطعة ارض محاطة بسيج ومولد كهرباء، مساحة كل كرفان (225) م² ويضم غرفتين وصالة استقبال، يعمل في كل بيت صحي معاون طبي ومعاون مختبر فضلا عن معاون صيدلي يجري تعيينهم بالتنسيق مع دائرة الصحة في المحافظة، كما سيتم تجهيزه (وبتخصيص من وزارة الصحة) بسرير فحص وجهاز فحص ضغط الدم وحامل مغذي وميكروسكوب وجهاز اسناد التنفس ومحرار لقياس الحرارة فضلا عن التجهيزات المكتبية وكاشيرات (باصات دخول). ووزعت البيوت الصحية ضمن اقصية الطوز والدجيل وتكريت والشرقاط وسامراء وبيجي.

الانجاز المتحقق:

- تم تخصيص (20) قطعة ارض لإنشاء البيوت الصحية موزعه على 6 اقصية هي (الطوز، الدجيل، تكريت، الشرقاط، سامراء، بيجي)
- بدأ التنفيذ بتاريخ 28/6/2012
- تم انجاز (16) بيت صحي وبنسبة انجاز 80%، كما تم التنسيق مع دائرة صحة صلاح الدين لتزويد البيوت بالكوادر والاجهزة وبعض الادوية.

يخدم كل بيت صحي حوالي (1000-200) فردا ضمن الرقعة الجغرافية التي يغطيها او ما مجموعه 20 الف مستفيد.

- (2) دورة مبادئ الرعاية الصحية الأولية.
- (1) دورة للرعاية المتكاملة لصحة الاطفال.
- (2) دورة للرقابة الصحية (سلامة الغذاء للمتطوعات، دورة لعمال المطاعم).

وتضمن البرنامج (3) دورة بخصوص الولادة الامنة وخفض وفيات الامهات و(3) دورة حول الرش الوبائي والتضبيب (السيطرة على الامراض الانتقالية) تنفذ مرة واحدة خلال مدة تنفيذ البرنامج.

في نهاية البرنامج تتخرج المتطوعة كمرشدة صحية تكون نقطة ارتكاز بين المركز الصحي والأسر للإرشاد في كل ما يتعلق بالأمور الصحية مثل التدنر، الإنجاب... الخ .

أما الشق الثاني من البرنامج فيتضمن رفع الوعي الصحي من خلال شراء أجهزة ومعدات مثل شاشات عرض (LCD) تعرض إرشادات صحية وبرامج توعية في المراكز الصحية الفرعية وداتا شو لأغراض التدريب .


تم تنفيذ معظم البرنامج التدريبي من الدورات المخططة والبالغه 693 دورة والعمل مستمر لانجاز ما تبقى من البرنامج، كما تم تنفيذ الجزء الثاني من النشاط والمتعلق بشراء الحقائب والاجهزة وبنسبة تنفيذ للنشاط (90%)



الانجاز المتحقق:

- تم تنفيذ (613) دورة من اصل (693) دورة مخططة والعمل مستمر
- تم تدريب (1980) متطوعة كمرشدة صحية و(2970) عاملا في مجال سلامة وحفظ الغذاء (الرقابة الصحية) وهو مجموع خطتهم لهذا النشاط في حين تم تدريب(2790) عاملا في الرش الوبائي والتضبيب (السيطرة على الامراض الانتقالية) من مجموع (2970) عاملا تم التخطيط لتدريبهم في دورات الرش الوبائي، ومن خلال عمل المتدربين

خارطة (3): توزيع الابنية المدرسية على المحافظات (عدا اقليم كردستان) حسب نسب الانجاز المتحققة

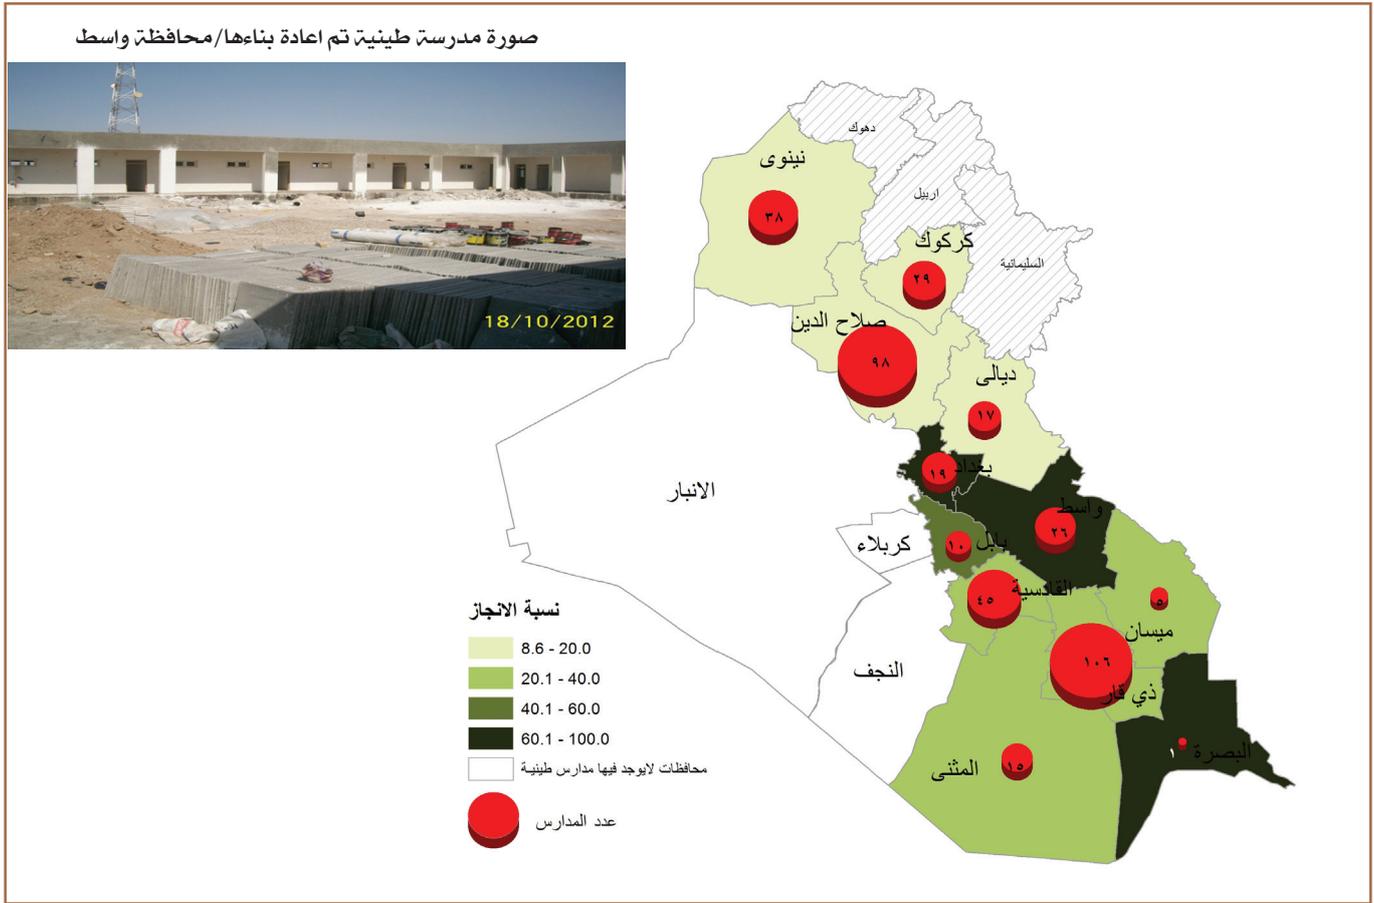

2.4. المحصلة الرابعة (بيئة سكن افضل للفقراء)

2.4.2. تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة في محافظة المثنى بكلفة كلية تبلغ (45) مليار دينار وتخصيص لعام 2012 يبلغ (14.7) مليار دينار:

انشاء مجمعات سكنية مخصصة للفقراء مع كافة الخدمات والبنى التحتية اللازمة لها وبواقع الف وحدة سكنية، توزع حسب النسبة السكانية للوحدات الادارية في المحافظة مع اجراء بعض التعديل للوحدات التي تعاني من نسب فقر اكبر. تتكون كل وحدة سكنية من طابق واحد وتحتوي على غرفتين وصالة ومطبخ وصحيات فضلا عن حديقة امامية وكراج، وتختلف مساحة الاراضي المخصصة في اقصية المحافظة اذ تم تخصيص (200) م² لكل وحدة سكنية في قضاء السماوة، و(250) م² لكل وحدة سكنية في اقصية (الخضر، الرميثة، السلمان) و(300) م² لكل وحدة سكنية في كل من الاقصية (الوركاء، الكرامة، النجمي، السوير، الدراجي، بصية، الهلال، المجد) الا ان مساحة البناء لكل وحدة سكنية ولكل الاقصية هي (106) م²، تبنى الوحدات السكنية وفق نمط بناء حديث (Sandwich Panel) والذي يتم استخدامه لأول مرة في المحافظة.

2.4.2.1 تخصيص (10.9) مليار دينار الى وزارة الاعمار والاسكان مشاريع لبناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة:

تبت استراتيجية التخفيف من الفقر اعطاء اولوية لتنفيذ مشاريع لبناء مجمعات سكنية قليلة الكلفة وقد خصصت قطعة ارض في محافظة الديوانية لبناء (175) دار سكني قليل الكلفة

يقدر عدد المستفيدين من المشروع 175 اسرة اي حوالي 1350 فردا

الانجاز المتحقق :

تم تحديد قطعة الارض المخصصة في محافظة الديوانية قضاء الشامية التي تبلغ مساحتها (30) دونم، حيث سيتم بالإضافة الى بناء (175) داراً، توفير خدمات البنى التحتية اللازمة لها.

تم اعداد الدراسات والمخططات والكلف التخمينية الخاصة بالمشروع واعلن عن المشروع بتاريخ (15/10/2012) وبنسبة انجاز (5%)

الانجاز المتحقق:

بعد فتح العطاءات بتاريخ (22/10/2012) قامت اللجنة بتحليل ودراسة العطاءات وحاليا بانتظار مصادقة السيد المحافظ على احالة المشروع للشركة المنفذة وقد تم تنفيذ 5% من النشاط يقدر عدد المستفيدين من النشاط بـ 1000 اسرة، وبما يعادل 8100 فردا.

2. 4. 3 تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة في محافظة الديوانية وبتخصيص (4) مليار دينار لكل مجمع (افقي وعمودي):

تم تخصيص قطعة الارض المرقمة (21/8) مقاطعة (5) ام العباسيات بمساحة (270) دونم، لبناء مجمعات سكنية افقية وعمودية قليلة الكلفة، تكون مساحة الوحدة السكنية في المجمعات السكنية الافقية (90) م² بناء (عدا مساحة الحديدية والكراج)، وتتكون مساحة البناء من غرفتي نوم وصالة ومطبخ وحمام، اما بالنسبة للبناء العمودي فتكون مساحة الوحدة السكنية (80) م² وتتكون من غرفة نوم وصالة ومطبخ وحمام.

الانجاز المتحقق:

بعد تخصيص الارض اعلن عن المشروع، واحيلت عروض الشركات المتقدمة الى لجان التحليل المختصة لغرض دراستها ورفع التوصيات بشأنها.

تم تنفيذ 10% من المخطط لكل من المجمعين الافقي والعمودي، ويقدر عدد المستفيدين من النشاط بـ 143 اسرة، وبما يعادل 1100 فردا

2. 4. 4 تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة (مع اوصول الخدمات الاساسية) في محافظة واسط في اقصية الكوت والحي والصويرة والعزيرية بكلفة بلغت (35) مليار دينار وبتخصيص لعام 2012 بلغ (11.9) مليار دينار:

يشمل النشاط بناء مجمعات سكنية افقية قليلة الكلفة في المحافظة، ولتنفيذه خصصت قطعة ارض بمساحة (500) دونم في قضاء الكوت لبناء (284) وحدة سكنية وقد تم الاعلان عنه بتاريخ (2012/8/15) واحيل للتنفيذ وباشرت الشركة المنفذة بتاريخ (2012/10/7) وبمدة تنفيذ 180 يوما، عانى المشروع من تاخر في تخصيص الاراضي في اقصية الكوت والحي والصويرة والعزيرية.

تم اكمال صب الاسس لـ (20) بناية من اصل (71) بناية مخططة وحيث ان نمط البناء جاهز يعتمد على صب الاسس بالدرجة الاساس فقد تم تنفيذ 48% من العمل المخطط خلال عام 2012.

صور بناء المجمعات السكنية - محافظة واسط



2. 4. 5 تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة في محافظة بابل (مع اوصول الخدمات الاساسية من روضة، حضانت، مسجد، طرق داخلية، شبكة مجاري مع محطة معالجة، انارة، ساحات خضراء) وبتخصيص (12.6) مليار دينار وينفذ على مدى ثلاث سنوات:

حددت المحافظة اولوياتها من تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2012 في بناء مجمعات سكنية قليلة الكلفة للفقراء وقد خصصت لتحقيق هذا الهدف قطعة ارض مساحتها (30) دونم في ناحية القاسم وبواقع (15) عمارة، كل عمارة تحتوي على (12) شقة، مساحة الشقة الواحدة (100) م²، ويشمل المشروع انشاء المجمعات السكنية فضلا عن توفير الخدمات الاساسية (روضة، حضانت، مسجد، طرق وساحات، شبكة مجاري مع محطة معالجة) وتتولى المحافظة التنفيذ المباشر للمشروع حيث اعلنت عن المشروع وحددت المواصفات المطلوبة ولعدم استيفاء الشركات المتقدمة لتلك المواصفات قامت المحافظة باعادة الاعلان مرة اخرى وتم احالة المشروع للتنفيذ.

يقدر عدد المستفيدين من النشاط 180 اسرة وما يعادل 1200 فرد

صور انشاء الاسواق الشعبية في قضائي بيجي وبلد/ محافظة صلاح الدين



2. 4. 8. تنظيم الاسواق في الاحياء الفقيرة (انشاء اسواق تضم 400 كشك موزعة على مراكز الوحدات الادارية في محافظة الديوانية) وبتخصيص (2) مليار دينار: تم التخطيط لبناء (400) كشك لتوفير فرص عمل للفقراء فضلا عن ضمان بيئة ملائمة محيطة بالسكن. تتوزع (200) كشك منها في مركز محافظة الديوانية والذي سينشأ ضمن قطعة الارض المخصصة في ام العباسيات مع المجمعات السكنية اللافقية والعمودية و(200) كشك توزع على الاقضية والنواحي في محافظة الديوانية، مساحة الكشك الواحد (2*3) او (2.5*2.5)، عانى النشاط من بعض التأخير وهو في مرحلة الاعلان والاحالة.

- احييت الاكشاك للتنفيذ لاحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، ونسبة الانجاز 15%.
- يوفر النشاط فرص عمل لـ 400 معيل/ وبما يعادل 3000 فردا مستفيد.

6.4.2. اتخاذ اجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لمشاريع بناء الوحدات السكنية قليلة الكلفة في محافظة كربلاء وبتخصيص (11.9) مليار دينار لعام 2012:

- شمل النشاط خلال عام 2012 تنفيذ مشروع في قرية الزكاريط وينقسم الى :
- تنفيذ شبكة مجاري مع محطة المعالجة وهو في مرحلة التعاقد.
- تنفيذ بناية لمقر صيانة مع تنفيذ شبكة ماء وهو في مرحلة الاعلان.
- تنفيذ شبكة كهرباء
- تنفيذ مركز صيانة للكهرباء
- تنفيذ شبكة اتصالات
- تنفيذ طرق
- انشاء البنى التحتية لمجمع دور قليلة الكلفة (1000) دار

الانجاز المتحقق :

- بدأ العمل في تنفيذ شبكة مجاري مع محطة معالجة حيث تم التعاقد، ويجري حاليا استكمال المخططات والتصاميم الخاصة بشبكات المجاري الثقيلة والامطار وتصاميم وحدة المعالجة واعداد جداول الكميات
- كما يجري الان الاعلان عن تنفيذ بناية لمقر صيانة.

2. 4. 7. تنظيم الاسواق في الاحياء الفقيرة (انشاء أسواق شعبية (سوق الجمعة)) في محافظة صلاح الدين وبتخصيص (2.4) مليار دينار:

تم انشاء اسواق شعبية عدد (8) في اقصية المحافظة، كل سوق مكون من (32) دكان ملحق به مصلى وصحيات، تنظم تلك الاسواق في الاحياء الفقيرة، وتبنى وفق نمط البناء التقليدي ، وقد تم اختيار مواقع الاسواق الشعبية حسب الكثافة السكانية والمساحة المتوفرة في الاقضية والنواحي وتوزع على الفقراء وفق الليات وضوابط تحدد بالتنسيق ما بين المحافظة والادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة فضلا عن ضمان بيئة ملائمة محيطة بالسكن للفقراء.

الانجاز المتحقق :

- بدأ التنفيذ في (6) قطع اراضي في اقصية بيجي وتكريت والدور وسامراء وبلد والدجيل ، وقد حقق النشاط نسب انجاز جيدة حيث انجزت اسواق اقصية كل من بلد والدور وتكريت وبيجي ، في حين يجري تنفيذ العمل في قضائي الدجيل وسامراء اما قطعتي الارض السابعة والثامنة المخصصة في قضائي الطوز والشرقاط فقد واجهت بعض المحددات ، الا ان المحافظة تغلبت عليها واستأنف العمل فيهما.

- تم انجاز 4 اسواق من مجموع 8 والعمل جاري في باقي الاسواق بنسب انجاز متفاوتة، نسبة تنفيذ النشاط 77%.
- يوفر النشاط فرص عمل لـ 256 معيل من اصحاب الاسر اي ما يعادل 1900 فرد مستفيد .

محافظة ديالى:**• انشاء طرق ريفية بطول (4) كم**

رغم حداثة تشكيل الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر وحداثة عملها في العراق الا انها حاولت جاهدة لتامين التخصيصات خلال عام 2012 بدعم من القائمين على ادارة الموازنة الاستثمارية في وزارة التخطيط، وقد كانت حصيلة تلك الجهود في عام 2012 الانشطة (24) المذكورة انفا، ورغم المحاولات الحثيثة والجهد المتواصل الا ان نسب التنفيذ لم تكن بمستوى الطموح لاسباب خارجة عن الارادة مما جعل الاستراتيجية تطمح الى مساندة الجهات العليا لتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ تلك الانشطة

تعد من المحافظات السبعة الاكثر فقرا، شملت بتخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2012 وبمبلغ (11.9) مليار، الا انها وبسبب ما مرت به من ظروف امنية واكثر من تغيير في الحكومة المحلية مما سبب في تغيير اولوياتها في كل مرة بالتالي لم تحقق الاستفادة المرجوة من تلك التخصيصات خلال عام 2012.. لذا تم تدوير المبلغ الى عام 2013. حددت المحافظة اولوياتها في (1/2/2012) بأربعة أنشطة وكالآتي:

- تنفيذ مجمعات ماء في القرى والمناطق النائية في المحافظة
- انشاء دور قليلة الكلفة في قرى قضاء بعقوبة
- انشاء مراكز صحية في القرى الفقيرة في قضاء خانقين

2.5. التحديات التي واجهت تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر في عام 2012

من بعض الاجراءات لانها لا تدخل ضمن تخصيصات المحافظة لتنمية الاقاليم (وحسب الكتاب الذي تم اصداره من الجهة المختصة في وزارة التخطيط باستثناء هذه المشاريع من ما ورد في الفقرة (1) من المادة (2) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (22) لسنة 2012 والخاص بتقديم مقترحات برنامج تنمية الاقاليم المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة وذلك لخصوصية هذه المشاريع.

5. عدم توفر خارطة للفقر مسقط عليها جيوب الفقر في العراق ادى الى ان لا يكون استهداف الفقراء في تنفيذ المشاريع بالدقة المطلوبة حيث ان بعض المشاريع تتسرب مزايها الى غير الفقراء.

6. تضمنت وثيقة الاستراتيجية بعض القوانين والتشريعات التي تضمن اصلاح السياسات الداعمة لانشطة تخفيف الفقر والفقراء وتشمل:

- قانون اعادة النظر بحزمة التشريعات والسياسات الزراعية لصالح المزارعين الفقراء.
- تضمين قانون العمل فقرات مرنة حول تحديد الحد الادنى من الاجر. (وهو احد فقرات مشروع قانون العمل الجديد).
- اعادة النظر في قانون شبكة الحماية الاجتماعية بما يضمن تسجيل ومواظبة أطفال الأسر المشمولة.
- ولاهية تلك القوانين وفعاليتها في توفير الاطار التشريعي المساند في تخفيف الفقر وتحقيق غايات الاستراتيجية ولضرورة الاسراع في تشريع تلك القوانين ووضعها حيز التنفيذ فالادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر تطمح في مساندة الجهات المعنية لدعم اقرارها وبالسرعة الممكنة حيث انها مازالت في مجلس الوزراء او مجلس النواب.
- 7. محدودية حجم التخصيصات السنوية لتنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر والتي لم ترقى الى ان تكون فقرة خاصة ضمن الموازنة السنوية للدولة.

1. تاخر اقرار موازنة عام 2012 وعدم وصول التخصيصات الى المحافظات لغاية شهر نيسان ادى الى تاخر تنفيذ أنشطة ومشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر وتدني نسب التنفيذ في عام 2012.

2. واجهت الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر تحدي تخصيص قطع اراضي لمشاريع وأنشطة الاستراتيجية مما اخر التنفيذ في عام 2012 وحد من الاسراع في تقديم مستلزمات الأنشطة للجهات المعنية للعام الحالي، لذا فان الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر بحاجة الى تدخل الامانة العامة لمجلس الوزراء من خلال دعم إجراءات تخصيص الأراضي لتنفيذ أنشطة تخفيف الفقر والتي تتطلب ذلك.

3. نقاط الارتكاز هم حلقة الوصل بين الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر وبين الجهات المعنية بالتنفيذ، يواجه معظمهم صعوبة في الحصول على البيانات المطلوبة في مجال تحديد الاولويات، توفير مستلزمات ادراج المشاريع ومتابعة التنفيذ من قبل الجهات المعنية في وزاراتهم او محافظاتهم فضلا عن عدم تفرغهم بشكل كامل لهذه المهمة، كما لوحظ ان دور نقاط ارتكاز المحافظات والذين يشغلون منصب مدير التخطيط والمتابعة على ملاك وزارة البلديات ضعيف كنقطة ارتكاز مقارنة باقرانهم الذين يشغلون منصب معاون محافظ او مستشار محافظ

4. تحديد الاولويات يخضع في بعض الاحيان الى ميول ورغبات الجهات المسؤولة في المحافظات المشمولة بالتخصيصات وينتج عن ذلك تغيير تلك الاولويات بتغيير المحافظ او مجلس المحافظة مما يربك العمل ويحد من استهداف الفقراء بتلك المشاريع او المنافع لذا تم استثناء أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر

3- تنفيذ مشاريع ضمن تخصيصات اضافية تستهدف الفقراء

مليار دينار ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2013 للقضاء على المساكن العشوائية حيث سيكون المشروع نواة لمشاريع وانشطة اوسع خلال الاعوام القادمة.

خطت الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر خطوات حثيثة في تنفيذ أنشطة ومشاريع تصب مخرجاتها في تحقيق الهدف العام وهو تخفيف الفقر في العراق ومن هذه المشاريع:

3.1. مشروع تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات

تعمل الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر وبالتعاون مع امانة بغداد ومحافظة بغداد لغرض تخصيص قطعة ارض لبناء مجمع سكني قليل الكلفة يستهدف سكان المنطقة العشوائية في حي طارق الواقعة ضمن ناحية حي الفرات قضاء مدينة الصدر الاولى، وبالتزامن مع العمل في العاصمة بغداد قامت وبالتنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات بالحصول على تخصيص قطع اراضي في كل من المحافظات (واسط، الديوانية، كربلاء، ديالى، ذي قار، بابل، صلاح الدين، المثنى، النجف) لبناء هذه المجمعات فيها وكما مبين في الجدول (9).

في ضوء اجتماعات اللجنة الفنية للإستراتيجية وجدت انه من الضروري ان تقوم وزارة التخطيط من خلال الادارة التنفيذية بتبني مشروع تنموي متكامل يحقق عدة اهداف ضمن برنامج عام 2013 يستهدف المناطق العشوائية الفقيرة في بغداد والمحافظات لانها تعد بؤر للفقر، عن طريق "اطلاق مبادرة" بتطوير منطقة عشوائية او اكثر، يهدف المشروع الى الارتقاء بمستوى المعيشة للمناطق العشوائية والمتدهورة عن طريق امدادها بالخدمات وتحسين وضعها المعيشي للنهوض بها وبما يساعد على اعادة الصورة الحضارية للمدن وهو احد مشروعات توفير مساكن قليلة الكلفة للفئات الفقيرة مع توفير الخدمات اللازمة لها. وحسب بيانات مجلس محافظة بغداد ان عدد العشوائيات فقط في بغداد حوالي 250 مجمع عشوائي .

فيما يخص العاصمة بغداد كان هناك مخاطبات مع الجهات المعنية حول تخصيص قطع اراضي للعشوائيات ومن خلال المتابعة والبحث اقترحت محافظة بغداد قطع اراضي للمشروع وبمساحة (27) دونم في مقاطعة (20) ضمن حدود بلدية بغداد الجديدة عائدة لامانة بغداد وتمت مفاتحة الامين وبانتظار الرد حيث لم يتم تخصيص الارض في بغداد لإنشاء المشروع

وبناء على مصادقة معالي السيد وزير التخطيط على مقترح المشروع المقدم عن الادارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر ودعمه في توفير التخصيص اللازم من موازنة عام 2013، تم تشكيل لجنة تكون مسؤولة عن تنفيذ مشروع الاستهداف الجغرافي للمناطق العشوائية في العراق برئاسة السيد وكيل وزارة التخطيط وتضم في عضويتها عدداً من المدراء العاميين للدوائر المختصة في وزارة التخطيط بموجب الامر الوزاري 4568 في 3/10/2012، اذ خصصت وزارة التخطيط مبلغ 200

جدول (9): قطع الارض المخصصة في المحافظات لمشروع القضاء على العشوائيات

بغداد	النجف	المثنى	صلاح الدين	بابل	ذي قار	ديالى	كربلاء	الديوانية	واسط	المحافظة
27	250	20	26	32	60	300	75	300	500	مساحة الارض المخصصة (دونم)

لم تحصل الموافقة النهائية على تخصيص (27) دونم في محافظة بغداد والعمل جاري في متابعتها

صور المنطقة العشوائية في حي طارق



3.2 : مسح خارطة الفقر في العراق لعام 2012

العراق وسيوفر المؤشرات على مستوى الاقضية وستكون نتائجه جاهزة للأستخدام قبل منتصف عام 2013.

2. بيانات على مستوى أصغر وحده إدارية

يتطلب اعداد خارطة الفقر ايضا بيانات على مستوى اصغر وحدة ادارية من التعداد العام للسكان ، وبالنظر لعدم تنفيذ التعداد ،تم تنفيذ مسح اسري واسع في الربع الاخير من عام 2012 شمل حوالي 311 الف اسرة ممثلة على مستوى اصغر وحدة إدارية (الناحية) بدعم مالي مشترك من وزارة التخطيط وصندوق الامم المتحدة للسكان وهو مسح خارطة الفقر ووفيات الامهات، سيوفر المسح مؤشرات على مستوى الناحية تسمح بتحديد بؤر الفقر، وسيقدم البنك الدولي الدعم الفني المطلوب لاعداد خارطة الفقر من خلال الربط واجراء المحاكاة ما بين نتائجه ونتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة .

يتطلب مشروع الاستهداف الجغرافي لتطوير المناطق الفقيرة أو أي برنامج اصلاح حكومي يستهدف الفقراء توفر خارطة للفقر مبينا عليها التوزيع الجغرافي لحيوب الفقر الذي سيقبل من نسبة الهدر في الموارد المالية في تنفيذ المشاريع التي تستهدف الفقراء، وقد قدرت بثلاث المبالغ المطلوبة في حال عدم وجودها من خلال الاستهداف الآني والدقيق للمناطق الفقيرة وتحديد احتياجاتها الفعلية بالإضافة إلى تخفيض تسرب المزايا إلى غير الفقراء ، ويتطلب اعداد الخارطة ما يأتي:

1. بيانات ومؤشرات تعكس الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة

يتطلب اعداد الخارطة بيانات ومؤشرات عن الظروف المعيشية للأسرة ، وفي هذا الشأن نفذ الجهاز حاليا المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة لعام 2012 الذي يمثل المرحلة الاولى من مشروع التعاون المشترك مع البنك الدولي والمتمثل بتوفير قاعدة البيانات المطلوبة لقياس خط الفقر واعداد الاستراتيجية الجديدة، استمر المسح لمدة سنة كاملة وغطى جميع محافظات

مراحل عمل مسح خارطة الفقر

1. صممت الاستمارة وتعليمات ملئها بجهود وطنية ودعم فني من قبل البنك الدولي وصندوق الامم المتحدة للسكان.
2. جرى تصميم واختيار العينة بخبرة وطنية واستشارة دولية والتي بلغت (311) الف اسرة موزعة على جميع المحافظات بما فيها اقليم كردستان.
3. تنفيذ المسح التجريبي، الذي اجري في ثلاث محافظات هي كربلاء وميسان واربيل في اقليم كردستان، الذي اسهم في الوقوف على المشاكل والمعوقات قبل التنفيذ الفعلي، كما تم اجراء التعديلات المطلوبة في ضوء ذلك.
4. اجراء دورة تدريبية للكادر المتقدم المسؤول عن اجراء المسح شملت آليات التنفيذ ومناقشة تفاصيل العمل الفني للتنفيذ.
5. بدأ المسح بتاريخ 13 كانون الاول عام 2012 بعد ان تم الانتهاء من الدورات التدريبية لكادر العمل الميداني في المحافظات لكل من الباحثين الميدانيين ورؤساء فرق العمل الميداني فيها التي جرت لمدة (7) ايام وذلك خلال الفترة (9-3/كانون الاول 2012).
6. انتهى العمل الميداني في جميع انحاء العراق بتاريخ (16/2/2013)
7. العمل يجري حاليا في ادخال بيانات المسح باستخدام الماسح الضوئي.
8. ستكون الخارطة جاهزة بعد نهاية النصف الاول من عام 2013.



صور العمل الميداني في محافظة ذي قار



صور اثناء تنفيذ المسح التجريبي في محافظة كربلاء

4. خلاصة تنفيذ أنشطة الاستراتيجية لعام 2012 من خطة التنمية للمحافظات والوزارات المعنية بالاستراتيجية

تبنت الوزارات المعنية بالأستراتيجية تنفيذ (46%) من الأنشطة وبما يعادل (43) نشاط، كان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية النصيب الأكبر حيث تبنت تنفيذ (37%) من عدد الأنشطة الكلي للوزارات (16 نشاط من 43 نشاط)، تلتها وزارة التربية وامانة بغداد وبعدهد أنشطة يساوي (9) أنشطة لكل منها. فيما كان لـ 12 محافظات نصيب في تنفيذ (50) نشاط (54% من مجموع الأنشطة الكلي)، وتصدرت محافظة نينوى بقية المحافظات في تنفيذ (6) أنشطة تستهدف الفقر

تفاصيل الأنشطة مدرجة في ملحق التقرير والذي يتضمن معلومات تفصيلية على مستوى كل نشاط وكما وردت في استمارة المتابعة.

من خلال متابعة الأنشطة المتعلقة بتحقيق اهداف استراتيجية التخفيف من الفقر ضمن خطة تنمية الوزارات والمحافظات لعام 2012 والتي نفذت تلك الأنشطة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (409) لسنة 2009، يعرض الجدول (10) خلاصة بالأنشطة حسب المحصلات الست الرئيسية، فمن مجموع (93) نشاط مخطط تم انجاز (24) نشاط اي ما نسبته (26%) من الأنشطة الكلية في حين ان (66) نشاط لازال قيد التنفيذ اي بنسبة (71%) من مجموع الأنشطة الكلي. معظم الأنشطة كانت ضمن اهداف تحسين المستوى الصحي (29 نشاط) ونشر وتحسين تعليم الفقراء (22 نشاط) وتوفير بيئة سكن افضل للفقراء (22 نشاط)،

جدول (10): توزيع أنشطة الاستراتيجية من خطة التنمية للوزارات والمحافظات لعام 2012 حسب المحصلات

عدد الأنشطة التي لم تبدأ بالتنفيذ	عدد الأنشطة قيد التنفيذ	عدد الأنشطة المنجزة	عدد الأنشطة الكلية	المحصلة
0	3	6	9	المحصلة الاولى (دخل اعلى من العمل للفقراء)
1	22	6	29	المحصلة الثانية (تحسن المستوى الصحي)
1	15	6	22	المحصلة الثالثة (نشر وتحسن تعليم الفقراء)
1	17	4	22	المحصلة الرابعة (بيئة سكن افضل للفقراء)
0	6	1	7	المحصلة الخامسة (حماية اجتماعية فعالة للفقراء)
0	3	1	4	المحصلة السادسة (تفاوت اقل بين النساء والرجال الفقراء)
3	66	24	93	المجموع الكلي للأنشطة

1.4 المحصلة الاولى : (دخل اعلى من العمل للفقراء)

بدورية سنوية ضمن خطة الوزارة، في حين تبنت وزارة الزراعة تنفيذ نشاطين ضمن هذه المحصلة كان طابع احدهما تشريعي والنشاط الاخر تدريبي.

اختصت هذه المحصلة بتوفير فرص لزيادة انتاجية الفقراء من خلال اشاعة انماط الأنشطة المدرة للدخل، وضمان حصول الفقراء على اجر منصف والقضاء على البطالة فضلا عن انشاء مكاتب تشغيل فعالة وما يصاحب ذلك من توفير فرص تدريب مهنية وقد كان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدور الاكبر في تحقيق ذلك حيث تبنت تنفيذ (7) أنشطة من مجموع (9) أنشطة ضمن هذه المحصلة وقد كانت اغلبها أنشطة تنفذ

جدول (11) : الانجاز المتحقق ضمن المحصلة الاولى : (دخل اعلى من العمل للفقراء)

الانجاز المتحقق	عدد الانشطة	الجهة المنفذة	الانشطة
تنفيذ (25686) زيارة تفتيشية لاصحاب العمل والمشاريع وهو اعلى من السقف الزمني المخطط لعام 2012	1	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	تنفيذ زيارات تفتيشية لضمان تنفيذ قانون العمل والضمان الاجتماعي
يتم ذلك من خلال التوعية والتوجيه اثناء الزيارات التفتيشية	1		تعريف العاملين الذين يستلمون الحد الأدنى من الاجر بحقوقهم في رفع الاجور للتوافق مع خط الفقر
بلغ عدد الوحدات (15) شعبة في المحافظات	1		تشخيص وحدة في مكاتب التشغيل في جميع المحافظات يستطيع العاملون بأجر مراجعتها
وفرت (6581) فرصة عمل في القطاع الخاص	1		قيام مكاتب تشغيل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل
فتح دورات تدريبية مهنية تستمر لمدة (6) اشهر وقد بلغ عدد المتدربين خلال عام 2012 (14380) متدرب	1		قيام مكاتب التشغيل بالتنسيق مع جهات التدريب وتأهيل وتعزيز مهارات العمل لدى الفقراء
يجري نشر الوعي الاعلامي من خلال وسائل الاعلام المختلفة وطبع البوسترات وتعميم الدليل التدريبي	1		تنظيم حملات توعية للفقراء للالتحاق بالمراكز وبرامج التدريب
تم تشكيل لجنة لهذا الغرض توصلت الى اعداد توصية لزيادة الحد الأدنى لاجر العامل غير الماهر الى (250) الف دينار شهريا ورفع هذه التوصية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء للمصادقة عليها	1		تضمين قانون العمل فقرات مرنة حول تحديد الحد الأدنى للاجر ليتناسب مع خط الفقر
تشريع اربع مشاريع قوانين هي مشروع قانون اعفاء المزارعين والفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة من ذمتهم ومشروع قانون تعويض الفلاحين والمزارعين عن الكوارث البيئية والمناخية ومشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية وتمليك حق التصرف والتملك فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين (والتي تمر عبر قنوات اقرارها والمصادقة عليها خدمة لصالح الفقراء)، ومشروع قانون القرى العصرية رقم (59) لسنة 2012 والذي تم اقراره ونشره في جريدة الوقائع العراقية.	1	وزارة الزراعة	اعادة النظر بحزمة التشريعات والسياسات الزراعية لصالح المزارعين الفقراء
تم تنفيذ (70) دورة تدريبية في اساليب الزراعة والري الحديث ضمن خطة الوزارة لعام 2012	1		برنامج لتدريب المزارعين على اساليب الزراعة والري الحديث

2.4 المحصلة الثانية: (تحسن المستوى الصحي)

نُفذت ضمن هذه المحصلة عددا متميزا من الأنشطة التي تهدف الى تحسين المستوى الصحي، تبنت تنفيذها كل من (امانة بغداد ووزارة البلديات) واحدى عشر محافظة هي النجف واسط ، كربلاء، بغداد ، بابل، الانبار، نينوى، ذي قار، المثنى ، الديوانية ، البصرة، بلغت عدد الأنشطة في هذه المحصلة 29 نشاط .

جدول (12) : الانجاز المتحقق ضمن المحصلة الثانية: (تحسن المستوى الصحي)

الانجاز المتحقق	عدد الأنشطة	الجهة المنفذة	الانشطة
مد شبكات ماء لمناطق فقيرة في الشعلة بنسبة تنفيذ (57.5%)	1	امانة بغداد	توسيع المشاريع لايصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة
انشاء (350) وحدة تحلية مياه في القرى الفقيرة في عموم المحافظات/ عدا اقليم كردستان، وبنسبة تنفيذ (54%)	1	وزارة البلديات	
مد خط انابيب لمنطقة ريفية وانشاء مجمع ماء وخطوط ناقلة لمنطقة فقيرة أخرى وبنسبة انجاز (83%)	1	محافظة النجف	
يشمل النشاط تجهيز ونصب مجع مياه العمادية سعة (200 م3) والمهاوية سعة (200 م3) في قرى فقيرة في قضائي الهاشمية والمسيب في المحافظة	1	محافظة بابل	
يتضمن 4 مشاريع لتوسيع وتأهيل ومد شبكات المياه ونصب وحدات ماء وصيانة ومد انابيب نقل الماء وتأهيل وحفر ابار ارتوازية في قرى فقيرة في المحافظة (نسبة الانجاز المتحققة 14.5%)	1	محافظة نينوى	
تنفيذ 5 مشاريع تضمنت انشاء وحدة تحلية وتجهيز ونصب مجمع ماء وانشاء مشاريع ماء وايصال الماء لقرى فقيرة في اضية القائم والرمادي والفلوجة وبنسبة تنفيذ (88%)	1	محافظة الانبار	
تنفيذ مشروع تجهيز ونصب مجمع ماء سعة (50م3/ساعة) مع شبكات ماء في قرية فقيرة في قضاء الرفاعي والذي انجز بالكامل وبنسبة انجاز (100%) في عام 2012	1	محافظة ذي قار	
تنفيذ مشروع مد وايصال وتأهيل شبكات ومجمعات ماء في القرى الفقيرة في قضاء السماوة وبنسبة انجاز (40%)	1	محافظة المثنى	
يشمل انشاء وتجهيز ونصب مجمعات ماء في القرى الفقيرة وبنسبة انجاز (45%)	1	محافظة الديوانية	
تنفيذ شبكة ماء في 5 قرى فقيرة وحي التحدي في قضاء الهندية في المحافظة وبنسبة انجاز (35%)	1	محافظة كربلاء	
تم نصب وتشغيل وحدة ماء مجمعة سعة (50 م3 / ساعة) في قرى فقيرة في المحافظة والذي انجز بالكامل وبنسبة تنفيذ (100%)	1	محافظة واسط	
تفكيك ونقل وتشغيل وفحص 5 مجمعات ماء سعة (200 م3/ساعة) في المناطق الفقيرة في العاصمة منها (اليوسفية ، التاجي ، اللطيفية ، الحسينية الاولى)	1	محافظة بغداد	

تم انجاز (48) برنامج اعلامي على قنوات (العراقية ، الفيحاء ، المسار، الرشيد ، افاق ، الديار) وبعض الصحف والمجلات العراقية وبنسبة تنفيذ (100%) في مجال نشر الوعي البلدي والبيئي في محافظة بغداد ونشر اعمال امانة بغداد امام انظار ومسمع المواطن البغدادي	1	امانة بغداد	القيام بحملات التوعوية بالوسائل المرئية والسمعية والمقروءة والندوات
ينفذ في منطقة الشعلة الفقيرة وتم الانجاز بنسبة (100%)	1	امانة بغداد	توسيع مشاريع الصرف الصحي
ينفذ في جميع المناطق في عموم محافظات العراق بضمنها المناطق الفقيرة عدا اقليم كردستان وذلك لعدم وجود خارطة للفقر	1	وزارة البلديات	
انجز مشروع تنفيذ شبكة مجاري ثقيلة في موقع الفرات ومنطقة الرشادية الفقيرة في الكوفة بنسبة (100%)	1	محافظة النجف	
يتم في المناطق الفقيرة في اقصية (الموصل ، مخمور ، تلكيف ، سنجار ، البعاج) (نسبة الانجاز المتحقق 41.8%)	1	محافظة نينوى	
نفذ المشروع في منطقة فقيرة في مركز المحافظة والذي انجز بنسبة (100%)	1	محافظة كربلاء	
يجري احواله مشروع محطات رفع مجاري في ناحية اليوسفي	1	محافظة بغداد	
ينفذ في قرية ريفية في قضاء المسيب وبنسبة انجاز (13%)	1	محافظة بابل	بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة
بناء مراكز رعاية صحية اولية عدد 5 انجز اثنان في المناطق الفقيرة في قضائي القائم والرطبة وما يزال 3 منها قيد التنفيذ في قرى فقيرة في قضاء الرمادي وبنسبة انجاز للنشاط (95%)	1	محافظة الانبار	
بناء مركز صحي في منطقة فقيرة وبنسبة انجاز (75%)	1	محافظة النجف	
انشاء بيوت صحية عدد 10 ومراكز صحية عدد 19 موزعة على القرى الفقيرة في اقصية المحافظة (نسبة الانجاز المتحقق 21% من عمر النشاط)	1	محافظة نينوى	
انشاء ثلاث مراكز رعاية صحية اولية في ناحية البطحاء وهو قيد التنفيذ	1	محافظة ذي قار	
بناء(3) مراكز رعاية صحية في القرى الفقيرة في قضائي السماوة والوركاء وبنسبة انجاز (35%)	1	محافظة المثنى	
ينفذ المشروع في منطقة الشيخ الفقيرة في قضاء ابي الخصيب وبنسبة انجاز (90%)	1	محافظة البصرة	
بناء (3) مراكز رعاية صحية ضمن المناطق الفقيرة في الحسينية والزعفرانية والمحمودية	1	محافظة بغداد	
يجري العمل على بناء (3) مراكز رعاية صحية اولية للمناطق الفقيرة في (ام غرار، حي الغدير ، العنتاكية) وبنسبة تنفيذ (73%)	1	محافظة كربلاء	
بناء مركز صحي في قرية فقيرة في قضاء الكوت	1	محافظة واسط	

3.4 المحصلة الثالثة: (نشر وتحسن تعليم الفقراء)

كاملت في حين لم يبدأ تنفيذ نشاط واحد هو (نشاط تعديل المادة (34 /اولا) من الدستور لمد الزامية التعليم الى المرحلة المتوسطة) والمحدد ضمن خطة وزارة التربية وذلك لعدم الحاجة الى تعديل المادة في الوقت الحاضر كون الوزارة لها صلاحيات ضمن قانون الوزارة لمد الزامية التعليم بشكل تدريجي عند توفر الظروف الملائمة وهي ماضية في تحقيق هذا الهدف وكون التعديل يتطلب اجراءات كثيرة .

تتولى وزارة التربية بشكل رئيس محصلة نشر وتحسن تعليم الفقراء وقد تبنت تنفيذ (9) أنشطة ضمن خطة عام 2012

على الرغم من تحسن الانفاق العام على التعليم من اجمالي الانفاق الحكومي منذ عام 2004 الا انه ما يزال دون المستويات المستهدفة وما تزال مستويات الامية مرتفعة بين الفقراء، وتعكس معدلات الالتحاق في مراحل التعليم ما بعد الابتدائي فروقا كبيرة بين الفقراء وغير الفقراء وبين الريف والحضر. ومن الجدير بالذكر ان هذه المحصلة تتوافق مع تحقيق الهدف الثاني من الاهداف الانمائية للاللفية في تحقيق التعليم الاساسي للجميع وقد شاركت في تحقيق اهداف هذه المحصلة عددا من الجهات من خلال تنفيذ (22) نشاط، تم تنفيذ (6) منها بصورة

جدول (13) : الانجاز المتحقق ضمن المحصلة الثالثة: (نشر وتحسن تعليم الفقراء)

الانجاز المتحقق	عدد الأنشطة	الجهة المنفذة	الأنشطة
يشمل اعداد استمارة احصائية وتوزيعها على المدارس وتتضمن بيانات عن الطلبة والمعلمين والابنية وتم انجاز النشاط بنسبة 100%	1	وزارة التربية	تكوين قواعد بيانات للفئة العمرية المشمولة بالتعليم الالزامي وفق التوزيع الجغرافي وتحديثها باستمرار
يشمل التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتربية وتزويدها بالبيانات الاحصائية الخاصة بالمناطق الريفية وبما يساعد على تنفيذ الزامية التعليم ومحو الامية وتعليم الكبار وبنسبة انجاز 100%	1		برنامج شراكة مع منظمات المجتمع المدني والوزارات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ الزامية التعليم
توجيه المديرية العامة للتربية في المحافظات كافة بتشكيل مجالس الاء والمعلمين وعقد اجتماعات بواقع اجتماع لكل شهر او اكثر عند الضرورة ويستمر هذا الاجراء سنويا وبنسبة انجاز (10%)	1		تفعيل العلاقة مع مجالس الاء والمعلمين وفق صيغة قانونية مؤسسية معدة لنشر ثقافة التعليم الالزامي
اعدت الوزارة استمارة لتحديد عدد المتسربين وتحديد عدد العائدين الى المقاعد الدراسية من المشمولين بقانون التعليم الالزامي وبنسبة انجاز (100%)	1		تطوير نظام رصد ومتابعة المتسربين ضمن فئة التعليم الالزامي وفق برامج الخطة السنوية
قيام الوزارة برفد كافة المدارس وخاصة في المناطق الريفية والاحياء الفقيرة بالكاتب المنهجية والمطبوعات العلمية وغيرها من المستلزمات وبنسبة انجاز 100%	1		اعطاء اولوية في توزيع الخدمات التربوية ذات العلاقة بكفاءة التعليم للنواحي والمناطق والاحياء الفقيرة
انشاء قاعدة بيانات تتضمن عدد الطلبة والمعلمين والمدارس في المناطق الريفية للعام الدراسي 2011/2012 وتقوم الوزارة بهذا الاجراء سنويا (نسبة الانجاز المتحقق 100% من المخطط لهذا العام)	1		انشاء قاعدة معلومات عن توزيع المناطق الفقيرة تربويا (جغرافيا واداريا) وفقا لدرجة الحرمان من المدارس المتوسطة والاعدادية
تم اصدار قانون محو الامية رقم 23 لسنة 2011 والتعليمات لتسهيل تنفيذه لسنة 2012 وبنسبة انجاز 100%	1		سن قانون محو الامية الالزامي
يتم عقد ندوات وتوزيع بوسترات وملصقات لغرض التوعية الاعلامية لخلق الوعي للالتزام بالتعليم الالزامي وبنسبة انجاز (15%) وسيتم النظر بمهام قسم الاعلام التربوي عند اعداد نظام الوزارة الجديد وجعله اكثر فاعلية	1		اعادة النظر بمهام قسم الاعلام التربوي لخلق الوعي باهمية الالتزام بالتعليم الالزامي
لوزارة صلاحيات ضمن قانون الوزارة لمد الزامية التعليم وهي ماضية في تحقيق هذا الهدف	1		تعديل المادة (34/اولا) من الدستور لمد الزامية التعليم الى المرحلة المتوسطة (الثالث متوسط)
تمت المصادقة على القانون من مجلس شوري الدولة حديثا وبانتظار عرضه على مجلس النواب، نسبة تنفيذه (70%)	1		وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

بناء (26) مدرسة في المناطق الفقيرة في المركز وفي اقصية العمارة والبتيرة وعلی الغربي وقلعة صالح والكحلاء والميمونة وبنسبة انجاز متحقق 50 %	1	محافظة ميسان	وضع برامج مساندة ودعم مع الحكومات المحلية لانشاء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة والاعدادية
بناء (15) مدرسة في القرى والنواحي الفقيرة في اقصية المجد والهلال والسماوة والسوير والرميثة (نسبة الانجاز 35%)	1	محافظة المنشي	
بناء اجنحة اضافية في المناطق الفقيرة في اقصية الشامية وعفك وترميم مدرسة في قضاء عفك (نسبة الانجاز المتحقق 40%)	1	محافظة الديوانية	
تم انجاز (93%) من مشروع هدم واعادة بناء مدرسة ابتدائية في منطقة فقيرة في قضاء المدينة	1	محافظة البصرة	
انشاء (30) مدرسة في المناطق الفقيرة في مدينة الصدر والراشدية والمعامل وبزايض الفضيلية وابو غريب والسويب وابو دشير والشعلة وهور الباشا والصابيات والحريّة واللطيافية وبنسبة انجاز (17%)	1	محافظة بغداد	
انجاز (12) مدرسة و(6) ملاحق مدارس في المناطق الفقيرة في نواحي الموققية والبشائر والاحرار واقصية النعمانية والصويرة والكوت وبنسبة تنفيذ (94%)	1	محافظة واسط	
بناء مدارس فضلا عن بناء اجنحة مدارس في المناطق الفقيرة في اقصية الهاشمية والمحاويل والمسيب والاسكندرية وبنسبة انجاز (35%)	1	محافظة بابل	
بناء (15) مدرسة في النواحي الفقيرة (الحر، الحسينية، الخيرات، الجدول الغربي) وبنسبة انجاز (30%)	1	محافظة كربلاء	
انشاء مدرسة في منطقة فقيرة في قضاء الكوفة وبنسبة تنفيذ (67%) والانتهاء من بناء مدرسة اخرى في منطقة فقيرة في ناحية الحيرة	1	محافظة النجف	
تخصيص تمويل كافٍ لانشاء مدرسة في قرية فقيرة في ناحية الفهود وبنسبة انجاز (65%)	1	محافظة ذي قار	
تخصيص تمويل لبناء (78) مدرسة موزعة على المناطق الفقيرة في اقصية مركز الموصل، مخمور، البعاج، سنجار، تلكيف، شيخان، الحمدانية، تلعفر واطافة اجنحة مدارس واقعة في اقصية (الحضر، الموصل، سنجار، تلكيف، الحمدانية)	1	محافظة نينوى	
تخصيص تمويل لبناء (5) مدارس في النواحي والقرى الفقيرة في اقصية (حديثة، الرمادي، الفلوجة، القائم) وبنسبة انجاز (78%)	1	محافظة الانبار	

4.4 المحصلة الرابعة : (بيئة سكن افضل للفقراء)

من المشاكل البيئية الأخرى، ولتحقيق اهداف هذه المحصلة تم تنفيذ 22 نشاط في عموم المحافظات 4 من هذه الأنشطة منجزة بالكامل و17 نشاط قيد التنفيذ، تولت امانة بغداد تنفيذ 6 أنشطة في مدينة بغداد

في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني وارتفاع نسبة الاكتظاظ ظهرت الحاجة الى توفير بيئة سكن ملائمة للفقراء من خلال توفير السكن الملائم وحل المشكلات التي تعمق الحرمان البيئي الذي يعاني منه الفرد العراقي وربط المناطق السكنية بشبكة الماء العامة فضلا عن حل مشاكل الاكتظاظ والتلوث وغيرها

جدول (14) : الانجاز المتحقق ضمن المحصلة الرابعة: (بيئة سكن افضل للفقراء)

الانجاز المتحقق	عدد الأنشطة	الجهة المنفذة	الأنشطة
نسبة الانجاز المتحقق 65% حيث تم توفير البنى التحتية للمجمع السكني في مدينة الصدر والذي يحتوي 492 داراً	1	وزارة الكهرباء	اتخاذ اجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لهذه المشاريع
تنفيذ الشبكة الكهربائية في قرى واحياء فقيرة (نسبة الانجاز المتحقق 50%)	1	محافظة الديوانية	
ايصال التيار الكهربائي واستحداث المغذيات وتأهيل محطات كهربائية للقرى والارياف في المحافظة وبنسبة انجاز (11.3%)	1	محافظة نينوى	
تحسين الشبكة الكهربائية لمناطق فقيرة في ناحية الحضرية وايصال التيار الكهربائي الى قرى ومناطق فقيرة في المحافظة ، نسبة التنفيذ 90%	1	محافظة واسط	
نسبة الانجاز (100 %) حيث تم ائارة 66 شارع في مدينة الصدر	1	وزارة الكهرباء	تنفيذ مشاريع تبليط وائارة الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرة
تطوير شوارع قطاعات في مدينة الصدر فضلا عن اكساء شوارع مناطق فقيرة في منطقة الشعلة في العاصمة بغداد (نسبة الانجاز المتحققة للنشاط 82.2%)	1	امانة بغداد	
تبليط وتأهيل وأكساء شوارع في مناطق وقرى فقيرة في الاضية (الموصل، الحضر، تلييف، شيخان، تلعفر، سنجار، البعاج، الحمدانية) وعددها (48) شارع وبنسبة انجاز (11.3 %)	1	محافظة نينوى	
انشاء شوارع مع شبكات مجاري في ناحية الحمار الفقيرة في قضاء الجبايش وبنسبة انجاز (75%)	1	محافظة ذي قار	
تبليط (3) طرق في قضاء الوركاء واكساء وتبليط طرق وشوارع في مناطق فقيرة في اضية السماوة والرميثة والخضر والهلال وبنسبة انجاز(25%)	1	محافظة المثنى	
تنفيذ مشاريع تبليط وائارة في المناطق الفقيرة (منطقة القطنية الشرقية ، طريق كنج والزهاء ، طريق النفاشة / ناحية تاج الدين، طريق الامام العكار / ناحية البشائر ، طريق ابو جلاج / قضاء النعمانية وبنسبة انجاز (99.8%)	1	محافظة واسط	
انشاء طريقتين في قرى فقيرة في مركز قضاء المحاويل بطول 3435م (نسبة الانجاز المتحقق 50%)	1	محافظة بابل	
تأهيل شبكة الكهرباء وائارة الطرق في محلات فقيرة في منطقة المعامل وبنسبة تنفيذ (50%)	1	محافظة بغداد	

مشروع مجمع (10*10) السكني ضمن قاطع مدينة الصدر الفقيرة والذي تم اعداد الدراسات والتصاميم له واحالة تقرير لجنة الدراسة والتحليل وتوصياتها الى الجهات العليا	1	امانة بغداد	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة
مشروع الالف وحدة سكنية في منطقة فقيرة في قضاء العمارة نسبة الانجاز المتحقق (30%)	1	محافظة ميسان	
ينفذ في قضاء عين التمر والقرى الفقيرة في النواحي (الحسينية ، الجدول الغربي ، الحر) وبنسبة تنفيذ (87%)	1	محافظة كربلاء	
انشاء دور قليلة الكلفة في قضاء الحلة / ناحية ابي غرق بالإضافة الى خدمات هي (مدرسة ابتدائية /18 صف ، مركز دفاع مدني، اسواق، استعلامات،شبكة مجاري للمجمع مع محطة معالجة ، محطة ضخ ماء للمجمع، طرق وساحات)	1	محافظة بابل	
نشاط دوري ومستمر ضمن خطة الوزارة	1	وزارة البلديات	توفير خدمات للتخلص من النفايات
توفير خدمات التخلص من النفايات في مدينة الصدر والشعلة وبنسبة انجاز(100%)	1	امانة بغداد	
انشاء (3) روابط للتوعية وبث التوعية في المدارس والجامعات والمناطق السكنية (نسبة الانجاز 100%)	1	امانة بغداد	برامج توعية للفقراء في المحافظة على البيئة المحيطة بالسكن
مشروع بناء نادي رياضي في قضاء السماوة وساحات متعددة في نواحي المجد والهلال والسوي وانشاء متنزهات عامة عدد (3) في مناطق فقيرة في ناحيتي المجد والهلال وقضاء السلطان (نسبة الانجاز المتحقق 40%)	1	محافظة المثنى	انشاء نوادي رياضية وعلمية ومنتزهات عامة
انشاء ملعب بسعة (5000) متفرج وملعب خماسي في منطقة السدة الفقيرة وخر ضمن بلدية الشعلة فضلا عن تنفيذ ملعب خماسي في مدينة الصدر الاولى الفقيرة، انشاء متنزهات وساحات في منطقة الشعلة ومدينة الصدر وبنسبة انجاز(73%)	1	امانة بغداد	
انجاز بناء سوق الشعلة بطاقة استيعابية 73 دكان وبنسبة انجاز (100%)	1	امانة بغداد	تنظيم الاسواق في الاحياء الفقيرة

5.4 المحصلة الخامسة: (حماية اجتماعية فعالة للفقراء)

الوطني الذي يبلغ (77) الف دينار شهريا للفرد لتحديد الفئات المستهدفة باعانات شبكة الحماية الاجتماعية، وانطلاقا من ذلك وبتوحيد الجهود فقد تم تحديد المحصلة الخامسة لتأمين حماية اجتماعية فعالة للفقراء والتي تنفذ اغلب انشطتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

جاء نظام شبكة الحماية الاجتماعية الذي وضعته الحكومة العراقية في نهاية عام 2005 لمساعدة الفقراء الذين عانوا خلال فترة الحصار الاقتصادي وافرازات الحرب الاخيرة فضلا عن تدهور الاوضاع الامنية والتهجير الذي زاد من حدة الوضع مما تطلب برامج اكثر واقعية تستهدف المستحقين فعلا ، ولان المعيار الذي تعتمد عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هو كل من يقل دخله اليومي عن دولار واحد لا يعكس الواقع الحالي لذلك دعت الاستراتيجية الى اعتماد معيار خط الفقر

جدول (15) : الانجاز المتحقق ضمن المحصلة الخامسة: (حماية اجتماعية فعالة للفقراء)

الانجاز المتحقق	عدد الانشطة	الجهة المنفذة	الانشطة
يهدف الى حجب البطاقة التموينية عن العوائل ذوي الدخل العالية وتخصيصها للعوائل الفقيرة والذي انجز بنسبة (78%)	1	وزارة التجارة	نظام رصد وتقييم واصلاح نظام البطاقة التموينية
نسبة التنفيذ (70%).	1	وزارة التخطيط	تحديث خط الفقر الوطني
اقرت صيغة مناسبة لتنفيذ اللامركزية في ادارة شؤون الشبكة حسب رؤيا وزارة العمل	1	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	اتخاذ الإجراءات لأعتماد اللامركزية في إدارة شؤون شبكة الحماية الاجتماعية
نسبة التنفيذ (90%)	1		تطوير قاعدة البيانات للأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية وتحديثها بشكل مستمر
نسبة التنفيذ (90%)	1		وضع برنامج لرفع القدرات لتأهيل وتدريب العاملين على حسن تطبيق نظام الشبكة
نسبة التنفيذ (85%) من خلال انجاز زيارات تدقيقية تفتيشية في بغداد والمحافظات	1		وضع تقارير أنظمة رقابية صارمة على آليات العمل وتنفيذ القانون من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
نسبة التنفيذ (90%) من خلال اجراء (1500) حملة اعلامية واجراء (66) لقاء تلفزيوني وطبع مطويات وكراسات تعريفية بعدد (1000) مطوي وكتاب وكراس تعريفية وتلقي شكاوى المواطنين	1		تصميم برنامج إعلامي موجه للمواطنين لتوعيتهم بحقوقهم وشروط الشمول والعقوبات الرادعة في حالة التجاوز على الشبكة

المسببة للفقر عن عامل الدخل حيث تفرض التقاليد الاجتماعية على المرأة وخصوصا في الريف نمطا من الحياة يرسخ الفقر وانطلاقا من ذلك فقد حددت الاستراتيجية عددا من الانشطة التي تهدف الى تقليل التفاوت بين النساء والرجال الفقراء من خلال ثلاث أنشطة تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذها، كما وتنفذ محافظة الانبار نشاطا ضمن المحصلة ذاتها

6.4 المحصلة السادسة: (تفاوت اقل بين النساء والرجال الفقراء)

تستهدف الاستراتيجية تقليل التفاوت بين النساء والرجال كما تهدف ومن خلال هذه المحصلة تمكين المرأة العراقية اقتصاديا عبر تحقيق مبدأ التكافؤ مع الرجل في التعليم وفرص العمل للحصول على دخل منصف، اذ لا تقل اهمية العوامل الاجتماعية


جدول (16) : الانجاز المتحقق ضمن المحصلة السادسة: (تفاوت اقل بين النساء والرجال الفقراء)

الانجاز المتحقق	عدد الانشطة	الجهة المنفذة	الانشطة
هدم واعادة بناء وانشاء مدارس للبنات (نسبة الانجاز المتحقق الفعلي للنشاط (87.5%)	1	محافظة الانبار	إعطاء الأولوية في إنشاء مدارس البنات الابتدائية والثانوية في الأحياء الفقيرة
تحقيق (32) زيارة الى معظم المراكز المنتشرة في بغداد والمحافظات والتي اثمرت زيادة الاقبال على الدورات حيث بلغ عدد المتدربات (8045) متدربة خلال عام 2012.	1	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	تبني نظام متابعة مستمر لتقويم برامج تدريب النساء وتأهيلهن
تشكيل لجنة عليا للتنسيق بين الوزارات (العمل، التربية، التعليم العالي) لتنظيم نشاطات التعليم والتدريب فيما يخص الاحتياجات التدريبية والمناهج والجودة مع مؤسسات القطاع الخاص والخاص بالمرأة العراقية وبنسبة انجاز (50%)	1		صياغة اطر تعاون مع القطاع الخاص لحثه على دعم برامج تأهيل مهنية في الريف العراقي
اجراء عمليات التوعية من خلال الزيارات التفتيشية وتوزيع دليل التفتيش وقد تم شمول (12996) امرأة فقيرة بالضمان الاجتماعي	1		برامج توعية موجه للنساء لا سيما في الريف العراقي للالتزام بنظام الضمان الاجتماعي

5- تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2013

- مواصلة التقدم وفق منحى التحسين المستمر تم زيادة تخصيصات الاستراتيجية من الموازنة الاستثمارية لعام 2013، حيث اصبحت (605) مليار دينار وبنسبة زيادة بلغت (36%) عما كانت عليه في عام 2012 (شكل 4 يبين مقدار الزيادة في تخصيص المحافظات والوزارات لعام 2013 عما كانت عليه في عام 2012)، تم توزيعها على المحافظات حسب نسبة الفقر فيها. كان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التخصيص الاكبر (165 مليار) وبنسبة (27%) من التخصيص الكلي كونها من الوزارات الخدمية المختصة بشكل وثيق بتمكين الفقراء، اما فيما يتعلق بتخصيص المحافظات كان لمحافظة ذي قار النصيب الاكبر بتخصيص قدره (40) مليار دينار وبنسبة (6.6%) من التخصيص الكلي
- ابلاغ الوزارات والمحافظات خلال شهر ايلول الماضي بمبلغ تخصيصاتها لعام 2013 بهدف توفير الفرصة اللازمة لتحديد الاولويات والبدء بالاجراءات المطلوبة تلافيا للتأخير.
- تم تحديد اولويات الوزارات والمحافظات من أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر من صلب الوثيقة مع مراعاة اولويتها لدى الفقراء.
- بهدف دعم اللامركزية الادارية في المحافظات وتحقيق نسب تنفيذ اعلى تم زيادة تخصيص المحافظات لعام 2013 فبعد ان كانت تشمل في عام 2012 المحافظات السبع الاكثر فقرا اصبح المبلغ المخصص للمحافظات 319 مليار دينار بزيادة بلغت (حوالي 265%) وشملت محافظات العراق كافة عدا اقليم كردستان.


شكل (4): مقارنة التخصيصات المالية لعامي 2012 / 2013 حسب المحافظات والوزارات

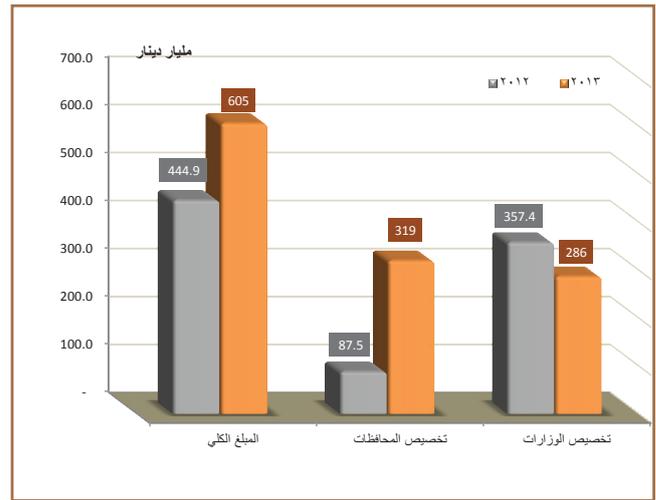

- عقدت الادارة التنفيذية لاستراتيجية التخفيف من الفقر اجتماعا مشتركا لנקاط ارتكاز الوزارات والمحافظات المشمولة بالتخصيصات لمناقشة اولويات كل منها، ولمنع ازدواجية الأنشطة التي ستنفذ خلال عام 2013 من مبلغ الدعم المخصص لها.
- بعد تحديد الاولويات من الجهات المعنية تم عرضها على اللجنة الفنية الدائمة لتخفيف الفقر واقرارها ومن ثم عرضت على اللجنة العليا وتمت المصادقة عليها كخطة لتخفيف الفقر لعام 2013.
- تم مخاطبة الجهات المعنية لتوفير متطلبات ادراج المشاريع ضمن خطة التنمية الوطنية وفيما يلي استعراضا لاولويات الجهات المعنية وفق التخصيصات المحددة لهم والجدول (18) يوضح اولويات الجهات المعنية وفق التخصيصات المحددة.

ولغرض تحقيق الانجاز المستهدف في عام 2013 تم اتخاذ الاجراءات الاتية:

صورة لاحد اجتماعات اللجنة الفنية/ بغداد

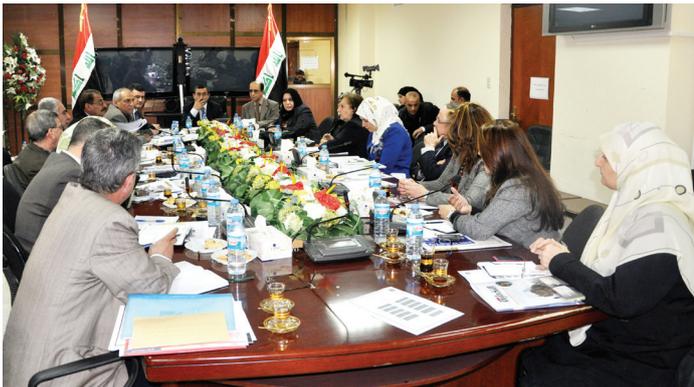

صورة لاحد اجتماعات الادارة التنفيذية مع نقاط ارتكاز الوزارات



جدول (17): توزيع تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2013 على الجهات المشمولة مرتبة ترتباً تنازلياً

الجهات	وزارة العمل والشؤون الإجتماعية	وزارة الصحة	وزارة الإعمار والإسكان	ذي قار	البصرة	المنشى	نينوى	ميسان	واسط	وزارة البلديات
التخصيص (مليار دينار)	165	50	50	40	35	31	30	25	23	21
النسبة من التخصيص الكلي (%)	27.27	8.26	8.26	6.61	5.79	5.17	4.96	4.13	3.82	3.46

الجهات	صلاح الدين	القادسية	النجف	الأنبار	بغداد	كركوك	بابل	كربلاء	ديالى	المجموع الكلي
التخصيص (مليار دينار)	20	20	15	15	15	15	13	12	10	605
النسبة من التخصيص الكلي (%)	3.31	3.31	2.48	2.48	2.48	2.48	2.08	2	1.65	100

جدول (18): تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة الاستثمارية لعام 2013 حسب اولويات المحافظات

الجهة	الاولويات	التخصيص (مليون دينار)
محافظة المنشى	1. مشروع بناء مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة (مدور) من عام 2012 موزعة على جميع الوحدات الادارية في المحافظة	31300
محافظة بابل	1. مشروع بناء مدارس في قرى محافظة بابل	12600
محافظة صلاح الدين	1. مشروع بناء مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة عدد(8) موزعة على اقصية المحافظة	20000
محافظة كربلاء	1. مشروع توفير البنى التحتية لمنطقة الزكاريط في قضاء عين تمر (مدور) من عام 2012 2. بناء مدرسة ابتدائية في ناحية الحسينية	12100
محافظة واسط	1. مشروع بناء مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة (مدور) من عام 2012	23100
محافظة الديوانية	1. مشروع بناء مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة مع مجمع ماء في مركز المحافظة 2. بناء (9) مدارس موزعة على (9) وحدات ادارية في المناطق والقرى الفقيرة.	20000

10000	1. مشاريع انشاء طرق للقرى الريفية في اقصية (بعقوبة، المقدادية، بلدروز، خانقين، الخالص) 2. تاهيل وتنفيذ شبكات كهرباء في القرى الفقيرة التابعة لاقضية (بلدروز، الخالص، بعقوبة، خانقين، المقدادية)	محافظة ديالى
40000	1. مشروع بناء مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة في قضاء الناصرية	محافظة ذي قار
35000	1. مشروع بناء مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة في ريف قضاء القرنة	محافظة البصرة
25000	1. مشروع بناء مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة موزعة على (5) وحدات ادارية في المحافظة	محافظة ميسان
30000	1. مشروع بناء مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة في قضاء الموصل 2. بناء مجمعات ماء (ابار ارتوازية) في قضاء سنجار	محافظة نينوى
15000	1. انشاء 5 مدارس ابتدائية ذات (18) صف في ريف عدة نواحي في المحافظة 2. انشاء اربع مجمعات تحلية ماء (سعة 25 م ³ / ساعة) في قرى متفرقة في المحافظة 3. توسيع المركز التخصصي لامراض الاذن والانف والحنجرة (ENT) مع اجهزة ومستلزمات طبية اخرى	محافظة النجف
15000	1. مشروع بناء مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة عدد(8) في جميع اقصية المحافظة (الرمادي، الفلوجة، هيت، حديثا، عانه، راوه، القائم، الرطبة) .	محافظة الأنبار
15000	1. انشاء مجمع سكاني عدد 2 قليل الكلفة في منطقة بسماية	محافظة بغداد
15000	1. مشروع بناء مجمعات سكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة عدد (2) شرقي وغربي كركوك	محافظة كركوك
20900	1. مشاريع لإيصال الماء الصالح للشرب في ريف كل من محافظات (ميسان، الأنبار، ذي قار، المثنى، القادسية، بابل) 2. مشاريع الصرف الصحي من خلال تجهيز البات تخصصية في اعمال المجاري في ريف (15) محافظة وبعدهد (40) البية	وزارة البلديات والاشغال العامة
65000 100000	1. دعم برنامج صندوق القروض الصغيرة للفقراء لشمول جميع المحافظات بالقرض 2. تدريب وتأهيل المستفيدين من القروض الصغيرة للفقراء	وزارة العمل والشؤون الإجتماعية
50000	1. بناء مراكز صحية رئيسية وفرعية في المناطق الفقيرة 2. تجهيز اجهزة ومستلزمات طبية للمراكز الصحية في المحافظات 3. مشروع شراء (3) مختبرات متنقلة	وزارة الصحة
50000	1. مشاريع بناء المجمعات السكنية للفقراء بمواصفات قليلة الكلفة	وزارة الاعمار والاسكان

ملحق (1)

استثمارات متابعة أنشطة الوزارات والمحافظات الممولة من

تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة

الاستثمارية لعام 2012

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز التالي (9)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق	
1.2.1	وضع ضوابط تضمن شمول أوسع للفقرى ببرامج الإقراض لإنشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / دائرة العمل والتدريب المهني	الادارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط	الوازنة الاستثمارية تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر	—	1 تم 2012	2 تم 2012	100%	100%	—
2.2.1	القيام بحملات توعوية للفقرى للاستفادة من البرامج (القرض الصغيرة للفقرى)	وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / دائرة العمل والتدريب المهني	مكتب الاعلام في الوزارة	الوازنة الاستثمارية تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر	45	تموز 2012	ايلول 2012	100%	100%	3%

من خلال اللجان المشكلة تم وضع الضوابط والشروط اللازمة لبرنامج الإقراض

وقد شملت المحافظات السبع الأكثر فقرا ويتم الآن الترويج للمعاملات الواردة من المحافظات حيث هناك (6870) معاملة قيد الدراسة من اصل (10350) مخططة وقد تمت المصادقة على (1446) معاملة للصرف وتم تحرير (240) صك وبنسبة تنفيذ 14% من المبلغ المخصص.

تعريف بالبرنامج والاعلان عنه بوسائل الاعلام السموية والقروية في المحافظات المشمولة ومقد الندوات التوعيفية

تم تحقيق (2) اعلان على شاشات شبكة الاعلام العراقية فضلا عن اعلانات الموقع الالكتروني وعلى عدد من الصحف المحلية في العراق

وزارة الصحة

خلاصة متابعي تنفيذ الأنشطة الاستراتيجية للتخفيف من الفقر لعام 2012

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)	نسبة الانجاز المالي (9)	ملاحظات والعقبات (10)
						البدء	الانتهاء			
1.1.2	تدريب ملاكات (1) مراكز الرعاية الصحية الأولية	وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات	--	الاستثمارية تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر	3.000	1 تم ايلول 2012	49%	90%	100%	تم مخاطبة الامانة العامة، مجلس الوزراء لاستكمال استثناء لشراء العيادات من شركة مختصة بصورة مباشرة للاسراع في عملية الشراء وقد خاطبت الامانة العامة لجنة الاعمار والخدمات بهذا الشأن ولا يزال الموضوع في مكتب رئيس اللجنة ولعدم ورود الاجابة من الجهة المختصة وكإجراء قانوني استحصلت موافقة معالي السيد وزير الصحة على توجيه دعوة مباشرة الى شركات مختصة لتقديم العروض وعلى ان لا تقل عن خمسة شركات ولم تقدم الشركات عطائاتها للوزارة لذلك تم توزيعها على دوائر الصحة للمحافظة الاكثر فقراً والبالغ عددها سبعة محافظات مصفاً اليها محافظة بغداد ليصبح عدد العيادات ثمانية عيادات سيدور النشاط وسيتم الاعلان والفتح والتحليل والاحالة خلال عام 2013
				من الفقر	6.000	1 تم حزيران 2012	1%	5%	100%	تم اعداد الوصفات والكلف التخمينية الخاصة بعربة العيادة المتقلة واجهزتها

(1) دورة مبادئ الرعاية الصحية الأولية ويكون بضمها يوم للتدرب، و دورة المعالجة المتكاملة للأمراض الطفيل (IMCI)، و دورة الرقابة الصحية للمتطوعات، و دورة الرقابة الصحية لعمال المطاعم.

وزارة الصحة

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	ملاحظات والعواقب (10)
						البدء	الانتهاء	الخطى الكلي	الفعلي او المتحقق		
3.6.2	استمرار توفير المواد (1) والمستلزمات القياسية (شراء أجهزة متعددة الأغراض)	وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات	-	الموازنة الاستثمارية تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر	500,000	حزيران 2012	2014	100%	100%	15%	- تم اكتمال المواصفات والكلف التخمينية واحيت الى المحافظات لشراء المباشر حيث تم استحصال موافقة معالي السيد وزير الصحة على الدعوة المباشرة للشركات لضمان سرعة الشراء وتم تحويل المبالغ للمحافظات المباشرة بعملية الشراء قامت بعض المحافظات بالشراء وهي (صلاح الدين، الابيار، دائرة صحة الرصافة).
3.6.2	استمرار توفير المواد (2) والمستلزمات القياسية (شراء أجهزة مختبرية)	وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات	-	الموازنة الاستثمارية تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر	29,500	حزيران 2012	2014	100%	15%	20%	- تم اكتمال المواصفات والكلف التخمينية واحيت الى المحافظات لشراء المباشر حيث تم استحصال موافقة معالي السيد وزير الصحة على الدعوة المباشرة للشركات لضمان سرعة الشراء وتم تحويل المبالغ للمحافظات المباشرة بعملية الشراء حيث يهدف النشاط الى شراء 21 جهاز مختبري توعدت اعراضه بين فحص الاغذية والتلوث والدم وغيرها توزع على المحافظات وقامت بعض المحافظات بالشراء وهي (المنى، صلاح الدين، واسط، الابيار، دائرة صحة الرصافة).

1. توفير أجهزة جهاز العلاج الضوئي الاسطواني المركز (Cylinder Phototherapy) وتوفير عدد تشخيصية (diagnostic kits) وتوفير اجهزة الكشف المبكر عن الامراض الوراثية (Adelphi)، جهاز اسناد التنفس (Infant flow SIPAP)
2. جهاز فحص وظائف الرئة، جهاز معالجة الشبكية، جهاز قياس ذروة تدفق الزفير، وجهاز تخطيط القلب، وجهاز اشعة ماموكرام، ومحارير الكتر ونبية، وثلاجات لحفظ اللقاح، وحامل لقاح، ومراقب الجماد

وزارة الصحة

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التحويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز الاتالي (9)	ملاحظات والوعوات (10)
						اليه	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
2.1.2	بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة (بناء وتأهيل وحدات وحدات الانترنت)	وزارة الصحة ودوائر الصحة في المحافظات	---	موازنة استثمارية تخصيصات استثمارية التخفيف الفقر	50.000	حزيران 2012	2014	100%	1%	---	<p>- خصص (27) موقع في بغداد والمحافظات لانشاء وحدات تدن بمساحة 2م(200) وبواقع ثلاثه طوابق للوحدة</p> <p>- تم تحديد الاتاك الطبي ويقوم قسم الابنية باعداد الكشوفات التحمينية لكافة الاعمال (المدينة، الكهر بائية، الميكانيكية)</p> <p>- تم احالة الموقع الى قسم العمود للاعلان عن مناقصة الانشاء وبواقع تقسيمها الى اربعة مواقع (شمالية ووسطى وجنوبية وقرات اوسطا) وتم اعادة الاعلان لعدم كفاية المتقدمين من الشركات وتم تحديد تاريخ خلق المناقصة حيث لم تحصل الوزارة على عطاءات لذلك تم احالتها الى المحافظات من قبل الوزارة لغرض الاعلان والفتح والتحليل والاحالة وتوقيع العقود والتنفيذ والاشراف والمتابعة من قبل دوائر الصحة ويكون الصرف مركزي من قبل مركز الوزارة</p>

- وحدات التدن موزعة كالاتي: (بغداد 2، المنشي 2، صلاح الدين 2، بابل 2، كربلاء 2، الديوانية 1، واسط 1، كركوك 2، ميسان 2، ذي قار 2، الاينار 3، النجف 1، ديالى 1، نينوى 2، البصرة 2)

وزارة التربية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجيتنا التخفيف من الفقر لعام 2012

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنظمة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق	
	تخصيص تمويل كاف ضمن الموازنة الاستثمارية التربوية حسب المراحل (اولوية للإلتحاق الحكومي الاستثماري التربوي) مع اولوية في تخصيص بناء وتأهيل المدارس المتوسطة والإعدادية في القرى والإحياء الفقيرة ووفق سقوف زمنية ملائمة	-المديرية العامة للتخطيط التربوي -الابنية المدرسية	المديريات العامة للترية ووزارة التخطيط	الموازنة الاستثمارية تخصيصات إستراتيجية من الفقر	140,000	كانون 2 2012	حزيران 2012	100%	28%	60%
	واجهت محافظات ديالى ، صلاح الدين ، كركوك ، نينوى تحديات البناء الجاهز (الكونكريتي) حيث تم فحص التربة في هذه المحافظات وتبين عدم نجاح البناء التقليدي فيها وتركها تحت خيل البناء الجاهز من خلال التعاقد مع شركات الكتل الكونكريتية والتي تمتلك قدرات متواضعة كون العراق جديد في هذا المجال									

- يشمل النشاط عدم وبناء (409) مدرسة طينية في محافظات بغداد (19)مدرسة، البصرة (1)مدرسة، هيسان(5)مدرسة،المنفى (15)مدرسة، ذي قار (106) مدرسة،الديوانية(45)مدرسة،واسط (26) مدرسة،بابل (10) مدرسة،ديالى (17) مدرسة،صلاح الدين (98) مدرسة، كركوك (29) مدرسة، نينوى (38)مدرسة (
- تم انجاز مدرستين في محافظتي البصرة وفي محافظتي بغداد /الكرخ الثالث

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المتفانية (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز التالي (9)	الاحكام والعواقب (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
1.1.4	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية للفقراء بوسائلها	وزارة الاعمار والإسكان		الموازنة الاستثمارية تخصيصات استراتيجيّة التخفيف من الفقر	10,900	ت 2012		100%	5%		نسبة الانجاز الفعلي تمثل تخصيص الارض واعداد الدراسات والمخططات والكلف التخمينية

- يشمل النشاط انشاء مجمعات سكنية للفقراء بوسائلها قليلة الكلفة في قطعة الارض المخصصة في محافظة الديوانية قضاء الشامية والتي تبلغ مساحتها (30) دونم وبواقع (175) دار
- تم الإعلان عن المشروع بتاريخ 15/10/2012

وزارة الاعمار والإسكان

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012

محافظة بابل

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المتفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)	نسبة الانجاز المالي (9)	الملاحظات والمعوقات (10)
						البدء	الانتهاء			
1.1.4	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية للفقرى بمواصفات قياسية (الكلفة: 1)	المحافظة	وزارة التخطيط	موازنة الاستثمارية تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر	18,000	1 ك 2012	حزيران 2015	3%	100%	- تأخر تنفيذ المشروع (تصاميم وإنشاء دور واطلة الكلفة مع الخدمات الأساسية) في المحافظة بسبب تخصيص الأرض وإعادة الإعلان أكثر من مرة وذلك لعدم تقديم المواصفات المناسبة من قبل الشركات -نسبة الانجاز المتحقق 3% من عمر المشروع والتي تمثل تخصيص الأرض ومرحلة تهيئة الدراسات والمخططات والكشوفات

1- مشروع بناء مجمعات سكنية للفقرى بمواصفات قياسية (الكلفة: 1) احيل الى شركة الفوا الهندسية بعد استكمال الموافقات على قطعة الأرض بمساحة 30 دونم في قضاء الحلة /ناحية ابي غرق /محافظة بابل..بعقد لمدة 30 شهراً لبناء 15 عمارة وبواقع 180 شقة، حددت مساحة الشقة بـ 100 م². سيتم بناء بناية لإدارة المجمع بالإضافة للخدمات الأساسية (روضة عدد 1)، حمامات (1)، مسجد، طرق وساحات، شبكة مجاري مع محطات المعالجة، انارة. اما خدمات (إيصال الماء الصالح للشرب) فهي مرتبطة مع نشاط إنشاء دور واطلة الكلفة من تخصيصات موازنة تنمية الاقاليم في نفس الناحية المذكورة انفا.

محافظة كركلاء

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الاتجاهات والموقات (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
2.2.4	اتخاذ اجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لهذه المشاريع (بناء الوحدات السكنية قديلة الكلفة)	المحافظة	- الوزارة - الدوائر - الخدمات في المحافظة	موازنة استثمارية تخصصيات استراتيجيه التخفيف من الفقر	27816	ايلول 2012	مستمر	100%	3%		الجزء الثاني من النشاط كان مشروع البنى التحتية لمنطقة الشرفيات / ناحية الحسينية لكن وبسبب اعتراض دائرة الاثار عليه فانتحت محافظة كركلاء وزارة التخطيط لتبديل مشروع البنى التحتية لمنطقة الشرفيات ناحية الحسينية الى مشروع (البنى التحتية لجمع دور قديلة الكلفة عدد 1000 دار) وتم تدويره الى عام 2013

وينقسم النشاط الى :

1- تنفيذ مشروع في قرية الزكاريط ويشمل :-

- أ- تنفيذ شبكة مجاري مع محطة المعالجة في قرية الزكاريط بكلفة (3.990) مليون دينار واعلن عن المشروع بتاريخ 19/9/2012. وتم التعاقد بكتاب قسم العقود 18795 في 19/11/2012 ويجري حاليا استكمال المخططات والتصاميم الخاصة بشبكات المجاري النقية والامطار وتصاميم وحدة المعالجة واعداد جداول الكميات. لصاقتها من قبل المركز الاستشاري
- ب- تنفيذ بناية لقر صيانة مع تنفيذ شبكة اياه الصحي لقرية الزكاريط بكلفة (224) مليون دينار. والشروع في طور الاعلان .
- ج- تنفيذ شبكة كهرباء في قرية الزكاريط بكلفة (352) مليون دينار .
- د- تنفيذ مركز صيانة للكهرباء في قرية الزكاريط بكلفة (1.671) مليون دينار .
- هـ - تنفيذ شبكة اتصالات في قرية الزكاريط بكلفة (3.958) مليون دينار .
- ح- تنفيذ الطرق لقرية الزكاريط بكلفة (5.621) مليون دينار
- 2- انشاء البنى التحتية لجمع دور قديلة الكلفة (1000) دار وكلفة (12.000) مليون دينار تم المصادقة على المشروع من قبل مجلس محافظة كركلاء بقرارهم الرقم 122 في 9/9/2012

محافظة واسط

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المتقدمة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز التالي (9)
						البناء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق	
1.1.4	تنفيذ مشاريع لبناء (1) المجمعات السكنية للعقراء بمواصفات قياسية الكلفة	المحافظة	وزارة التخطيط	موازنة استثمارية تخصصيات استراتيجية التخفيف من الفقر	35.000	اب 2012	نيسان 2013	48%	100%	
										- المشروع ممدود الى عام 2013 - خصص مبلغ (11.9) لعام 2012 لبناء مجمع سكني يتكون من 284 وحدة سكنية (شقة) في مدينة الكوت (مجمع الكرامات السكني) - تم الاعلان بتاريخ 15/8/2012 - تم توقيع العقد بتاريخ 9/18/2012 مع شركة بمدة تنفيذ 180 يوم - تمت المباشرة بتاريخ 7/10/2012 - تم صب اسس 20 بناية من اصل 71 - نسبة الانجاز المحقق لعام 2012 هي 58% ، و نسبة الانجاز الفعلي المتحقق 48% من عمر المشروع - توقف العمل للفترة 19 - 11/28/2012 بسبب الامطار

يتم حاليا مشروع المجمعات السكنية للعقراء في قضاء الكوت كمرحلة أولى حيث خصصت ارض بمساحة (500) دونم في قضاء الكوت. وخصصت ايضا الاراضي لباقي الوحدات الادارية وبالتنظر المحصول على تصاميم وكشوفات لوحات واطن الكلفة و استدرج عروض من قبل شركات الوزارات المختصة في بناء الوحدات السكنية قليتا الكلفة عدا قطعة ارض قضاء العزيزية وقضاء شيخ سعد التي تمر بقنوات بانتظار استحصال الموافقات.

محافظة صلاح الدين

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الاحصاءات والعمقات (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
2.1.2	بناء مراكز رعاية صحية أولية مجهزة إنشاء بيوت صحية عدد (20)	- المحافظة - دائرة الصحة - دائرة التخطيط والمتابعة	- المحافظة - دائرة البلديات - دائرة الصحة	الاستثمارية تخصصات إستراتيجية التخفيف من الفقر	2.000	حزيران 2012	شباط 2013	100%	80%	100%	

تم تخصيص (20) قطعة ارض لبناء البيوت الصحية موزعة على الاقضية (الطوز، الحجيل، تكريت، الشرقاط، سامراء، بييجي)

- بدأ العمل بتاريخ 28/6/2012.
- يتكون كل بيت صحي من (كرفان مزود بأجهزة تبريد محاط بسياج ويحتوي على مولد كهرباء)
- تم التنسيق مع دائرة صحة صلاح الدين لتزويد البيوت الصحية بالكوابل والأجهزة وبعض الأدوية
- تم انجاز (16) بيت صحي

محافظة صلاح الدين

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (9)		نسبة الانجاز المالي (9)	ملاحظات والموقات (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
1.1.1	توفير وأداهم البنى التحتية المأمعة للإنتاج والتسويق (إنشاء طرق زراعية بطول 30 كم)	- المحافظة - مديرية الطرق والحسور - دائرة التخطيط والتابعة	- دائرة الزراعة - دائرة البلديات - المجلس المحلي	الموازنة الاستثمارية تخصصات إستراتيجية التخفيف من الفقر	3.300	حزيران 2012	نيسان 2013	100%	72%	100%	بعض المشاريع تأخرت بسبب الأوضاع الأمنية وهطول الأمطار الغزيرة

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجيات التخفيف من الفقر لعام 2102

تاريخ المباشرة 2012/6/7 وفيما يأتي نسب التنفيذ لكل مشروع :-

1. طريق مطيبقة - حمزين (12) كم / نسبة الانجاز الفعلي (30%) توقف المشروع لدواعي أمنية لفترة زمنية واستأنف العمل في شهرت 2 بعد حل اغلب المواقف
2. طريق قرية الشهيد عبد الله جبارة (3) كم / نسبة الانجاز الفعلي (50%)
3. طريق قرية سلمان مكحول (3) كم / نسبة الانجاز الفعلي (50%)
4. طريق الشهيد ضامن بطول (3) كم / نسبة الانجاز الفعلي (100%)
5. طريق بسطامي - جردعلي- بروجلي- ابو حسن بطول (5) كم / نسبة الانجاز الفعلي (100%).
6. طريق قرية النبع سليمان بيك بطول (2) كم / نسبة الانجاز الفعلي (75%)
7. طريق قرية قره ناز - امري (2) كم / نسبة الانجاز الفعلي (100%)

محافظة صلاح الدين

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	الكلية الكليته مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الملاحظات والمواقف (10)
						البداية	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
1.1.1	استيراد ابقار حلبب هولندية مهجنه عدد (800) توزع على الأراامل	المحافظة		الموازنة الاستثمارية تخصصات إستراتيجية التخفيف من الفقر	4.900	حزيران 2012	أيلول 2012	100%	100%	100%	-تم اخذ تعهد خطي من الأراامل بعدم بيع البقرة لمدة 5 سنوات -حدثت (3) حالات وفاة مسجله وتم توعيتها من قبل الشركة المجهزة

- تم التعاقد من قبل محافظة صلاح الدين مع شركة عراقية لتجهيز (800) بقرة لتوزيعها على الأراامل ذات الدخل المحدود وتم التوزيع بإشراف رؤساء الوحدات الإدارية المشمولة وممثل عن دائرة الثروة الحيوانية

- أعدت لجنة لتوزيع الأبقار على الأراامل وفق استمارة مضافة، بالاعتماد على نسبة الأراامل والمستوى المعاشي وعدد الأطفال للأراامل في كل وحدة ادارية وزعت كالاتي :-

1. قضاء تكريت/العلم العدد (85)بقرة
 2. قضاء الطوز (امرئي) - سليمان بيك - مركز القضاء (120)بقرة .
 3. قضاء سامراء(مركز سامراء - ناحية المعتمد - ناحية دجلة) العدد(160) بقرة
 4. قضاء بلد (الضالعيتي - الاسحاقني - يثرب) العدد(115) بقرة .
 5. قضاء بيجي (مركز قضاء بيجي -الصينيتي) العدد(90)بقرة .
 6. قضاء الدور العدد (45) بقرة .
 7. قضاء الشرفاط العدد(120) بقرة .
 8. قضاء الدجيل العدد(65)بقرة .
- بتاريخ 2012/9/30 تم تجهيز كافة الاقضية
 - الايقار من النوع العربي الهجين والذي يلائم الأجواء لعراقية

محافظة صلاح الدين

خلاصة متابعة تنفيذ الاستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

ملاحظات والعوقات (10)	نسبة الانجاز المالي (9)	نسب الانجاز (%)		مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية مليون دينار (6)	التمويل (5)	الجهات الساندة (4)	الجهة المنفذة (3)	أسم النشاط (2)	وزن النشاط (1)
		الفعلي او المتحقق	المخطط الكلي	الانتهاء	البناء						
هناك موقوفات في بعض الوحدات الادارية في استملاك الأراضي (نزاعات ملكية متجاوزين)	100%	77%	100%	نيسان 2013	حزيران 2012	2,400	الموازنه الاستثمارية تخصيصات استراتيجيه التخفيف من الفقر		المحافظة	تنظيم الأسواق في الأحياء الفقيرة	3.3.4

- النشاط مكون من (8) أسواق شعبية في كافة الأقسية كل سوق شعبي مكون من (32) ادكان وباحة داخلية ومصلى ومرافق صحية كافة كل سوق (300) مليون دينار بدأ عمل النشاط بتاريخ (22/6/2012)
 1. نسبة الانجاز الفعلي المتحقق في قضاء الدجيل/تل مسكين (50%) تمثل (صب السقف) /نسبة الانجاز المالي (100%)
 2. نسبة الانجاز الفعلي المتحقق في قضاء بلد /شطيطة (100%) تم المباشرة بتاريخ 9/18 بسبب تاخير تسليم القطعة / نسبة الانجاز المالي (100%)
 3. نسبة الانجاز الفعلي المتحقق في قضاء سامراء جبيرية3 (80%) تمثل (تأسيس كهربائيات +بياض الجمان) /نسبة الانجاز المالي (100%)
 4. نسبة الانجاز الفعلي المتحقق في قضاء الدور (100%) /نسبة الانجاز المالي (100%)
 5. نسبة الانجاز الفعلي المتحقق في تكريت (القادسية/ قرية ديوم) - (100%) /نسبة الانجاز المالي (100%)
 6. نسبة الانجاز الفعلي المتحقق في بييجي (قرية سيد غريب) (100%) /نسبة الانجاز المالي (100%)
 7. القطعة السابعة (قضاء الطوز/ امرلي) تاخر استلام قطع الأرض الى تاريخ (11/11/2012) بسبب مشاكل في استحصال الأرض (نزاعات ملكية) نسبة الانجاز الفعلي المتحقق (20%)
 8. القطعة الثامنة (قضاء الشرقاط/ قرية جميل) تم استلام الأرض وتوقف العمل لوجود مشاكل امنية (نزاعات عشائرية) وبدأ العمل من جديد في نهاية شهر ايلول بعد حل اغلب المشاكل نسبة الانجاز الفعلي (70%) تمثل (صب السقف + تأسيس الكوربات) نسبة الانجاز المالي (100%)

محافظة الدوالية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز التالي (9)	الملاحظات والعواقب (10)
						البدء	الانتهاء	الخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
1.1.4	تنفيذ مشاريع لبناء (1) المجمعات السكنية للفقراء بخواصات قبايلة الكلفة (بناء مجتمعات سكنية افقية)	المحافظة	وزارة التخطيط	موازنة استثمارية تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر	4.000	تاريخ توقيع العقد	240 يوم بعد تاريخ توقيع العقد	100%	100%	—	تم تخصيص الارض واعلن عن المشروع ، واحيت عروض الشركات المتقدمة الى لجان التحليل المختصة لغرض دراستها ورفع التوصيات بشأنها
1.1.4	تنفيذ مشاريع لبناء (2) المجمعات السكنية للفقراء بخواصات قبايلة الكلفة (بناء مجتمعات سكنية عمودية)	المحافظة	وزارة التخطيط	موازنة استثمارية تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر	4.000	تاريخ توقيع العقد	240 يوم بعد تاريخ توقيع العقد	100%	100%	—	تم تخصيص الارض واعلن عن المشروع ، واحيت عروض الشركات المتقدمة الى لجان التحليل المختصة لغرض دراستها ورفع التوصيات بشأنها

- 1- بناء وحدات سكنية (افقية) قبايلة الكلفة في مركز المحافظة في منطقة ام العباسيات مقاطمة (5).
- 2- بناء وحدات سكنية (عمودية) قبايلة الكلفة في مركز المحافظة في منطقة ام العباسيات مقاطمة (5)

محافظة الديوانية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التحويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	ملاحظات والملاحظات (10)
						البدء	الانتهاء	المتحقق	المخطط الكلي		
3.3.4	تنظيم الاسواق في (1) الاحياء الفقيرة	المحافظة	وزارة التخطيط	موازنة استثمارية تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر	2,000	تاريخ توقيع العقد	15%	100%	240 ولدة يوم	---	- احيت الاكشاك الى احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن - تأخر توقيع العقد بسبب امتراض احدى الشركات المتقدمة على المعاهدات مما أدى الى تدخل الرقابة المالية والتي قامت بالتدقيق، والمحافظة حالياً بانتظار اطلاق الصرف لغرض اكتمال اجراءات التعاقد
1.1.1	توفير وادارة البنى التحتية المصممة للإنتاج (تأهيل معمل التجارة) (2)	المحافظة	وزارة التخطيط	موازنة استثمارية تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر	1,900	تاريخ توقيع العقد	---	---	---	---	- توجد مشاكل مع وزارة البيئية، كون موقع العمل داخل التصهيم الاساس للمحافظة - وتجري حالياً محاولة استحصال استثناء من وزارة البيئية لإعادة تأهيله

1- بناء (400) كمش، توزع (200) كمش في مركز المحافظة، في منطقتي ام العباسيات ومطبعة (5) و(200) كمش في باقي الوحدات الادارية للمحافظة.

2- تأهيل معمل التجارة التابع لديوان المحافظة الواقع ضمن مركز المحافظة.

محافظة المنى

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنبذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الاحداث والمواقات (10)
						البدء	الانتهاء	الخطط الكلية	الفعلي او المتحقق		
1.1.4	تنفيذ مشاريع لبناء (1) المجمعات السكنية للفقره بمواصفات قياسية الكلفة	المحافظة	- وزارة التخطيط - دائرة الاسكان - دائرة البلديات - عقارات الدولة - دائرة العقود	موازنة استثمارية تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر	45.000	ايلول 2012	1 تم 2014	100%	5%	—	تم الاعلان عن المشروع وتم تحليل العطاءات وقد رسي العطاء على احدى الشركات وبانتظار موافقة المحافظ عليها

1- مشروع بناء (1000) وحدة سكنية موزعة على الاقضية والنواحي (مدينة السماوة (350)، والرميثة (140)، والنخضر (110)، والسلمان (35) والنواحي (الوركا (80)، والمجد (50)، والسوير (60) والدرجي (25)، والكرام (30)، والنجي (40)، البصية (35)، والهلال (45)) وحسب الكثافة السكانية فيها.

ملحق (2)

استثمارات متابعة أنشطة الوزارات والمحافظات من خطط
تنمية الوزارات والمحافظات لعام 2012

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الالاحقات والمعوقات (10)
						البداية	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
1.3.1	تنفيذ زيارات تفتيش ومراقبة حسن تطبيق قانون العمل والضمن الاجتماعي لمراقبة بيئة العمل اللائق	- قسم تفتيش العمل - اتحاد نقابات العمال - اتحاد الصناعات	القضاع الخاص ، منظمات المجتمع المدني	موازنة جارية	مليون دينار (6)	2012 ك	2012 ك	100%	100%	9	تم زيادة عدد المفتشين وزيادة عدد السيارات حيث تم تاجير سيارات تستخدمها اللجان التفتيشية لتنفيذ النشاط تجاوز تنفيذ زيارات التفتيش عن السقف المخطط والبالغ (24000) حيث بلغ عدد الزيارات المنفذة (25686) زيارة من قبل فرق التفتيش لأصحاب العمل والمقارن المشمولين بأحكام قانون العمل والضمن الاجتماعي لمراقبة بيئة العمل اللائق وقد كان عدد المؤسسات التي طبقت القانون ما يقارب (21283) مؤسسة، أما بالنسبة للمؤسسات التي لم تحلق القانون توجه لها ائثار وبعد مرور عشرة ايام تحال الى محكمة العمل لأصدار قرار بما يعرامه او الحس لأصحابها

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساعدة (4)	التمويل (5)	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	ملاحظات والمواقف (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
2.3.1	تضمين قانون العمل فقرات مرتبة حول تحديد الحد الأدنى للأجر ليتناسب مع خط الفقر.	لجنة لدراسة الحد الأدنى للأجور في وزارة العمل وبرئاسة دائرة العمل وعضوية ممثلي اتحاد نقابات العمال واتحاد المصناعات العراقي.	- اتحاد رجال الاعمال والقطاع الخاص .	الموازنة الجارية	---	2 2012	1 2012	70%	100%		تم عقد (4) اجتماعات بتاريخ 8/8/2012 - 12/2/2012 - 8/4/2012 - 3/9/2012 اجتماعات مستمرة ودورية وتم رفع توصيات اللجنة بشأن المقترح الجديد للحد الأدنى للأجور الى امارة مجلس الوزراء - صدور التعديل الاول لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 الرقم (77) لسنة 2012 المادة (4) ذاتياً تحديد الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن الحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم الدرجات الوظيفية للموظفين - تم اعداد توصية لزيادة الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر الى (250000) دينار شهرياً وفق اخر اجتماع للجنة تحديد الاجور ورفع هذه التوصية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء للمصادقة عليها .

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الملاحظات والعيقات (10)
						البدء	الانتهاء	المنعقد او المتحقق	المخطط الكلي		
3.3.1	تعريف العاملين الذين يستلمون الحد الأدنى من الأجر بحقوقهم في رفع الأجور لتوافق مع خطط الفقر	فرق تفتيش العمل في دائرة العمل قسم الاعلام	- الاتحاد العام لتقنيات العمل - وسائل الاعلام	الموازنة الجارية	—	1 تم 2012	2 تم 2012	100%	100%		<p>- يتم بث التوعية والتوجيه بين صفوف العاملين لدى أصحاب العمل والعمال خلال الزيارات التفتيشية اليومية لفرق التفتيش والتي تضم في عضويتها ممثلي اصحاب العمل والعمال</p> <p>- ينفذ هذه الزيارات فرق تفتيش ووزارة العمل حيث يقوم الفريق بتعريف العاملين بحقوقهم ومراقبة بيئة العمل اللائق في الزيارة ذاتها وقد نفذ الفريق (25686) زيارة من العدد المخطط (24000)</p> <p>زيارة لعام 2012، كما يتم توزيع دليل التفتيش على المشاريع المفتشة، وقد تم تنفيذ (3) لقاءات تعريفية في القضايا المتفرقة حول الموضوع</p>

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسب الانجاز المالي (9)	الملاحظات والوقفات (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
4.3.1	تشخيص وحدة في مكاتب التشغيل في جميع المحافظات يستطيع العاملون باجر مراجعتها عند عدم التزام أرباب العمل بالقانون	التفتيش في الشركات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	- الاتحاد العام لتقنيات العمل - وسائل الاعلام	الموازنة الجارية	-	1 تم 2012	2 تم 2012	100%	100%		الوحدة موجودة في قسم التفتيش المركزي في مقر دائرة العمل وشعب التفتيش في المحافظات وهي (15) شعبية، وعملها مستمر في زيارة ومقابلة اصحاب العمل والعمال، إذ تتلقى الوحدة شكاوى او الابلاغ عن اصابات العمل وتقوم لجان محددة بالتحقيق في هذه الحالات وقد بلغت هذه الشكاوى لحد تاريخ اصدار التقرير 50 شكوى وتشترك وزارة العمل في اللجان التفتيشية
											- تقوم اللجان التفتيشية بزيارة موقع العمل ومن دون ذكر الشخص المشتكى ويتحول صاحب العمل الى الاجراءات القانونية او محكمة العمل في حالة مصداقية الشكوى وان نسبتها الانجاز هي من المخطط لهذا العام

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة الممولة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	ملاحظات والمواقف (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
1.4.1	قيام مكاتب التشغيل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل	دائرة العمل والتدريب المهني	- القطاع الخاص - المنظمات الدولية - هيئة الاستثمار	موازنة جارية	---	1ك 2012	2ك 2012	100%	100%		- تم مضاعفة جهود الاستقصاء من قبل الوزارة للحصول على عدد من فرص العمل المتاحة - تم تنفيذ (4346) زيارة لقطاعات العمل الخاص المختلفة لغاية نهاية عام 2012 للحصول على فرص عمل لتشغيل العاطلين المسجلين حيث تم الحصول على (6581) فرصة عمل خلال الفترة المذكورة وترشيح العاطلين اليها وان نسبة الانجاز هي من المخطط لهذا العام

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة اكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز التالي (9)	الاحداث والمواق (10)
						البدء	الانتهاء	الخطط اكلية	الفعلي او المتحقق		
1.6.1	تنظيم حملات توعية للفقرء لالاتحاق بالراكز وبرامج التدريب	- دائرة العمل والتدريب المهني - اعلام الوزارة	- اتحاد نقابات العمال - اتحاد الصناعات العراقية - هيئة الاعلام - القطاع الخاص	موازنة جارية	—	1 2012	2 2012	100%	100%		يجري نشر الوعي الاعلامي من خلال وسائل الاعلام المختلفة وطبع الفولدرات والبوسترات وتعميم الدليل التدريبي المتضمن مواقع التدريب والفعاليات التدريبية. اذ يجري التنسيق والتعاون المستمر مع المجالس البلدية ومنظمات المجتمع المدني للتوعية واستقطاب الفئات المستهدفة وذلك بتوزيع دليل التدريب لعام 2012 المعد من الدائرة على كافة الجهات المشر اليها في الفعالية، كما تم تعميم خطة تدريب عام 2012 على كافة الوزارات ومجالس المحافظات لغرض استقطاب المتدربين حيث تم تدريب (14380) متدرب من خلال (958) دورة في بغداد والمحافظات، كما شملت هذه الحملات توزيع بوسترات وشرائح ضوئية في شوارع بغداد اضافة الى تنفيذ اصلاحات لالاتحاق بمراكز التدريب وتوزيع بوسترات في جميع المناطق القريبة من مراكز التدريب وان نسبة الانجاز هي من الخطط لهذا العام

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الملاحظات والعوقات (10)
						البدء	الانتهاء	المتحقق	المخطط الكلي		
2.4.1	قيام مكاتب التشغيل ¹ بالتنسيق مع جهات التدريب وتأهيل وتعزيز مهارات العمل لدى الفقراء	دائرة العمل والتدريب المهني / مراكز التدريب المهني	- اتحاد نقابات العمال - اتحاد الصناعات - مجالس المحافظات - القطاع الخاص	موازنة جارية	---	1ك 2012	2ك 2012	90%	100%		تعقد دورات مهنية لتعليم الحاملين المسجلين في بغداد والمحافظات وتضم دورات (اللغة الانكليزية، الحاسبات، اللغة العربية) والتدريب المهني (التجارة، الحداة، تكييف، تبريد، كهرباء، صيانة، موبائل) - بلغ عدد المتخرجين من الدورات اعلاه و لغاية شهر تك 1 عام 2012 (14380) متدرجا من مجموع (16000) متدرجا ضمن الخططة
3.2.6	تبني نظام متابعة مستعمر لتتويع برامج تدريب النساء وتأهيلهن	دائرة العمل والتدريب المهني	القطاع الخاص. وزارة المرأة	موازنة جارية	---	1ك 2012	2ك 2012	67%	100%		- تم تحقيق (32) زيارة الى معظم المراكز المنتشرة في بغداد والمحافظات منها مراكز (الوزيرية، المصدر وحي اورو والشعلة والشعب) التابعة لمحافظة بغداد ومراكز كركوك، الموصل، الاناصرية، الرمادي، النجف، ديالى والعمل مستمر على طول السنة للزيارات وثمرت هذه الزيارات عن زيادة الاقبال على الدورات حيث بلغت زيادة الاقبال على الدورات حيث بلغت (8045) متدرجة

1 من خلال تنفيذ دورات تدريبية في مختلف الاختصاصات للفقراء ووفق احتياجات سوق العمل.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الاتجاهات والعمومات (10)
						البدء	الانتهاء	الخطوط الكلي	الفعلي او المتحقق		
2.2.6	صياغة اطر تعاون مع القطاع الخاص لبحثه على دعم برامج تأهيل مهنية في الريف العراقي	- دائرة العمل والتدريب المهني - قسم التدريب المهني	- اتحاد المصناعات - اتحاد ارباب العمل	الموازنة الجارية	—	1 تم 2012	2 تم 2012	50%	100%	—	- تم تشكيل لجنة عليا للتنسيق بين الوزارات (العمل، التربية، التعليم العالي) لتنظيم نشاطات التعليم والتدريب فيما يخص الاحتياجات التدريبية والنماذج والجودة مع مؤسسات القطاع الخاص -عمل اللجنة مستمر من اجل ايجاد آلية تشريعية لبحث القطاع الخاص على التعاون مع مراكز تدريب دائرة العمل لتحديد الاحتياجات التدريبية لهن سوق العمل
3.3.6	برامج توعية موجه للنساء لاسيما في الريف العراقي لالتزام بنظام الضمان الاجتماعي	دائرة العمل والتدريب المهني	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	الموازنة الجارية	—	1 تم 2012	2 تم 2012	100%	100%	—	تم التوعية من خلال الزيارات التفتيشية وتوزيع دليل التفتيش على النساء ومن خلال هذه الزيارات تم شمول (12996) امرأة فقيرة بالضمان الاجتماعي

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الوحدات الإدارية التابعة للدارة الرعاية الاجتماعية (4)	التمويل (5)	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الملاحظات والمعوقات (10)
						البدء	الانتهاء	الانجاز الفعلي او المتحقق	المخطط الكلي		
1.1.5	اتخاذ الاجراءات لاعتماد الالامركزية في ادارة شؤون شبكة الرعاية الاجتماعية	دارة الرعاية الاجتماعية / شبكة الرعاية الاجتماعية	الوحدات الإدارية التابعة للدارة الرعاية الاجتماعية / شبكة /شبكة الاجتماعية دائرة الصحة والسلامة المهنية مركز تنخيص العوق دائرة العمل والتدريب المهني	موازنة استثمارية	---	2 ت 2012	مستمرة	100%	100%	---	<p>- اقرت الصيغة الحالية في ادارة شؤون شبكة الرعاية الاجتماعية في المحافظات ان يكون التمويل والاعانة بصورة لامركزية من خلال تشكيل لجنة عليا لشبكة الرعاية الاجتماعية في المحافظات يكون رئيسها النائب الاول للمحافظ وتمنح لهذة اللجان صلاحيات التمويل والاعانة اما فيما يخص التخصصات المالية فهي مركزية وذلك لضمان عدالة التوزيع بين محافظات العراق وان هذا الاجراء هو الافضل والاضمن من وجهة نظر دائرة الرعاية لنا فسيتم الاستمرار بالعمل وفق هذا النهج لتقليل الاجراءات البيروقراطية علما ان الصلاحيات المنوطة لرؤساء اللجان عالية</p>

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساعدة (4)	التمويل (5)	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز التالي (9)	ملاحظات والمعلومات (10)
						البدء	الانتهاء	الفعلي او المتحقق	المخطط الكلي		
2.1.5	تطوير قاعدة البيانات للأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية وتحديثها بشكل مستمر	دائرة الرعاية الاجتماعية	البنك الدولي	منحة البنك الدولي	8 مليون دولار	حزيران 2006	نيسان 2013	90%	90%	90%	- لانجاز هذا النشاط تم تخصيص الحسابات والسيرفرات في جميع اقسام الدائرة في المحافظات وتم تفعيل الاشارة لنقل وتبادل المعلومات بين المحافظات والمركز بصورة الكترونية للمحافظات (بغداد، النجف، الديوانية، كربلاء، بابل، كركوك، واسط، المثنى، صلاح الدين) والعمل مستمر على باقي المحافظات
3.1.5	وضع برنامج لرفع القدرات لتأهيل وتدريب العاملين على حسن تطبيق نظام الشبكات	دائرة الرعاية الاجتماعية / قسم التخطيط	-وزارة التخطيط -وزارة المالية	موازنة جارية	5	1 تم 2012	2 تم 2012	90%	100%	—	تم وضع برنامج بمعدل عشر دورات في المجال القانوني والبحث الاجتماعي والحسابات والبرمجة وادخال البيانات والشؤون المالية لكن لم تتحقق جميعها بسبب قلة التخصيصات المالية ضمن موازنة 2012 للموفدين من المحافظات الى مقر الوزارة، اضافة الى ذلك يقوم قسم التخطيط بدوره في ادخال الكادر بدورات خارجية من خلال المركز الوطني للتطوير الاداري التابع الى وزارة التخطيط

1. يتضمن البرنامج اعداد مناهج تدريبية لرفع القدرات وتدريب العاملين على حسن الاداء الوظيفي وفي جميع الاختصاصات المطلوبة وخاصة التدقيق والاحصاء والمالية وادخال البيانات والبحث الاجتماعي وقد شمل البرنامج دورات للباحثين الاجتماعيين، قانونيين، مدخلي بيانات، مهندسين، مبرمجين في المركز والمحافظات لغرض تطوير قدراتهم

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجيات التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	ملاحظات والمعوقات (10)
						الانتهاء	البدء	الفعلي او المتحقق	المخطط الكلي		
4.1.5	وضع تقارير أنظمة رقابية صارمة على آليات العمل وتنفيذ القانون من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية	دائرة الرعاية الاجتماعية / شبكة الحماية الاجتماعية - قسم -القانونية- قسم التدقيق -لجنة مكافحة الفساد	-هيئة النزاهة -ديوان الرقابة -الفتش العام	موازنة جارية	---	1 2012	2 2012	85%	100%	---	- تم تنفيذ زيارة تفريقية تفهيمية في بغداد والمحافظات (عدا اقليم كردستان) حيث تكون الخطة زيارة المحافظة كل فصل، اي تنفيذ (60) زيارة في السنة لتابعة الامور المالية ، والية عمل الشبكة وتدقيق المبالغ المسترجعة من المتجاوزين وتدقيق الاضابير والبيانات المدخلة على برنامج الشبكة وتقوم اللجنة بتحديد اعداد المتجاوزين على الشبكة وبعدها اتخاذ الاجراءات اللازمة باسترداد الاموال وحالتهم الى القضاء ولم يتم تحقيق جميع الزيارات التفهيمية الى اقسام الرعاية في المحافظات قللت الكادر المتخصص وعدم توفير تخصيص مالي على حساب الانفاق

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الاحداثيات والمواقف (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
6.1.5	تصميم برنامج إعلامي موجه للمواطنين لتوعيتهم بحقوقهم وشروط الشمول والعقوبات الرادعة في حالة التجاوز على الشبكة	قسم الاعلام في دائرة الرعاية الاجتماعية	- الفضائيات والمجلات والصحف المحلية والإذاعات	موازنة جارية	6	1 تم 2012	2 تم 2012	90%	100%		<p>- اجراء (1500) حملة اعلامية تهدف الى نشر الوعي بين الفئات المستهدفة لاجابة الشبكة</p> <p>- يتم استقبال شكاوى المواطنين بمعدل (50) شكوى يوميا ويتم الاجابة عليها خلال (48) ساعة</p> <p>- اجراء (66) لقاء تلفزيوني وصحفي في المحافظات ضمنها محافظة البصرة وذي قار وكربلاء</p> <p>- من خلال الحملات الاعلامية وبالتنسيق مع مكتب معالي وزير العمل تم احالة (483) معاملة بصورة مباشرة لاكمال اجراءات الشمول</p> <p>- تم طبع مطويات وكتب وكراس تعريفي وتوزيعها على الوزارات وعلى مجالس المحافظات وبعدها (1000) تكل منها، وان نسبة الانجاز من المخطط لهذا العام</p>

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الاحتياجات والمواقف (10)
						البدء	الانتهاء	المنفذ او المتحقق	المخطط الكلي		
2.3.3	إعادة النظر بقانون وتعليمات شبكة الحماية الاجتماعية بما يضمن تسجيل ومواطنة أطفال الأسر المشمولة	دائرة الرعاية الاجتماعية	مجلس شوري الدولة	موازنة استثمارية	—	أيلول 2011	—	70%	100%	—	تمت المصادقة على القانون من مجلس شوري الدولة حديثاً وبانتظار عرضه على مجلس النواب

وزارة التربية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الملاحظات والعوقات (10)
						البدء	الانتهاء	الفعلي او المتحقق	المخطط الكلي		
5.1.3	إعادة النظر بهام قسم الإعلام التربوي لخلق الوعي بأهمية الالتزام بالتعليم الإلزامي	الديريّة العامة للعلاقات الثقافية	القنوات الفضائية و منظمات المجتمع المدني	الموازنة الجارية	88	أيلول 2012	فبراير 2013	15%	100%	8%	سيتم النظر بهام الإعلام التربوي عند إعداد نظام الوزارة الجديد وجعله أكثر فاعلية وخاصة في مجال توعية المجتمع بأهمية التعليم وبناء ثقافة تربوية طموحة من خلال عقد الندوات واللقاءات مع المواطنين والحث على الاستمرارية والانتظام بالدوام في المارس وتشجيع المواطنين على التعلم وتثقيفهم للتهوض بالمجتمع والتركيّز على تعليم الفتيات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الاهتمام بالتربية والتعليم وبمشاركة القنوات الفضائية والصحف بالإضافة الى المصققات والبوسترات وقد تم عقد 40 ندوة بواقع ندوتين في كل مديرية عامرة للتربية بالإضافة الى الندوات التي تعقدتها المنظمات

وزارة التربية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الملاحظات والمعلومات (10)
						البدء	الانتهاء	الفعلي او المتحقق	المخطط الكلي		
1.1.3	تعديل المادة (34/اولا) من الدستور لدم الزامية التعليم الى المرحلة المتوسطة (الثالث المتوسط)	المديرية العامة للتربية	الجهات الساندة	التمويل	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	البدء	الانتهاء	الفعلي او المتحقق	المخطط الكلي	نسبة الانجاز المالي (9)	بينت وزارة التربية عدم الحاجة الى تعديل المادة في الوقت الحاضر كون الوزارة لها صلاحيات ضمن قانون الوزارة لدم الزامية التعليم وهي ماضية في تحقيق هذا الهدف وان التعديل يتطلب اجراءات كثيرة
2.1.3	تكوين قاعدة بيانات للغة العمرية المشمولة بالتعليم الازامي وفق التوزيع الجغرافي وتحديد بها باستمرار، وبالتركيز على المناطق الريفية والفقيرة لتسهيل متابعة الاسر المشمولة	المديرية العامة للتخطيط التربوي	المديريات العامة للتربية والتعليم العام والمحاسن والمحلية	الموازنة الجارية	22	تشرين 1 2011	اب 2012	100%	100%	100%	يشمل النشاط اعداد استمارة احصائية وتوزيعها على المدارس كافة تتضمن بيانات عن الطلبة والعلميين والابنية حسب البنية والجنس ولاصغر وحدة ادارية وهذه البيانات تحدد سنويا
3.1.3	برنامج شراكة مع منظمات المجتمع المدني وكذلك الوزارات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ الزامية التعليم	-وزارة التربية -وزارة الدورات تشؤون منظمات المجتمع المدني	المديريات العامة للتربية ومحاسن المحافظات	الموازنة الجارية	32	تشرين 1 2011	ايلول 2012	100%	100%	100%	يشمل النشاط التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتربية وتزويدها بالبيانات الإحصائية الخاصة بالمناطق الريفية حيث بلغت عدد المنظمات (103) وجميعها تعمل في مجال محو الأمية وتعليم الكبار

وزارة التربية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز التالي (9)	الملاحظات والمواقف (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
4.1.3	تفعيل العلاقة مع مجالس الالاء والعلمين وفق صيغة قانونية ومؤسسية ومعدة لنشر ثقافة التعليم الالزامي	-المديرية العامة -المديرية العامة للاشراف التربوي	- الشؤون القانونية - نقابة المعلمين - المديرية العامة للتربية	الموازنة الجارية	8	ايلول 2012	ايار 2013	100%	10%	5%	توجيه المديرية العامة للتربية في المحافظات كافة بتشكيل مجالس الالاء والعلمين وعقد الاجتماعات بواقع اجتماع واحد لكل شهر او اكثر عند الضرورة وقيام المشرفين التربويين والاختصاصيين بضمور تلك الاجتماعات وتقديم التقارير الالزامية والاطلاع على نصف سنوية الالاء التي تواجه المدارس خلال العام الدراسي ويستمر هذا الاجراء سنويا

1- تم تشكيل لجنة مشتركة لمديرتي التعليم العام والاشراف التربوي لتفعيل دور مجالس الالاء والعلمين وفق البنية الجديدة ليكون دوره فاعلا في سير العمل التربوي في المدرسة وتذليل الصعوبات التربوية بالتعاون والتنسيق مع الشرف التربوي للمدرسة و اولياء امور التلاميذ

وزارة التربية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التحويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز الاثالي (9)
						البدء	الانتهاء	الفعلي او المتحقق	المخطط الكلي	
6.1.3	تطوير نظام رصد ومتابعة المتسربين ضمن فترة التعليم الإلزامي وفق البرامج الخططة السنوية لوزارة التربية (فرق المديرية العامة للتعليم)	المديرية العامة للتخطيط التربوي - المديرية العامة للتعليم	المديريات العامة للتربية والمجالس المحلية	الموازنة الجارية	39	1 كانون 2011	نيسان 2012	100%	100%	92%
1	تطوير نظام رصد ومتابعة المتسربين ضمن فترة التعليم الإلزامي وفق البرامج الخططة السنوية لوزارة التربية (فرق المعلمين الميدانية، اعتبار تقليص فرص التسرب معيارا للكفاءة... الخ)	المديرية العامة للتعليم	المجالس المحلية	الموازنة الجارية	39	1 كانون 2011	نيسان 2012	100%	100%	92%

1- بلغ عدد المتسربين للعام الدراسي (2010-2011) (70639) تلميذ وتلميذة وتم اعادة (30%) اما في العام الدراسي (2011-2012) فقد بلغ عدد المتسربين (75825) تلميذ وتلميذة والعائدين منهم (23483) التلميذ وتلميذة بنسبة اعادة (31%)

وزارة التربية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة الاستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنظمة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الإحاطات والمؤقات (10)
						البدء	الانتهاء	المتحقق	المخطط الكلي		
1.4.3	إعطاء أولوية في توزيع الخدمات التربوية ذات العلاقة بكفاءة التعليم (مختبرات وسائل تعليمية... الخ) للنواحي والمناطق والأحياء الفقيرة	- المديرية العامة - المديرية العامة للمناهج		الموازنة الجارية	لا يحتاج الى تمويل	ايار 2012	تشرين 1 2012	100%	100%		قيام الوزارة برفد كافة المدارس وخاصة في المناطق الريفية والأحياء الفقيرة بالكتب الفهجية والطبوعات العلمية والقواميس والصادر الحديثة والأثاث المكتبي والصفى و أجهزة الحاسوب ولوازمها والأجهزة المختبرية والوسائل التعليمية من مصورات وخرائط وتجهيز المختبرات بالواد المختبرية والأثاث وهناك خطة لمصاعف حصص المدارس في الأحياء الفقيرة والريفية وسد الحاجة من المعلمين والدرسين بطريقة تسوية الملاكات التعليمية والتدريسية قبل بداية العام الدراسي (2013-2012) وهذا الاجراء يتبع سنويا نسبة الانجاز 100%امن المخطط السنوي لعام 2012

وزارة التربية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة الممولة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز التالي (9)	الإلاحتات والمواق (10)
						البدء	الانتهاء	الفعلي او المتحقق	المخطط الكلي		
1.5.3	سن قانون محو الامية الازلامي	وزارة التربية	-المديريات العامة للتربية والشؤون الاجتماعية-وزارة والدفاع والمالية	الموازنة الجارية والاستثمارية	28 مليار دينار + 56 مليار دينار المصاغة لبناء مراكز محو الامية	كانون 2011	اذار 2012	100%	100%	100%	تم اصدار قانون محو الامية رقم 23 لسنة 2011 والتعليمات لتسهيل تنفيذه لسنة 2012 وتقوم الوزارة بالاستعداد لإطلاق حملة محو الامية وذلك بتهيئة الإحصاءات الخاصة بالأشخاص الاميين ووضع الخطط لتحديد الحاجة من مراكز محو الامية وتهيئة المعلمين الالزامين بالاضافة الى الكتب المنهجية والقرطاسية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني (ويستمر لمدة اربع سنوات)

وزارة التربية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012

رمز النشاط (1)	أسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساعدة (4)	التحويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز التالي (9)	الملاحظات والمعوقات (10)
						البدء	الانتهاء	الانجاز الفعلي او المتحقق	المخطط الكلي		
1.2.3	إنشاء قاعدة معلومات عن توزيع المناطق الفقيرة تروبويا (جغرافيا واداريا) وفقا لدرجة الحرمان من المدارس المتوسطة والاعدادية	المديرية العامة للتخطيط التربوي	- المديرية العامة للتعليم العام - المديرية العامة للتربية في المحافظات	الموازنة الجارية	5	1 تشرين 2012	1 ايار 2012	100%	100%	100%	إنشاء قاعدة بيانات تتضمن عدد الطلبة والعلميين والمدارس في المناطق الريفية للعام الدراسي 2011/2012 واستخراج المؤشرات التربوية ومقارنتها مع نفس المؤشرات في المناطق الحضرية لبيان الفرق وبالتالي يمكن تحديد درجة الحرمان وتقوم الوزارة بهذا الاجراء سنويا اما بخصوص المناطق الفقيرة فسيتم إنشاء قاعدة بيانات منفصلة لها في عام 2013 بالاعتماد نتائج خارطة الفقر التي ينفذها الجهاز المركزي للإحصاء لسد احتياجات المناطق الفقيرة من الدراسات الميدانية والبشرية

1 - تقوم وزارة التربية بتنفيذ مشروع نظام الإدارة التربوية (emis 2004) الذي يتضمن كم هائل من البيانات حول المعلومات الأساسية للمدرسة والطالب

امانة بغداد

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التحويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز التالي (9)	الاحداث والمواق (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
1.2.2	القيام بحملات التوعية بالوسائل المرئية والسمعية والقروية والندوات (1)	مديرية العلاقات والاعلام /امانة بغداد		الموازنة الجارية		1 تم 2014	2 تم 2012	100%	100%		- انجز (48) برنامج تلفزيوني من المجموع الكلي (48) برنامج -نسبة الانجاز الفعلي هي 100% من المخطط السنوي لعام 2012
1.3.2	توسيع المشاريع لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة (2)	دائرة ماء بغداد		- موازنة استثمارية - تنمية الاقاليم	3,464	1 تم 2012	تموز 2008	57.5%	100%		- العمل مستمر في محطة 428 بنسبة الانجاز 85% (اما محطة 460 فقد تم سحب العمل ويتم الان التنفيذ مباشرة وبلغت نسبة الانجاز الفعلي 30%) -نسبة الانجاز الفعلي 57.5% من عمر المشروع
2.3.2	توسيع مشاريع الصرف الصحي (3)	دائرة مجاري بغداد		- موازنة استثمارية	2,433	1 تم 2012	حزيران 2010	100%	100%		- انجز العمل

- 1- يشمل النشاط اعمال على مدار السنة على القنوات (العراقية، الفيجاه، المسار، الرشيد، افاق، الديار) وصحيفه (صوت بغداد) ومجلة (اللق بغداد).
- 2- يشمل النشاط اعمال مد شبكة ماء لمحتي (460 ، 428) بلدية الشعلة.
- 3- يشمل النشاط انشاء احواس تفتيش بقطر 1800 ملم في شارع السعودي /بلدية الشعلة ومحطة ضخ على جانب مبزل الصقلاوية جهة الجوادين والرحمانية.

امانة بغداد

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز الاتي (9)	الاحداث والمعوقات (10)
						اليه	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
1.1.4	تنفيذ مشاريع لبناء المجمعات السكنية للفقره بمواصفات قليلة الكلفة (10*10) / (10*10)	امانة بغداد / دائرة المشاريع في الامانة		- موازنة استثمارية	4.765	نيسان 2010	مستمر				تم احالة تقرير لجنة الدراسة والتحليل وتوصياتها مع اوليات الدعوة وثاقها لغرض عرض الموضوع على الامانة العامة لمجلس الوزراء
1.3.4	تنفيذ مشاريع تبليط وازارة الطرق الودية الى الأحياء الفقيرة (2)	دائرة المشاريع في الامانة		- موازنة استثمارية - تنمية الاقاليم	18.734	ايلول 2012	حزيران 2013	82.2%	100%		- العمل مستمر من قبل الشركة المنفذة - نسبة الانجاز الفعلي 82.2% من عمر المشروع
3.3.4	تنظيم الاسواق في الأحياء الفقيرة (3)	بلدية الشعلة		- موازنة جارية تخصيص (المالرة)		نيسان 2011	نيسان 2012	100%	100%		تم الانتهاء من بناء السوق بقطاع استيعاب 73 دكان

- 1- يقع مشروع (10*10) ضمن قاطع مدينة الصدر 1. علما انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى من اعداد التصاميم مع شركة برود واي البريطانية ولدة 145 يوم
- 2- انجز مشروع تبليط وازارة شوارع القطاعات (2، 3، 12، 18، 19، 19، 20، 21، 20، 74، 83) ضمن قاطع بلدية الصدر 1؛ المصدر 2/ تنفيذ اعمال محلة 341 (ام الكبر-العز لان) ، واكساء محلات (464، 418 ، 420 ، 422 ، 524 ، 528) في الشعلة وما يزال قيد التنفيذ في محلة 428 بكلفة 5.563 مليون بنسبة انجاز فعلي 62% وفي محلة 573 بكلفة 4.894 مليون بنسبة انجاز فعلي 10% ومحلة 464 بنسبة انجاز فعلي 92% في الشعلة

3- سوق الشعلة الرابعة بمساحة 4650 م² / ضمن قاطع بلدية الشعلة .

المانحة بعداد

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التحويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الإنجاز (%) (8)		نسبة الإنجاز التالي (9)	الاحاطات والمواق (10)
						البدء	الانتهاء	الخطى الأعلى	الفعلي أو المتحقق		
4.3.4	توفير خدمات التخلص من النفايات (1)	دوائر البلدية		- الموازنة الجارية		1ك 2012	2ك 2012	100%	100%		- اجز العمل - نسبة الانجاز المتحقق 100% من الخطط لعام 2012 وهو سنوي - يفتد ملعب (5000) متفرج خلال 14 شهر حسب العقد - تم الانتهاء من ملعب خماسي في سدة مدينة الصدر قطاع 39 بنسبة 100% - نسبة الانجاز الفعلي 73% من عمر المشروع
5.3.4	أشياء نوادي رياضية وعلمية ومنتزهات عامة (2)	دوائر البلدية - دائرة التنزهات والتشجير والتشجير		- الموازنة الجارية - الموزنة الاستثمارية - تنمية اقاليم	12,357	1ك 2014	ادار 2011	73%	100%	59%	- إنشاء (3) روابط للتوعية ونشر ثقافة الوعي البلدي في المناطق الفقيرة
6.3.4	برامج توعية للفقر في المحافظات على البيئات الحيطية بالسكن (3)	دوائر البلدية/ قسم التوعية		الموازنة الجارية		1ك 2012	2ك 2011	100%	100%		

- 1 - خدمات التخلص من النفايات تشمل بلدية الشعلة، الصدر / 1، الصدر / 2 وعلى طول السنة وتعتبر من الاعمال الدورية اليومية بحيث تعد خطة من قبل البلدية في كل شهر وتحديد المعدات والمستلزمات للشهر المقبل وتم رفع 2807288 طن نفايات وهو الخطط الكلي السنوي لعام 2012.
- 2 - إنشاء ملعب بسعة (5000) متفرج وملعب خماسي في السدة واجهة قطاع 39 واخر بسعة (2000) متفرج ضمن بلدية الشعلة، ملعب خماسي في مدينة الصدر / 1 المناطق الفقيرة وا إنشاء منتزهات وساحات ضمن بلديات مدينة الشعلة والصدر / 1 والصدر / 2.
- 3 - إنشاء روابط توعوية للتوعية في المدارس والجامعات والمناطق السكنية وا إنشاء روابط (اصدقاء الامانة اسبوع الوعي البلدي، مؤتمر الوعي البلدي).

وزارة البلديات والأشغال العامة

خلاصة متابعة تنفيذ الأنشطة الاستراتيجية المتخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنظمة (3)	الجهات المساعدة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز التالي (9)	ملاحظات والعواقب (10)
						البدء	الانتهاء	الخطط الكلى	الفعلي او المتحقق		
1.3.2	توسيع المشاريع لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة (1)	- المديرية العامة للمساء - مديرية ماء المحافظات		الموازنة الجارية	37,642	تموز 2010 يناير 2014	72%	54%	100%		- تم الانتهاء من نصب (190) وحدة تحلية مياه . - تكلت الشركة المنظمة للمشروع في نصب وحدات التحلية المبتقنة وتم توجيه انذار الى الشركة المنظمة بموجب كتاب المديرية العامة للماء الرقم م/س/17826 في 31/10/2012 -توجد وحدات تحلية بعدد (72) وحدة في مديريات ماء المحافظات (واسط، البصرة، الأنبار) لم يتم نصبها بسبب عدم تهيئتها الواقع من قبل المديريات اعلاه . وما تبقى (88) وحدة تحلية قيد التنفيذ -نسبة الانجاز الفعلي المتحقق 54% من عمر المشروع .

1 - يشمل هذا النشاط إنشاء (350) وحدة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية في القرى والارياف في عموم المحافظات وزعت محطات التحلية الـ(350) وحدة على المحافظات كالاتي (نينوى (17)، كركوك(17)، صلاح الدين (30)، ديالى(23)، بغداد(12)، الانبار (22)، بابل (23)، كربلاء المقدسة(19)، واسط(29)، النجف الاشرف (23)، الديوانية (27)، المنفى (29)، ميسان(23) ، ذي قار(30)، البصرة(26) .

وزارة البلديات والأشغال العامة

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز التالي (9)	ملاحظات والعواقب (10)
						البدء	الانتهاء	المتحقق	المتوقع		
2.3.2	توسيع مشاريع الصرف الصحي	- المديرية العامة للمياه - مديرية مياه المحافظات	مجالس البلدية	الموازنة الجارية-تتمية الاقاليم	858,802	ادار 2006	1ك 2015	97%	35%	100%	<p>- يشمل هذا النشاط جميع المناطق في عموم العراق وذلك لعدم وجود خارطة للفقر.</p> <p>-الكلفة السابقة للمشروع كانت 930,540 مليون دينار وقد خفضت الوزارة كلفة المشروع في خطتها لعام 2012</p> <p>-انشاط مستمر</p> <p>- نسبة الانجاز الفعلي 35% من عمر المشروع</p> <p>- نسبة الانجاز المخطط لغاية نهاية عام 2012 85% من عمر المشروع</p> <p>- هذا النشاط يشمل جميع المواطنين ضمن حدود البلدية في المحافظات لعدم وجود حصر للمناطق الفقيرة والنشاط ينفذ سنوياً .</p> <p>- هذا النشاط ادرج ضمن خطة تنمية الاقاليم للمحافظات ويتم الصرف والتابعة من قبلهم اي ان المحافظة هي الجهة المسؤولة عن الصرف والتنفيذ .</p>
4.3.4	توفير خدمات التخلص من النفايات	مديريات البلدية في المحافظات	مجالس البلدية	الموازنة الجارية-تتمية الاقاليم		1ك 2014	2ك 2010	مستمر	مستمر		

وزارة الكهرباء

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساعدة (4)	التمويل (5)	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز الثاني (9)	ملاحظات والحواف (10)
						البداية	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
2.2.4	اتخاذ اجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لهيئة المشاريع (مشروع تاهيل شبكة كهرباء مدينة الصدر)	المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر	-وزارة الكهرباء	الموازنة الاستثمارية	2500	1 تم 2012	2 تم 2012	65%	100%	20%	-نسبة التنفيذ تمثل توفير البنى التحتية للمجمع السكني في مدينة الصدر والبالغ عددها (492) دار -اغلب المشاريع تم إحالتها الى الشركات
1.3.4	تنفيذ مشاريع تبليط وازارة الطرق الودية الى الاحياء الفقيرة ❖	المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر	-	الموازنة الاستثمارية	398	1 تم 2012	2 تم 2012	100%	100%	100%	تم انازه 66 شارع في مدينة الصدر

❖ ينفذ المشاهدين في محافظة بغداد /مدينة الصدر

وزارة الزراعة

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجي التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنظمة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق	
2.1.1	برنامج لتدريب المزارعين على اساليب الزراعة والحديث والري الحديث	- وزارة الزراعة /الهيئة العامة للإرشاد والتعاون الزراعي	- مديريات الزراعة في المحافظات - دوائر الري في المحافظات - المنظمات الدولية المتخصصة	موازنة جارية	99,671	تس 2011	تس 1 2012	100%	100%	100%
3.1.1	أعادة النظر بحزمة التشريعات والسياسات الزراعية لصالح المزارعين الفقراء (1)	- وزارة الزراعة / الدائرة القانونية	رئاسة الوزراء / هيئة المستشارين -الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية / مجلس النواب / لجنة الزراعة والمياه	موازنة جارية		تس 2011	مستمر	100%	50%	

القوانين هي :

- 1- مشروع قانون القرى العصرية.. تمت المصادقة على القانون المذكور وهو قانون رقم (59) لسنة 2012 وتم نشره بجمريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4252 في 15/10/2012
- 2- مشروع قانون اعطاء المزارعين والفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابغة للقرية من ذمتهم.
- 3- مشروع قانون تعويض الفلاحين والمزارعين عن الكوارث البيئية والمناخية.
- 4- مشروع قانون اجار الاراضي الزراعية وتعليق حق التصرف والتملك فيها للمخريجين الزراعيين والبيطريين .

وزارة التخطيط

خلاصة متابعة تنفيذ الأنشطة الاستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الملاحظات والعواقب (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
1.2.5	تحديث خطة الفقر الوطني سنويا بالاستفادة من مسوحات الاسر والصادر الاحصائية الاخرى لتحديد الاسر المستهدفة بالأعانة	- الجهاز المركزي للأحصاء - هيئة احصاء اقليم كردستان	البنك الدولي	- الموازنة - الاستثمارية - البنك الدولي	5246	2011	حزيران 2013	70%	100%	—	تضمن النشاط تنفيذ مسح (IHSES II) وتحديث خط الفقر وهو في مرحلة استخراج نتائج المسح والتقريرات الاولية لقياس خط الفقر

وزارة التجارة

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز التالي (9)	الملاحظات والمعلومات (10)
						البداية	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
2.3.5	نظام رصد وتقويم واصلاح نظام البطاقة التموينية	وزارة التجارة	---	الموازنة الجارية	---	ايار 2011	ايار 2013	78%	100%	---	<p>- يشمل النشاط حجب البطاقة التموينية عن العوائل ذوي الدخل العاليية وتخصيصها للعوائل الفقيرة ولتحقيق ذلك تم تنفيذ مسح شامل للعوائل من خلال طبع استمارة الشمول حسب بيانات نظام التموين مصنفة حسب الفروع والمراكز التموينية وتسليمها الى وكلاء الواد الغذائية بموجب محضر وتوزيعها بعد ذلك على العوائل لادراج البيانات الخاصة بكل عائلته</p> <p>تم اعادة الاستمارة بعد ملء البيانات المطلوبه فيها بعد ذلك الى المجالس البلدية لغرض تصديقها واعيدت بعدها الى مسؤولي المراكز ومن تم الى وحدة الحاسبة في الفرع التمويني لغرض ادخال البيانات ومن تم تسلم الى دائرة التخطيط والمتابعة/ الحاسبة المركزية لغرض ارسفتها</p> <p>- تم استرجاع وادخال جميع استمارات الشمول الخاصة بمرکز تعوين (سيد الشهداء) 100% احد المراكز التموينية في محافظة بغداد اضافة الى استرجاع وادخال استمارات قضاء (بلد) ومن محافظات واسط تم استرجاع وادخال 50% من استمارات الشمول وابتدأ استرجاع وادخال استمارات الشمول الخاصة بباقي المحافظات</p>

محافظة نينوى

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012

الإحداثيات والموكلات (10)	نسبة الإنجاز الآلي (9)	نسب الإنجاز (%) (8)		مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية مليون دينار (6)	التمويل (5)	الجهات السائدة (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
		الفعلي أو المتحقق	المخطط الكلّي	الإنهاء	البدء						
		41.8%	100%	حزيران 2013	حزيران 2012	29,586	تمهية الأقاليم	المحافظة	مديرية المجاري	توسيع مشاريع الصرف الصحي	2.3.2

1 - تأهيل وتنفيذ شبكات الصرف الصحي في الأحياء الفقيرة في نواحي الاقضية (الوصل ،مخمور ،تلكيف ،سنجار ،البعاج) وعددها (9)

محافظة نينوى

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012

الإحداثيات والموكلات (10)	نسبة الإنجاز الآلي (9)	نسب الإنجاز (%) (8)		مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية مليون دينار (6)	التمويل (5)	الجهات السائدة (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
		الفعلي أو المتحقق	المخطط الكلّي	الإنهاء	البدء						
بعض المشاريع قيد الاحالة		21%	100%	1 نفا 2013	حزيران 2012	60,080	تمهية الأقاليم	المحافظة	دائرة الصحة	بناء مراكز رعاية صحية أولية مجهرية	2.1.2

1. إنشاء بيوت صحية عددها (10) في قرى فقيرة في الاقضية (تلعفر ،تلكيف ، سنجار)

2. إنشاء مراكز صحية عدد (19) في قرى فقيرة في الاقضية (القيار ،الوصل ،تلعفر ،تلكيف ،الحمالين ،سنجار ،البعاج) /قيد الاحاله

محافظة زينوى

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الملاحظات والعواقب (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
1.3.2	توسيع المشاريع لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	مديرية الماء	المحافظة	تمنية الاقاليم	39,404	1 ^ك 2013	تفوز 2012	100%	14.5%		بعض المشاريع قيد الاحالة

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجيات التخفيف من الفقر لعام 2102

- 1- توسيع وتأهيل ومد شبكات ماء وعددها (13) في القرى الفقيرة التابعة للاقصية (الموصل، تلغفر، الحمداية، البعاج) الكلفة الكلية (3.320) مليون دينار
- 2- تاهيل ونصب وحدات ماء عددها (7) في القرى الفقيرة التابعة للاقصية (الموصل، تلغفر، الحمداية، تالكيف) الكلفة الكلية (18.534) مليون دينار
- 3- صيانة ومد خطوط انابيب نقل المياه الصالحة للشرب وعددها (7) في القرى الفقيرة التابعة للاقصية (الموصل، تلغفر، الحمص، الكلفة الكلية (12.325) مليون دينار/ قيد الاحالة
- 4- تاهيل وحفر ابار ارتوازية وعددها (6) في القرى الفقيرة التابعة للاقصية (تلغفر، تالكيف، سنجار، الشيجان) الكلفة الكلية (5.225) مليون دينار/ قيد الاحالة

محافظة نينوى

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساعدة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	ملاحظات والملاحظات (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
2.2.3	تخصيص تمويل كاف ضمن الموازنة الاستثمارية التربوية حسب المراحل (أو لوية للإلتحاق الحكومي الاستثماري التربوي) مع أولوية في تخصيص بناء وتأهيل المدارس المتوسطة والإعدادية في القرى والإحياء الفقيرة ووفق سقف زمنية ملائمة (1)	مديرية التربية	المحافظة	تمتية الاقاليم	68.930	حزيران 2012	حزيران 2013	100%	9.6%		

تم تخصيص (68.930) مليون دينار من موازنة تمنية الاقاليم لبناء مدارس واصافة اجنحة في المناطق الفقيرة وهي كالآتي :-

- 1- بناء (78) مدرسة (مختلفة عدد الصفوف) في النواحي والأحياء الفقيرة وموزعة على الاقصية (الموصل، مخمور، البعاج، سنجار، تكليف، شيوخان، الحمدانية، العس)
- 2- اضافة (30) جناح للمدارس الواقعة في النواحي والأحياء الفقيرة موزعة على الاقصية (الحضر، الموصل، سنجار، تكليف، الحمدانية)

محافظة نينوى

خلاصة متابعة تنفيذ النشاط استراتيجي التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الملاحظات والعوقات (10)
						البداية	الانتهاء	الخطط المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
1.3.4	تنفيذ مشاريع تخطيط وازارة الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيره	-مديرية بلدية الموصل -مديرية بلديات نينوى -مديرية طرق وجسور نينوى	محافظة نينوى	تنمية الاقاليم	34205	تموز 2012	حزيران 2013	100%	11.3%		بعض المشاريع قيد الاحداث

يشمل النشاط :-

1. تخطيط وتأهيل وأكساء شوارع في القرى الفقيرة التابعة للاقضية (الموصل، الحضر، تكليف، شيجان، تكعفر، سنجان، البعاج، الحمدانية) وعددها (48)شارع، كلفة المشروع (24,205) مليون دينار
2. تطوير الطرق الريفية (متعددة) شركات لجنة لتحديد الطرق الريفية التي سيتم تخطيطها وحددت كلفته للمشروع (10,000) مليون، والمشروع قيد الاحداث

محافظة نينوى

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الاحكامات والمعوقات (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	النفعي او المتحقق		
2.2.4	اتخاذ اجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لهذة المشاريع (مشاريع استحمام مغنيات وايصال التيار الكهربائي لقرى فقيرة في المحافظة)	-مديرية بلدية الموصل -مديرية البلديات -مديرية طرق وجسور	المحافظة	تنمية الاقاليم	8,195	2012 توزر	2013 حزيران	100%	11.3%		

يشمل النشاط :-

1. اكمال التيار الكهربائي للقرى والأرياف وعددها (4) قرية في الاقضية (المنقر، شيخان، الحماني، الكلفت) (1,935) مليون دينار
2. استحداث مغنيات وتأهيل محطات وعددها (7) مغربي في القرى الفقيرة التابعة للاقضية (المنقر، مخمور، الكيف، الموصل) الكلفت (6,260) مليون دينار

محافظة الأبنار

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنظمة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز التالي (9)	اللاحقات والعواقب (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
2.1.2	بناء مراكز رعاية صحية أولية مجهزة	المحافظة	مجلس المحافظة - دائرة الصحة	تنمية الأقاليم	1.327	اذار 2012	حزيران 2013	100%	95%	97.8%	

المشاريع المكونة للنشاط

- 1- بناء مركز صحي في قضاء القائم /قرية شط العرب أنجز العمل بتاريخ 8/8/2012
- 2- إنشاء مركز صحي مع دار في قضاء الرطبة/ قرية الوليد أنجز العمل بتاريخ 29/8/2012
- 3- إعادة بناء مركز صحي فرعي عدد (2) في قضاء الرمادي /قرى السجارية و البوعلي الجاسم
- 4- إنشاء مركز صحي فرعي في قضاء الرمادي /قرية الصوفية

محافظة الاثيار

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساعدة (4)	التمويل (5)	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الاحكامات والموقات (10)
						البداية	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
2.1.6	إعطاء الأولوية في إنشاء مدارس البنات الابتدائية والتأهوية في الأحياء الفقيرة	المحافظة	- مجلس المحافظة - مديرية التربية	تتمية الأقاليم	2.887	1 آذار 2012	100%	87.5%	76%		

المشاريع المكونة للنشاط

- 1- هدم وإعادة بناء ثانوية القائم للبنات (18) صف في قضاء القائم / (حي فقير في مركز القضاء) أنجز العمل بتاريخ 5/9/2012
- 2- هدم وإعادة بناء مدرسة الأزهار للبنات (18) صف في قضاء الرمادي / (حي فقير في مركز القضاء)
- 3- إنشاء مدرسة ثانوية 12 صف للبنات في قضاء القائم / قرية سعدة أنجز العمل بتاريخ 21/7/2012
- 4- هدم وإعادة بناء مدرسة بدر الكبرى للبنات 12 صف في قضاء الفلوجة / قرية الكراغول

محافظة الانبار

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجيتنا التخفيف من الفقر لعام 2012

محافظة الانبار	نسبة الانجاز الآلي (9)	نسب الانجاز (%) (8)		مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية مليون دينار (6)	التمويل (5)	الجهات السائدة (4)	الجهة المنفذة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
		الفعلي او المتحقق	المخطط الآلي	البدء	الانتهاء						
الملاحقات والموقات (10)	66%	88%	100%	2 تشرين 2012	ادار 2012	2,680	تمهية الأقاليم	-مجلس المحافظة - دائرة الماء	المحافظة	توسيع المشاريع الإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الغربية	1.3.2
هناك تلاكؤ من قبل الشركة في مشروع تجهيز ونصب مجمع ماء في قضاء الفلوجة / قرية ابو عرسان سعة 3(100م)											

المشاريع المكونة للنشاط

- 1- إنشاء وحدة تحليه في قضاء الرمادي/قرية الحجر انجز العمل بتاريخ 10/9/2012
- 2- تجهيز ونصب مجمع ماء في قضاء الفلوجة/ قرية ابو عرسان سعة (100 م)3(نسبة الانجاز الفعلي 40% وهناك تلاكؤ من قبل الشركة المنفذة وتم التوجيه بحث الشركة للإسراع في الانجاز)
- 3- إنشاء مشروع ماء سعة 200 م3 في قضاء القائلم / قرية الصفرة ووردي الصفرة انجز العمل بتاريخ 10/8/2012
- 4- إنشاء مشروع ماء سعة 200 م3 في قضاء القائلم/ قرية النهية والبركبة انجز العمل بتاريخ 11/8/2012
- 5- إيصال ماء في قضاء الرمادي / قرية خلف الحميرة مع إنشاء شبكة ماء لمشروع ماء الطاش الجديد انجز العمل بتاريخ 10/11/2012

محافظة الأبنار

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	ملاحظات والمواقف (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
2.2.3	تخصيص تمويل كاف ضمن الموازنة الاستثمارية التربوية حسب المراحل (أولية للإناطق الحكومي الاستثماري التربوي) مع أولوية في تخصيص بناء وتأهيل المدارس المتوسطة والإعدادية في القرى والإحياء الفقيرة وفق سقف زمنية ملائمة	المحافظة	- مجلس المحافظة - مديرية التربية	تمتية الأقاليم	2.935	ادار 2012	تشرين 2 2012	78%	100%	77%	هناك تاكو في مشروع بناء مدرسة بروانتر لوجود اعمال على الجسر المؤدي الى الناحية

المشاريع المكونة للنشاط

- تم تخصيص (2.935) مليون دينار من موازنة تمنية الأقاليم لبناء مدارس في المناطق الفقيرة وهي كالآتي :-
- 1- بناء مدرسة 12 صف في قضاء حديثة / ناحية بروانتر - قرية الهضبة (نسبة الانجاز الفعلي %45 وهناك توقف بسبب وجود أعمال على الجسر المؤدي إلى القرية)
 - 2- بناء مدرسة الشمس 12 صف في قضاء الرمادي / قرية الجزيرة الملاحمة البحر العمل بتاريخ 2012/9/8
 - 3- إنشاء مدرسة المنصور 12 صف في قضاء الرمادي / قرية البوعيث / المخازن - البو محمد
 - 4- إنشاء مدرسة 12 صف في قضاء الفلوجة / قرية البوعزام المحامدة النشاف
 - 5- إنشاء مدرسة 12 صف في قضاء القائم / قرية العش

محافظة بغداد

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجيية التخفيف من الفقر لعام 2012

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التحويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز الاتالي (9)	الالتزامات والوعودات (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
4.2.3	وضع برنامج مساندة ودعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة والاعدادية (1)	المحافظة	وزارة التربية	موازنة تنميتها الإقليم	38.789	اب 2012	تموز 2013	100%	17%	40%	- تمت المباشرة في تنفيذ بناء المدارس وهي في مراحل صب الاسس. - نسبة الانجاز المخطط لعام 2012 هي 20% والنسبة الفعلية المتحققة 17% من عمر المشروع
1.3.2	توسيع الشاربع لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة (2)	المحافظة	وزارة البلديات والاشغال العامة	موازنة تنميتها الإقليم	21.524	تموز 2012	آب 2014	100%	20%	10%	- العمل مستمر في جميع المناطق. - نسبة الانجاز المخطط لعام 2012 هي 20% والنسبة الفعلية المتحققة 20% من عمر المشروع

- 1- يشمل النشاط تنفيذ وإنشاء (30) مدرسة للمناطق الفقيرة في (الرشيدية/ مقاطعتي البو دالي، منطقتي معامل الباوية، مقاطعتي 5 عاشور، بزازي، الفضيبي، محلة 759 مقاطعتي 16، القطاعات (28,29) مدينة الصدر / 1 مقاطعتي 13 الخزانات، ابو غريب/الرضوانية الغربية/مقاطعتي 17، السويب، ابو دشير، هور الباشا/ مقاطعة 25، صايبات /مقاطعتي 22، الشعلة، الحرية، مدينة الصدر/2، محلة 37 /الطليبيتا).
- 2- يشمل النشاط تفكيك ونقل وتشغيل وفحص مجمع ماء سعة 200 م³/ ساعة عدد (5) مجمعات في المناطق الفقيرة (اليوسفية/الفتح والجانبين، التاجي/جرف اللجح والفلحاح، حي اليساري في العبايبي، ناحية الطليبي، قرية الكرامة والسعادة، ناحية الزهور (الحسينية الاولى)).

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز التالي (9)	الاتصالات والمواقع (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
2.3.2	توسيع مشاريع الصرف الصحي (1)	المحافظة	وزارة البلديات	موازنة تميمية الاقاليم	13000	لم تتم المباشرة بالشروع لحد الان					<ul style="list-style-type: none"> - من مشاريع عام 2012 والمشروع في مرحلة الاحالة - تاخر تنفيذ المشروع بسبب تخصيص الارض
1.3.4	تنفيذ مشاريع تبليط وازارة الطرق الؤدية الى الاجياء الفقيرة (2)	المحافظة	وزارة الكهرباء	موازنة تميمية الاقاليم	16211	حزيران 2012 حزيران 2013		50%	100%	10%	<ul style="list-style-type: none"> - تم المباشرة بالعمل في المحلات المذكورة اذناه ومازال الاعلان عن محلة 777 مستمراً. - نسبة الانجاز المخطط لعام 2012 هي 60% والنسبة الفعلية المتحققة 50% من عمر المشروع.
2.1.2	بناء مراكز رعاية صحية أولية مجهزة (3)	المحافظة	وزارة الصحة	موازنة تميمية الاقاليم	14.504	تموز 2012 تموز 2013		20%	100%	76%	<ul style="list-style-type: none"> - تم المباشرة في المشروع في المناطق (الزعرانية والحسينية) - مركز صحة قضاء المحمودية في طور الاعلان - نسبة الانجاز المخطط لعام 2012 هي 30% والنسبة الفعلية المتحققة 20% من عمر المشروع

1 - يشمل النشاط محطات رفع لجاري ناحية اليوسفي ومعظمها في المناطق الريفية.

2 - يشمل النشاط تاهيل شبكة الكهرباء وازارة الطرق في محلات منطقة العامل الفقيرة /بغداد المحلات (779,777,775,774,773,772,771).

3 - يشمل النشاط انشاء (3) مراكز صحية في المناطق الفقيرة في (الحسينية، الزعرانية) و مناطق فقيرة في قضاء المحمودية.

محافظة بابل

خلاصة متابعة تنفيذ النشاط استراتيجي التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الاحداثيات والموقات (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او التحقق		
4.2.3	وضع برنامج مساندة ودعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس خاصة للتوسط والاعداديا(1)	ديوان المحافظة	دائرة التربية	تنمية الاقاليم	17154	حزيران 2012	تموز 2013	100%	35%	100%	-النشاط بشكل عام مستمر ولا توجد اي معوقات -تأخر الاحالات ادى الى تاخير التنفيذ في بعض المدارس في قضاء الهاشمية -نسبة الانجاز الفعلي 35% من عمر المشروع
2.1.2	أثناء مراكز رعاية صحية أولية مجهزة (2)	ديوان المحافظة	دائرة الصحة	تنمية الاقاليم	423	2ت 2012	2ت 2013	100%	13%	100%	العمل مستمر
1.3.2	توسيع الشوارع لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة (3)	ديوان المحافظة	دائرة الماء	تنمية الاقاليم	2,717	حزيران 2012	تموز 2013	100%	20%	100%	مدة التنفيذ 365 يوما من تاريخ المباشرة الفعلي 28/6/2012

1- بناء (10) مدارس (4) مدارس ذات (12) صف (6) مدارس ذات (18) صف) في مناطق فقيرة في قضاء الهاشمية /ناحية القاسم وبناء (13) جناح مدارس في مناطق فقيرة في قضاء الهاشمية ناحية الشوملي وقضاء المحاويل / ناحية الامام والحي العسكري ومناطق فقيرة في قضاء السيب /ناحية السدة والسكندرية.

2- هدم وبناء مركز صحي عدد (1) في قرية الباج الشمالي الفقيرة /جرف الصخر/قضاء السيب .

3- تجهيز وفحص وتنفيذ ونصب مجمع ماء العمادية سعة 002 م³/ساعة في قضاء الهاشمية ، تجهيز وفحص وتنفيذ مجمع ماء الهاوية قرية (5) سعة 200م³/ساعة في ناحية السدة

محافظة بابل

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساعدة (4)	التمويل (5)	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الملاحظات والوقوات (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
1.3.4	تنفيذ مشاريع تبليط وازارة الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرة (1) تنفيذ	ديوان المحافظة	دائرة الطرق والجسور	تمتية الإقليم	1.194	ايلول 2012	اذار 2013	50%	100%		تمت المباشرة الفعالية بتاريخ 18/9/2012 وبمدة عقد 210 يوم والعمل مستمر - ان نسبة الانجاز المتحققة 50% من عمر المشروع
1.1.4	انشاء دور قلبية الكلفة في قضاء الحلة / ناحية ابي غرق بالاضافة الى خدمات هي (مدرسة ابتدائية / 18 صف ، مركز دفاع مدني، اسواق، استعلامات، شبكة مجاري للمجمع مع محطة معالجة ، محطة ضخ المياه للمجمع، طرق وساحات) .	ديوان المحافظة		تمتية الإقليم	27.843	1ك 2012	حزيران 2015	3%	100%		- يشمل النشاط 25 عمارة يبلغ عدد الشقق 300 شقة - يقدر عدد المستفيدين 300 أسرة - مدة التنفيذ 30 شهراً - تأخر المشروع بسبب تخصيص الارض - نسبة التنفيذ تمثل مرحلة تهيئة الدراسات والمحطات والكشوفات

1 - انشاء طريقين في مركز قضاء المحاويل (طريق قرية برون وطريق حمزة كربول بطول 3435م).

2 - انشاء دور قلبية الكلفة في قضاء الحلة / ناحية ابي غرق بالاضافة الى خدمات هي (مدرسة ابتدائية / 18 صف ، مركز دفاع مدني، اسواق، استعلامات، شبكة مجاري للمجمع مع محطة معالجة ، محطة ضخ المياه للمجمع، طرق وساحات) .

محافظة كركلاء

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الاحكامات والموقات (10)
						البدء	الانتهاء	الفعلي او المتحقق	نسب الاحكام الكلية		
2.1.2	بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة (1)	المحافظة	مديرية الصحة	- الموازنة الاستثمارية - تنمية القاليم	7,500	تشرين 2 2010	2 2012	73%	100%	31%	- العمل مستمر ونسبة الانجاز فعلي 73% من عمر المشروع
2.3.2	توسيع مشاريع الصرف الصحي (2)	المحافظة	وزارة البلديات مديرية الجاري	- موازنة استثمارية - تنمية القاليم	22,961	2 2011	نيسان 2012	100%	100%	100%	انجر المشروع
1.1.4	تنفيذ مشاريع لبناء الجمعيات السكنية للقراء بمواصفات قليلة الكلفة (3)	المحافظة	المحافظة - الإدارة المحلية	- موازنة استثمارية - تنمية القاليم	22,961	2 2010	مستمر	87%	100%	81%	

- 1- انشاء (3) مراكز صحية فرعية للمناطق الفقيرة في (ام غرار، حي الغدير، العنتاكية).
- 2- تنفيذ مجاري تقيية لمنطقة فقيرة تقع ضمن شارع الاسعاف النوري/مركز المحافظة.
- 3- تنفيذ المشاريع في قضاء (عين تم) ومناطق فقيرة في النواحي (الحسينية، الجبول الغربي، الحص).

محافظة كركلاء

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساعدة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (8)		نسبة الانجاز المالي (9)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق	
1.3.2	توسيع المشاريع لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة (1)	المحافظة	مديرية الماء	موازنة استثمارية	2.224	1 تم 2010	مستمر	35%	34%	- العمل مستمر - نسبة الانجاز المخططة لعام 2012 هي 59% - نسبة الانجاز الفعلي 35% من عمر المشروع
4.2.3	وضع برنامج مساعد و دعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس خاصة للتوسطة والاعدادية (2)	المحافظة	مديرية التربية	- موازنة - استثمارية - تميمية اقليم	48.047	تشرين 2 2010	مستمر	30%	33%	- العمل مستمر - بعض المدارس في مرحلة صب السقوف - نسبة الانجاز المخططة لعام 2012 هي 65% - نسبة الانجاز الفعلي المتحقق 30% من عمر المشروع

1- تنفيذ شبكة ماء في القرى الفقيرة في (شبخ حمزة سيد حسن، محرم عيشة، الطنبي، الكص الشمالي، سيف سعد) وحي التحدي الفقير.

2- بناء (15) مدرسة في المناطق الفقيرة في النواحي (الحرم، الحسينية، الخيرات، الجدول الغربي).

محافظة واسط

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجيتنا التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التحويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (8)	نسبة الانجاز التالي (9)	ملاحظات والمعلومات (10)
						البدء	الانتهاء			
1.3.2	توسيع المشاريع لايصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة (1)	المحافظة	مديرية الماء	تنمية الاقاليم	1.599	حزيران 2012	تشرين 2011	80%	انجز المشروع	-العمل مستمر وتم انجاز 10 مدارس و 4 ملاحق من المشروع -تاريخ الانتهاء المشرع نهاية عام 2012 لكن تاخر عمل المقاول بسبب الامطار -نسبة الانجاز الفعلي 94% من عمر المشروع

- 1- يشمل النشاط تجهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء مجتمعة طاقتها 50م3/س في (3) قري ريفية فقيرة هي (قريتنا النور (البو دراج)/ الكوت، قريتنا الاحرار، قريتنا كميوش /ناحية الدبوني).
- 2- يشمل النشاط بناء (10) مدارس ذات 6 صف في المناطق الفقيرة في (الموقيتية والبشائر) و بناء ملاحق مدارس 4 صف عدد (6) في قضاء النعمانية وناحية الاحرار وبناء مدرسة 12 صف (الاقمار) / قريتنا 6 الريفية الفقيرة في قضاء الصويرة، انشاء مدرسة ذات 18 صف على القطعة المرقمة (2/6032) /44 حي الجهاد في المناطق الفقيرة في قضاء الكوت.

محافظة واسط

خلاصة متابعة تنفيذ الأنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنظمة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)	نسبة الانجاز التالي (9)	الاحداثيات والموقعات (10)
						البدء	الانتهاء			
1.3.4	تنفيذ مشاريع تباطؤ وازارة الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرة (1)	المحافظة	مديرية طرق وجسور	تمتية الاقاليم	7750	ابر 2012	تشرين 2011	99.8%	73%	-العمل مستمر وحاليا تقام اعمال الازارة في الطرق المكتملة كطريق (كنج والزهره في قضاء الكوت) وتم انجاز 4 مقاولات من المشروع -نسبة انجاز فعلي 99% من عمر المشروع -تعرقل التنفيذ في بعض المناطق بسبب الازواضع الامنية
2.2.4	اتخاذ اجراءات لتوفير البنى التحتية اللازمة لهذه المشاريع (ايصال التيار الكهربائي للمناطق والقرى الفقيرة في المحافظة) (2)	المحافظة	مديرية كهرباء	تمتية الاقاليم	5802	ابر 2013	حزيران 2011	90%	71%	-العمل مستمر

1 - يشمل النشاط تنفيذ تباطؤ وازارة الطرق في الاحياء والمناطق الفقيرة (منطقة القطبية الشرقية، طريق كنج والزهره، طريق النفاضة / ناحية قاج الدين، طريق الامام العكار / ناحية البشار، طريق ابو جراح / قضاء العمالية).

2 - تحسين الشبكة الكهربائية لمنطقة حي طليحة وحي التتمية / ناحية الحضرة وايصال التيار الكهربائي الى حي العروبة الفقير / ناحية الويفية، اوصول التيار الكهربائي الى قرية الروضان (25) دار سكن للمواطنين الفقيرة).

محافظة واسط

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنظمة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	الكلية االكلفة دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الملاحظات والموافات (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
2.1.2	بناء مراكز رعاية صحية أولية مجهزة (1)	المحافظة	دائرة الصحة	تنمية اقاليم	477	1 2012	اب 2013	100%	3%		تم البدء بالتنفيذ والان في مراحل اعداد تحريات التربة للاسس -نسبة الانجاز الفعلي 3% من عمر المشروع وتمثل مرحلة تهيئة الدراسات والكشوفات والمخططات -نسبة الانجاز المخطط لعام 2012 هي 20%

1 - يشمل النشاط بناء مركز صحي في قرية كصيبة الريفية في قضاء الكوت .

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجيات التخفيف من الفقر لعام 2102

محافظة النجف الأشرف

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز الثاني (9)	ملاحظات والعواقب (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
1.3.2	توسيع المشاريع لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة (1)	-المحافظة - دائرة الماء	دائرة الماء	- تنمية الأقاليم - الوزارة التشغيلية	4.409	شباط 2011	1 ت 2013	83%	100%	89%	- انجز مشروع مد خط الأنابيب لمنطقة الرضوية بنسبة انجاز 100% في شهر تم 2012/2 - نسبة الانجاز الفعلية لجمع ماء ناحية الحيدرية 60% من النسبة المخططة 67% لعام 2012 -نسبة الانجاز المتحقق 83% من عمر النشاط الكلي
2.3.2	توسيع مشاريع الصرف الصحي (2)	-المحافظة - دائرة المجاري	دائرة المجاري	- تنمية الأقاليم - الوزارة التشغيلية	2.194	حزيران 2011	نيسان 2012	100%	100%	68%	انجز المشروع.

1. يشمل النشاط مد خط انابيب المنطقة الرضوية الريفية التي تبعد 5 كم عن مدينة النجف الأشرف من مجمع ماء البراكية بكلفة (904) مليون دينار وخطوط ناقلة في الحيدرية بكلفة (3.505) مليون دينار.

2. يشمل النشاط تنفيذ شبكة مجاري فقيرة في موقع الفرات ومنطقة الرشادية الفقيرة في الكوفة.

محافظة النجف الاشرف

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التحويل (5)	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز التالي (9)	الملاحظات والمواقف (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
4.2.3	وضع برنامج مساعد (1) ودعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة والاعدادية	دائرة التربية		- الموازنة التشغيلية -الخطوة الاستثمارية	1,581	ايار 2011	2 تموز 2013	67%	64%	67%	- نسبة الانجاز الفعلي المتحقق 67% من عمر النشاط
2.1.2	بناء مراكز رعاية صحية اولية مجهزة (2)	دائرة الصحة		تنمية الاقاليم	730	تموز 2012	تموز 2013	75%	54%	75%	النشاط مستمر علما ان نسبة الانجاز الفعلي المتحقق 75% من عمر النشاط

1. يشمل النشاط إنشاء مدرسة 18 صف في منطقة حي البلاد في الكوفة والعمل مستمر وتم الانتهاء من انشاء مدرسة 12 صف في قرية المهيبات في ناحية الحيرة.
2. يشمل النشاط بناء مركز للرعاية الصحية الأولية في منطقة الحوامم الفقيرة في الكوفة.

محافظة الديوانية

خلاصة متابعة تنفيذ الأنشطة الاستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الاحداثيات والموقات (10)
						البدء	الانتهاء	الفعلي او المتحقق	المخطط الكلي		
1.3.2	توسيع الشوارع لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	- وزارة البلديات - المحافظات	- مديرية الماء - التخطيط والمتابعة - مجلس المحافظة	تمتية الأقاليم	49.522	1 تم 2013	2 تم 2012	45%	100%	44%	- بعد اعداد الكشوفات والتصاميم تم الاعلان عن المشاريع وحيث الى الشركة للتنفيذ - تم تحديد المواقع وصب الاساسات لتصب مجموعات الماء وربطها بالشبكة

يشمل المشروع :-

- ❖ إنشاء مجمع ماء سعة 3/50 ساعة إلى قرية الديابجة مع شبكة طولها (4.5) كم في ناحية السنينة
- ❖ إنشاء مجمع ماء سعة 3/50 ساعة إلى قرية المزاربع مع شبكة طولها (4) كم في ناحية السنينة
- ❖ إنشاء مجمع ماء سعة 3/200 ساعة إلى قرية ال بطة - ال عيطان مع شبكة طولها (20.5) كم قضاء الديوانية
- ❖ تجهيز ونصب مجمع ماء سعة 3/200 ساعة مع شبكة طولها (24) كم إلى قرية الجبور (شط الهوى - الباجي - الخضران - دقياح - البوكوس - ام ال خمسين) في قضاء الحمزة
- ❖ تجهيز ونصب مجمع ماء سعة 3/50 ساعة مع شبكة طولها (24) كم إلى القرى (ال شبل - زايد - جواد - فرج - مشكور - سيد - رحمن - جاسم - محمد) مع مد شبكة 14 كم في ناحية السدير

محافظة الديوانية

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنظمة (3)	الجهات المساندة (4)	التحويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز التالي (9)	الملاحظات والموقعات (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
2.2.4	اتخاذ اجراءات تنويع (1) البنى التحتية اللازمة لهذه المشاريع (المجمعات السكنية)	- وزارة الكهرباء - المحافظة	- مديرية الكهرباء - التخطيط والمتابعة - مجلس المحافظة	تمتية الأقاليم	39655	ايار 2012	ايار 2013	47%	50%	100%	- بعد تحديد المناطق التي تنصب عليها المحولات تم صب الاساسات لنصب المحولات عليها وتثبيتها وربطها بالشبكة الكهربائية - يتم تأهيل الشبكات الكهربائية (الوحدة، الزوية، العكبر)
4.2.3	وضع برنامج مساندة (2) ودعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس خاصة المتوسطة والإعدادية	- وزارة التربية - المحافظة	- تربية الديوانية - التخطيط والمتابعة - مجلس المحافظة	تمتية الأقاليم	14.572	ايار 2012	ايار 2013	30%	40%	100%	تم اصدار الكشوفات والتصاميم واحيل المشروع الى الشركة للتنفيذ وتم الانتهاء من تسوية الارض وصب الباتلو للبدء بتنفيذ البناء

1. تنفيذ الشبكة الكهربائية في المحافظة لقرية البو فحينة والبو ربيع قضاء الديوانية، تنفيذ الشبكة الكهربائية لقرية حي آل عمود (المتنصر)، تأهيل الشبكة الكهربائية لحي العكبر، تأهيل الشبكة الكهربائية لحي الزوية، تأهيل الشبكة الكهربائية لحي الوحدة خلف الرعابي
2. بناء جناح (6 صف) في مدرسة الحندق في ناحية فماس قضاء الشامية، بناء جناح (6 صف) في مدرسة البيادر في ناحية نضر /قضاء عكبر، ترميم مدرسة عكبر الابتدائية (نقد النشاط في المناطق الفقيرة في المحافظة).

محافظة المنى

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	اشارات والملاحظات (10)
						البدء	الانتهاء	الخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
4.2.3	وضع برنامج مساندة (1) ودعم مع الحكومات المحلية لإنشاء وتأهيل المدارس خاصة للتوسطة والاعدادية	- مديرية التربية - مديرية المنطقة - المحافظة	- مديرية التربية - التخطيط والمتابعة - مجلس المحافظة	تممية الاقاليم	26275	اذار 2012	حزيران 2013	30%	35%	100%	- تم فحص التربة للمواقع التي حددت - تمت تسوية الاراضي وصب الاساسات والمباشرة بالبناء
1.3.4	تنفيذ مشاريع تبليط (2) واتارة الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرة	- المحافظة - وزارة البلديات	- مديرية البلدية - كهرباء المنى - التخطيط والمتابعة	تممية الاقاليم	150,862	نيسان 2012	تموز 2013	23%	25%	100%	- احالة المشاريع بعد اعداد الكشوفات والتصاميم - المشروع اكساء وتبليط الطرق والشوارع مناطق في الاقصية (السماعة والرميثة والخضر والهلال) - بعد تحديد مسار الطرق تتم الان تسويتها

1. بناء مدارس (6صف) عددها (12) في مناطق فقيرة في السماعة (قرية ال عيث) وفي قرية بني سلامة) قضاء المجد وقضاء الهلال / منطقتي بحيرة ساوة وانشاء مدارس (18) صف عددها (3) في مناطق فقيرة في قضاء السوير وقضاء الرميثة

2. اكساء وتبليط طرق وشوارع مناطق في السماعة والرميثة والخضر والهلال كما يتضمن النشاط تبليط (3) طرق في القرى الهيمية الغربية) وال (الجهول) والحراز) في قضاء الوركاء

محافظة المنفى

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجيتنا التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز التالي (9)	الملاحظات والمعلومات (10)
						البدء	الانتهاء	الفعلي او المتحقق	المخطط الكلي		
5.3.4	انشاء نوادي رياضية (1) وعلمية ومنتزهات عامة	- الشباب المحافظة- وزارة الشباب المحافظة- المحافظة	- مديرية الشباب المحافظة- والتابعة	تمتية الاقاليم	6070	ايار 2013	ايار 2012	40%	100%	25%	- تأخر في تقديم مديرية الشباب كصف انشاء بناية نوادي الشباب - المشروع يضم انشاء ساحات متعددة في مركز كل من ناحية (المجد والهلال والسوير) وانشاء 3 منتزهات عامة في قضاء السلطان وناحية كل من (المجد والهلال)
2.1.2	بناء مراكز رعاية (2) صحية اولية مجهزة	- مديرية الصحة- المحافظة	- المحافظة- المجالس المحلية	تمتية الاقاليم	1,950	شباط 2013	نيسان 2012	35%	100%	25%	- بعد تحديد المناطق التي تحتاج الى مراكز رعاية صحية اعدت الكشوفات والتصاميم وتم الاعلان - تم صب الاساسات والبدء بالبناء وحدد الاثاث الطبي للمراكز

1- انشاء نادي المنفى في قضاء السماوة في منطقة (الحيدرية) وساحات متعددة في مركز كل من ناحية المجد وناحية الهلال وناحية السوير وانشاء منتزهات عامة عدد (3) في قضاء السلطان وناحية المجد وناحية الهلال
2- بناء (3) مراكز رعاية صحية في قرية (ال عصبية) وحي التاميم قضاء السماوة، وفي قرية (ال عنتري) قضاء الوركاء

محافظة المنفى

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2012

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات المساندة (4)	التمويل (5)	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	ملاحظات والعوقات (10)
						البدء	الانتهاء	الفعلي او المتحقق	المخطط الكلي		
1.3.2	توسيع الشرايح لايصال الماء للصالح للشرب للمناطق الفقيرة	- مديرية الماء	- وزارة البلديات - مجلس المحافظة - المجلس المحلي	تتمية الاقاليم	52.956	فبراير 2012	حزيران 2013	40%	100%	35%	تم احالة المجمعات الى وزارة الصناعة والمعادن بعد الاجابة على العروض المقدمة. وتم البدء في تنفيذ الود والايصالات ويجري الان ربطها بالشبكة

- مد وايصال وتأهيل شبكات ومجمعات الماء في قضاء السهارة للقرى (9) نيسان، الشوات، منطقتي الحميدية، ال مطير)

محافظة ذي قار

خلاصة متابعة تنفيذ الأنشطة استراتيجيّة التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التحويل (5)	التكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز التالي (9)	الاحداثيات والموقعات (10)
						البدء	الانتهاء	الخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
1.3.2	توسيع المشاريع لإيصال (1) الماء الصالح للشرب للمناطق الفقيرة	- مديرية الماء - المحافظة	- المحافظة البلدية -القطاعمقامية	تنمية الاقاليم	475	1	حزيران 2012	100%	100%	75%	تم انجاز المشروع بشكل نهائي وتم الاستلام بصورة رسمية
2.2.3	تخصيص تمويل كاف (2) ضمن الموازنة الاستثمارية التربوية حسب المراحل (او لوية للإناطق الحكومية الاستثماري التربوي) مع اولوية في تخصيص بناء وتأهيل المدارس المتوسطة والاعدادية في القرى والمناطق الفقيرة والاحياء الفقيرة وفق سقف زمنية ملائمة	مديرية التربية - المحافظة	- مديرية ذي قار - محافظة ذي قار - مجلس المحافظة	تنمية الاقاليم	1.100	حزيران 2011	شباط 2012	65%	100%	57%	- تم تحديد فترة المشروع بسبب تأخير نقل الملكية وتأخير المصادقة على الكشوفات الاضافية - تم حفر الاسس وفرش طبقة من الجلود وطبقات من السببس وتم صب (الباتلو) وصب خرسانات (الباتلو) وتمت اعمال (الباتلو) للجدران وصب الخرسانات فوق (الباتلو) وصب كتية الجدار وبناء احواض (السبتتلك)

1- تجهيز ونصب مجمع ماء سعتر (50) م/ساعة مع شبكات ماء في قرية النهضه في قضاء الرفاعي

2- تخصيص تمويل (1.100) مليار ومائة مليون دينار لإنشاء مدرسة ثانوية (12) صف في قرية العمارة في ناحية القهود

محافظة ذي قار

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة استراتيجيّة التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	الكلية الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	الملاحظات والمعلومات (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
2.1.2	بناء مراكز رعاية (1) صحية اولية مجهزة	دائرة الصحة - المحافظة	مديرية البلديات - التسجيل العقاري - المحافظة	تنمية الاقاليم	1.000	تموز 2011	ايار 2013	100%	5%	10%	- تم اعداد الكشوفات والتصاميم للمشروع واحيل الى التنفيذ - تمت المباشرة بالتنفيذ الارض، وتم صرف سلفة تشغيلية بما يعادل 10% من قيمة مبلغ الاحالة
1.3.4	تنفيذ مشاريع تخطيط (2) وازارة الطرق المؤدية الى الاحياء الفقيرة	مديرية البلدية - المحافظة	مجلس المحافظة - مديرية البلديات - مديرية الجاري	تنمية الاقاليم	2.610	تموز 2012	تموز 2014	100%	75%	32%	بعد تحديد مسار الطريق تم تنظيف و تسوية الارض وفرش الارض بطبقات من السبيس ويجري الان كبس الشوارع بمكائن ومن ثم البدء بعملية الاكساء

1- انشاء (3) مراكز صحية مناطق فقيرة في ناحية البطحاء لتقضاء الناصرية

2- انشاء شوارع مع شبكات مجاري مناطق فقيرة في ناحية الحمار لتقضاء الجياش

محافظة ميسان

خلاصة متابعة تنفيذ أنشطة الاستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

ملاحظات والمعوقات (10)	نسبة الانجاز اللائي (9)	نسب الانجاز (%) (8)		مدة التنفيذ (7)		الكلفة الكلية مليون دينار (6)	التمويل (5)	الجهات الساكنة (4)	الجهة المنظمة (3)	اسم النشاط (2)	رمز النشاط (1)
		الفعلي او المتحقق	المخطط الكلي	الانتهاء	البدء						
تجري عمليات البناء حيث تم الانتهاء من البناء فوق دار والعمل مستمر في باقي الدور فوق مستوى الباتلو	30%	30%	100%	اب 2013	ت2 2011	48.750	تممية الاقاليم	- التخطيط والتابعة - مجلس المحافظة	المحافظة	تنفيذ مشاريع بناء (1) المجمعات السكنية للفقر بمواصفات قياسية الكلفة	1.1.4
- الانتهاء من البناء فوق مستوى الباتلو لغاية السقوف مدارس قرية (ابو شطيب) وقرية الصبيحة وقرية نور الصالح ذات (6) صف - تجري عمليات البناء في جميع المدارس بمراحل متتالية حيث يتم التهيئة لنصب السقوف	50%	50%	100%	ت1 2013	ادار 2011	52.800	تممية الاقاليم	- التخطيط والتابعة - مجلس المحافظة	المحافظة	وضع برنامج مساندة (2) ودعم مع الحكومات المحلية لانشاء وتاهيل المدارس خاصة للتوسعة والاعمارية	4.2.3

1- تنفيذ مشروع (1000) وحدة سكنية مقسم الى مجتمعات بواقع (500) وحدة سكنية في المجتمع الواحد ويكون موقعها في قضاء العمارة منقطة البتيرة
2- يشمل مشروع بناء المدارس:-

- بناء مدرسة (6) صف في قرية ابو شطب في قضاء العمارة، بناء مدرسة (6) صف في قرية نور الصالح قضاء البتيرة
- بناء (6) مدارس ذات (18) صف في المركز وفي قضاء علي الغربي وقضاء قلعة صالح في المناطق الفقيرة منها
- بناء (10) مدارس ذات (12) صف في المركز وفي النواحي (العدل وكميت والعزير وحلي الشرقي) قضاء علي الغربي
- بناء (7) مدارس ذات (9) صف في الاضية (الكحلاء واليومنة) وفي النواحي (الخير والسلام وكميت) في المناطق الفقيرة منها

محافظة البصرة

خلاصة متابعة تنفيذ الأنشطة الاستراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2102

رمز النشاط (1)	اسم النشاط (2)	الجهة المنفذة (3)	الجهات الساندة (4)	التمويل (5)	الكلفة الكلية مليون دينار (6)	مدة التنفيذ (7)		نسب الانجاز (%) (8)		نسبة الانجاز المالي (9)	اللائحة والمعرفات (10)
						البدء	الانتهاء	المخطط الكلي	الفعلي او المتحقق		
4.2.3	وضع برنامج مساندة (1) ودعم مع الحكومات المحلية لانشاء وتأهيل المدارس خاصة للتوسعة الاعمادية	- مديرية التربية - عقود المحافظة	- مديرية التربية - عقود المحافظة	تمية الاقاليم	84,300	ت 2011	ث 1 2012	93%	100%	85%	- المشروع في مرحلة الاعمال النهائية
2.1.2	بناء مراكز رعاية (2) صحية اولية محجزة	- مديرية الصحة - عقود المحافظة	- مديرية الصحة - عقود المحافظة	تمية الاقاليم	1,290	ايلول 2011	ث 1 2012	90%	100%	81%	- المشروع في مرحلة الاعمال النهائية

(1) يشمل هدم وإعادة بناء مدرسة (العلی) الابتدائية (12) صف في منطقة العلی وهي منطقة فقيرة في قضاء المدينة محافظة البصرة

(2) المشروع انشاء بناية مركز صحة قطاع (البي الخصيب) في منطقة الشيخ يقضاء (البي الخصيب) وهي منطقة فقيرة
